

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 1 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

INFORME INTERVENTORÍA DE GESTIÓN SOCIAL No. 4
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 290 DE 2018 LOTE 1
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN



OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, JURÍDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 290 DE 2018. CUYO OBJETO ES REALIZAR POR PRECIO UNITARIO CON FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS PARA LA ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PARA LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO.

**JULIO
BOGOTÁ D.C.**

 INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 2 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

Contenido

1. PLAN DE GESTIÓN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL.	5
1.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	5
1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.	5
1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:	6
1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:.....	6
1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	6
1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:.....	7
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME	7
2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	8
2.1.1 Reunión de inicio.....	8
2.1.1.3 REUNION EXTRAORDINARIA.....	9
2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.	10
2.1 Puntos satélites de información.....	11
2.1.1 Tabla Puntos satélites de información	11
2.1.2 VOLANTES INFORMATIVOS.	12
2.1.2.1 Tabla Consolidado entrega de Volantes.....	12
2.1.2.1.1 Comentarios con respecto a las entregas de volantes informativos.	13
2.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	14
2.3.1 Punto CREA.....	14
2.3.1.1 Tabla Punto CREA.	14
2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	15
2.4.1 COMITES CREA.....	15
2.4.1.1 Tabla Consolidado Miembros Comité CREA – Selva Dorada.....	¡Error!
Marcador no definido.	
2.4.1.2 MIEMBROS DEL COMITÉ CREA BARRIO MODELIA.....	16
2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACION DE EMPLEO.	17
2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.....	18
2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad.	18
2.6.1.1 Comentarios de la actividad.	19
2.6.2 Actas de compromisos.	20
2.6.3 Registros fílmicos y fotográficos de las vías.	20
2.6.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO	21
2.6.4.1 Capacitación Buen Trato y Convivencia MONC – Modelia.....	21

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía local de Fontibón</small>
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 3 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

2.6.4.1.1 Capacitación Buen Trato y Convivencia MONC – La Selva Dorada **¡Error! Marcador no definido.**

2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
2.8 LISTA DE ANEXOS COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL – MEDIO MAGNETICO.	24
2.9 FOTOGRAFÍA (1)	26

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 4 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

INTRODUCCIÓN

Para el presente informe de gestión social la interventoría hace acompañamiento al contratista con el fin de dar cumplimiento al contrato de obra No 290 de 2018 Lote 1 cuyo objeto es: REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, JURÍDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA. 290 de 2018 CUYO OBJETO ES REALIZAR POR PRECIO UNITARIO CON FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS PARA LA ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PARA LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO. De acuerdo con lo escrito anterior mente el presente informe expone el conjunto de actividades orientadas y supervisadas por la INTERVENTORÍA CONSTRUCIVILES S.A.S para ejecutar las actividades según plan de gestión social, las cuales para esta etapa fueron registradas en los formatos aprobados por la interventoría del área Social.

La construcción de las obras generará algunos impactos a la comunidad residente y comerciante del sector durante su desarrollo; por tal razón el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBON, ha venido implementado y mejorando el proceso desarrollado en los siguientes programas:

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía local de Fontibón</small>
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 5 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

1. PLAN DE GESTIÓN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL.

1.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

Busca implementar acciones de comunicación para brindar información veraz, clara y oportuna a la comunidad sobre las actividades técnicas, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo antes, durante y después de la ejecución de la obra; este programa contempla las siguientes actividades:

- Reunión de Inicio
- Reunión de finalización de la obra
- Reuniones extraordinarias

1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

A través de este programa se realiza la publicación de información del proyecto, mediante entrega de piezas de comunicación las cuales son entregadas a las unidades sociales algunas de ellas en visitas domiciliarias donde se presenta el portafolio de las actividades que se realizaran en la ejecución de la obra; para este programa se hacen las siguientes actividades.

- Ubicación de puntos satélites de información
- Afiches de información
- Volantes de información ciudadana o comunicados.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía local de Fontibón</small>
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 6 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Con este programa se acerca al ciudadano a la gestión pública, facilitándole el acceso a la información sin tener que desplazarse a la entidad. El fin es contar con los medios suficientes para brindarle una atención oportuna a la solicitud que presente frente a la obra, los elementos básicos para la atención a la comunidad son:

- Punto CREA (centro de reunión encuentro y atención en obra).
- Línea telefónica
- Correo electrónico
- Recepción de quejas, reclamos, solicitudes de información y sugerencias.

1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:

En este programa se capacita al personal de la obra sobre los temas relacionados a la atención al ciudadano y aspectos sociales en la ejecución del proyecto.

1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

El presente programa busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población que apunte al mejoramiento de las condiciones económicas de la población participante. Según lo estipulado en el apéndice social del contrato EL CONTRATISTA deberá contratar como mínimo un (60) % del personal no calificado para la obra, estableciendo que su domicilio se encuentre en la localidad que atraviesa el proyecto para este caso localidad de FONTIBON. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá llevar una planilla (formato respectivo de personal no

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 7 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

calificado) que registre esta circunstancia. Los oficios que se entenderán como mano de obra no calificada son los siguientes: cargue, descargue, excavación, limpieza y en general las actividades concernientes a un obrero raso. Durante la reunión de inicio de obra se socializará con la comunidad las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes.

1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:

Durante el desarrollo de la obra existen diferentes actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad. En estas actividades el área Social de la interventoría efectúa el acompañamiento respectivo para hacer el acercamiento directo con la comunidad y el personal técnico del proyecto; estas actividades son:

- Levantamiento de actas de vecindad.
- Levantamiento de actas de compromiso.
- Realización del registro fílmico y fotográfico de las vías.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME

El presente Informe de Gestión Social consolida las actividades desarrolladas por el contratista INGESCOR LTDA, dando cumplimiento al anexo técnico-social correspondiente al contrato 290 de 2018 lote 1 que tiene por objeto “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO- LOTE 1.”, para el periodo correspondiente del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 8 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

A continuación se presentan y se describen cada una de las actividades desarrolladas por el contratista en acompañamiento de la interventoría del área social dentro del componente de Gestión Social para el proyecto y las obras a desarrollar durante el contrato No. 290 de 2018, para el presente periodo.

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

2.1.1 Reunión de inicio.

Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, el contratista INGESCOR LTDA, bajo la supervisión y aprobación de la Interventoría, dio cumplimiento con la reunión de inicio de los CIV´S que fueron determinados desde el área técnica (Barrio Kasandra); a través de esta se procedió a informar a la comunidad sobre las diferentes actividades a realizar desde las áreas técnicas, Ambiental, SST y social, las diferentes acciones a ejecutar con relación a los cerramientos y PMT´s aprobados, y se dio respuesta a los interrogantes surgidos en torno a la comunidad con respecto a las obras a desarrollar.

Las generalidades de esta actividad se relacionan en la siguiente tabla.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 9 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

CIV	BARRIO	FECHA	LUGAR	# DE ASISTENTES	OBSERVACIONES
9000319 9000302 9000284 9000863 9000252	KASANDRA	10/06/19	Tramo a ejecutar – KASANDRA	48 personas	<p>Durante la reunión se contó con la presencia de profesionales tanto de contratista e interventoría así como del Ingeniero Rubén Díaz y el Señor Edgar Granados por parte de la Alcaldía Local de Fontibón, las temáticas desarrolladas a lo largo de la reunión corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación del proyecto y del grupo de trabajo. - Presentación de las actividades de los componentes técnico, ambiental, SST y social. - Entrega de datos de contacto a la comunidad. - Cronograma de actividades: Inicio y Finalización. - Alcance del proyecto. - Construcción del espacio público. - Contratación de MONC. - Seguridad de comunidad y empresa contratista. - Inicio y normatividad respecto al encerramiento - Horario de trabajo. - Conformación del comité CREA..

2.1.1.3 REUNION EXTRAORDINARIA.

Para el presente periodo se programaron reuniones extraordinarias con líderes comunitarios de los frentes de obra Selva Dorada y Modelia Etapa 1 José Pérez y Beatriz González, respectivamente; con el fin de socializar la actualización de PMT y solicitar prórroga del mismo a la Secretaría Distrital de Movilidad. La socialización

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía local de Fontibón</small>
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 10 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

para el frente de obra Modelia Etapa 1 se realizó el 05 de junio de 2019, mientras que la reunión para el CIV de Selva Dorada se realizó el 14 de junio de 2019.

Por otra parte, algunos residentes de la Carrera 134 A entre calles 14D y 14F que están por fuera de los CIV'S que se intervendrán en el frente de obra Kasandra presentaron inconformidad pues el tramo de vía donde residen no está contemplado dentro de este contrato. En reunión extraordinaria el día 20 de junio de 2019, se les explicó que este tramo de vía no se puede intervenir pues está dentro de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) por la ronda del río Bogotá; sin embargo, frente a las inquietudes que presentaron por el desnivel en el alcantarillado y las inundaciones que se presentan en temporada invernal, se les explicó que la intervención que realizará el contratista dedicará especial atención a esta problemática para buscar corregir esta situación. Como evidencia de este encuentro se genera y se firma por las partes involucradas acta de reunión extraordinaria.

2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

El presente programa se orienta a brindar información clara y oportuna, respecto a las condiciones generales del proyecto, así como de las actividades próximas a realizar, las recomendaciones para la sostenibilidad de las obras ejecutadas y los

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 11 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

datos de contacto tanto de contratista como de interventoría, a la comunidad que se encuentra la zona de influencia directa del proyecto.

A continuación se describen las actividades correspondientes a este programa.

2.1 Puntos satélites de información.

Con el propósito de dar cumplimiento en lo escrito en el Plan de Gestión Social, el contratista mantuvo instalado 2 puntos satélites para los CIV'S que iniciaron actividades durante el periodo en mención de la siguiente manera:

2.1.1 Tabla Puntos satélites de información

CIV	Frente de Obra/Barrio	Fecha de instalación/verificación	Nombre de persona contacto	Teléfono
9000319 9000302 9000284	Kassandra	20 de junio de 2019	Minimercado Oasis Carmenza Díaz	3118865487
9000863 9000252	Kassandra	20 de junio de 2019	Restaurante MAFI Yaneth Ortiz	3143038274

Por otra parte, con el fin de actualizar la información entregada a la comunidad a través de los puntos satélites de información, durante el periodo en mención, se realizó la verificación del volante instalado para los CIV'S en intervención en el barrio Modelia, selva dorada y en la alcaldía local, al igual que el cambio/actualización del mismo con la información referente al avance de la obra.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 12 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Tabla Puntos satélites de información - Actualizados

CIV	Frente de Obra/Barrio	Fecha de instalación/verificación	Nombre de persona contacto	Teléfono
9003285	Modelia Etapa 1	19 de junio de 2019	Alberto Fandiño	3115070040
9000748	Selva Dorada	26 de junio de 2019	Paola Escobar	3134891582
-	Cartelera Alcaldía Local Fontibón	13 de junio de 2019	Marlon González Of. Prensa	3125073637

2.1.2 VOLANTES INFORMATIVOS.

Para el mes que corresponde al presente informe, y con el propósito de invitar a la comunidad del frente de obra del barrio Kasandra, se proyectó la entrega de volantes de invitación a la comunidad a la Reunión de Inicio, el volante contó con información relacionada con la zona de influencia de la reunión, la fecha, hora y lugar, la información básica del contrato y los datos de contacto del área social del contratista, Los volantes fueron distribuidos puerta a puerta, previa aprobación por parte de interventoría y visto bueno por parte de la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Fontibón; en los predios en los cuales no fue posible contactar al propietario y/o habitante del predio se procedió a depositar el volante bajo puerta o buzón dejando la respectiva anotación en el formato control entrega de volantes.

Las generalidades de estas actividades se describen a continuación:

2.1.2.1 Tabla Consolidado entrega de Volantes

CIV	Frente de Obra/Barrio	Fecha de entrega	Total de volantes entregados puerta a puerta
-----	-----------------------	------------------	--

 INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 13 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

9000319 9000302 9000284 9000863 9000252	Kasandra	04 de junio de 2019	42 Volantes
---	----------	---------------------	-------------

2.1.2.1.1 Comentarios con respecto a las entregas de volantes informativos.

Para el presente periodo el contratista cumplió con las actividades correspondientes a este programa logrando así una comunidad totalmente informada, la cual evita las quejas ante el ente contratante y el normal desarrollo de las ejecuciones en obra.

Plegable de Plan de Manejo de Tráfico – PMT Kasandra

Con el propósito de brindar información sobre aspectos relacionados con la movilidad vehicular y peatonal, desvíos y cierres (fechas, horarios, duración, rutas y tipo de señalización) que afecten la cotidianidad de las zonas de influencia directa del contrato, durante el periodo en mención se procedió con la distribución de un volante informativo comunicando a la comunidad sobre estas afectaciones, en los CIV del frente obra Kasandra en donde se dio inicio a las actividades constructivas, de la siguiente manera:

Tabla Consolidado entrega de Plegable de PMT - Kasandra

CIV	Frente de Obra/Barrio	Fecha de entrega	Total de volantes entregados puerta a puerta
9000319 9000302 9000284	Kasandra	20 de junio de 2019	40 Volantes

 INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 14 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

9000863			
9000252			

2.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

2.3.1 Punto CREA.

Durante el periodo en mención el contratista contó con la adecuación del espacio físico de atención a la comunidad según los lineamientos establecidos en el anexo técnico social, de igual forma se procedió con la atención, de la siguiente manera:

2.3.1.1 Tabla Punto CREA.

Horario de atención	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
Lunes, Miércoles y Viernes 9:00am - 12:00pm	Calle 22A No. 96D-34	9279981	atenciónalciudadanoingescor@gmail.com

La atención a la comunidad durante el mes en mención, se encontró a cargo de la profesional social del contratista, con el apoyo e intervención del profesional técnico, ambiental y SST del contratista (en los casos que fuese necesario), a través de la atención de cada uno de los medios destinados para tal fin.

Adicionalmente, durante el desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas y los diferentes recorridos realizados, se procedió a resolver las inquietudes de la comunidad y a informar sobre los medios y mecanismos de atención disponibles.

 INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 15 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Durante el periodo en mención se generaron cuatro (4) manifestaciones ciudadanas que se presentaron en el frente de obra Modelia Etapa 1 durante los recorridos realizados por el profesional del área social.

A continuación se relacionan las PQRS recibidas durante el periodo de este informe:

Tabla consolidado PQRS Recibidas durante el periodo

CIV	Frente de Obra	Fecha	Nombre	Dirección	Teléfono
9003285	Modelia	05/06/19	Adriana Echavarría	Cll 23G # 75 - 56	3017080825
9003285	Modelia	10/06/19	Daniela Prada	Cll 23G # 75 - 84	3102685065
9003285	Modelia	19/06/19	Bertha Rodríguez de Gómez	Cll 23G # 75 - 66	3134596621
9003213	Modelia	19/06/19	Carolina Triana	Cll 23G # 80B - 07	3003534007

2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

2.4.1 COMITES CREA.

Durante el periodo en mención se convocó a los miembros del comité CREA del barrio Selva Dorada para presentar el avance de obras en los componentes técnico,

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S</p>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía local de Fontibón</small>
	<p style="text-align: center;">Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN</p>	<p style="text-align: center;">Página 16 de 31</p>	
<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1</p>		<p style="text-align: center;">PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019</p>	

ambiental y social; así mismo, se aprovechó el espacio para recoger sus inquietudes y observaciones.

Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta los CIV'S en los cuales se dio inicio a las actividades constructivas, durante el periodo en mención se conformó el Comité CREA para el frente de obra de Kasandra, durante la reunión de inicio de obra, de la siguiente manera:

Tabla consolidada Comité CREA – Inscripción (Kasandra)

CIV'S	Frente de Obra/Barrio	Fecha de conformación/reunión	Total de participantes	Anexo
9000319 9000302 9000284 9000863 9000252	Kasandra	10 de junio de 2019	6	Anexo 8

Tabla consolidada Miembros Comité CREA – Kasandra

CIV'S	Nombre	Dirección	Teléfono	Anexo
9000319	Carmeza Díaz	Cra 134A No.14F-06	3118865487	Anexo 9
JAC	Azucena Parra	Calle 16A No. 136-50	3108052158	
9000252	Margoth Tejada	Cra 134A No.15B-24	3012571612	
9000284	Carlos A. Ladino	Cra 134A No.15-19	5727536	
9000319	Ciro Andrés Arroyo	Calle 14DBis No.134A-40	3102264816	
9000252	José A. Benavides	Cra 134A No.15B-06	5743313	

2.4.1.2 MIEMBROS DEL COMITÉ CREA BARRIO MODELIA.

CIV'S	Nombre	Dirección	Teléfono
-------	--------	-----------	----------

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 17 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

5000324	Rafael Alfonso	Calle 23G No. 81-45	2952475
9003213	Ruth Pachón	Calle 23G No. 80B-27	3228447386
9003024	Flor Santamaría	Calle 23G No. 81C-49	3188931442
5000324	Álvaro Rodríguez	Calle 23G No. 81-46	3158958014
Veeduría Ciudadana	Beatriz González	N.A	3134335586

2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACION DE EMPLEO.

Durante el periodo en mención el contratista procedió con la convocatoria para la contratación del personal de mano de obra no calificada (MONC) de la localidad de Fontibón, a través de las diferentes actividades ejecutadas por el área de Gestión Social en los CIV´S proyectados para iniciar, así como en la reunión de inicio de obra realizada para el frente de obra de Modelia y Selva Dorara , comunicando las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes, así mismo, en los puntos satélites de información, en el punto CREA.

Para el periodo que corresponde al presente informe, teniendo en cuenta la información registrada por el área SST y Administrativa, y contenida dentro del formato 17 - Control de personal, durante el mes de junio se contó con la contratación de 15 trabajadores correspondientes a la modalidad de MONC. A la fecha el contrato cuenta con 10 trabajadores pertenecientes a la localidad de Fontibón, teniendo así un porcentaje de contratación del 66.6%.

TABLA CONSOLIDADO PERSONAL CONTRATADO DE LA LOCALIDAD DURANTE EL PRESENTE PERIODO.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 18 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Nombre	Cedula	Dirección	Barrio
Johan Alexander Agredo Rojas	1016113046	CL 22 J N° 114 A 46	Fontibon
Carlos Alberto Salamanca Valencia	1133154258	CL 22 A # 96D -35	Fontibon
Uriel Vargas Rubiano	3166870	KR 134 A 14 F 18	Kasandra
Willan Yanine Ferreira	93358796	KR 134 A 16-34	Kasandra

NOTA: Cabe mencionar que a la fecha se han recepcionado hojas de vida de trabajadores de la localidad, sin embargo algunos de ellos no cumplen con los perfiles requeridos para la contratación dentro del proyecto y los que se encuentran seleccionados están a la espera del avance de las obras y de la apertura de nuevos frentes para su vinculación en el proyecto. Se establece para los siguientes periodos la contratación de más trabajadores de la localidad, así como la continuación de la convocaría y la recepción de hojas de vida.

2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad.

Durante el mes que corresponde al presente informe se completó la actividad de levantamiento de actas que había iniciado el 24 de mayo de 2019, realizando este documento en la totalidad de los predios (41) de los CIV'S del barrio Kasandra.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 19 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Tabla Consolidado Levantamiento de actas de vecindad.

CIV	Frente de Obra/Barrio	Fecha de levantamiento	Dirección	Total actas levantadas
9000284 9000302 9000319 9000863 9000252	Kasandra	24 de mayo al 15 de junio de 2019	Carrera 134A entre Calle 14F y 16	41

Este proceso fue desarrollado por el ingeniero inspector de obra, contando con el acompañamiento del residente social del contratista; en éste se procedió a verificar las condiciones actuales de la vivienda, las posibles fallas presentes en las mismas, así como las señales de alarma que se deben tener presentes durante las actividades constructivas;

2.6.1.1 Comentarios de la actividad.

Este proceso fue desarrollado por el ingeniero inspector de obra, contando con el acompañamiento del residente social del contratista; en éste se procedió a verificar las condiciones actuales de la vivienda, las posibles fallas presentes en las mismas, así como las señales de alarma que se deben tener presentes durante las actividades constructivas; de igual forma, se tomó registro fotográfico tanto del

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 20 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

exterior como del interior de la vivienda como evidencia y soporte de las situaciones observadas. De acuerdo al inventario inicial de predios, en donde se identificaron 40 viviendas, y habiendo levantado 12 actas a la fecha de corte de este informe, quedan pendiente 28 visitas para completar la actividad en los CIV de Kasandra.

2.6.2 Actas de compromisos.

Durante el periodo en mención se procedió con el levantamiento de tres (3) actas de compromiso para los siguientes casos especiales con la comunidad:

Tabla consolidado Actas de compromiso-

CIV	Frente de obra/Barrio	Dirección	Nombre	Fecha	Compromiso
9003285	Modelia	Calle 23G No. 75-77	Miguel Garavito	25 de junio de 2019	Intervenir el andén en baldosa y construirlo en concreto
9003285	Modelia	Calle 23G No. 80B-27	Ruth Pachón	25 de junio de 2019	Intervenir el andén en baldosa y construirlo en concreto
9003285	Modelia	Calle 23G No. 80B-63	Ricardo Gonzalez	25 de junio de 2019	Intervenir el andén en baldosa y construirlo en concreto

2.6.3 Registros fílmicos y fotográficos de las vías.

Con el propósito de registrar el estado inicial de las obras localizadas en el área de influencia directa del proyecto y de las vías aledañas, incluyendo el espacio público,

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 21 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

el profesional del área técnica en compañía del área social, durante el periodo en mención realizaron recorrido y registro fílmico y fotográfico del área de influencia directa del proyecto

Esta actividad fue desarrollada en los CIV'S del barrio Kasandra, que iniciaron actividades constructivas a lo largo del presente mes.

2.6.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO

2.6.4.1 Capacitación Prevención Acoso laboral MONC – Modelia

Durante el presente periodo se realizó la capacitación de *Prevención del acoso laboral* al personal en obra que se encuentra adelantando trabajos en el frente de obra de Modelia. Esta actividad se realizó el 28 de junio de 2018 a las 9:00 am y en ella se contó con la participación de 5 trabajadores. El propósito fundamental de

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 22 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

este ejercicio fue generar estrategias de prevención del acoso para promover el respeto entre compañeros de trabajo y con la comunidad; así mismo, se reiteró el conducto regular para la presentación de PQRS, para ello se entregaron tarjetas con la información de contacto del Punto CREA a los trabajadores, recordándoles entregar estos datos a personas de la comunidad que se acerquen a ellos para manifestar sus inquietudes, quejas, sugerencias y observaciones.

Tabla 1. Capacitación MONC – Modelia

CIV'S	Frente de Obra/Barrio	Fecha de Capacitación	Total de participantes	Anexo
9003285 9003213	Modelia	28 de junio de 2019	5	Anexo 11

OTRAS ACTIVIDADES.

Comité Obra – Alcaldía Local de Fontibón

El 19 de junio de 2019 a las 10:00 am se realizó comité integral de obra en las instalaciones Alcaldía Local de Fontibón, en el cual participaron profesionales del contratista, interventoría y apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía local de las áreas técnica, ambiental y social. En este espacio se revisaron compromisos adquiridos, avance en los diferentes frentes de obra y se discutieron actividades por

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 23 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

desarrollar en las próximas semanas, generando a su vez nuevos compromisos que serán verificados en el próximo comité.

2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente periodo el contratista cumplió con las actividades desarrolladas en del componente de Gestión Social la cuales permitieron el acercamiento de la comunidad con cada una de las obras a desarrollar por tal razón se hace necesaria la continua participación de la población perteneciente a la zona de influencia directa del proyecto.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 24 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Para el presente periodo las lluvias que se presentaron han generado retrasos en los frentes de obra; pese a ello, la comunidad se ha mostrado comprensiva frente a esta situación, pues es una condición que sale del alcance de los responsables del proyecto. Por su parte el contratista ha empezado a tomar medidas para evitar incumplimientos y dar celeridad a los trabajos.

Es importante recalcar la activa participación de las comunidades en donde se han iniciado actividades tanto técnicas como ambientales y sociales, pues se han visto líderes comprometidos con sus comunidades que se mantienen al tanto de los avances en los trabajos, así mismo han manifestado su apoyo para facilitar el avance de las actividades del contratista, demostrando sentido de pertenencia y apropiación de su espacio público.

2.8 LISTA DE ANEXOS COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL – MEDIO MAGNETICO.

Anexo 1. Actas de socialización prórroga PMT.

Anexo 2. Acta de reunión extraordinaria Kasandra.

Anexo 3. Puntos satélites de información - Instalados

Anexo 4. Puntos satélites de información - Actualizados

Anexo 5. Volante Informativo Reunión de Inicio Kasandra.

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 25 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

Anexo 6. Volantes invitación – Reunión de inicio de obra

Anexo 7. Plegable de PMT - Kasandra

Anexo 8. Comité CREA – Inscripción (Kasandra)

Anexo 9. Miembros Comité CREA – Kasandra

Anexo 10. Actas de compromiso

Anexo 11. Capacitación MONC – Modelia

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 26 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

2.9 FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: REUNIÓN INICIAL BARRIO KASANDRA

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 27 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

FOTOGRAFÍA (2)



**Texto explicativo de la fotografía: ACOMPAÑAMIENTO TALLER CAPACITACIÓN PERSONAL
MODELIA**

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 28 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	


FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: REUNION EXTRAORDINARIA BARRIO SELVA DORADA

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN		Página 29 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

FOTOGRAFÍA (4)

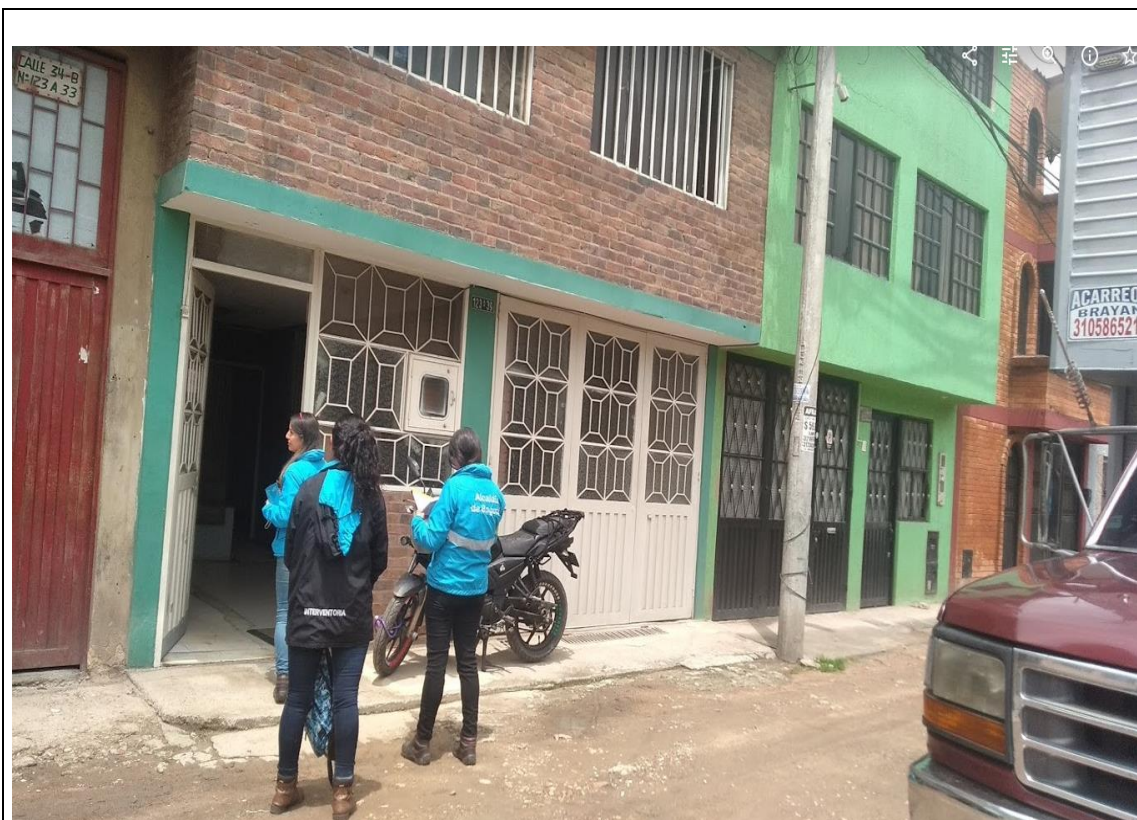

Texto explicativo de la fotografía: RECORRIDO DE OBRA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS KASANDRA

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
	Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Página 30 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1		PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019	

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía: ACOMPAÑAMIENTO TALLER DE CAPACITACIÓN SELVA DORADA

 INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía local de Fontibón
Informe – No.04 -L1 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN		Página 31 de 31	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283 DE 2018 – LOTE 1			PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía: ACOMPAÑAMIENTO REUNIÓN COMITÉ CREA SELVA DORADA
