

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5 DEL CONTRATO 5032 – 2023

**PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE
2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR:
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

SUPERVISOR:
ING. DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

AGOSTO 2024

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN 1
			PÁGINA
Contrato de Obra No. 2986 - 2023 4622 - 2023 2954 - 2023 3411 - 2023			
Contratista: JAC ASOJUNTAS MUNICIPIO DE URIBIA JAC ETNIA WAYUU MUNICIPIO DE URIBIA JAC JONJONCITO MUNICIPIO DE URIBIA JAC SHIRURIA MUNICIPIO DE MANAURE			
Contrato de Interventoría No. 5032-2023			
Interventoría: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS			
Objeto Contrato de Obra: Convenio Solidario No 2986-2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
Convenio Solidario No 4622-2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
Convenio Solidario No 2954-2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
Convenio Solidario No 3411-2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
INFORME MENSUAL No.5..... MES O PERIODO: JULIO 2024.			
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	53
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		6
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		22
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		26
3.1	Información general del contrato		26
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		30
3.3	Seguimiento Items no previstos		38
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		38
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		44
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	44
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	44
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	45
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	45
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	50
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	50
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	50
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	50
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	50
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	50
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	51
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	51
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		56
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		57
5.3	Informes especialistas y profesionales		80
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		80
5.5	Informe matriz de riesgos.		80
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	80
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	80
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	80
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	81
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	81
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	81
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	81
7	Conclusiones y recomendaciones		83
8	Anexos		86
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y vídeo del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y vídeo de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.			
Firma: _____ Nombre: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Resolución de designación No.			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial			

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

- 2.1.1 Localización del Corredor a intervenir
- 2.1.2 Localización del campamento y fuentes de materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- 2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial
- 2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

3. CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

- 3.1.1 Datos del Convenio

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS

- 3.2.1 Etapa de Revision de Estudios y Diseños
- 3.2.2 Obras de Mejoramiento – Placa Huella
- 3.2.3 Valores ejecutados

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.1 INFORME SEMANAL

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIOS

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONVENIOS

4.3.1 Control del Personal de convenios

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social convenios

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ONTRATO DE OBRA

4.4.1 Informe financiero y presupuestal

4.4.2 Forma de pago de los conevenios

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones

4.9.2 Actas de comité de obra o actas de reunión

4.9.3 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

4.10 FUENTE DE MATERIALES

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría

5.2.2 Control de correspondencia.

5.2.3 Registro fotográfico

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 Control Personal de Interventoría

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.3.1 Informe financiero y presupuestal

6.3.2 Forma de pago del contrato

6.3.3 Actas de Costos de Interventoría

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES.

7.2 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD

8 ANEXOS

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual No 5 del Contrato de Interventoría No 5032 de 2023 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", comprendido en el periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024.

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2023, por parte del el INVIAS se da orden de inicio al Contrato de Interventoría No 5032 de 2023 teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos, para realizar el seguimiento a los Convenios solidarios No 2986, 4622, 2954 y 3411 de 2023.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por tal razón el Instituto Nacional de Vías suscribió los Convenios Solidarios No 2986, 4622, 2954 y 3411 de 2023, con los Organismos de Acción Comunal, cuyo propósito se orientará necesariamente hacia la intervención de vías regionales en su jurisdicción. Los Objetos de cada proyecto se describen a continuación:

Convenio Solidario No 2986-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Convenio Solidario No 4622-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

Convenio Solidario No 2954-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Convenio Solidario No 3411-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

2.1.1 Localización del Corredor a intervenir

Los proyectos se encuentran localizados en los Municipios de Uribia y Manaure, en el Departamento de La Guajira.

El Municipio de Uribia ocupa una estratégica posición marítima y fronteriza; abarca toda la región de la Alta Guajira y una parte de la Media Guajira. En él se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la comunidad wayúu. Sus límites son:

- **Norte y Oriente:** con el mar Caribe.
- **Sur:** con Venezuela (Alta Guajira, Municipio Guajira, Estado Zulia).
- **Suroccidente:** con el municipio de Maicao.
- **Occidente:** con el municipio de Manaure.

El Municipio de Manaure es reconocido principalmente por encontrarse en este las salinas marítimas más importantes del país. El mar Caribe que bordea la costa, es la fuente más abundante de agua convirtiéndose no solo en generador de alimentos sino como elementos primarios para la industria de la sal, base de la economía de esta región. Sus

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

límites son:

- **Norte:** Con el mar Caribe.
- **Nororiente:** Con el municipio de Uribia.
- **Sur:** Con el municipio de Maicao.
- **Occidente:** Con el municipio de Riohacha.

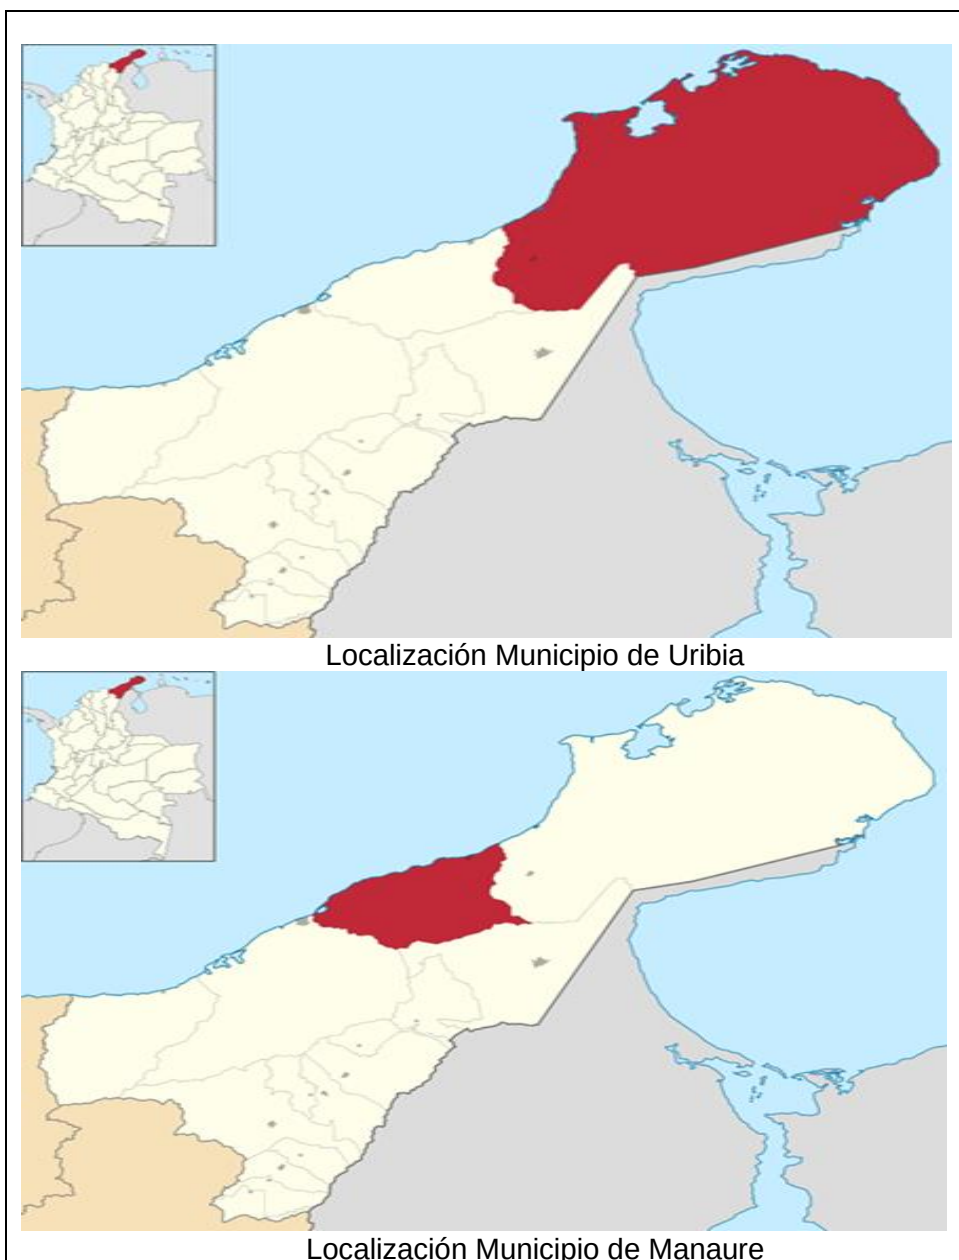


Figura 1. Localización del proyecto

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Localización del Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir es la vía a Cardón, que conduce de Mareiwamana a casicho, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.90197
- **Longitud Inicial:** -72.185163
- **Latitud final:** 11.90936
- **Longitud final:** -72.197695

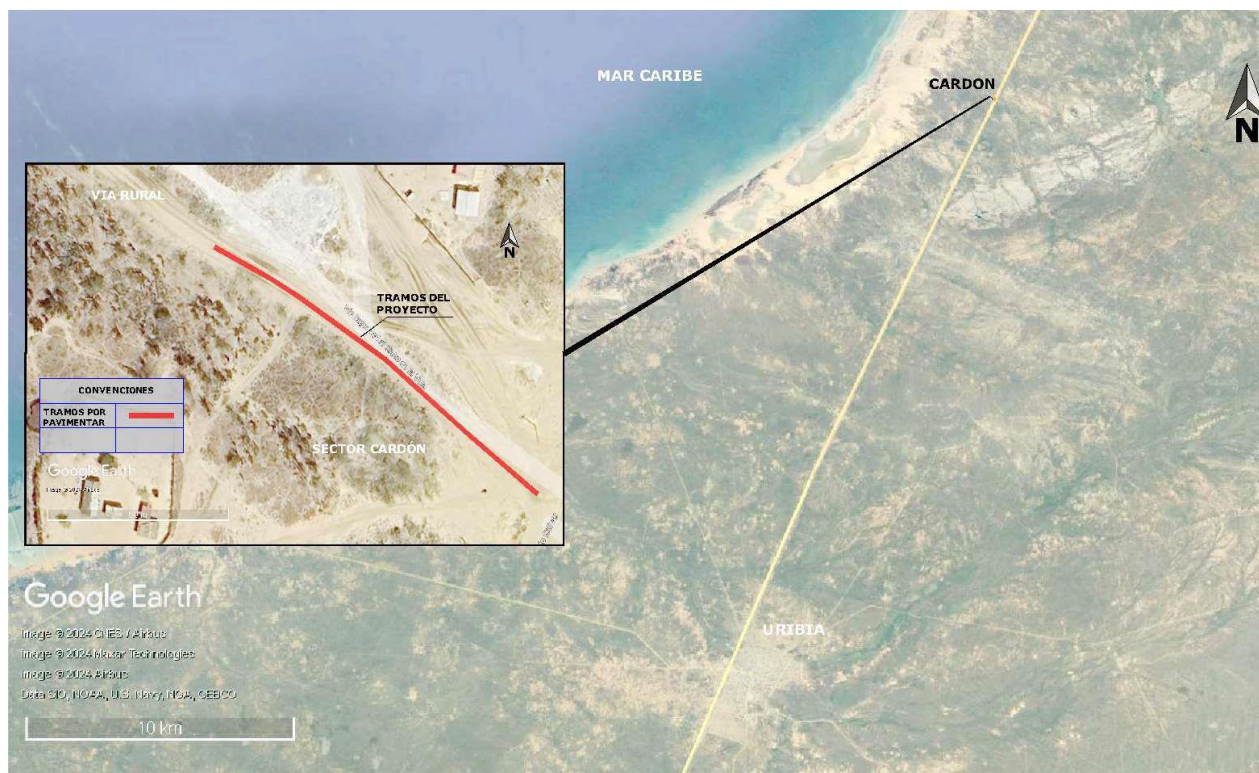


Figura 2. Localización del tramo a intervenir vía a Cardón

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

➤ **Localización del Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir en el barrio Etnia Wayuu, es la vía que conduce al arroyo de Chemerrain, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.721666
- **Longitud Inicial:** - 72.254166
- **Latitud final:** 11.7258333
- **Longitud final:** 72.246668

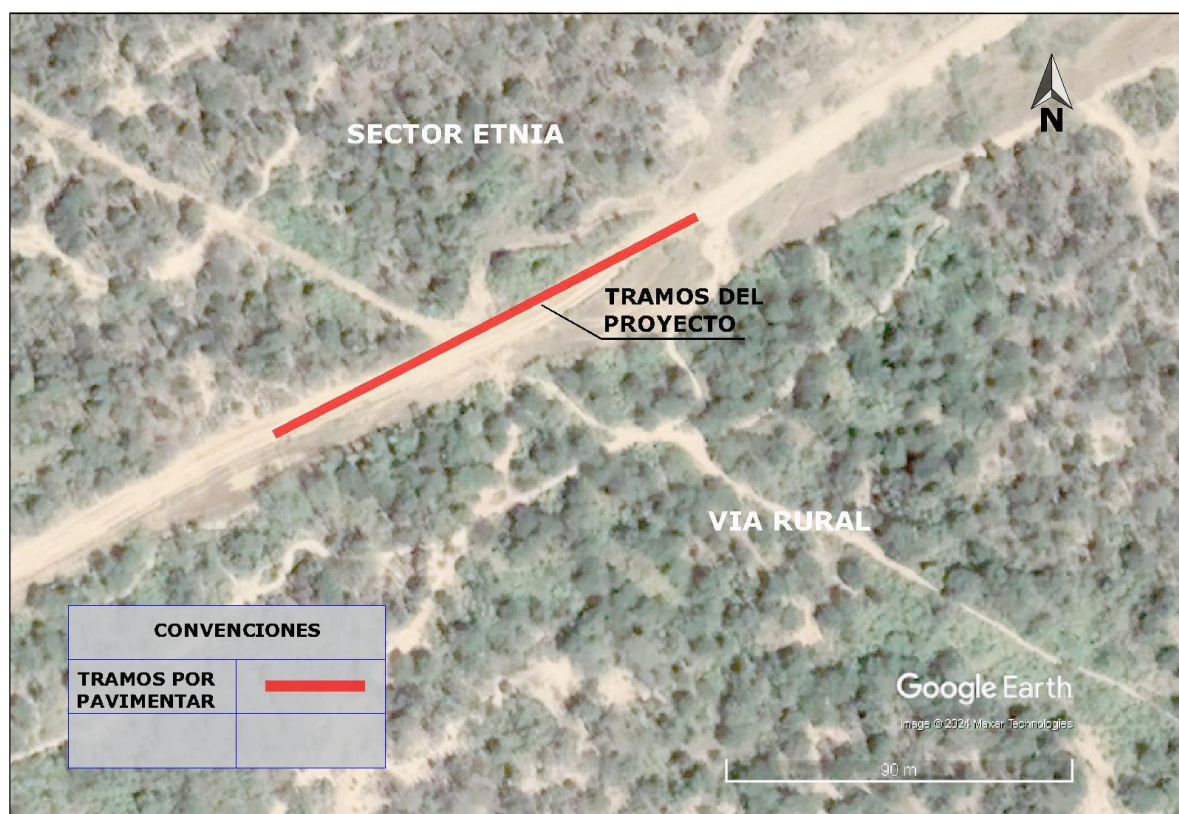


Figura 3. Localización del tramo a intervenir vía arroyo Chemarrain

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Localización del Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir es la vía que conduce hacia el Corregimiento de Jonjoncito en el sector de Jomarraali hasta Villa Sapa, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.777106
- **Longitud Inicial:** -72.135629
- **Latitud final:** 11.770224
- **Longitud final:** -72.151733



Figura 4. Localización del tramo a intervenir vía a Jonjoncito

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Localización del Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

El tramo vial a intervenir corresponde a la vía que va desde Casa azul en la vía que comunica al Municipio de Manaure con Uribia, hasta el Corregimiento de Shiruria, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.766705
- **Longitud Inicial:** -72.335733
- **Latitud final:** 11.434242
- **Longitud final:** - 72.214166

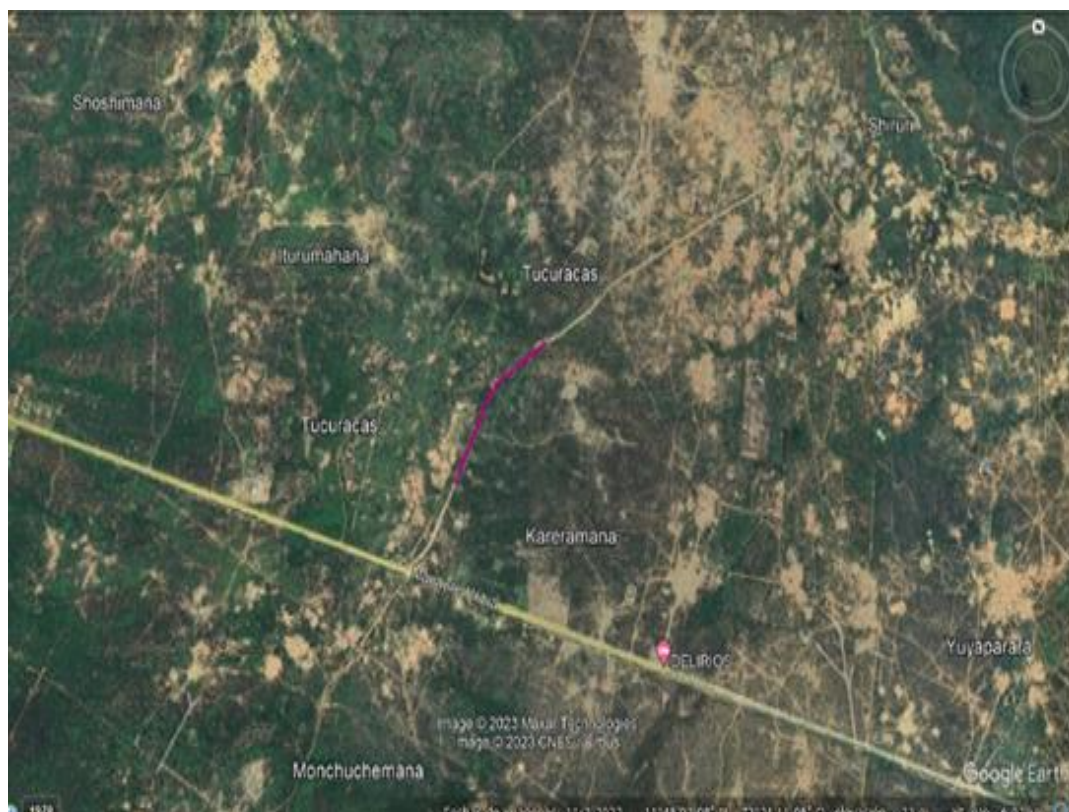


Figura 5. Localización del tramo a intervenir vía a Shiruria

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

2.1.2 Localización del campamento y fuentes de materiales

A continuación, se indica la localización del campamento para cada uno de los Convenios Solidarios objeto de la Interventoría:

Convenio Solidario No 2986-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El campamento estará ubicado en la comunidad de Cardón, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 4622-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El campamento estará ubicado en el Barrio Etnia Wayuu, por el sector del Puente sobre el arroyo Chemarrain, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 2954-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El campamento estará ubicado en el sector de Villa Sapa, Corregimiento de Jonjoncito, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 3411-2023.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El campamento estará ubicado en la comunidad de Shiruria, Municipio de Manaure.

La Fuente de materiales, se encuentra ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, en el Municipio de Albania, Departamento de la Guajira.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			



Figura 6. Localización del Municipio de Albania

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El desarrollo de los proyectos beneficia directamente a los usuarios de las vías terciarias de las zonas rurales de los municipios de URIBIA y MANAURE, en el Departamento de la Guajira

Los principales beneficios del proyecto se encuentran en mejorar las condiciones de las vías de comunicación priorizadas las cuales son utilizadas de manera permanente para trasporte de productos comerciales, productos de ganadería y agricultura en cada región, impactando de esta manera el desarrollo de la región.

Los proyectos se encuentran enfocados en resolver las deficientes condiciones de movilidad en las áreas rurales de los municipios y en los problemas de acceso a estas comunidades de los habitantes de estos sectores, debido a que no existe una infraestructura óptima.

Teniendo en cuenta que se pretende promover la competitividad de los Municipios, se requiere de una oferta de transporte y malla vial adecuada que genere mecanismos facilitadores en el traslado, comunicación e interacción de la oferta de productos como la comercialización, con el fin de acceder de manera efectiva a los mercados interno y externo.

Así mismo, el mejoramiento de la infraestructura de la malla vial para el transporte promueve el desarrollo al interior de los municipios permitiendo mayor valorización y mejor calidad de vida de los habitantes del sector.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En la actualidad el Departamento de La Guajira no cuenta con una red vial rural en buenas condiciones, originando dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural con el resto del departamento, así pues por su estado precario, se ha priorizado los siguientes tramos de vía con lo que se pretende mejorar las condiciones de las mismas, ya que son utilizadas para trasporte de las comunidades indígenas, transporte de productos comerciales, productos de ganadería caprina, pesca y agricultura de las regiones. Dicha problemática tiene como efecto el bajo desarrollo socio- económico de las regiones.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros debido a que estos tramos son casi intransitables. Las vías para intervenir presentan similares características, corresponden a corredores rurales en condiciones regulares de transitabilidad, todas las vías carecen de estructura y tanto la calzada como las obras de drenaje son insuficientes para su conservación a través del tiempo, deterioradas rápidamente por el soporte del tránsito vehicular.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

- Estado inicial de la Vía del Convenio Solidario No 2986 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



Figura 8. Estado inicial de la vía a Cardón

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		



Sector Inicial



Sector Final

Figura 9. Sector Inicial y final de la vía a Cardón

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 2954 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



Figura 10. Estado inicial de la vía a Jonjocito

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		



Sector Inicial



Sector Final

Figura 11. Sector Inicial y final de la vía a Jonjoncito

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 3411 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



Figura 12. Estado inicial de la vía a Shiruria

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 3411 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”



Sector Inicial



Sector Final

Figura 14. Sector Inicial y final de la vía Etnia Wayuu

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

➤ **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía a Cardón, que conduce de Mareiwamana a Casicho.

Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**
 - Excavaciones varias sin Clasificar
 - Subbase Granular Clase C
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
 - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
 - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
 - Excavaciones Varias sin Clasificar
 - Excavaciones en roca en seco
 - Demolición de Estructuras
 - Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
 - Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
 - Relleno para Estructuras con Suelo
 - Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
 - Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía que conduce al arroyo de Chemerrain,

Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**
 - Excavaciones varias sin Clasificar
 - Subbase Granular Clase C
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía que conduce hacia el Corregimiento de Jonjoncito en el sector de Jomarraali hasta Villa Sapa. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**
 - Excavaciones varias sin Clasificar
 - Subbase Granular Clase C
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
 - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
 - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.". Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Manaure. El tramo vial a intervenir es la vía que va desde Casa azul en la vía que comunica al Municipio de Manaure con Uribia, hasta el Corregimiento de Shiruria Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**
 - Excavaciones varias sin Clasificar
 - Subbase Granular Clase C
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
 - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
 - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial

➤ **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 110 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 113 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 126 ML PLACA HUELLA

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

- 113 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

➤ **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 75 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 116 ML PLACA HUELLA

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 105 ML PLACA HUELLA

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

- 70 ML PAVIMENTO RÍGIDO

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

3. CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Datos del Convenio

➤ Información Convenio Solidario No 2986 de 2023.

CONVENIO SOLIDARIO No 2986 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE URIBÍA
NIT	901.656.273-8.
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ORLANDO KORZO SOCARRAS
N° IDENTIFICACIÓN:	5.184.696 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$191.227.860) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Información Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO NO 4622 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU
NIT	901.656.261-1.
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ,
N° IDENTIFICACIÓN:	17.868.328 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 189.034.380). MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Información Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO NO 2954 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO
NIT	901.656.168-2.
REPRESENTANTE LEGAL:	LINDEY ALMAZO ROSADO,
N° IDENTIFICACIÓN:	27.034.690 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$189.974.442) MONEDA CORRIENTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Información Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO No 3411 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA
NIT	825.001.809-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO RAFAEL EPIEYU HENRIQUEZ
N° IDENTIFICACIÓN:	17.859.722 DE MANAURE - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$191.716.260,00) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS

3.2.1 Etapa de Revision de Estudios y Diseños

➤ Convenio Solidario No 2986 de 2023.

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante la etapa de revisión, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.
- ✓ Se realizaron las actas de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- ✓ Se realizaron reuniones y comités operativos con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.
- ✓ Se realizaron reuniones en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, El ingeniero Supervisor por parte del Invias, El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión y la Junta de Acción Comunal, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invias y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- ✓ La junta de acción comunal realizó los estudios de suelos, topografía, ajuste de estudios y diseños, ajuste del presupuesto y plan de compras para dar inicio a la etapa de construcción.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante la etapa de revisión, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.
- ✓ Se realizaron las actas de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- ✓ Se realizaron reuniones y comités operativos con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.
- ✓ Se realizaron reuniones en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, El ingeniero Supervisor por parte del Invias, El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión y la Junta de Acción Comunal, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invias y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- ✓ La junta de acción comunal realizó los estudios de suelos, topografía, ajuste de estudios y diseños, ajuste del presupuesto y plan de compras para dar inicio a la etapa de construcción.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

Durante la etapa de revisión, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.
- ✓ Se realizaron las actas de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- ✓ Se realizaron reuniones y comités operativos con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.
- ✓ Se realizaron reuniones en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, El ingeniero Supervisor por parte del Invias, El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión y la Junta de Acción Comunal, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invias y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- ✓ La junta de acción comunal realizó los estudios de suelos, topografía, ajuste de estudios y diseños, ajuste del presupuesto y plan de compras para dar inicio a la etapa de construcción.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Durante la etapa de revisión, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.
- ✓ Se realizaron las actas de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- ✓ Se realizaron reuniones y comités operativos con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.
- ✓ Se realizaron reuniones en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, El ingeniero Supervisor por parte del Invias, El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión y la Junta de Acción Comunal, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invias y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- ✓ La junta de acción comunal realizó los estudios de suelos, topografía, ajuste de estudios y diseños, ajuste del presupuesto y plan de compras para dar inicio a la etapa de construcción.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

3.2.2 Obras de Mejoramiento

➤ Convenio Solidario No 2986 de 2023.

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades en la etapa de construcción:

- CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
Se realizó la construcción de la placa huella, con un porcentaje de avance del 70%, con la ejecución de las siguientes actividades:
 - Instalación de valla publicitaria
 - Excavaciones varias sin Clasificar
 - Subbase Granular Clase C
 - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
 - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
 - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
A la fecha, no se ha dado inicio a la construcción de la Alcantarilla en obra, sin embargo, se tienen adelantadas las siguientes actividades:
 - Figuración Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
 - Suministro de Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior

➤ Convenio Solidario No 4622 de 2023.

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades en la etapa de construcción:

- CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

El 21 de Agosto de 2024, se procedió al inicio de la construcción de la placa huella, con la ejecución de las actividades de excavaciones varias sin Clasificar; Sin embargo, se presentó un paro por parte de comunidades indígenas impidiendo la continuidad de las obras. Las comunidades indígenas manifestaron que la vía a intervenir pasa por su territorio y que no iban a dejar que se ejecuten las actividades hasta tanto no se les pague el valor de servidumbre y que si las máquinas seguían trabajando las podrían incinerar.

La interventoría, mediante oficio informó esta situación y solicitó el acompañamiento del área social del Instituto Nacional de Vías y las recomendaciones y/o procedimientos que se deben seguir, a fin de establecer diálogos con la comunidad, que permitan llegar a un acuerdo para la continuidad de las obras. Así mismo, teniendo en cuenta que el Plazo para la ejecución del Convenio de la referencia vence el 30 de septiembre de 2024 y que es desconocido el tiempo que se podría tardar en efectuar las reuniones para buscar alternativas de solución a la problemática y poder llevar a cabo la normal ejecución del proyecto, sugirió la Suspensión temporal del Convenio, hasta que se pueda llegar a consensos con las comunidades indígenas, que permita la ejecución de las actividades.

La Junta de Acción Comunal del Barrio Etnia Wayuu, mediante oficio de fecha 26 de Agosto de 2024, dirigido a la Secretaría de Asuntos Indígenas y a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Uribia, informó la situación presentada y solicitó acompañamiento para el día 30 de agosto de 2024 a las 2:00 PM, a fin de establecer diálogos, que permitan llegar a un acuerdo para la continuidad de las obras.

El día 30 de Agosto de 2024, se realizó reunión con miembros de la comunidad, la Junta de acción Comunal, el Director Territorial de Invias Guajira y la Interventoría.

En dicha reunión, el Director Territorial Invias realizó una exposición del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" explicando la importancia que tiene para mejorar la transitabilidad de la vía existente, permitiendo mayor conexión en los territorios, promoviendo el desarrollo del área rural y generando el empoderamiento de las comunidades. Explicó en detalle el proceso que siguió la Junta para la postulación del tramo a intervenir, el presupuesto asignado, el manejo de los recursos y el plazo contractual que se tiene para llevar a cabo la ejecución de las obras, el cual finaliza el 30 de Septiembre.

La comunidad indígena que impidió la continuidad de las obras, solicitó el cambio del Maestro de Obra y de los obreros que van a laborar en la construcción de la Placa huella, para que se pueda continuar con las actividades.

El Presidente de la Junta de Acción comunal, manifestó que ya el maestro y los obreros están contratados, con exámenes médicos y afiliaciones a seguridad social y que pertenecen a una comunidad aledaña a la zona de ejecución del proyecto.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

El Director de la Territorial, solicitó que se realicen los diálogos entre las dos comunidades, de manera que se pueda dar participación al personal de obra de ambas comunidades, para lo cual se deben enviar los datos a la Interventoría para su aprobación.

La Interventoría solicitó a la Junta de Acción Comunal, la presentación de un cronograma de actividades que permita la ejecución del objeto contractual en el plazo previsto, es decir hasta el 30 de Septiembre de 2024.

A la fecha de corte del presente informe, La Interventoría se encuentra a la espera de la remisión de los documentos de las personas que van a laborar, para la verificación de sus afiliaciones y demás requisitos.

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades en la etapa de construcción:

- CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
- Instalación de valla publicitaria
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C

A la fecha, se realizaron actividades de excavación y subbase granular en un tramo de 80 ml de 105 ml, por lo tanto, se tiene un porcentaje de avance en esta actividad del 76,2%.

El 8 de Agosto de 2024, durante las actividades de ejecución de Subbase Granular Clase C, se presentó un paro por pate de comunidades indígenas no pertenecientes al área de influencia del proyecto impidiendo la continuidad de las obras.

Mediante oficio, la representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Jonjocito LINDEY ALMAZO ROSADO, informó esta situación a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Municipio de Uribia y solicitó acompañamiento para el día 18 de agosto, a fin de establecer diálogos con la comunidad, que permitan llegar a un acuerdo para la continuidad de las obras.

El 18 de agosto de 2024, se realizó reunión en el sitio de ejecución de las obras, con la presencia de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Jonjocito, un representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Municipio de Uribia, la Interventoría y el acompañamiento del área Social y Técnica por parte de la Dirección Territorial Guajira del Instituto Nacional de Vías; con el fin de realizar los diálogos que

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

permitan la resolución de los inconvenientes presentados, por los inconformismos de algunas comunidades indígenas y se pueda desarrollar adecuadamente la ejecución del Convenio Solidario No 2954 de 2023.

Durante el desarrollo de la reunión, la Señora ALTAGRACIA EPINAYU, en calidad de Autoridad Tradicional Indígena del Corregimiento de Jonjocito, informa a los asistentes, que se presenta inconformismo por parte de los señores JUAN FRANCISCO GONZÁLES, NICANOR JARARIYU Y LORENZO JAYARIYU, de la comunidad de Paatsuain, los cuales no permiten que se desarrolle la ejecución de las actividades.

Se estuvo a la espera de los integrantes de la comunidad de Paatsuain, la cual generó el conflicto y quien había solicitado que se hiciera la reunión, pero esta no se presentó; Por lo que no se pudo escuchar a las partes y por lo tanto, no se logró establecer los diálogos con la comunidad, que permitan llegar a un acuerdo para la continuidad de las obras.

La representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Jonjocito LINDEY ALMAZO ROSADO, manifestó que convocarán otra reunión con la Junta Mayor de Palabrereros para buscar alternativas de solución a la problemática y poder llevar a cabo la normal ejecución del proyecto. Así mismo, sugirió que se suspenda temporalmente la ejecución del Convenio Solidario No 2954 de 2023, puesto que desconoce la disponibilidad de los palabrereros y no sabría cuanto tiempo se podrían demorar en llevar a cabo la reunión para llegar a un consenso que permita la ejecución de las actividades.

La interventoría, mediante oficio informó esta situación al Instituto Nacional de Vías y sugirió la Suspensión temporal del Convenio, hasta que se pueda llegar a consensos con las comunidades indígenas, que permita la ejecución de las actividades.

Con el objeto de verificar los compromisos por parte de la Junta de acción Comunal en la reunión efectuada el 18 de agosto, se realizó reunión el día 30 de Agosto de 2024 con la Presidenta de la Junta de acción Comunal, el Director Territorial de Invias Guajira, la Interventoría, la Autoridad tradicional Indígena del sector donde se desarrolla la ejecución de las obras Sra ALTAGRACIA EPINAYÚ, los Palabrereros ILDER AGUILAR, PATRICIO GÓMEZ y miembros de la comunidad.

En dicha reunión, el Director Territorial Invias realizó una exposición del programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" explicando la importancia que tiene para mejorar la transitabilidad de la vía existente, permitiendo mayor conexión en los territorios, promoviendo el desarrollo del área rural y generando el empoderamiento de las comunidades. Explicó en detalle el proceso que siguió la Junta para la postulación del tramo a intervenir, el presupuesto asignado, el manejo de los recursos y el plazo contractual que se tiene para llevar a cabo la ejecución de las obras, el cual finaliza el 30 de Septiembre.

Los Palabrereros asistentes a la reunión manifestaron que realizarán una reunión con las autoridades indígenas que se oponen a la ejecución del proyecto: JUAN FRANCISCO

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

GONZÁLES, NICANOR JARARIYU Y LORENZO JAYARIYU, de la comunidad de Paatsuain, para informar la importancia del proyecto establecer diálogos que permitan llegar a un acuerdo para la continuidad de las obras.

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Durante el mes de agosto de 2024, no se realizaron actividades de construcción en la obra.

Mediante oficios, la Interventoría informó a la Junta de acción Comunal, el presunto incumplimiento en la ejecución del Convenio Solidario, por las demoras en dar Inicio a la etapa de Obras de Mejoramiento y Mantenimientos.

Se exhortó a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, a cumplir a cabalidad con la CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL.

En caso de que la JAC no cumpla con sus obligaciones, esta Interventoría solicitará al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la terminación del Convenio Solidario No 3411 de 2023, teniendo en cuenta las causales de terminación como se detalla a continuación:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente convenio se dará por terminado en los siguientes eventos:

- I. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a ninguna de ellas.
- II. Por el cumplimiento del objeto del convenio.
- III. Por vencimiento del plazo pactado.
- IV. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del OAC.
- V. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que hagan imposible continuar. su ejecución.

El Presidente de la Junta de Acción comunal informó que la demora obedece a las lluvias presentadas en la zona de ejecución del proyecto, que el terreno se encuentra saturado y no se pueden adelantar la ejecución de las actividades iniciales de movimiento de tierra.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

3.2.3 Valores ejecutados

A continuación, se indican los valores desembolsados a las juntas:

➤ Convenio Solidario No 2986 de 2023.

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

DESEMBOLSOS REALIZAODS		
DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	\$ 1.410.986,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	\$ 279.105,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	YUL FRONTADO SUAREZ	\$ 800.000,00
CAJA MENOR INICIO DE PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	\$ 600.000,00
SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR	WYLLKYNS WALLID AVILA DE LA ROSA	\$ 2.800.000,00
SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO RESIDENTE	YESMAR JOSÉ OCHOA	\$ 7.000.000,00
ESTUDIO DE SUELOS	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO JG	\$ 1.700.000,00
SERVICIO DE COMISIÓN TOPOGRÁFICA INICIAL	ARLEY OSPINA MARÍN	\$ 1.209.500,00
REVISIÓN Y/O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MIGUEL GARCÍA ROMANI	\$ 5.500.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL	KATHY YULIETT SOSSA CABARCAS	\$ 2.800.000,00
DOTACIÓN Y SEGURIDAD TOPOGRAFÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN	GRUPO GRAN COLOMBIA S.A.S	\$ 2.009.000,00
	ARLEY OSPINA MARÍN	\$ 750.000,00
MAESTRO DE OBRA	AUGUSTO RAFAEL PERTUZ OSPINO	\$ 1.918.882,50
OBRERO	MIGUEL ALFONSO CAMPO URIANA	\$ 650.310,00
OBRERO	JUAN MANUEL GARCIA EPINAYU	\$ 650.310,00
OBRERO	RAMON VICENTE IGUARAN GONZALEZ	\$ 650.310,00
OBRERO	JOSE VICENTE EPINAYU	\$ 650.310,00
OBRERO	JOSE FRANCISCO PUSHAINA EPINAYU	\$ 650.310,00
OBRERO	ALEJANDRO IGUARAN PUSHAINA	\$ 650.310,00
OBRERO	NOLAN ALBERTO CAMPO URIANA	\$ 650.310,00
MEDIDAS AMBIENTALES	LA GRAN COLOMBIA SAS	\$ 486.600,00
SOCIALIZACION DEL PROYECTO		\$ 400.000,00
DISEÑO DE MEZCLAS Y CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO JG	\$ 1.209.414,40

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

VALLA Y ESTRUCTURA METÁLICA	J&G PUBLICIDAD	\$ 1.289.500,00
EXÁMEN DE INGRESO	MARIO OSORIO LOPEZ	\$ 350.000,00
TRANSPORTE MATERIAL Y PERSONAL	YUL FRONTADO SUAREZ	\$ 5.000.000,00
SUB-BASE GRANULAR MAS TRASPORTE	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 10.710.000,00
TRITURADO	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 4.400.000,00
ARENA	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 2.800.000,00
PIEDRA CICLÓPEO	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 1.800.000,00
CEMENTO - ACERO. – ALAMBRE	FERROELECTRICOS URIBIA S.A.S	\$ 14.606.892,00
ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA	FERREMATERIALES BETO	\$ 21.925.800,00
TUBERÍA DE CONCRETO 90X100CM	LA MACUIRA	\$ 7.270.104,00
VALOR TOTAL		\$ 105.577.953,90
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		\$ 191.227.860,00
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR		\$ 85.649.906,10

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS		
DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR
REINTEGRO GASTOS DE POLIZAS	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUIZ	\$ 1.319.789,08
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARIA	\$ 300.000,00
TOPOGRAFIA	ARLEY OSPINA MARIN	\$ 1.140.000,00
ESTUDIO DE SUELO	OSCAR IVAN GUERRA CHINCHIA	\$ 1.700.000,00
CALA MENOR - PAPELERIA	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUIZ	\$ 300.000,00
CONTADOR	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	\$ 700.000,00
PAGO REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	JOSE ALBERTO RONDON	\$ 5.300.000,00

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

PAGO PRÓRROGA POLIZA CUMPLIMIENTO NB-100295468 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NB-100072954	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	\$ 267.911,00
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	\$ 200.000,00
SERVICIOS PRESTADOS ING AMBIENTAL PAGA	YERSSON MANUEL DIAZ AGUIRRE	\$ 1.500.000,00
CAJA MENOR INCIO DE PROYECTO SEGÚN COSTOS ADMINSTRATIVOS APROBADOS MES 2	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	\$ 300.000,00
REEMBOLSO GASTOS DE SOCIALIZACIÓN INICIAL	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	\$ 350.000,00
PAGO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	LEIDY ANDREA GONZALEZ YEPES	\$ 660.000,00
SERVICIOS PRESTADOS INGENIERO RESIDENTE	FREDY ENRIQUE MAGDANIEL TORRES	\$ 1.750.000,00
IMPRESIÓN DE VALLA	JUAN GONZALES	\$ 340.000,00
DOTACIÓN Y SEGURIDAD	EDILMA ROSA AGAMEZ FURNIELES	\$ 1.937.000,00
MEDIDAS AMBIENTALES	FERRETERÍA JS	\$ 1.285.000,00
PAGO DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR	JIMMY GONZALES BRITO	\$ 4.000.000,00
PAGO DE TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR	JIMMY GONZALES BRITO	\$ 12.000.000,00
ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROCARGADOR	ADALBERTO JOSE VILLALOBO HENRIQUEZ	\$ 6.420.000,00
TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA	JOSE GONZALEZ BRITO	\$ 2.000.000,00
TRANSPORTE PRESIDENTE JUNTA	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	\$ 400.000,00
CONTADOR PUBLICO (CPS)	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	\$ 1.400.000,00
INGENIERO RESIDENTE (CPS)	FREDY ENRIQUE MAGDANIEL TORRES	\$ 3.500.000,00
VALOR TOTAL		\$ 49.069.700,08
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		\$ 189.034.380,00
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR		\$ 139.964.679,92

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

DESEMBOLSOS REALIZAODS		
DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR
REINTEGRO GASTOS DE POLIZAS	LINDEY ALMAZO ROSADO	\$ 1.764.269,00
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARIA	\$ 1.200.000,00
TOPOGRAFIA	ARLEY OSPINA MARIN	\$ 1.140.000,00
ESTUDIO DE SUELO	OSCAR IVAN GUERRA CHINCHIA	\$ 1.700.000,00
CALA MENOR – PAPELERIA	LINDEY ALMAZO ROSADO	\$ 300.000,00
CONTADOR	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	\$ 700.000,00
INGENIERO RESIDENTE	DIEGO FERNANDO MUÑOS ORTIZ	\$ 1.750.000,00
PAGO REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	JOSE ALBERTO RONDON	\$ 5.300.000,00
PAGO PRÓRROGA POLIZA CUMPLIMIENTO NB-100295468 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NB-100072954	LINDEY ALMAZO ROSADO	\$ 103.415,89
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	\$ 800.000,00
SERVICIOS PRESTADOS ING AMBIENTAL PAGA	YERSSON MANUEL DIAZ AGUIRRE	\$ 1.500.000,00
CAJA MENOR INCIO DE PROYECTO SEGÚN COSTOS ADMINSTRATIVOS APROBADOS MES 2	LINDEY ALMAZO ROSADO	\$ 300.000,00
REEMBOLSO GASTOS DE SOCIALIZACIÓN INICIAL	LINDEY ALMAZO ROSADO	\$ 350.000,00
PAGO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	LEIDY ANDREA GONZALEZ YEPES	\$ 660.000,00
IMPRESIÓN DE VALLA	JUAN GONZALES	\$ 340.000,00
DOTACIÓN Y SEGURIDAD	EDILMA ROSA AGAMEZ FURNIELES	\$ 1.937.000,00
MEDIDAS AMBIENTALES	FERRETERÍA JS	\$ 1.285.000,00

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES.Subbase Granular Clase C para relleno.	JIMMY GONZALES BRITO	\$ 3.600.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES. Desde Cantera hasta Jonjoncito - Mun. de Uribia	JIMMY GONZALES BRITO	\$ 16.200.000,00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA. 15 horas Retrocargador Tipo Pajarita y 24 horas Vibrocompactador 3 Ton.	ADALBERTO JOSE VILLALOBO HENRIQUEZ	\$ 7.050.000,00
TRASLADO DE MAQUINARIA AMARILLA. Transporte de Retrocargador Pajarita y Vibrocompactador 3 Ton desde Uribia a Corregimiento Jonjoncito.	JOSE GONZALEZ BRITO	\$ 3.000.000,00
PAGO DE VIAJES MUNICIPIO URIBIA - CORREGIMIENTO DE JONJONCITO Transporte de proveedores de maquinaria y Subbase identificacion del sitio de obra en Jonjoncito.	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	\$ 400.000,00
CONTADOR PUBLICO (CPS)	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	\$ 1.400.000,00
INGENIERO RESIDENTE (CPS)	DIEGO FERNANDO MUÑOZ ORTIZ	\$ 3.500.000,00
PAGO ALQUILER DE ALMACEN. Corregimiento Jononcito Sector Villasapa. Almacen y Vivienda.	ALTAGRACIAS EPINAYU EPINAYU	\$ 800.000,00
VALOR TOTAL		\$ 57.079.684,89
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		\$ 189.974.442,00
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR		\$ 132.894.757,11

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

A la fecha, no se han realizado desembolsos.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Al cierre del presente informe, no se presentaron Ítems No previstos en los Convenios Solidarios a los que se les realiza la Interventoría.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

➤ **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Se realizó la construcción de la placa huella, con un porcentaje de avance del 70%.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Inicio de las actividades en Obra con la construcción de Alcantarilla.
- ✓ Finalización de la construcción de la placa huella.
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

➤ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

El 21 de Agosto de 2024, se procedió al inicio de la construcción de la placa huella, con la ejecución de las actividades de excavaciones varias sin Clasificar; Sin embargo, se presentó un paro por parte de comunidades indígenas impidiendo la continuidad de las obras

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Asistir a las reuniones convocadas para realizar los diálogos que permitan continuar con la ejecución de las actividades.
- ✓ Realizar las actividades de excavación y el extendido, conformación y compactación de la subbase granular, para posteriormente realizar la construcción de la placa huella.
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

A la fecha, se realizaron actividades de excavación y subbase granular en un tramo de 80 ml de 105 ml, por lo tanto, se tiene un porcentaje de avance en esta actividad del 76,2%.

El 8 de Agosto de 2024, durante las actividades de ejecución de Subbase Granular Clase C, se presentó un paro por parte de comunidades indígenas no pertenecientes al área de influencia del proyecto impidiendo la continuidad de las obras.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

- ✓ Asistir a las reuniones convocadas para realizar los diálogos que permitan continuar con la ejecución de las actividades.
- ✓ Realizar las actividades de excavación y el extendido, conformación y compactación de la subbase granular, para posteriormente realizar la construcción de la placa huella.
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

A la fecha no se han realizado actividades en obra. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de las actividades del movimiento de tierra para luego proceder con la construcción de pavimento rígido.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Inicio de las actividades en Obra con las actividades de movimiento de tierra
- ✓ Inicio de la construcción de pavimento rígido.
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.1 INFORME SEMANAL

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a INFORME SEMANAL, se anexa al presente informe para cada uno de los Convenios Solidarios.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIOS

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 corresponde a Maquinaria y Equipo Contrato de Obra, en el cual la Interventoría lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. Este formato, se anexa al presente informe para cada uno de los Convenios Solidarios.

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONVENIOS

4.3.1 Control del Personal de convenios

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social convenios

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En este Formato, la Interventoría verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación.

Igualmente, el Interventor verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica de acuerdo con la normatividad vigente, cuando aplique.

Adjunto al presente informe, se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Informe financiero y presupuestal

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, en el cual la Interventoría debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia. Este formato, se anexa al presente informe para cada uno de los Convenios Solidarios.

4.4.2 Forma de pago de los convenios

De acuerdo a la minuta de los Convenios Solidarios se tiene:

CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al **OAC** el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el **OAC** cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos el **OAC** deberá presentar al **INSTITUTO** certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del **OAC**, del interventor contratado por **EL INSTITUTO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras **EL INSTITUTO** cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el Director Territorial Guajira tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del **OAC**, de la Interventoría contratado por **EL INSTITUTO** y por el Supervisor del Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del **OAC**, y del interventor y/o supervisor del **INSTITUTO**, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

II. El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre.

III. Los recursos del presente Convenio **NO** podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el **OAC** en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

lugar.

IV. De conformidad con lo previsto en el párrafo del Artículo 60 de la Ley 2166 del 2021 el **OAC** deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos.

V. EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al **OAC** los estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al **OAC** su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al objeto de este.

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por **EL INSTITUTO** serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique **EL INSTITUTO**; la copia de la consignación debe ser remitida al **INSTITUTO** indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al **OAC**, el número, año del convenio y el nombre del **OAC**. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias electrónicas de fondos.

VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán realizarse con pago en cheque o por ventanilla.

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual.

X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el **OAC**, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga **EL INSTITUTO**, informando el número y año del convenio, el nombre del **OAC** y el concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el **OAC** reintegrará al **INSTITUTO** el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en dinero realizados por **EL INSTITUTO**, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por **EL INSTITUTO**, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.

XII. El **OAC** debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del **OAC**, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

PARÁGRAFO: Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera.

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, en el cual la Interventoría lleva el registro diario del estado general del tiempo; indicando el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias intensas. Este formato, se anexa al presente informe para cada uno de los Convenios Solidarios.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, en el cual la Interventoría registra los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

Se solicitó a las juntas de acción comunal la presentación de estos ensayos y a la fecha, este documento se encuentra pendiente de entrega.

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, en el cual la Interventoría realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad en la plataforma del SECOP. Anexo al presente informe se presentan las garantías de los convenios solidarios.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, en el cual la Interventoría realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del Plan de Calidad del Contrato de Obra y toma las acciones correctivas en el caso contrario.

Se solicitó a las Juntas de acción comunal la entrega del plan de calidad. A la fecha, este documento se encuentra pendiente de entrega.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones

En este ítem, la Interventoría presenta el Programa de Obra y de Inversiones con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual.

Adjunto al presente informe, se presenta el programa de obra para cada uno de los convenios Solidarios.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

4.9.2 Actas de comité de obra o actas de reunión

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 en el cual la Interventoría registra la reunión semanal con el propósito de efectuar seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros durante la ejecución del contrato de obra.

cuando la reunión no corresponda a un comité de obra, se utiliza el Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2. Durante el presente periodo, se realizaron reuniones con los integrantes de cada junta, con el objetivo de revisar cotizaciones y realizar la aprobación en los comités operativos.

Anexo al presente informe se presentan el acta de comité de seguimiento contractual y los comités operativos aprobados durante el presente periodo.

4.10 FUENTE DE MATERIALES

La Fuente de materiales, se encuentra ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, en el Municipio de Albania, Departamento de la Guajira.

4.9.3 Resumen Mensual Estado General del Proyecto



INVIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA DE OBRA

JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU
URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA
MANAURE

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS EDIFICE
S.A.S

CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023,
4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023

CONTRATO
INTERVENTORIA No.
5032-2023

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°5

MES: AGOSTO - 2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPH-MV-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

GUAJIRA

PERIODO MES:

MES No 5, AGOSTO 2024

CONTRATO DE OBRA No.:

2986-2023

PLAZO INICIAL:

HASTA 31 DICIEMBRE 2023

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

29/12/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

17/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

30/09/2024

PLAZO ACUMULADO:

231 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 191.227.860,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 191.227.860,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA (ASOJUNTAS)

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

5032 - 2023

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación		
Construcción		
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Pontones		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		
Placa huella	ml	75
Alcantarilla tipo 2	Und	1

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación			
Construcción			
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Pontones			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			
Placa huella	ml	53	53
Alcantarilla tipo 2	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
OBRAS	\$ 137.591.288,00		\$ 137.591.288,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 3.446.047,00		\$ 3.446.047,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.190.525,00		\$ 49.190.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 191.227.860,00		\$ 191.227.860,00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
APORTE OAC				
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO	\$ 87.089.362,90		\$ 87.089.362,90	\$ 105.577.953,90

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO






PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial


	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPH-MV-IN-15-FR-2																																																																			
					VERSION	1																																																																			
					PÁGINA																																																																				
FECHA: 31/08/2024 (31/08/2024)																																																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: MES No 5, AGOSTO 2024																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 4622-2023 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 189.034.380,00																																																																									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 189.034.380,00																																																																									
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024																																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																									
PLAZO ACUMULADO: 237 DÍAS ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ																																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Portones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ml</td><td>116</td></tr><tr><td></td><td>Alcantarilla tipo 2</td><td>Und</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Portones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)		Placa huella	ml	116		Alcantarilla tipo 2	Und		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ml</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Alcantarilla tipo 2</td><td>Und</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Portones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			Placa huella	ml		0		Alcantarilla tipo 2	Und	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																							
Pavimentación	Construcción																																																																								
	Mejoramiento																																																																								
	Rehabilitación																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																								
	Puentes																																																																								
	Portones																																																																								
Mantenimiento																																																																									
	Otros (Especificar cuales)																																																																								
	Placa huella	ml	116																																																																						
	Alcantarilla tipo 2	Und																																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																								
	Mejoramiento																																																																								
	Rehabilitación																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																								
	Puentes																																																																								
	Portones																																																																								
Mantenimiento																																																																									
	Otros (Especificar cuales)																																																																								
	Placa huella	ml		0																																																																					
	Alcantarilla tipo 2	Und																																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																																									
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td>\$ 1.000.000,00</td><td></td><td>\$ 1.000.000,00</td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 134.810.657,00</td><td></td><td>\$ 134.810.657,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.044.320,00</td><td></td><td>\$ 4.044.320,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 49.179.403,00</td><td></td><td>\$ 49.179.403,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 188.034.380,00</td><td></td><td>\$ 188.034.380,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	OBRAS	\$ 134.810.657,00		\$ 134.810.657,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.044.320,00		\$ 4.044.320,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.179.403,00		\$ 49.179.403,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 188.034.380,00		\$ 188.034.380,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 49.069.700,08</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	APORTE OAC					OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 49.069.700,08	VALOR EJECUTADO																		
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																						
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00																																																																						
OBRAS	\$ 134.810.657,00		\$ 134.810.657,00																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.044.320,00		\$ 4.044.320,00																																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.179.403,00		\$ 49.179.403,00																																																																						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 188.034.380,00		\$ 188.034.380,00																																																																						
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																					
APORTE OAC																																																																									
OBRAS																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 49.069.700,08																																																																					
VALOR EJECUTADO																																																																									
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																									
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 49.069.700,08			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																						
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9																																																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																									
																																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																									
Firma:  Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2522237430 CHD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																									

	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPM-VN-15-FR-2																																																														
				VERSION	1																																																														
				PÁGINA																																																															
FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: MES No. 5, AGOSTO 2024																																																																			
CONTRATO DE OBRA No.: 2954-2023 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 189.974.442,00 FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 189.974.442,00 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - PLAZO ACUMULADO: 231 DIAS ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																																			
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ml 105</td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento	Otros (Especificar cuáles)		Placa huella	ml 105																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																	
Pavimentación	Construcción																																																																		
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento	Otros (Especificar cuáles)																																																																		
	Placa huella	ml 105																																																																	
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																			
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ml</td><td>0</td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Otros (Especificar cuáles)			Placa huella	ml	0																																
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																
Pavimentación	Construcción																																																																		
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento	Otros (Especificar cuáles)																																																																		
	Placa huella	ml	0																																																																
AVANCE FINANCIERO																																																																			
<table><thead><tr><th colspan="4">VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</th><th colspan="5">VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</th></tr><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td>\$ 1.000.000,00</td><td></td><td>\$ 1.000.000,00</td><td>APORTE OAC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 135.719.809,00</td><td></td><td>\$ 135.719.809,00</td><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.071.594,00</td><td></td><td>\$ 4.071.594,00</td><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 49.183.039,00</td><td></td><td>\$ 49.183.039,00</td><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 189.974.442,00</td><td></td><td>\$ 189.974.442,00</td><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 57.079.684,00</td></tr></tbody></table>					VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES						BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	APORTE OAC					OBRAS	\$ 135.719.809,00		\$ 135.719.809,00	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.071.594,00		\$ 4.071.594,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.183.039,00		\$ 49.183.039,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 189.974.442,00		\$ 189.974.442,00	VALOR EJECUTADO				\$ 57.079.684,00
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																											
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	APORTE OAC																																																															
OBRAS	\$ 135.719.809,00		\$ 135.719.809,00	OBRAS																																																															
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.071.594,00		\$ 4.071.594,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																																															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.183.039,00		\$ 49.183.039,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 189.974.442,00		\$ 189.974.442,00	VALOR EJECUTADO				\$ 57.079.684,00																																																											
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																			
INVERSIÓN EN OBRA																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ AVANCE DE OBRA EN % (B/A):																																																																			
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																			
MANO DE OBRA CALIFICADA: 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9																																																																			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																			
<div></div> <div></div>																																																																			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																			
<div></div> <div><p>Firma: Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2522237430 CHD</p><p>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div>																																																																			

 	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPH-MV-IN-15-FR-2																																	
					VERSION 1																																	
					PÁGINA																																	
FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: MES No 5, AGOSTO 2024																																						
CONTRATO DE OBRA No.: 3411-2023 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023 FECHA DE INICIO: 29/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 230 DÍAS VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 191.716.260,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 191.716.260,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																						
OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>70</td></tr><tr><td>Mezoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarilla tipo 2</td><td></td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	70	Mezoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)		Placa huella		Alcantarilla tipo 2											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																				
Pavimentación	Construcción	70																																				
	Mezoramiento																																					
	Rehabilitación																																					
Estructuras	Túneles																																					
	Puentes																																					
	Pontones																																					
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)																																					
	Placa huella																																					
	Alcantarilla tipo 2																																					
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Mezoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Placa huella</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarilla tipo 2</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción		0	Mezoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)			Placa huella			Alcantarilla tipo 2		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																			
Pavimentación	Construcción		0																																			
	Mezoramiento																																					
	Rehabilitación																																					
Estructuras	Túneles																																					
	Puentes																																					
	Pontones																																					
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)																																					
	Placa huella																																					
	Alcantarilla tipo 2																																					
AVANCE FINANCIERO																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td>\$ 1.000.000,00</td><td></td><td>\$ 1.000.000,00</td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 137.404.352,00</td><td></td><td>\$ 137.404.352,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.122.131,00</td><td></td><td>\$ 4.122.131,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 49.189.777,00</td><td></td><td>\$ 49.189.777,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 190.716.260,00</td><td></td><td>\$ 190.716.260,00</td></tr></tbody></table>						BÁSICO	IVA	TOTAL	APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	OBRAS	\$ 137.404.352,00		\$ 137.404.352,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.122.131,00		\$ 4.122.131,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.189.777,00		\$ 49.189.777,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 190.716.260,00		\$ 190.716.260,00										
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																			
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00																																			
OBRAS	\$ 137.404.352,00		\$ 137.404.352,00																																			
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.122.131,00		\$ 4.122.131,00																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.189.777,00		\$ 49.189.777,00																																			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 190.716.260,00		\$ 190.716.260,00																																			
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>NO SE HAN GIRADO RECURSOS</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	APORTE OAC					OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO	NO SE HAN GIRADO RECURSOS							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																		
APORTE OAC																																						
OBRAS																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																						
VALOR EJECUTADO	NO SE HAN GIRADO RECURSOS																																					
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																						
INVERSIÓN EN OBRA																																						
EMPLIDOS GENERADOS EN EL MES																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): AVANCE DE OBRA EN 1% (B/A):																																						
MANO DE OBRA CALIFICADA: 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS: TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																						
																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																						
Firma: Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2522237430 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																						

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 5032 DE 2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S
NIT	900.768.923-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI MABEL PEREZ CHUD,
N° IDENTIFICACIÓN:	No 31.577.305 expedida en Cali (Valle del Cauca),
VALOR:	OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y UN PESOS (\$82.340.031,00)
FECHA DE INICIO	27 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	29 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 de enero de 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a las juntas de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la construcción de las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.
- ✓ Se realizó asistencia a la reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión y la comisión de la Subdirección de Sostenibilidad del Invias, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, la implementación del PAGA, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invias y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se dieron las instrucciones a las Juntas de Acción Comunal y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- ✓ Se realizó el apoyo y coordinación desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y ambiental a las juntas de acción comunal, para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.
- ✓ Se realizó acompañamiento durante la Auditoría Técnica a los Convenios Solidarios, realizada por el Ingeniero Lenis Sanabria.
- ✓ Se verificó que las actividades ejecutadas cumplan con las Especificaciones Técnicas y procesos constructivos.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

5.2.2 Control de correspondencia.

Adjunto al presente informe se presentan las correspondencias recibidas y enviadas.

CORRESPONDENCIA CONTRATO 5032-2023 MES AGOSTO			
Número de correspondencia	Fecha	Asunto	Dirigido a
OFC-5032-032	09/08/2024	Presunto incumplimiento en la ejecución del convenio 3411-2023	Pdte. Claudio Epieyu
OFC-5032-033	12/08/2024	Presunto incumplimiento en la ejecución del convenio 4622-2023	Pdte. Claudio Gómez Ruz
OFC-5032-034	12/08/2024	Solicitud de documentación para etapa de obras de mantenimiento y mejoramiento Shiruria	Pdte. Claudio Epieyu
OFC-5032-035	12/08/2024	Inconvenientes presentados por la comunidad que impiden el normal desarrollo de las actividades Jonjoncito.	Apoyo a la supervisión
OFC-5032-036	20/08/2024	Reiteración presunto incumplimiento convenio solidario No. 4622-2023	Pdte. Claudio Gómez Ruz
OFC-5032-037	20/08/2024	Gestión ambiental inicial Jonjoncito	Atención al ciudadano INVIAS. Jairo Fernando Argüello Urrego.
OFC-5032-038	26/08/2024	Suspensión convenio 2954 - Jonjoncito	Dubin Camargo Almenarez. Isaac Zuleta Laura Vega
OFC-5032-039	26/08/2024	Suspensión convenio 4622 – Etnia Wayuu	Dubin Camargo Almenarez. Isaac Zuleta Laura Vega

5.2.3 Registro fotográfico


➤ Convenio Solidario No 2986 de 2023.

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

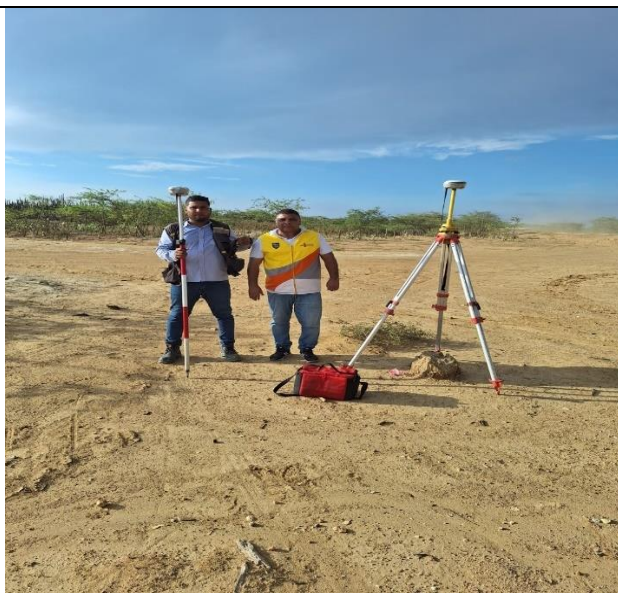

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	MES: AGOSTO - 2024
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	MES: AGOSTO - 2024
	OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		



 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

➤ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**


Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		

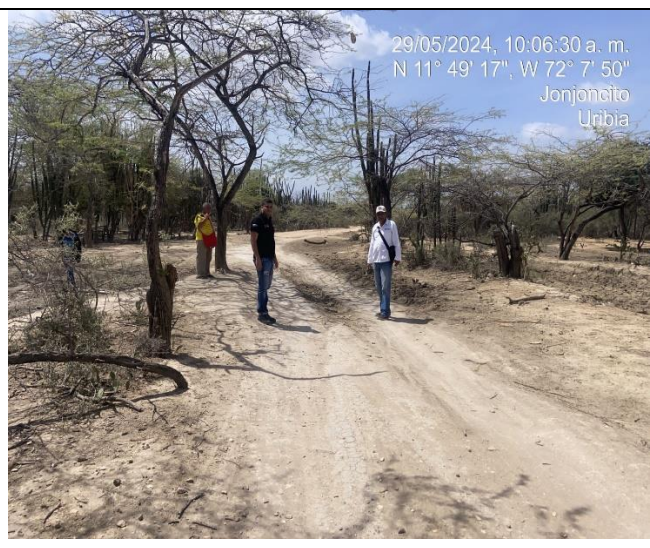

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			




	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		




	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		

➤ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

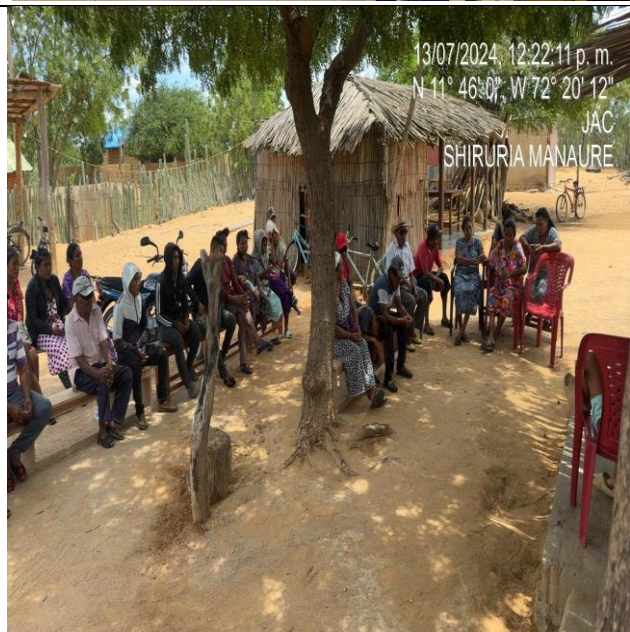

 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

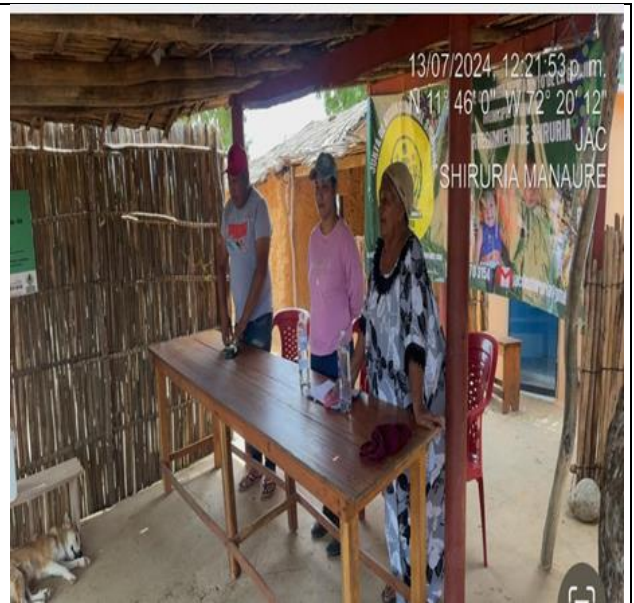

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	MES: AGOSTO - 2024
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

Anexo al presente informe, se presentan los informes de revisión al Ajustes de estudios y diseños, por parte de los profesionales de la Interventoría.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.

Adjunto al presente informe, se anexa el informe financiero de los desembolsos realizados.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha, las juntas de Acción Comunal vienen cumpliendo a cabalidad con la matriz de riesgos.

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No se tienen otros programas y aplicativos.

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a equipo y vehículos del Contrato de Interventoría con sus soportes.

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 Control Personal de Interventoría

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Anexo al presente informe se presenta el informe financiero y presupuestal del Contrato de Interventoría.

6.3.2 Forma de pago del contrato

De acuerdo a la minuta del contrato de Interventoría, se tiene:

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

6.3.3 Actas de Costos de Interventoría

Anexo al presente informe, se presenta el acta de costos, correspondiente al mes de Agosto de 2024.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a las Garantías del Contrato de Interventoría.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. En el cual el Interventor realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato. Se viene cumplimiento adecuadamente con el plan de calidad.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría.

Para el Contrato de Interventoría, no se realizó giro de Anticipo.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Anexo al presente informe, se presenta el Plan de Cargas

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a los Convenios Solidarios No 2986 de 2023, 4622 de 2023, 2954 de 2023 y 3411 de 2023, de tal manera que se cumplan con los requerimientos estipulados por el Instituto Nacional de Vías.
- Para el Convenio Solidario No 2986 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. Durante la etapa de Construcción, se efectuó la construcción de 53 ml de placa huella. Para el siguiente periodo, se tiene programado continuar con la ejecución de la placa huella y dar inicio a la construcción de Alcantarilla y cumplir a cabalidad con el objeto contractual en los plazos previstos.
- Para el Convenio Solidario No 4622 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. Durante la etapa de construcción, La junta de acción comunal realizó transporte de maquinaria hasta el sitio de las obras, para dar inicio a las actividades de excavaciones varias sin clasificar, sin embargo, se presentó un paro por parte de comunidades indígenas impidiendo la continuidad de las obras.
- Para el Convenio Solidario No 2954 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dio inicio a la ejecución de las obras, con el transporte del material de subbase. Durante la etapa de construcción, se realizaron las actividades de excavaciones varias sin clasificar y Subbase Granular Clase C, en un tramo de 80 ml. Durante las actividades, se presentó un paro por pate de comunidades indígenas proyecto impidiendo la continuidad de las obras.
- Para el Convenio Solidario No 3411 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, Durante la etapa de revisión, se han realizado los

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”			

estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con las actividades del movimiento de tierra. La Interventoría realizó la aprobación del desembolso para la compra de materiales, alquiler de equipos, herramientas y gastos administrativos, para el inicio de las actividades del movimiento de tierras y posteriormente la construcción de Pavimento rígido. No se ha podido dar inicio a la ejecución de actividades en obra, porque el terreno se encuentra saturado, producto de las lluvias intensas en la zona.

- Se realizaron comités con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos que se deben cumplir para el inicio de las obras.
- Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.
- Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.
- Se realizó el apoyo y coordinación desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y ambiental a las juntas de acción comunal, para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.
- Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a las juntas de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la construcción de las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- Durante el presente mes, se presentaron lluvias moderadas e intensas en la zona de influencia de la obra. Producto de las lluvias, durante gran parte del mes de Agosto de 2024, el terreno se encontraba saturado y no se podían adelantar actividades puesto que se podría colocar en riesgo la calidad de las obras. Así mismo, las vías de acceso a la zona del proyecto se encontraban en condiciones adversas lo que generó inconvenientes para el ingreso de materiales e insumos para la ejecución de las actividades en los Convenios á los cuales se les realiza la Interventoría.
- Para el Convenio Solidario No 4622 de 2023, que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, la Interventoría realizó acompañamiento durante la reunión efectuada el 30 de Agosto de 2024 con la comunidad, a fin de establecer los diálogos que permita la continuidad de las obras.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

- Para el Convenio Solidario No 2954 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", la Interventoría realizó acompañamiento durante las reuniones efectuadas el 18 y el 30 de Agosto de 2024 con la comunidad, a fin de establecer los diálogos que permita la continuidad de las obras.
- Para el Convenio Solidario No 2986 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", la Interventoría realizó acompañamiento a la Auditoría realizada por el Ingeniero Lenis Sanabria el día 29 de Agosto de 2024.
- La Interventoría realizó asistencia el día 27 de Agosto, a la reunión convocada en la Dirección Territorial, con la comisión de la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías, referente a los lineamientos para la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

8 ANEXOS

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°5 MES: AGOSTO - 2024
	JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	CONTRATO INTERVENTORIA No. 5032-2023	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

RESUMEN FINANCIERO INTERVENTORIA CONTRATO 5032-2023							
Contrato N°		5032-2023					
Valor contrato		\$ 82.340.031,00					
FACTURA ELECTRÓNICA #1		No. CPE 21			26-jun-24		
ACTA		5			\$ 6.775.622,00		
FACTURA ELECTRÓNICA #2		No. CPE 26			22-jul-24		
ACTA		6			\$ 10.255.182,00		
FACTURA ELECTRÓNICA #3		No. CPE 28			31-jul-24		
ACTA		7			\$ 10.969.182,00		
FACTURA ELECTRÓNICA #4		No. CPE 32			28-ago-24		
ACTA		8			\$ 17.071.145,00		
SALDO CONTRATO:					\$ 37.268.900,00		
