

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

1. INFORMACION JURIDICA

No. CONTRATO:	CCD-046-2024 / CCD-03-2024 Secop II
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA A LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
CONTRATISTA:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL
SUPERVISOR:	PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
VALOR:	NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$96.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	224 DEL 04 MARZO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	224 DEL 27 MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	1 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2025
PLAZO:	DIECISÉIS (16) MESES
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se cancelará así: en dieciséis (16) pagos mensuales vencidos por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) M/CTE, cada uno

2. DETALLE DE PAGOS

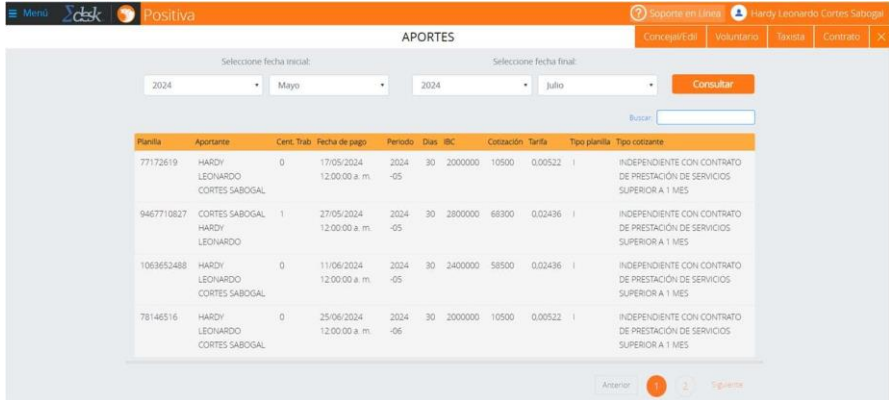
CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		\$ 96.000.000,00
VALOR ADICIONES (SI APLICA)		

VALOR PAGOS REALIZADOS CUENTA No 1	\$ 6.000.000,00	
VALOR PAGOS REALIZADOS CUENTA No 2	\$ 6.000.000,00	
VALOR PAGOS REALIZADOS CUENTA No 3	\$ 6.000.000,00	
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	\$ 6.000.000,00	
SALDO	\$ 72.000.000,00	
SUMAS IGUALES	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
OBLIGACIONES GENERALES		
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se está desarrollando el objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA A LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.” asociado al contrato CCD-046-2024. En donde se está cumpliendo a cabalidad cada una de las obligaciones pactadas conforme a las directrices del supervisor del contrato.
2	Presentar los informes y/o productos, de conformidad con lo establecido en el contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se presenta el presente informe No. 4 en donde se especifica la ejecución de cada obligación tanto general como específica firmada del contrato CCD-046-2024
3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, cumplí con las obligaciones contraídas frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; aportando copia de la planilla No 1065019488 pagada a NUEVA SANITAS, PORVENIR y ARL POSITIVA.

	documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia.	<table><tr><th>MES</th><th>N° DE PLANILLA</th><th>PAGADA</th></tr><tr><td>ABRIL</td><td>1063651355</td><td>10/05/2024</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>1063652488</td><td>10/06/2024</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>1064308927</td><td>10/07/2024</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>1065019488</td><td>13/08/2024</td></tr></table> <p>Tabla 1. Reporte planilla Seguridad Social.</p>	MES	N° DE PLANILLA	PAGADA	ABRIL	1063651355	10/05/2024	MAYO	1063652488	10/06/2024	JUNIO	1064308927	10/07/2024	JULIO	1065019488	13/08/2024
MES	N° DE PLANILLA	PAGADA															
ABRIL	1063651355	10/05/2024															
MAYO	1063652488	10/06/2024															
JUNIO	1064308927	10/07/2024															
JULIO	1065019488	13/08/2024															
4	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se informó al supervisor todas las novedades que se enfrentaron durante la ejecución del contrato, sin presentarse hasta el momento ninguna anomalía.															
5	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Corporación y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se mantuvo absoluta reserva y confidencialidad sobre la información que por causa o con ocasión del contrato se manejó.															
6	Dar aplicación a las políticas y emplear los formatos del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad de la Información y demás, aprobados por la Entidad.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se dio aplicación a los formatos del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad de la Información que la Entidad Corporación Colombia Digital ha aprobado.															
7	Asistir de manera presencial a las instalaciones de la Corporación para el cumplimiento de las actividades pactadas, siempre y cuando la	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, no se requirió la asistencia de manera presencial a las instalaciones de la Corporación, de acuerdo el requerimiento de la necesidad del servicio.															

	necesidad del servicio así lo requiera.	
8	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus actividades contractuales.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, no se asignaron equipos y elementos para el cumplimiento de las actividades contractuales, los elementos que se utilizan son de propiedad del contratista.
9	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación, a través del supervisor del contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se acató todas las instrucciones dadas por parte del Supervisor durante el desarrollo del contrato.
10	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, no se requirió el desplazamiento a un lugar distinto al definido de ejecución del contrato, las labores se han realizado en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta que es el lugar en donde se desarrolla la ejecución del Proyecto.
11	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que esta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 2.2.4.2.2.9 del Decreto 1072 de 2015).	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se informó a la Entidad Positiva Seguros, de la novedad de ingreso y afiliación a la administradora de riesgos laborales.</p>  <p>Imagen 1. Reporte de aportes a la ARL Positiva del mes de mayo de 2024.</p>
12	Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo la Corporación en los términos y oportunidades establecidos en el artículo 2.2.4.2.2.18 del	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se practicó examen pre ocupacional en donde el resultado fue "APTO" para el cargo, el cual fue remitido al supervisor del contrato.




	<p>Decreto 1072 de 2015.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Nit. 900454855-3 Cel. 310 307 6666 - 313 474 8388 Calle 19 N° 13 - 44 Barrio Juan Mellao - Acacias Centro Comercial Llanocentro local 108 - Villavicencio servicios@ipssco.co</p> </div>  </div> <p style="text-align: right;">N° 24.203</p> <h3 style="text-align: center;">CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL</h3> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN</th> <th colspan="2">TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL</th> </tr> <tr> <td>10 DIA</td> <td>11 MES</td> <td>2022 AÑO</td> <td>ACACIAS (META, COLOMBIA)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VALORACIÓN OCUPACIONAL DE INGRESO</td> </tr> </table> <p>DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORA EL TRABAJADOR O ASPIRANTE</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>PARTICULARES CONTADO</th> <th>PARTICULARES</th> </tr> <tr> <td>Nombre de la empresa</td> <td>Empresa en misión</td> </tr> </table> <p>DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO</th> <th>Genero</th> <th>Edad</th> <th>Documento de Identificación</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Apellidos y Nombres</td> <td>MASCULINO</td> <td>35 AÑOS O MESES 13 DIAS</td> <td>CC 1122120298</td> </tr> </table> <p>Cargo INGENIERO APOYO SUPERVISION</p> <p>CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL EN EL MOMENTO LAS CONDICIONES DE SALUD SON ADECUADAS PARA LA LABOR ESPECIFICA</p> <p>Observaciones: NO APLICA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>N/A</th> <th>NO SE EVALUARON REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)</th> </tr> <tr> <td>RESTRICCIONES LABORALES</td> <td>TIPO</td> </tr> <tr> <td>SIN RESTRICCIONES LABORALES</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table> <p>El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL</td> <td>✓</td> <td>ENFASIS OSTEO MUSCULAR</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>PERFIL LIPÍDICO</td> <td>✓</td> <td>AUDIOMETRIA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CUADRO HEMÁTICO</td> <td>✓</td> <td>OPTOMETRIA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>GLUCEMIA</td> <td>✓</td> <td>-----</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>RECOMENDACIONES MÉDICAS</th> <th>RECOMENDACIONES OCUPACIONALES</th> <th>HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES</th> </tr> <tr> <td>EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO</td> <td>USO DE EPP</td> <td>HABITOS SALUDABLES</td> </tr> <tr> <td>AUDIOMETRIA DE CONTROL EN UN AÑO</td> <td>PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL</td> <td>DIETA BALANCEADA</td> </tr> </table> <p>OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>EPP SEGÚN EL CARGO, HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA, CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONTROL MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO, CONTINUAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, LAVADO DE MANOS, USO DE TAPABOCAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PRESENTA RIESGO BAJO DE COMPLICACIONES POR COVID 19.</p> <p>Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verdaderas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Médico</th> <th>Aspirante o Trabajador</th> </tr> <tr> <td> <p>Firma: </p> <p>Nombre: GOMEZ GUEVARA KATHERINE</p> <p>R. M.: 50-11876 L.S.O.: 2353</p> </td> <td> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO</p> <p>CC: 1122120298</p> </td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">  <p>Código de Seguridad I596O1U24203</p> </div>	FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN		TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL		10 DIA	11 MES	2022 AÑO	ACACIAS (META, COLOMBIA)			VALORACIÓN OCUPACIONAL DE INGRESO		PARTICULARES CONTADO	PARTICULARES	Nombre de la empresa	Empresa en misión	CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO		Genero	Edad	Documento de Identificación	Apellidos y Nombres		MASCULINO	35 AÑOS O MESES 13 DIAS	CC 1122120298	N/A	NO SE EVALUARON REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	ENFASIS OSTEO MUSCULAR	✓	PERFIL LIPÍDICO	✓	AUDIOMETRIA	✓	CUADRO HEMÁTICO	✓	OPTOMETRIA	✓	GLUCEMIA	✓	-----		RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES	EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES	AUDIOMETRIA DE CONTROL EN UN AÑO	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA	Médico	Aspirante o Trabajador	<p>Firma: </p> <p>Nombre: GOMEZ GUEVARA KATHERINE</p> <p>R. M.: 50-11876 L.S.O.: 2353</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO</p> <p>CC: 1122120298</p>
FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN		TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL																																																													
10 DIA	11 MES	2022 AÑO	ACACIAS (META, COLOMBIA)																																																												
		VALORACIÓN OCUPACIONAL DE INGRESO																																																													
PARTICULARES CONTADO	PARTICULARES																																																														
Nombre de la empresa	Empresa en misión																																																														
CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO		Genero	Edad	Documento de Identificación																																																											
Apellidos y Nombres		MASCULINO	35 AÑOS O MESES 13 DIAS	CC 1122120298																																																											
N/A	NO SE EVALUARON REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)																																																														
RESTRICCIONES LABORALES	TIPO																																																														
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA																																																														
EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	ENFASIS OSTEO MUSCULAR	✓																																																												
PERFIL LIPÍDICO	✓	AUDIOMETRIA	✓																																																												
CUADRO HEMÁTICO	✓	OPTOMETRIA	✓																																																												
GLUCEMIA	✓	-----																																																													
RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES																																																													
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES																																																													
AUDIOMETRIA DE CONTROL EN UN AÑO	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA																																																													
Médico	Aspirante o Trabajador																																																														
<p>Firma: </p> <p>Nombre: GOMEZ GUEVARA KATHERINE</p> <p>R. M.: 50-11876 L.S.O.: 2353</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO</p> <p>CC: 1122120298</p>																																																														
<p>13</p>	<p>Conocer y aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de sus actividades.</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se conoció y aplicó la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las actividades y obligaciones contratadas.</p>																																																													
<p>14</p>	<p>Durante el desarrollo de las actividades, el contratista debe conocer y aplicar normas, procedimientos e instructivos para la</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se conocieron y aplicaron las obligaciones contractuales referente a la prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por la Corporación durante el desarrollo del contrato. Asimismo, se reitera el compromiso de cumplir plenamente con dicha disposición para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Se reconoce la</p>																																																													

Imagen 2. Concepto medico ocupacional.

	prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por la Corporación.	importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y me esfuerzo por aplicar las mejores prácticas en este sentido.
15	Suscribir conjuntamente con el Supervisor el Acta de confidencialidad de la información cuando aplique según el objeto del contrato y lo establecido en el Manual de Contratación	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, para el desarrollo del presente contrato no aplicó la suscripción de Acta de confidencialidad de la información, de acuerdo con el objeto del contrato suscrito.
16	EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, so pena que se adelanten las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se dio cumplimiento con la remisión del soporte de pago de la planilla de seguridad social integral correspondiente al mes de JULIO al supervisor del contrato CCD-046-2024.
17	Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 de 2020.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, no se requirió la presentación de factura electrónica como requisito para el pago de los servicios contratados, sino cuenta de cobro por ser persona natural.
18	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato señaladas por el supervisor del contrato	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, todas las directrices impartidas por el jefe inmediato fueron acatadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	Apoyar en la supervisión del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se apoyó a la supervisión en cada una de las obligaciones pactadas en el desarrollo del contrato 046 de 2024, dentro del periodo se realizó el acompañamiento en la elaboración del cronograma del proyecto y de flujos, así como el recibimiento de 7 remisiones, también se realizaron diferentes reuniones de avance y seguimiento.
2	Brindar seguimiento en la supervisión del desarrollo de las actividades técnicas para la correcta ejecución del objeto contractual.	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se realizó el acompañamiento técnico en donde se verificó la entrega 7 realizada por el contratista, las cuales se entregaron los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, muflas, herrajes de suspensión, herrajes de retención, Marquillado y entrada a zona wifi a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico. <p>Y adicional los servicios de instalación y transporte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios de instalación (transporte de equipos, pruebas, configuración, equipamiento, elementos, materiales y accesorios, documentos de planeación y entrega de servicio, trámite de permisos, adecuación de sitios y puesta en servicio por zona Wi-Fi) <p>Cada uno de las actividades se han realizado, según el avance y ejecución del proyecto.</p>
3	Avalar a la supervisión en la instalación de la infraestructura de soluciones tecnológicas de acceso público Urbanas.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, dentro de este periodo se ha realizado la logística para la implementación de la infraestructura, hasta el momento se han recibido las remisiones 1, 2 del mes de abril, las remisiones 3 y 4 del mes de mayo, las remisiones 5 y 6 del mes de junio, y la remisión 7 respecto a equipos y software.

REMISION 7.

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S.
Formato acta de reunión
FTTH28 Versión: 03
Fecha: 25/07/2019



Puerto Gaitán - Meta, 27 de junio de 2024

INGENIERO – PABLO SANDOVAL

Supervisor contrato CCD-053-2024 suscrito entre CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL Y LA EMPRESA SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S- SDT INGENIERÍA.

Ref: Contrato NO. **CCD-053-2024**, suscrito CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL Y LA EMPRESA SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S- SDT INGENIERÍA, cuyo objeto es **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOPORTE DE 25 ZONAS WIFI, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LAS 25 ZONAS WIFI IMPLEMENTADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META."**

Asunto: REMISIÓN DE SUMINISTRO 07.

En atención a nuestras obligaciones contractuales, por medio del presente documento nos permitimos relacionar los ítems a suministrar correspondientes del Contrato NO. **CCD-053-2024**.

ÍTEM	CAN	MEDIDA	SERIAL	ÍTEM CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14000	METROS	NA	Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, muflas, herrajes de suspensión, herrajes de refención, Marquillado y entrada a zona wifi a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico.	\$ 140.003,00	\$ 1.960.042.016,81
2	25	UNIDAD	NA	Servicios de instalación (transporte de equipos, pruebas, configuración, equipamiento, elementos, materiales y accesorios, documentos de planeación y entrega de servicio, trámite de permisos, adecuación de sitios y puesta en servicio por zona Wi-Fi)	\$ 20.499.563,39	\$ 512.489.084,87
SUB TOTAL						\$ 2.472.531.101,68
IVA						\$ 469.780.909,32
TOTAL						\$ 2.942.312.011,00
FIRMA DE QUIEN EMITE REMISIÓN				FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN DE BIENES		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CC:				CC:		
FECHA:				FECHA:		

		<div> <div> SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S. Formato acta de reunión FTTH28 Versión: 03 Fecha: 25/07/2019 </div> <div>  </div> </div> <p>ANEXOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANEXO1 FICHAS TECNICAS • ANEXO2 DISEÑO TENDIDO DE FIBRA • ANEXO3 CERTIFICACIONES • ANEXO4 REGISTRO FOTOGRAFICO • ANEXO5 ENTREGABLES FIBRA OPTICA • ANEXO6 SDT-CCD0532024-008-2024 INFORME INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA <p>Agradeciendo la atención a la presente.</p> <p>Atentamente,</p> <p><i>Sergio E. Chiquiza Garzón</i> SERGIO ESTEBAN CHIQUEZA GARZÓN Gerente del proyecto – Contrato CCD-053-2024</p>
4	Hacer seguimiento a la supervisión en el recibo de equipos tecnológicos, su instalación, pruebas y puesta en operación.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se realizó la revisión de la fibra óptica y la puesta de implementación de la misma.

		 <p>Imagen 3. Recorrido de la Fibra óptica instalada.</p> <p>En la imagen 3, se observa el recorrido de la fibra óptica instalada en el municipio de Puerto Gaitán, garantizando el perfecto funcionamiento de las zonas WiFi.</p>																																																																																																															
<p>Orientar y asistir y proyectar en la elaboración de documentos a la estructuración técnica de la fase precontractual de los procesos de la contratación derivados del proyecto</p> <p>5</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se mantuvo los tiempos y la programación previamente diseñada.</p> <table> <tr> <th colspan="8">IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED</th></tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th><th>Comienzo</th><th>Fin</th><th>Duración</th><th>abr-24</th><th>may-24</th><th>jun-24</th><th>jul-24</th></tr> <tr> <td>1.1. INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACCESO PÚBLICO URBANAS</td><td>10/01/2024</td><td>31/07/2025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Gabinete de conmutación para montaje en piso con mínimo 80 PU, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>10/01/2024</td><td>20/04/2024</td><td>15</td><td>X</td><td>\$ 15.734.355,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Módulo de Firewall Virtual para control de aplicaciones y prevención de intrusiones y sobre la red ofrecida. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>10/01/2024</td><td>20/04/2024</td><td>15</td><td>X</td><td>\$ 59.000.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Router Core con mínimo 5 puertos Ethernet. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>10/01/2024</td><td>20/04/2024</td><td>15</td><td>X</td><td>\$ 16.160.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de software para monitoreo de la red para 100 dispositivos. Incluye pantalla de visualización de 60". De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/04/2024</td><td>20/05/2024</td><td>21</td><td>X</td><td>\$ 145.140.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mallas, herrajes de suspensión, herrajes de anclaje, alfileres y empujadores a una sola o a tres conductores, según corresponda de la red. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/05/2024</td><td>20/07/2024</td><td>45</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>\$ 2.332.450.000,00</td></tr> <tr> <td>Implementación de Equipo OLT Opón con mínimo 4 puertos PON y capacidad mayor a 100 dispositivos ONU, y mínimo 2 interfaces de salida a 100Mbps o superiores. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/06/2024</td><td>20/07/2024</td><td>22</td><td></td><td></td><td>X</td><td>\$ 464.683.789,00</td></tr> <tr> <td>Implementación de OLT Opón con 2 puertos PON y mínimo una interfaz ethernet 10/100/1000. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>10/05/2024</td><td>20/05/2024</td><td>18</td><td></td><td>\$ 226.570.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de sistema eléctrico híbrido voladizo para las Zonas Veli (Urbanas con potencia mínima de 500 para la solución incluye (baterías, controlador híbrido, paneles solares). De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/05/2024</td><td>20/06/2024</td><td>24</td><td></td><td>X</td><td>\$ 610.250.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Sistema a Puesta a tierra (paralela o perpendicular) de punto, tubería, tratamiento punto, Cable cableado mínimo 100 Mm. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/05/2024</td><td>20/06/2024</td><td>24</td><td></td><td>X</td><td>\$ 79.823.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Gabinete de conmutación de exteriores, para montaje en pared o poste, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>20/05/2024</td><td>20/06/2024</td><td>24</td><td></td><td>X</td><td>\$ 78.235.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Implementación de Punto de acceso WiFi dual band para exteriores con antenas integradas que incluyan accesorios de instalación (2 AP's Zona Veli) gestión y mantenimiento mediante controlador virtual. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.</td><td>10/01/2024</td><td>20/04/2024</td><td>15</td><td>X</td><td>\$ 596.200.000,00</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Imagen 4. Cronograma de ejecución del proyecto.</p>	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED								DESCRIPCIÓN	Comienzo	Fin	Duración	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	1.1. INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACCESO PÚBLICO URBANAS	10/01/2024	31/07/2025						Implementación de Gabinete de conmutación para montaje en piso con mínimo 80 PU, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 15.734.355,00			Implementación de Módulo de Firewall Virtual para control de aplicaciones y prevención de intrusiones y sobre la red ofrecida. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 59.000.000,00			Implementación de Router Core con mínimo 5 puertos Ethernet. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 16.160.000,00			Implementación de software para monitoreo de la red para 100 dispositivos. Incluye pantalla de visualización de 60". De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/04/2024	20/05/2024	21	X	\$ 145.140.000,00			Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mallas, herrajes de suspensión, herrajes de anclaje, alfileres y empujadores a una sola o a tres conductores, según corresponda de la red. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/07/2024	45		X	X	\$ 2.332.450.000,00	Implementación de Equipo OLT Opón con mínimo 4 puertos PON y capacidad mayor a 100 dispositivos ONU, y mínimo 2 interfaces de salida a 100Mbps o superiores. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/06/2024	20/07/2024	22			X	\$ 464.683.789,00	Implementación de OLT Opón con 2 puertos PON y mínimo una interfaz ethernet 10/100/1000. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/05/2024	20/05/2024	18		\$ 226.570.000,00			Implementación de sistema eléctrico híbrido voladizo para las Zonas Veli (Urbanas con potencia mínima de 500 para la solución incluye (baterías, controlador híbrido, paneles solares). De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 610.250.000,00		Implementación de Sistema a Puesta a tierra (paralela o perpendicular) de punto, tubería, tratamiento punto, Cable cableado mínimo 100 Mm. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 79.823.000,00		Implementación de Gabinete de conmutación de exteriores, para montaje en pared o poste, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 78.235.000,00		Implementación de Punto de acceso WiFi dual band para exteriores con antenas integradas que incluyan accesorios de instalación (2 AP's Zona Veli) gestión y mantenimiento mediante controlador virtual. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 596.200.000,00		
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN	Comienzo	Fin	Duración	abr-24	may-24	jun-24	jul-24																																																																																																										
1.1. INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACCESO PÚBLICO URBANAS	10/01/2024	31/07/2025																																																																																																															
Implementación de Gabinete de conmutación para montaje en piso con mínimo 80 PU, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 15.734.355,00																																																																																																												
Implementación de Módulo de Firewall Virtual para control de aplicaciones y prevención de intrusiones y sobre la red ofrecida. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 59.000.000,00																																																																																																												
Implementación de Router Core con mínimo 5 puertos Ethernet. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 16.160.000,00																																																																																																												
Implementación de software para monitoreo de la red para 100 dispositivos. Incluye pantalla de visualización de 60". De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/04/2024	20/05/2024	21	X	\$ 145.140.000,00																																																																																																												
Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mallas, herrajes de suspensión, herrajes de anclaje, alfileres y empujadores a una sola o a tres conductores, según corresponda de la red. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/07/2024	45		X	X	\$ 2.332.450.000,00																																																																																																										
Implementación de Equipo OLT Opón con mínimo 4 puertos PON y capacidad mayor a 100 dispositivos ONU, y mínimo 2 interfaces de salida a 100Mbps o superiores. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/06/2024	20/07/2024	22			X	\$ 464.683.789,00																																																																																																										
Implementación de OLT Opón con 2 puertos PON y mínimo una interfaz ethernet 10/100/1000. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/05/2024	20/05/2024	18		\$ 226.570.000,00																																																																																																												
Implementación de sistema eléctrico híbrido voladizo para las Zonas Veli (Urbanas con potencia mínima de 500 para la solución incluye (baterías, controlador híbrido, paneles solares). De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 610.250.000,00																																																																																																											
Implementación de Sistema a Puesta a tierra (paralela o perpendicular) de punto, tubería, tratamiento punto, Cable cableado mínimo 100 Mm. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 79.823.000,00																																																																																																											
Implementación de Gabinete de conmutación de exteriores, para montaje en pared o poste, con switches en par y en serie, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	20/05/2024	20/06/2024	24		X	\$ 78.235.000,00																																																																																																											
Implementación de Punto de acceso WiFi dual band para exteriores con antenas integradas que incluyan accesorios de instalación (2 AP's Zona Veli) gestión y mantenimiento mediante controlador virtual. De acuerdo con las características mínimas registradas en el documento técnico.	10/01/2024	20/04/2024	15	X	\$ 596.200.000,00																																																																																																												

		 <p>Imagen 5. Cronograma de Flujos del proyecto actualizado.</p>
6	<p>Respaldar a la supervisión verificación de la prestación de servicios de instalación (transporte de equipos, pruebas, configuración, equipamiento, elementos y accesorios, documentos de planeación, trámite de permisos, adecuación de sitios, conectividad y puesta en servicio) de las zonas wifi-implementadas.</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se terminó con la implementación física de las zonas WiFi, durante este periodo se terminó de recibir la implementación de la fibra óptica y la puesta en marcha de las zonas WiFi.</p>
7	<p>Ayudar a la supervisión en el seguimiento a la incorporación de esquemas de seguridad de la información en la solución implementada.</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se realizó la creación de un repositorio de información en donde se creo una carpeta en un drive compartido con la supervisión en donde se subió la información correspondiente a las entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La url de esta carpeta es:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1KXvig2rZOZVHYe7pk2d_EznYKbaK3Rk9?usp=drive_link, en este link con acceso solamente al personal de la supervisión reposa la documentación referida a las entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.</p>
8	<p>Asistencia en la gestión documental que correspondan al seguimiento del avance del proyecto</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se ha realizado la asistencia y realizó la verificación con el acta de recibido a satisfacción de la remisión 7</p>



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
V01
Vigente desde 22/04/2024

ACTA N°	7	FECHA:	1 de julio de 2024
CONTRATO N°	0053	ORDEN DE COMPRA N°	N/A
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S - SOT INGENIERIA		
CC o NIT N°	900-4354-2		
OBJETO:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOPORTE DE 25 ZONAS WIFI, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LAS 25 ZONAS WIFI IMPLEMENTADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META".		
ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
VALOR TOTAL DE LA OBLIGACIÓN:	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DÍCE		
VALOR DE LA ENTREGA:	\$ 2.332.450.000,00		

Se recibe (14000) metros de fibra óptica de 24 hilos implementada en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, al almacén correspondiente a la séptima entrega parcial de suministros del contrato No 053 de 2024.

Por medio de la presente solicito la realización de ingreso de almacén del siguiente elemento adquiriendo según contrato No 053 de 2024. Se presenta la tabla de cumplimiento del dispositivo adquirido con respecto a lo solicitado al anexo técnico del contrato.

- Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mufas, herrajes de suspensión, herrajes de retención, Marquillado y entrada a zona vial a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico.

FIBRA ÓPTICA		VALIDACIÓN
Cantidad	14000 metros	CUMPLE
Capilaridad	Fibra óptica monomodo 12 hilos, <u>Adss</u> , con el <u>S08B</u> , según plano	CUMPLE
Tipo	Monomodo G.652D	CUMPLE
Características	Atenuación mínima por kilómetro distintas ventanas de operación	CUMPLE
S08B	Para distancia inter postal de Mayor a Bómba y/o dependiendo el vano en la instalación del tendido de fibra óptica	CUMPLE
Protección	Cable debe contar con protección contra rayos UV y humedad	CUMPLE
Temperatura	Rango mínimo -10° C -50° C	CUMPLE

Compañía Colombia Digital
Regist. S.C.
www.colombiadigital.gov.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
V01
Vigente desde 22/04/2024

Aislamiento	El cable óptico debe ser totalmente dieléctrico, en construcción del tipo <u>single tube</u> (tubo holgado).	CUMPLE
Contenido Cable	Los tubos holgados deberán contener al interior 6 o 12 fibras ópticas dependiendo la capacidad de la fibra.	CUMPLE
Identificación	Los tubos holgados y las fibras ópticas deberán identificarse, de acuerdo con el código de colores.	CUMPLE
Cubierta	El cable deberá tener una cubierta externa de polietileno de color negro, con protección contra intemperie y resistente a la luz solar, esta debe ser continua, lisa, libre de fisuras, poros y otras imperfecciones.	CUMPLE
Instalación	La fibra Dejado de la cubierta externa deberá incluir 1.180,00 <u>dB/km</u> .	CUMPLE

Tabla 1. Validación de las características de la Fibra óptica.

ITEM	CAN	UNIDAD	SEAL	TRA CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	14000	METROS	N/A	Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mufas, herrajes de suspensión, herrajes de retención, Marquillado y entrada a zona vial a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico.	\$ 166.603,57	\$ 2.332.450.000,00

Se indica que el contratista CUMPLE con las características técnicas del suministro según especificaciones del ANEXO TÉCNICO.

REVISIÓN DEL SUMINISTRO

Item	Descripción	Cant. Unidad	V unitario	V Total
1	Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mufas, herrajes de suspensión, herrajes de retención, Marquillado y entrada a zona vial a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico.	1	\$ 166.603,57	\$ 2.332.450.000,00
TOTAL				\$ 2.332.450.000,00

Tabla 3. Revisión del suministro séptima entrega Parcial

Compañía Colombia Digital
Regist. S.C.
www.colombiadigital.gov.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
V01
Vigente desde 22/04/2024

El suscrito Supervisor del Contrato N°0053 de 2024 a nombre de SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S - SOT INGENIERIA con objeto "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOPORTE DE 25 ZONAS WIFI, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LAS ZONAS 25 ZONAS WIFI IMPLEMENTADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META", se recibió a entera satisfacción y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de calidad y garantía establecidas en el contrato.

FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN	
CONTRATISTA	SUPLENTE
Contratista	SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SOT
Supervisor	PABLO SANDOVAL
Revisión Técnica	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL
Apoyo a la Supervisión	

Acta N°	7	Contrato N°	0053	de	20 de junio del 2024
---------	---	-------------	------	----	----------------------

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexo el registro fotográfico de los elementos, bien o obra entregada por el contratista en el que se evidencie su estado o hallazgos de mismo.

FIBRA ÓPTICA



Compañía Colombia Digital
Regist. S.C.
www.colombiadigital.gov.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
V01
Vigente desde 22/04/2024



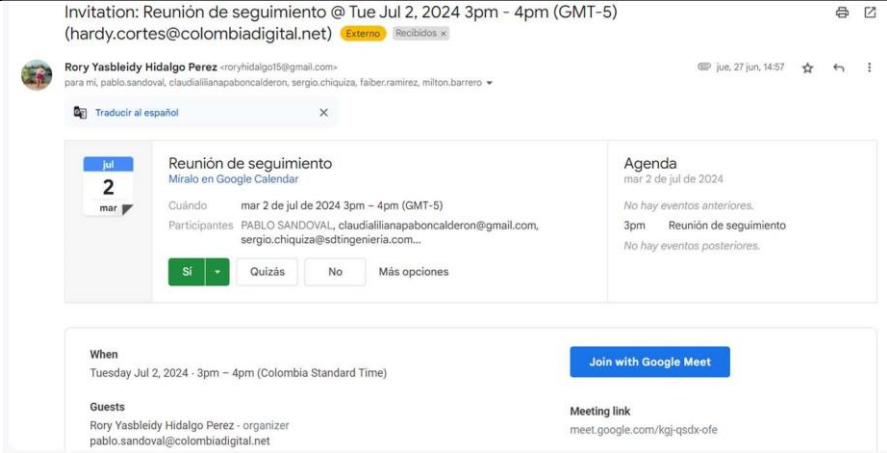
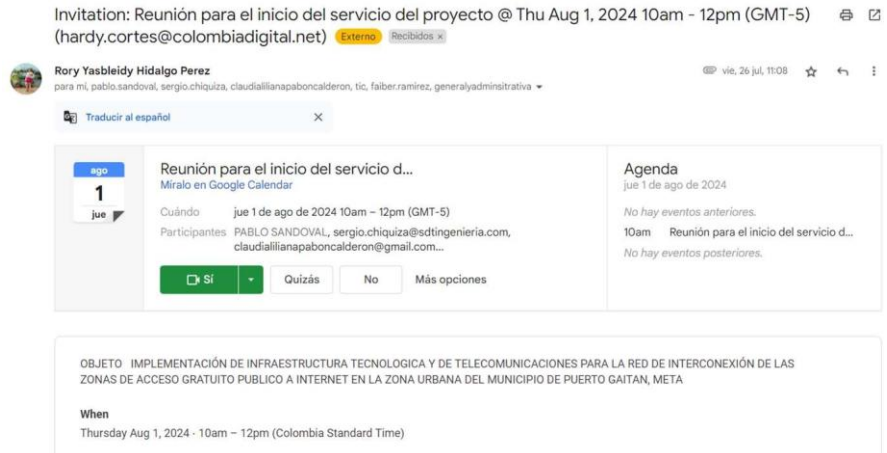
Compañía Colombia Digital
Regist. S.C.
www.colombiadigital.gov.co

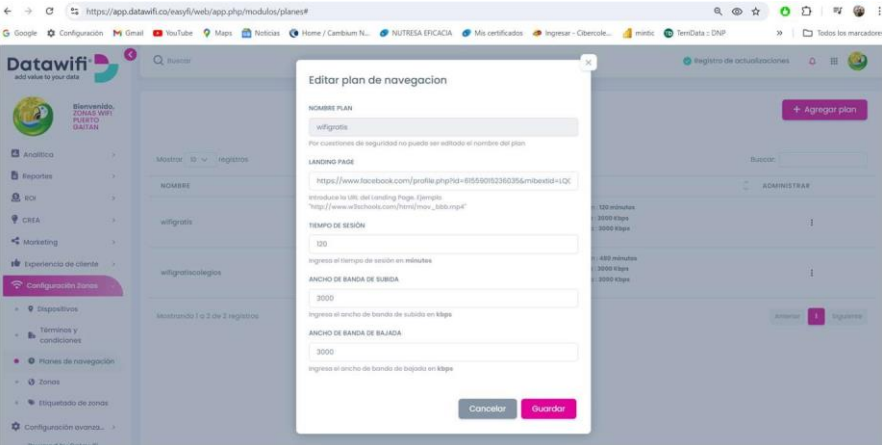


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
V01
Vigente desde 22/04/2024



Compañía Colombia Digital
Regist. S.C.
www.colombiadigital.gov.co

		 <p>Imagen 7. Invitación para reunión seguimiento y control.</p>  <p>Imagen 8. Invitación inicio del servicio del proyecto</p>
10	Entregar a la Corporación toda la información, documentos y archivos recopilados y producidos en desarrollo de la ejecución del contrato al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes, en medio digital, e impreso de común acuerdo con el supervisor del contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, como se indicó anteriormente se creó un repositorio desde un correo hardy.cortes@colombiadigital.net , el cual se creó una carpeta compartida en drive con el fin de garantizar el resguardo de la información y que puede ser recibida y administrada en tiempo real.

11	<p>Construir los planes de pruebas sobre las funcionalidades de las zonas wifi instaladas por la Corporación en cumpliendo los lineamientos del proyecto desarrollado</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, este plan de navegación se encuentra configurado en el portal cautivo, se tiene verificada cada una de las zonas WiFi.</p>  <p>Imagen 9. Configuración plan de navegación en la plataforma Datawifi.</p>
12	<p>Velar por el cumplimiento los lineamientos y normatividad vigente para instalaciones eléctricas y de datos</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se realizó la verificación de cada una de las zonas WiFi, así como la cantidad de usuarios</p>  <p>Imagen 10. Numero de sesiones y usuarios en el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2024.</p>
13	<p>Apoyar en el seguimiento de la calidad en la prestación del servicio durante la vida del proyecto de acuerdo con SLA establecidos.</p>	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se terminaron de implementar las zonas WiFi que es el objeto principal del proyecto, pero si se tiene definido en el anexo técnico los lineamientos que se deben cumplir en cuanto a los SLA establecidos para el recibido a satisfacción.</p>


14	Mantener correctamente en el repositorio de la Corporación según las prácticas definidas por la Dirección de Tecnología de la Corporación toda la información relacionada y pertinente a la ejecución del proyecto.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, como se indicó anteriormente se creó un repositorio digital desde un correo hardy.cortes@colombiadigital.net , el cual se creó una carpeta compartida en drive con el fin de garantizar el resguardo de la información y que puede ser recibida y administrada en tiempo real.																																	
15	Apoyar en la verificación y control en el cumplimiento de las características técnicas y licenciamientos (si aplica) de los equipos que forman parte de las zonas wifi a implementar.	<p>Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se realizó la verificación de los equipos por medio del formato de acta de recibido a satisfacción, en donde se indica si los equipos cumplen los requerimientos técnicos establecidos en el anexo técnico, a continuación, se relaciona los cuadros que se encuentran dentro del formato para la verificación técnica.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FIBRA ÓPTICA</th><th>VALIDACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantidad</td><td>14000 metros</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Capilaridad</td><td>Fibra óptica monomodo ≥ 12 hilos, Adss con el Span según vano.</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Monomodo G.652D</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Características</td><td>Atenuación mínima por kilómetro distintas ventanas de Operación</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Span</td><td>Para distancia Inter postal de Mayor a 80mts y/o dependiendo el vano en la instalación del tendido de fibra óptica</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Protección</td><td>Cable debe contar con protección contra rayos UV y humedad</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Temperatura</td><td>Rango mínimo: -10°C $\sim 50^{\circ}\text{C}$.</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Aislamiento</td><td>El cable óptico debe ser totalmente dieléctrico, en construcción del tipo loose tube (tubo holgado).</td><td>CUMPLE</td></tr> <tr> <td>Contenido Cable</td><td>Los tubos holgados deberán contener al interior 6 o 12 fibras ópticas dependiendo la capacidad de la fibra.</td><td></td></tr> <tr> <td>Identificación</td><td>Los tubos holgados y las fibras ópticas deberán identificarse, de acuerdo con el código de colores ,</td><td>CUMPLE</td></tr> </tbody> </table>	FIBRA ÓPTICA		VALIDACIÓN	Cantidad	14000 metros	CUMPLE	Capilaridad	Fibra óptica monomodo ≥ 12 hilos, Adss con el Span según vano.	CUMPLE	Tipo	Monomodo G.652D	CUMPLE	Características	Atenuación mínima por kilómetro distintas ventanas de Operación	CUMPLE	Span	Para distancia Inter postal de Mayor a 80mts y/o dependiendo el vano en la instalación del tendido de fibra óptica	CUMPLE	Protección	Cable debe contar con protección contra rayos UV y humedad	CUMPLE	Temperatura	Rango mínimo: -10°C $\sim 50^{\circ}\text{C}$.	CUMPLE	Aislamiento	El cable óptico debe ser totalmente dieléctrico, en construcción del tipo loose tube (tubo holgado).	CUMPLE	Contenido Cable	Los tubos holgados deberán contener al interior 6 o 12 fibras ópticas dependiendo la capacidad de la fibra.		Identificación	Los tubos holgados y las fibras ópticas deberán identificarse, de acuerdo con el código de colores ,	CUMPLE
FIBRA ÓPTICA		VALIDACIÓN																																	
Cantidad	14000 metros	CUMPLE																																	
Capilaridad	Fibra óptica monomodo ≥ 12 hilos, Adss con el Span según vano.	CUMPLE																																	
Tipo	Monomodo G.652D	CUMPLE																																	
Características	Atenuación mínima por kilómetro distintas ventanas de Operación	CUMPLE																																	
Span	Para distancia Inter postal de Mayor a 80mts y/o dependiendo el vano en la instalación del tendido de fibra óptica	CUMPLE																																	
Protección	Cable debe contar con protección contra rayos UV y humedad	CUMPLE																																	
Temperatura	Rango mínimo: -10°C $\sim 50^{\circ}\text{C}$.	CUMPLE																																	
Aislamiento	El cable óptico debe ser totalmente dieléctrico, en construcción del tipo loose tube (tubo holgado).	CUMPLE																																	
Contenido Cable	Los tubos holgados deberán contener al interior 6 o 12 fibras ópticas dependiendo la capacidad de la fibra.																																		
Identificación	Los tubos holgados y las fibras ópticas deberán identificarse, de acuerdo con el código de colores ,	CUMPLE																																	

		Cubierta.	El cable deberá tener una cubierta externa de polietileno de color negro, con protección contra intemperie y resistente a la luz solar, esta debe ser continua, lisa, libre de fisuras, poros y otras imperfecciones.	CUMPLE
		Instalacion	La fibra Debajo de la cubierta externa deberá incluir 1 hilo de rasgado.	CUMPLE
		Tabla 2. Revisión de la fibra óptica, respecto a los requerimientos del anexo técnico.		
16	Cumplir con la transferencia de conocimiento sobre los artefactos construidos al supervisor del contrato o a quien el designe para tal fin.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se ha estado a la disposición de lo que requiera la supervisión y cualquier solicitud que requiere trasferencia de conocimiento se hará.		
17	Reportar las inconformidades identificadas en el desarrollo del proyecto en la herramienta que para tal fin asigne la Corporación.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, no se ha presentado ninguna inconformidad en el desarrollo del contrato.		
18	Abstenerse de revelar la información (oral, grafica o escrita o en cualquier otro medio) que se le suministre por parte de la Corporación, durante el tiempo de permanencia en las instalaciones de la entidad y/o en el ejercicio de su labor adoptando las medidas de seguridad para que la información no sea copiada o duplicada por otros terceros no autorizados.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, siempre se abstuvo de revelar alguna información referente al proyecto, ni tampoco se ha compartido información a terceros.		
19	Ayudar a que se cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos del proceso.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se ha ayudado en la verificación de que todos los equipos cumplan las especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico.		

20	Y las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.	Durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024, se ha estado a disposición del supervisor y de las tareas que él designe.
----	--	---



HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL
C.C. No 1.122.120.298 de Acacías (Meta)
CONTRATISTA

VoBo SUPERVISOR CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL Ing. Pablo Sandoval T.	
---	---
