

INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 Del: 16 de diciembre de 2024 Al: 22 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 58 Días
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: San Juan del Cesar SUPERVISOR: ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO; DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

SEMANAL			ACUMULADO			SEMANAL			ACUMULADO		
Obra programada (%)			39,12%			83,99%			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra			\$ 29.810.088,22			\$ 64.001.771,71			Valor básico de la Obra		
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
Contratista: CONSORCIO PROINVERSIONES						Interventor: JVM INGENIERÍA S.A.S BIC					
Contrato No.			2344 de 2024			Contrato No.			2366 DE 2024		
Valor Inicial:			\$ 76.201.657,00			Valor Inicial:			\$ 110.605.055,00		
Valor Actualizado:			N/A			Valor Actualizado:			N/A		
Plazo Inicial:			3 MESES			Plazo Inicial:			3 MESES		
Plazo Actualizado:			N/A			Plazo Actualizado:			N/A		
Fecha de Iniciación:			26/10/2024			Fecha de Iniciación:			26/10/2024		
Fecha de Vencimiento:			31/12/2024			Fecha de Vencimiento:			31/12/2024		
IMAGEN OFICINA						IMAGEN OFICINA					

AVANCE

EN LA SEMANA EN CUESTION SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
DESMONTE DE CIELO RASO.
- DESMONTE DE LUMINARIAS.
- INSTALACION DE CIELO RASO.
- VINILO TIPO I, PINTURA PREMIUM DE ALTA CALIDAD.
- INSTALACION DE CIELO RASO.
EXCAVACION DE MATERIAL.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura en muros de interior.



Comentario: Aplicación de pintura en muros de interior.






Comentario: Desmonte de cielo raso.



Comentario: Desmonte de luminarias led.

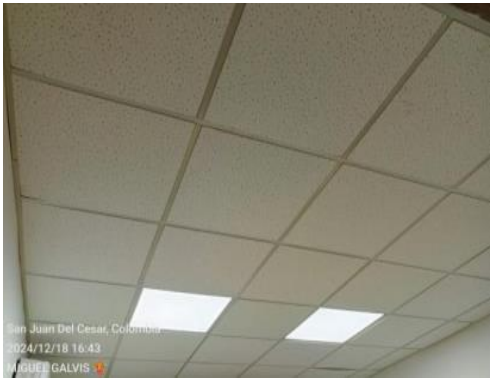

San Juan Del Cesar, Colombia

2024/12/18 16:43

MIGUEL GALVIS

Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso.



Comentario: Demolicion de muro y excavacion de material.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña</div> <div>Matrícula No.:13202-21700</div>

