



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

SST No. 7

PERIODO DEL INFORME

20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 904 de 2023

Objeto: *“Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica a la construcción con base a los diseños de ingeniería a detalle el equipamiento urbano denominado casa de la cultura de la localidad de Suba”*

Firma Interventora: Sociedad Técnica Sota Ltda.

NIT: 891101100-5

24 de octubre de 2024

Bogotá

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel:(608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com

CONTENIDO

<u>ANEXOS</u>	<u>3</u>
<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>4</u>
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	<u>4</u>
<u>LOCALIZACIÓN</u>	<u>5</u>
<u>ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DESARROLLADAS</u>	<u>5</u>
<u>EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA</u>	<u>6</u>
<u>REGISTROS DE INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN</u>	<u>7</u>
<u>EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO</u>	<u>7</u>
<u>REGISTROS DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</u>	
<u>ENTREGA DE DOTACIÓN</u>	<u>7</u>
<u>REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST</u>	<u>8</u>
<u>FORMATOS DE TRABAJO EN ALTURAS</u>	<u>10</u>
<u>REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS EJECUTADAS</u>	<u>11</u>
<u>REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y REGISTROS DE</u>	
<u>CALIBRACIÓN DE EQUIPOS</u>	<u>12</u>
<u>PROTOCOLOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, CON SUS</u>	
<u>RESPECTIVOS SOPORTES</u>	<u>12</u>
<u>EVIDENCIAS DE LAS GESTIONES ADELANTADAS PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS</u>	
<u>PRIORITARIOS (SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CERRAMIENTOS) Y DEMÁS QUE APLIQUEN DE</u>	
<u>SEGURIDAD INDUSTRIAL) -</u>	<u>13</u>
<u>CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO</u>	<u>15</u>



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

ANEXOS

Anexo 1. Seguridad Social equipo de Interventoría

Anexo 2. Certificado de mujeres vinculadas al proyecto

Anexo 3. Informe Mensual SST No. 6 Contratista de obra



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente documento es presentar el informe mensual de interventoría en materia de Seguridad y Salud en el trabajo correspondiente al mes No. 7 en donde se identifica el avance de obra desarrollado por el contratista de obra Unión Temporal COCON 2023 del contrato 903 de 2023 cuyo objeto es: *“ejecutar las actividades para la construcción de la casa de la cultura de la localidad de suba y las demás actividades que se detallen en el anexo técnico”*. Por lo anterior este documento expone de manera sistémica y ordenada los principales aspectos SST desarrollados durante el presente período informado como observaciones y recomendaciones realizadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Contratante:	Fondo de Desarrollo Local de Suba
Firma Interventora	Sociedad Técnica SOTA LTDA
NIT:	891101100-5
Contrato No.	No 904 de 2023
Objeto del Contrato	Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica a la construcción con base a los diseños de ingeniería a detalle el equipamiento urbano denominado casa de la cultura de la localidad de Suba.
Valor	Doscientos treinta y cinco millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos M/CTE (\$ 235.687.473)
Fecha de Inicio	22 de enero de 2024
Plazo Inicial	6 mes(es)
Suspensión 1	10 de abril de 2024
Suspensión 2	20 de mayo de 2024
Firma Interventora	Unión temporal COCON 2023
NIT	901785401
Representante Legal	Alberto Sánchez Solano
Contrato No.	903 de 2023
Póliza de cumplimiento del contrato de obra	21-40-101225370
Periodo del informe	20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com

LOCALIZACIÓN

La Obra está localizada en la localidad de Suba, se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.



Fuente. Google Earth Pro

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DESARROLLADAS

En el periodo comprendido entre el 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024 el Contratista continua con la realización de actividades constructivas, con el acompañamiento del residente y el supervisor SST de interventoría. La interventoría verificó la ejecución de actividades constructivas por parte del contratista, como se relaciona a continuación:

- Excavaciones y rellenos
- Cimentación
- Estructuras
- Obras de redes húmedas

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Para el presente periodo de reporte se realizan actividades de gestión y elaboración documental estipulados en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Equipo de trabajo y Seguridad social Interventoría

A continuación, se presenta el personal mínimo requerido de interventoría:

Nombre	Cargo
Ricardo Barrero Mossos	Director
Patricia Ojeda Artunduaga	Residente
Carlos Andrés Pérez Buriticá	Ingeniero Electricista
Yudi Carolina Jiménez Franco	Especialista Ambiental
Luis Ángel Espitia López	Especialista Estructural
Paola Guerrero Rodríguez	Especialista Geotecnia
Yudi Carolina Jiménez Franco	Profesional SST
Laura Valentina Ardila Castellanos	Ingeniera auxiliar

Ver **Anexo 1.** Seguridad Social equipo de Interventoría.

Como se puede observar en la anterior tabla, la interventoría da cumplimiento a lo indicado en base al Decreto Distrital 332 de 2020, con un porcentaje de inclusión de personal femenino, correspondiente al 57.14%, superando así lo indicado por la norma, para ramas de actividad económica de la construcción, donde se exige un 13.8%. La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, durante el periodo comprendido del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024, verificó en base al decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, el cumplimiento de pagos de seguridad social del personal de obra relacionado por parte del contratista, y el cumplimiento de medidas preventivas y de control para la Seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de intervención, como se relaciona a continuación:

Nombres	Cargo	MOC/MONC	Procedencia
Ricardo Andrés Cristancho	Director de obra	MOC	Santander
David Castelblanco	Residente de obra	MOC	Bogotá
Nury Yasmín Céspedes	Especialista en Gerencia de procesos SST	MOC	Bogotá
Andrés Uriel Arias Angulo	Maestro de obra	MONC	Bogotá
Domingo de Jesús Mendoza	Oficial de obra	MONC	Bogotá
Jesús David Arias Gaviria	Ayudante	MONC	Bogotá
Edwin Pérez Acosta	Ayudante	MONC	Bogotá
Franklin de Jesús Matheus	Ayudante	MONC	Bogotá

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com

Nombres	Cargo	MOC/MONC	Procedencia
Cesar Mauricio Segura	Maestro de obra	MONC	Bogotá

Ver **Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra

Registros de Inducción – reinducción

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra presenta ingresos de personal administrativo y personal operativo nuevo, por lo cual se ejecutan las correspondientes actividades de inducción al personal. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.5. ingresos)

Exámenes Médicos de ingreso

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra presenta ingresos de personal administrativo y personal operativo nuevo, por lo cual, se realizan los correspondientes exámenes médicos ocupacionales de ingreso; así mismo, no se presentan despidos o reducción de personal, por lo cual no se realizan exámenes médicos de egreso. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.5. ingresos)

Registros de entrega y suministro de elementos y equipos de protección personal. Entrega de dotación

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que se realiza el correcto uso y porte por parte de los trabajadores, de los EPP, y el contratista hace entrega del listado de EPP. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.4. Entrega de EPI)

	
Fecha: 25 de septiembre de 2024	Fecha: 25 de septiembre de 2024

<p>Descripción: porte y uso adecuado de EPP.</p> 	<p>Descripción: porte y uso adecuado de EPP.</p> 
<p>Fecha: 25 de septiembre de 2024 Descripción: porte y uso adecuado de EPP.</p>	<p>Fecha: 25 de septiembre de 2024 Descripción: porte y uso adecuado de EPP</p>

Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en SST

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra realiza por medio del residente de obra, las correspondientes charlas preoperacionales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Así mismo, la interventoría realiza el acompañamiento a las jornadas de charlas preoperacionales, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.5. ingresos, 6.5.4. Asistencia a capacitaciones).



Fecha: 02 de octubre de 2024
Descripción: simulacro distrital



Fecha: 04 de octubre de 2024
Descripción: capacitación



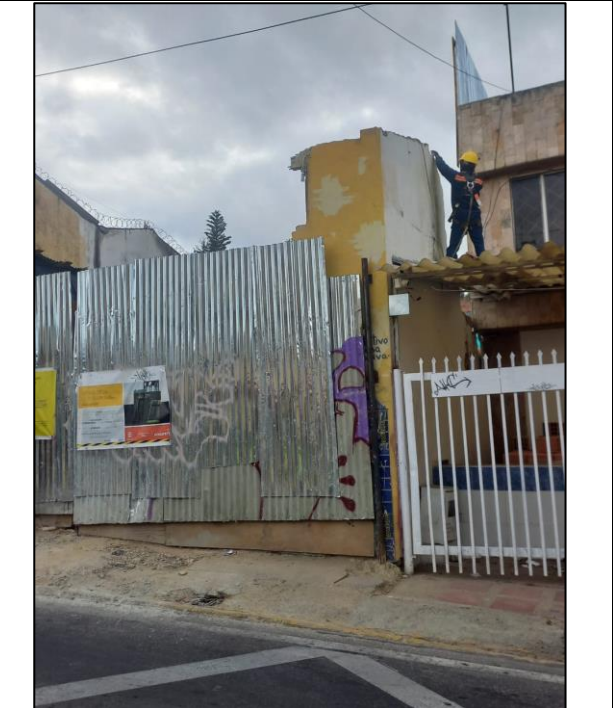
Fecha: 08 de octubre de 2024
Descripción: capacitación



Fecha: 11 de octubre de 2024
Descripción: capacitación

Formatos de Trabajo en alturas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra realizó trabajos de alturas por lo cual hace entrega de los formatos de ATS, permiso de trabajo en alturas; el contratista de obra hace entrega de los certificados de cursos avanzados en alturas de los trabajadores. junto con los certificados de los cursos avanzados en alturas, de los trabajadores que han ejecutado estas actividades. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.7. ATS).

	
<p>Descripción: Trabajo en alturas</p>	<p>Descripción: Trabajo en alturas</p>
	
<p>Descripción: Trabajo en alturas</p>	<p>Descripción: Trabajo en alturas</p>

Registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista realiza las correspondientes inspecciones en sitio, a instalaciones (orden y aseo y condiciones de seguridad), equipos y herramientas. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.8. inspecciones)



Fecha: 11 de octubre de 2024

Descripción: Inspecciones a maquinaria



Fecha: 11 de octubre de 2024

Descripción: Inspecciones a maquinaria

	
<p>Fecha: 26 de septiembre de 2024 Descripción: Inspecciones a maquinaria</p>	<p>Fecha: 02 de octubre de 2024 Descripción: Inspecciones a maquinaria</p>

Registros de mantenimiento de equipos, herramientas, máquinas y registros de calibración de equipos

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra no utiliza equipos susceptibles de calibración.

Protocolos de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, con sus respectivos soportes

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que se han aplicado encuestas de perfil sociodemográfico a los trabajadores relacionados en el apartado “*equipo de trabajo y seguridad social*”, y cuenta con la correspondiente base de datos de los trabajadores. (**Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 7 Contratista de obra, anexo 6.5. ingresos, 6.5.1. perfil sociodemográfico).

Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios (señalización, demarcación, cerramientos) y demás que apliquen de seguridad Industrial) -

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra realiza los correspondientes cerramientos de las áreas intervenidas, con poli sombra, zinc y cinta de peligro, al igual que implementa la señalización pertinente.

	
<p>Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024 Descripción: señalización, demarcación y cerramientos</p>	<p>Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024 Descripción: señalización, demarcación y cerramientos</p>



Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024
Descripción: señalización, demarcación y cerramientos



Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024
Descripción: señalización, demarcación y cerramientos



Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024



Fecha: 01 al 07 de octubre de 2024

Descripción: señalización, demarcación y cerramientos

Descripción: señalización, demarcación y cerramientos

Caracterización de la accidentalidad y ausentismo

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que se presenta un accidente laboral en el equipo de trabajo del contratista de obra, con lesión leve, reportado el día 16 de septiembre de 2024. El contratista de obra realiza el correspondiente reporte y toma las medidas correctivas a lugar. Ver **Anexo 3.** Informe Mensual SST No. 6 Contratista de obra. Anexo

Fecha y hora del incidente: 28 de septiembre de 2024 - 11:00 AM.

Lugar del incidente: Muro costado norte de la casa de la cultura.

Persona involucrada: Raúl Enrique Palencia Palacio.

Naturaleza del incidente: Caída de martillo demoledor en pierna izquierda.

Descripción detallada: El trabajador se encontraba demoliendo el muro del costado norte ubicado cerca a la entrada de la obra, y en medio de la actividad el martillo se resbala por lo que cae sobre la pierna izquierda del trabajador generando la lesión muscular.

La interventoría no presenta eventos de accidentes, enfermedades o incidentes.

Jornadas de orden y aseo

La interventoría verifica durante el presente periodo informado, que el contratista de obra realiza las correspondiente jornadas de orden y aseo.



Descripción: jornadas de orden y aseo en sitio y predios aledaños	Descripción: jornadas de orden y aseo en sitio y predios aledaños
	
Descripción: jornadas de orden y aseo en sitio y predios aledaños	Descripción: jornadas de orden y aseo en sitio y predios aledaños


RECOMENDACIONES

1. Todas y cada una de las actividades contenidas y reportadas en el informe de obra, deben contener registro fotográfico como evidencia de cumplimiento, y, como complemento a los formatos debidamente diligenciados y firmados.
2. Implementar medidas de prevención enfocadas al autocuidado del trabajador, para prevención de accidentes y enfermedades de tipo laboral.

CONTROL DE CAMBIOS



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Fecha: 24 de octubre de 2024		
Versión 1		
Elaboró	Revisó	Concepto
Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo Interventoría	Director de Interventoría	Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo Interventoría
		Concepto-observaciones a informe No. 7 de obra: Aprobado

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Anexo 1. Seguridad Social equipo de Interventoría

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-80426493
NOMBRE EMPLEADO	RICARDO BARRERO MOSSOS
EPS	ALIANSAUD EPS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233615
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5433003
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.500.000	0,1600000	\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.040.000	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.500.000	0,0400000	\$ 260.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.500.000	0,0696000	\$ 452.400	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.500.000	0,0400000	\$ 260.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 1.105.000	\$ 260.000	\$ 452.400	\$ 260.000	\$ 2.077.400

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-52256126
NOMBRE EMPLEADO	PATRICIA OJEDA ARTUNDUAGA
EPS	ALIANSAUD EPS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233653
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2024-09
PERIODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.350.000	0,1600000	\$ 1.016.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.016.000	\$ 31.800	\$ 31.800	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.350.000	0,0400000	\$ 254.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.350.000	0,0696000	\$ 442.000	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.350.000	0,0400000	\$ 254.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 1.079.600	\$ 254.000	\$ 442.000	\$ 254.000	\$ 2.029.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-52364825
NOMBRE EMPLEADO	PAOLA GUERRERO RODRIGUEZ
EPS	ALIANSAUD EPS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233644
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERIODO PENSIÓN	2024-09
PERIODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.200.000	0,1600000	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.200.000	0,1250000	\$ 400.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.200.000	0,0696000	\$ 222.700	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 512.000	\$ 400.000	\$ 222.700	\$ 0	\$ 1.134.700

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-78716085
NOMBRE EMPLEADO	LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233644
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERIODO PENSIÓN	2024-09
PERIODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.200.000	0,1600000	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.200.000	0,1250000	\$ 400.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.200.000	0,0696000	\$ 222.800	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 512.000	\$ 400.000	\$ 222.800	\$ 0	\$ 1.134.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-75087896
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS ANDRES PEREZ BURITICA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.
AFP	SKANDIA FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233644
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERIODO PENSIÓN	2024-09
PERIODO SALUD	2024-09
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.265.000	0,1600000	\$ 682.400	\$ 0	\$ 0	\$ 682.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.265.000	0,1250000	\$ 533.200	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.265.000	0,0696000	\$ 296.900	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 682.400	\$ 533.200	\$ 296.900	\$ 0	\$ 1.512.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-20
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-53155444
NOMBRE EMPLEADO	YUDI CAROLINA JIMENEZ FRANCO
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233653
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2024-09
PERIODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.339.000	0,1600000	\$ 1.014.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.014.200	\$ 31.700	\$ 31.700	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.339.000	0,0400000	\$ 253.600	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.339.000	0,0696000	\$ 441.200	6

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.339.000	0,0400000	\$ 253.600	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 1.077.600	\$ 253.600	\$ 441.200	\$ 253.600	\$ 2.026.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-14
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1000930770
NOMBRE EMPLEADO	LAURA VALENTINA ARDILA CASTELLANOS
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233563
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	\$ 52.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	\$ 90.500	5742101

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	\$ 52.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 402.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-891101100
SUCURSAL	014
FECHA PAGO	2024-11-14
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1079661799
NOMBRE EMPLEADO	JESUS ALBERTO ULLOA GAMARRA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	31233563
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	\$ 52.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	\$ 90.500	5742101

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	\$ 52.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 402.500



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Anexo 2. Certificado de mujeres vinculadas al proyecto

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT 891.101.100-5

Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (608) 8572464 – Cel 3154184422

E-mail: Ricardobarrero@sotaic.com intersota.casacultura@gmail.com

Bogotá, agosto 02 de 2024

Señores

FONDO LOCAL ALCALDÍA DE SUBA
Alcaldía Local de Suba

REF: CERTIFICACIÓN

Yo, BENJAMÍN BARRERO ARCINIEGAS, Representante Legal de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA., con Nit. No. 891.101.100 – 5, y FRANCY EDITH CLAROS CASTRO, como Revisora Fiscal de la compañía y con tarjeta profesional No. 185901–T, nos permitimos certificar que la empresa inició con la vinculación de (3) tres mujeres para la ejecución del contrato de interventoría que corresponden al 50%, y actualmente mantiene vinculadas a (4) cuatro mujeres, correspondiente al 57.28%, superando así lo indicado por la norma, para ramas de actividad económica de la construcción, donde se exige un 13.8%. en base a los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.


A continuación, nos permitimos referenciar a las mujeres vinculadas, según el periodo relacionado:

Nombre	Cargo	Periodo de vinculación
Patricia Ojeda	Ingeniera, residente de Interventoría	22-01-2024 al 19-07-2024
Yudi Carolina Jiménez	Ingeniera Ambiental, Esp. HSST	22-01-2024 al 19-07-2024
Paola Guerrero Rodríguez	Especialista Geotecnia	22-01-2024 al 19-07-2024
Laura valentina Ardila C.	Ingeniera Auxiliar	20-06-2024 al 19-07-2024

Dada en Neiva a los 02 días del mes de agosto del 2024.

Atentamente,


BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Representante Legal SOTA LTDA.


FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
T.P. 185901–T

Elaboro YCJ
Reviso RB
cc- Archivo Sota Ltda., infraestructura arcadia suba



SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Anexo 3. Informe Mensual SST

No. 7 Contratista de obra

Radicado No: 20246110222822
