

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 12.08.2024
--	---	---

CONTRATO	026	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	7	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
NIT/CC	1113311986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
CÓDIGO CIU CONTRATISTA	4923 Transporte de carga por carretera

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 27.500.000	
ADICION EN VALOR	\$ - 0 -	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 30 DE 2024	
ADICION EN TIEMPO		
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO	
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO		
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		
NOMBRE DEL CESIONARIO		
NIT/CC		
REPRESENTANTE LEGAL		
GARANTIAS SI O NO	NO	
NUMERO DE POLIZA		
TIPO DE GARANTIAS		
Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0000050	Valor(es)	\$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024
---------------	---------	-----------	---------------	----------	------------------

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

N° RP	0000277	Valor (es)	\$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024
--------------	---------	------------	---------------	-----------	--------------------

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión
--	---

Valor contratado	\$ 27.500.000
------------------	---------------

Valor Primer pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Segundo pago parcial	\$ 2.750.000
----------------------------	--------------

Valor Tercer pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Cuarto pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Quinto pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Sexto pago parcial	\$ 2.750.000
--------------------------	--------------

Valor Séptimo pago parcial	\$ 2.750.000
----------------------------	--------------

Saldo ejecutado a la fecha	\$ 16.500.000
----------------------------	---------------

Saldo por Ejecutar	\$ 8.250.000
--------------------	--------------

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4566110427	AGOSTO
PENSION	4566110427	AGOSTO
ARL		

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades																									
22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ACTIVIDADES CONTRATADAS (A 10 MESES)																									
	<table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>No.</td><td>264</td><td>28.000</td><td>7.392.000</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>No.</td><td>44</td><td>90.000</td><td>3.960.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>No.</td><td>44</td><td>367.000</td><td>16.148.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$27.500.000</td></tr></table>	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000	TOTAL				\$27.500.000
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																					
	Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000																					
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000																					
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000																					
	TOTAL				\$27.500.000																					
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (A 1 MES)																									
	<table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>26.4</td><td>28.000</td><td>739.200</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>90.000</td><td>396.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>367.000</td><td>1.614.800</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$2.750.000</td></tr></table>	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800	TOTAL				\$2.750.000
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																					
	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200																					
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000																					
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800																					
	TOTAL				\$2.750.000																					
	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES																									
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTO</th><th>RESULTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS</td><td>Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora</td><td>Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad (Cant. 26.4)</td><td>10% </td></tr></table>	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad (Cant. 26.4)	10% 																		
ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN																							
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad (Cant. 26.4)	10% 																							

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

		Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos (Cant. 4.4)	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector La Rivera. Longitud 8 km. Conformación de vía. Sector el Paraíso hasta Aures Nuevo. Longitud 6 km. Conformación de vía.	9%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	Atención de 4Km de vías urbanas Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. - Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	Sector barrio La Esperanza. Longitud de vía 0.4 km. se conformaron las calles sin pavimento. Sector barrio Obrero Longitud 0.3 km. Conformación de vías y cancha deportiva. Sector Calle 13 entre carrera 11 y 12. Longitud 0.1 km. Conformación de vía para mejoramiento de tránsito vehicular. Calle 14 entre carrera 10 y 11. Longitud 0.1 km. Cajeo de vía. Calle 20 diagonal al CIC. Longitud 0.1 km. Cajeo para pavimentar. Carrera 17 calle 16 Longitud 0.1 km. Conformación vía para recuperación tránsito vehicular.	50%

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

			Carrera 18 entre calles 19 y 20. Longitud 0.2 km . Conformación y descapote de vía. Barrio el Progreso Longitud 0.2 km . Conformación vías urbanización las Colinas.	
		Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2,6KM de vías asfaltadas en la zona urbana		
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Sector barrio La Esperanza. Esparcimiento de material para conformación de vía. 21 m³. Calle 13 entre carrera 11 y 12. Mejoramiento tránsito vehicular. 70 m³ Calle 14 entre carrera 10 y 11. Cajeo de vía. 84 m³. Calle 20 diagonal al CIC. Cajeo para pavimentar. 9 m³. Carrera 9 donde termina la doble calzada. 80 m³. Carrera 17 Remoción de escombros 49m³. Carrera 18 entre calles 19 y 20.	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

			<p>Conformación y descapote de vía de material vegetal. 21 m³.</p> <p>La Rivera. Cargue de material granular. 32 m³.</p> <p>Parque Agroindustrial. Remoción de Material Granular 70 m³.</p> <p>Carrera 17 Calles 11 y 12 Inicio de trincho para recuperar paso de un carril. 30 llantas y 21 m³.</p>	
		Otras Actividades de Apoyo	<p>Carrera 11 Calle 3. Remolque de carro mal estacionado y llevado a bodega de transito.</p> <p>Esquina calle 17 carrera 10. Demolición casa esquinera que presentaba peligro de derrumbe.</p> <p>Sector Calle 13, se desarmó y removió valla caída debido a fuerte vendaval.</p>	
<p>Registro Fotográfico</p> <p>Conformación de vía, barrio la Esperanza</p> <div></div>				

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Sector barrio Obrero, Conformación de vía



Calle 13 entre carrera 11 y 12, mejoramiento tránsito vehicular



Calle 14 Carrera 10 y 11 cajeo y cargue volquetas




CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Calle 20 diagonal al CIC, cajeo para pavimentar

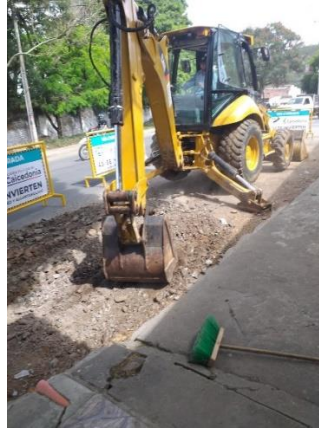

Carrera 9 donde termina la doble calzada, remoción



Carrera 17 Remoción de Escombros



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Carrera 17 Apertura de vía



Carrera 17 Calle 6, conformación de vía



Carrera 18 Calles 19 y 20 descapote y conformación de vía



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

La Rivera. Descargue de material granular en área de falla



El Progreso Conformación de vías



Parque Agroindustrial, remoción de material granular



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Carrera 11 Calle 3, Remolque de carro hacia Bodega de Transito



Carrera 17 entre calle 11 y 12. Inicio de trincho para recuperar paso



Esquina de la calle 17 con carrera 10. Demolición de la casa esquinera que presentaba peligro de derrumbamiento



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Sector Paraiso hasta Aures Nuevo, Conformación de vía



Mantenimiento preventivo de Motoniveladora y Retroexcavadora



4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat 416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. (se cambiaron cuchillas de la motoniveladora)

Sector La Rivera, Longitud 8 km, Conformación de vía. Sector el Paraíso hasta Aures Nuevo, Longitud 6 km, Conformación de vía. Sector barrio La Esperanza, Longitud de vía 0.4 km se conformaron las calles sin pavimento. Sector barrio Obrero, Longitud 0.3 km, Conformación de vías y cancha deportiva. Sector Calle 13 entre carrera 11 y 12, Longitud 0.1 km, Conformación de vía para mejoramiento de tránsito vehicular. Calle 14 entre carrera 10 y 11, Longitud 0.1 km, Cajeo de vía. Calle 20 diagonal al CIC, Longitud 0.1 km, Cajeo para pavimentar. Carrera 17 calle 16 Longitud 0.1 km, Conformación vía para recuperación tránsito vehicular. Carrera 18 entre calles 19 y 20, Longitud 0.2 km, Conformación y descapote de vía. Barrio el Progreso, Longitud 0.2 km, Conformación vías urbanización las Colinas. Sector barrio La Esperanza, Esparcimiento de material para conformación de vía, 21 m³. Calle 13 entre carrera 11 y 12, Mejoramiento tránsito vehicular, 70 m³. Calle 14 entre carrera 10 y 11. Cajeo de vía, 84 m³. Calle 20 diagonal al CIC, Cajeo para pavimentar, 9 m³. Carrera 9 donde termina la doble calzada, 80 m³. Carrera 17, Remoción de escombros, 49m³. Carrera 18 entre calles 19 y 20, Conformación y descapote de vía de material vegetal, 21 m³. La Rivera, Cargue de material granular, 32 m³. Parque Agroindustrial, Remoción de Material Granular, 70 m³. Carrera 17 Calles 11 y 12 Inicio de trincho para recuperar paso de un carril, 30 llantas y 21 m³. Carrera 11 Calle 3, Remolque de carro mal estacionado y llevado a bodega de tránsito. Esquina calle 17 carrera 10, Demolición casa esquinera que presentaba peligro de derrumbe.

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 2.750.000

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO X

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO X

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI X NO___

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI X NO___

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia Valle, 27 de septiembre de 2024

Firma del interventor y/o supervisor:

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO

Secretario de Obras Públicas
Supervisión

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
