

INFORME MENSUAL No. 8

**ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
"CORPAMAG".**

**OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES
HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PERIODO: 26 SEPTIMBRE DE 2024 HASTA 25 DE OCTUBRE DE 2024

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	4
2.1	DESCRIPCION GENERAL	4
2.2	LOCALIZACIÓN	5
2.2.1	Localización Especifica del Proyecto	6
2.2.2	Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras	7
2.3	ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	10
3	ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	17
3.1	CONTRATO DE OBRA	17
3.1.1	INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023 ..	17
4	ACTIVIDADES DE OBRA	17
4.1	ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO	17
4.1.1	INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO	20
4.1.2	INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO	20
4.1.3	PERSONAL DE OBRA	21
4.1.4	EQUIPO DE OBRA	22
4.1.5	ACTIVIDADES REALIZADAS	23
4.1.6	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION	23
4.1.7	BITÁCORA DE OBRA.	25
4.1.8	CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO	25
4.1.9	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	25
4.1.10	CONTROL DE PERSONAL	25
4.2	ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	26
4.2.1	CONTROL DE PÓLIZAS	26
4.2.2	CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES	27
4.2.3	CORRESPONDENCIA	27
4.2.4	ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS	28
4.2.5	REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	28
4.3	ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO	28
4.4	ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO	30
4.4.1	ACTAS PARCIALES DE COBRO	30
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8 26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023
---	---	---

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024.	17
Tabla 2. Informes Semanales.	21
Tabla 3. Personal de Obra.	22
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.....	22
Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.	22
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.....	22
Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.	23
Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.	26
Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo.....	28
Tabla 9. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.	30

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.	6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.	7
Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.....	9
Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.....	9
Ilustración 5. Registro Topográfico - Rio Gaira. Fuente: Propia.	10
Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia.	13
Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.	14
Ilustración 8 Balance de presupuesto de obra No.1 correspondiente a los periodos 2023 y 2024...	16
Ilustración 9. Extencion de manto de Geocontenedor – K2+800.00-K2+900.00. Fuente: Propia. ...	19
Ilustración 10. Reparación de via de Geocontendor– K2+800.00 – k2+900.00. Fuente: Propia.....	19
Ilustración 11. Trabajo de topografía. Rio Gaira.	20

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia.	24
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.	24
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.	24
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.	25
Gráfico 5. Avance Financiero de Ejecutado Vs Pagado Mensual. Fuente: Propia.....	30

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**.

El presente documento corresponde al informe mensual no. 8, este contiene las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 26 de septiembre de 2024 y 25 de octubre de 2024, en cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría. El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas.

De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.

Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**.

El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.

Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud norte y 74° 12' 06" de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km², de los cuales 55.10 Km² pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km² a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



2.2.1 Localización Específica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	 CONSORCIO ICASM2023
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para el año **2024** el río escogido fue el **RIO GAIRA**. El tramo de intervención va desde la desembocadura en el Rodadero hasta donde se tenga proyectado.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

RIO GAIRA

La degradación hidráulica y ambiental de este río, está asociada principalmente en la cuenca baja, donde se encuentra asentada la mayor parte de la población urbana; esto se ha generado por diferentes procesos históricos de desplazamiento y a su vez de invasión de manera no planificada en terrenos que generalmente no cuentan con condiciones físicas, ambientales, geográficas. Estas comunidades han invadido la cuenca de este importante afluente, año tras año ante situaciones ambientales relacionada con las épocas de inviernos torrenciales de la región son vulnerables a los procesos de inundación por los desbordamientos del río, ocasionándoles afectaciones en sus viviendas.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Sumado a eso, está la ausencia de cultura ambiental por parte de las poblaciones asentadas en la ronda hídrica del río, evidenciado en el manejo de las excretas y desechos arrojados permanentemente al cauce; situación que muestra claramente la falta de pertenencia de las comunidades asentadas en la cuenca del río, lo que además de contribuir a la pérdida de la capacidad hidráulica, contribuye al deterioro paisajístico de este sector de la ciudad y ocasiona que las comunidades aledañas a la zona tengan una percepción negativa de este afluente, por otra parte este cumulo de basuras y desechos impactan negativamente en el ecosistema marino.

Es preciso indicar que como consecuencia de factores meteorológicos como lo son grande precipitaciones o deshieles, el caudal de los ríos aumenta repentinamente produciendo desbordamientos e inundaciones, afectando a las poblaciones aledañas. Estas situaciones climáticas cuando los ríos aumentan su cauce y arrastran de aguas arriba gran cantidad de lodos que se alojan en las desembocaduras, ocasiona sedimentación de las cuencas bajas, en el caso del río Gaira estas cantidades de sedimento interrumpen la interconexión natural entre este afluente y el sistema marino, lo que ocasiona un detrimento en la fauna del ecosistema estuarino de este importante sector, evidenciándose en el detrimento de la actividad pesquera en estos ecosistemas y por ende afectando económicamente a la población dedicada a esta actividad.

Es por eso que la población ha percibido el río como un problema durante años, ya que este se encuentra asociado a procesos como las inundaciones que año tras año se sufren en la ciudad. El invierno y la deforestación en la parte media de la cuenca, es una de las causas importantes de las inundaciones, la ruptura de boquetes y bermas que permiten el paso del agua hacia áreas residenciales provocando la pérdida de los mismos y el direccionamiento del agua hacia las comunidades dejando como resultado pérdidas materiales del patrimonio de la población.

Debido a lo anterior, se presentan entonces cambios del uso del suelo en áreas de uso público, reduciendo las posibilidades de restauración ecológica y conservación, comprometiendo la viabilidad de objetivos de protección ligados a las comunidades ubicadas en la zona de intervención.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.



Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 5. Registro Topográfico - Río Gaira. Fuente: Propia.



2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”** para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.15 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio.

Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.

Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención.

- **COMPONENTE TOPOGRÁFICO**

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y $e=10N$, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ± 0.80 m.

- **COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO**

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.

De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.
2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- **COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO**

Para estimar los caudales picos del Río Gaira, se generará modelo lluvia-escorrentía; que permita, con base en las características de cuenca y de las lluvias característica de diferentes períodos de retorno, estimar el caudal de pico de escorrentía para cada de estos períodos. Para tal efecto, se emplearán herramientas informáticas.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Río Gaira. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023


La cuenca cuenta con aproximadamente 10.875 hectáreas. La longitud del río Gaira es de 33,95 kilómetros y tiene un caudal promedio anual de 2,7 m³/s a la altura de la estación MINCA ubicada en el centro poblado del mismo nombre.

Los principales afluentes del río Gaira son: quebrada El Palmar, quebrada Las Mercedes, quebrada Agua Dulce, quebrada La Macanilla, entre otras. Sus principales centros poblados son Minca, Gaira y el Rodadero.

• COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

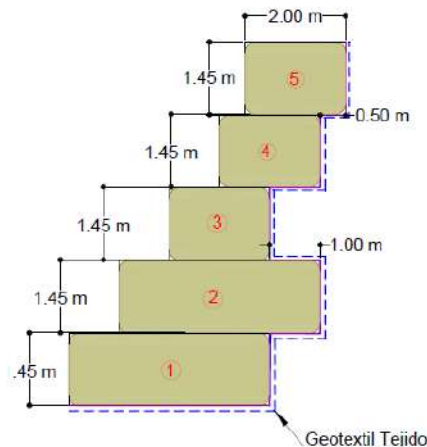

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.
- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,
- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el río, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.
- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.
- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO 2024

Ilustración 8 Balance de presupuesto de obra No.1 correspondiente a los periodos 2023 y 2024.

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA NIT. 800.099.287-4				
BALANCE DE PRESUPUESTO DE OBRA VIGENCIA 2023 - 2024						
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023 "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"						
AÑO 2023-2024						
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						\$ 29,672,424.00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	\$ 3,709,053.00	\$ 29,672,424.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 5,791,797,688.33
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	85,790.29	\$ 15,543.18	\$ 1,333,453,861.15
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	82,600.29	\$ 40,034.60	\$ 3,306,869,419.18
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	11.0	\$ 46,500,598.00	\$ 511,506,578.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	3,190.0	\$ 151,008.00	\$ 481,715,520.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	800.0	\$ 31,202.00	\$ 24,961,600.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	2,575.00	\$ 43,292.00	\$ 111,476,900.00
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	1,970.00	\$ 11,073.00	\$ 21,813,810.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 5,821,470,112.330
Aministración (23%)						\$ 1,338,938,126.00
Imprevistos (2%)						\$ 116,429,402.00
Utilidad (5%)						\$ 291,073,506.00
IVA (19%) sobre la Utilidad						\$ 55,303,966.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 1,801,745,000.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL						\$ 7,623,215,112.33
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 1,050,640,549.00
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	\$ 246,260,339.00	\$ 246,260,339.00
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	12.0	\$ 35,256,288.00	\$ 423,075,456.00
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Manzanares.	und	1.0	\$ 212,020,356.00	\$ 212,020,356.00
3.4	P - 3.5	Estudios y Diseños de Parque Lineal en áreas disponibles de Ronda Hidrica.	Glb	1.00	\$ 169,284,398.00	\$ 169,284,398.00
IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA (19%)						\$ 199,621,704.31
VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 1,250,262,253.31
VALOR TOTAL OBRA AÑO 2023-2024						\$ 8,873,477,366.00

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	2024
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	RIO GAIRA
VALOR DEL PERIODO:	\$ 8.873.477.366,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

Se reanuda el retiro de material de la actividad de remoción. Se continua con la instalación del muro en geocontenedor en el punto de la k2+800.00 hasta la k2+900.00.

Semana No. 29 (30/09/2024 - 6/10/2024)

1. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800 hasta la k2+900.00.
2. Se continúan con las actividades de rescate de fauna silvestre.
3. Se realizo actividad de cargue y retiro de material de remoción.
4. Se inicia las jornadas de sensibilización ambiental con las comunidades.

Semana No. 30 (7/10/2024 - 13/10/2024)

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

1. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800 hasta la k2+900.00.
2. Se continua con las actividades de rescate de fauna silvestre.

Semana No. 31 (14/10/2024 - 20/10/2024)

1. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800 hasta la k2+900.00.
2. Se continua con las actividades de rescate de fauna silvestre.
3. Se continua con las jornadas de sensibilización ambiental con las comunidades.

Semana No. 32 (21/10/2024 - 27/10/2024)

1. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800 hasta la k2+900.00.
2. Se continua con las actividades de rescate de fauna silvestre.
3. Se continua con las jornadas de sensibilización ambiental con las comunidades.
4. El 25 de octubre se realizo visita de campo del supervisor del contrato y se realizo recorrido de Quebrada Bureche.
5. El 25 de octubre se realizo visita de campo con el Especialista hidráulico para el segundo punto de geocontenedores.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 9. Extencion de manto de Geocontenedor – K2+800.00-K2+900.00. Fuente: Propia.



Ilustración 10. Reparación de via de Geocontendor– K2+800.00 – k2+900.00. Fuente: Propia.




	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

Se continua con el replanteo e implantación del muro en geocontenedor en el sector de la Licorera

Ilustración 11. Trabajo de topografía. Rio Gaira.

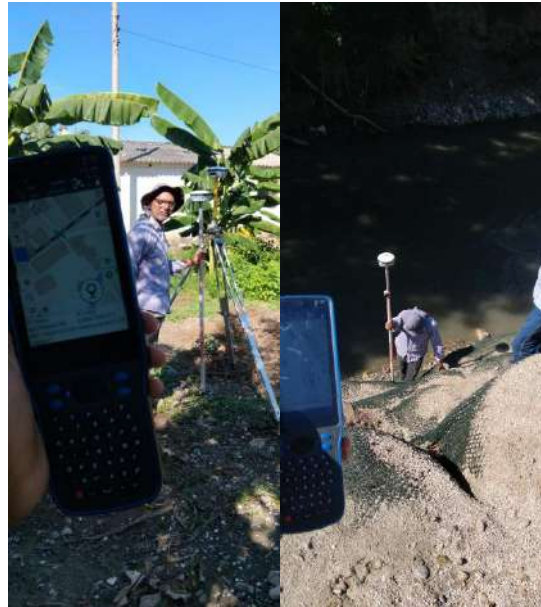

En el “Anexos No. 7 Componente Topográfico” se pueden encontrar las carteras y los planos de lo levantado en el periodo.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 29	INFORME SEMANAL N°29 (30SEP-6OCT)
SEMANA 30	INFORME SEMANAL N°30 (7OCT-13OCT)

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

SEMANA 31	INFORME SEMANAL N°31 (14OCT-20OCT)
SEMANA 32	INFORME SEMANAL N°32 (21OCT-27OCT)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el **“Anexo No.1 Informes Semanales”** del presente Informe.

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal de obra en el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Especialista Ambiental	Rosa Elvira Villamizar Sierra
Especialista Hidráulico	Danilo Gregorio Rodríguez Correa
Ingeniero Topógrafo	Angela María Fernández Fajardo
Trabajador Social	Andrés Felipe Giraldo Pérez
Profesional SST	Ana Milagro Marengo Caballero
Coordinador de Obra	Santiago José Ospino Urueña
Ingeniero Residente	Jonathan Antonio Caro Escobar
Ingeniero Ambiental	Cindy Rodríguez Medina
Ingeniero Ambiental	Daxy Nizayen Aguas Beleño
Técnico SST	Dayana Marcela Cervantes Giraldo
Biólogo	Andrés Felipe Pontón Albor
Biólogo	Sergio Andres Mendivil – Rivas
Veterinario	Abdón Segundo Peralta Atencio
Topógrafo	Leonardo Rafael Noguera Consuegra
Ayudante Topógrafo	José Felipe Venecia Montenegro
Ayudante de Obra	José Jorge Linero Macias
Ayudante de Obra	Edgar Enrique Rivera Julio
Ayudante de Obra	Jhon Martin Rudas Torres
Ayudante de Obra	Juan Jose Cervantes Romero
Ayudante de Obra	Gustavo Daniel Hernández Melendrez
Ayudante de Obra	Ronald Alberto Mendoza Rivera
Oficial de Obra	Yeison Atencio Barrios
Oficial de Obra	Jose Fernando Padilla Gutierrez
Inspector de obra	Belizario Antonio Bornacelly Marriaga
Ayudante de Obra	Ricardo Jose Gual Almarales
Ayudante de Obra	Sergio Rafael Granados Moreno
Ayudante de Obra	Ubaldo Antonio Gaviria Leguia
Ayudante de Obra	Elber Antonio Camargo Echeverria
Inspector de Obra	Rafael Eduardo Pacheco De Leon
Aux. Trabajador Social	Deisy Andrea Giraldo Giraldo
Conductor	Gustavo Ernesto Cotes Rodriguez
Conductor Volqueta	Eugenio Andres Niño Angarita
Conductor Volqueta	Abimelec Flores Quintero

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Conductor Volqueta	Wilber Enrique Orozco Florez
Conductor Volqueta	Emeris De Jesus Berrio Rivera
Conductor Volqueta	Manuel Eliecer Avila De La Hoz
Conductor Volqueta	Herney Del Carmen Rumbo Martinez
Conductor Volqueta	Norman Alberto Sierra Garcia
Conductor Volqueta	Fredy Alberto Marriaga Rada
Conductor Volqueta	Ronald Miguel Patron Martinez

Tabla 3. Personal de Obra.

(Ver Anexo N.o.2 Personal de Obra)

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX

Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.

VOLQUETAS:

MARCA	PLACA	CAPACIDAD
FOTON	KNL-551	17M3
FOTON	KNL-545	17M3
FOTON	KNL-546	17M3
FOTON	KNL-568	17M3
FOTON	KNL-571	17M3
FOTON	KNL-572	17M3
FREGHTLINER	WLK-229	17M3
FOTON	KNL-550	17M3
FOTON	KNL-549	17M3

Tabla 6. Relación Maquinara de Obra.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento Hidráulico

- 1) Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada.
- 2) Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.
- 3) Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.
- 4) Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50.
- 5) Geotextil Tejido de Poliéster

Actividades Complementarias

- 6) Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre: Se continua con las actividades de rescate y ahuyentamiento de fauna silvestre a lo largo del Rio Gaira.
- 7) Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre, se realizaron actividades de mantenimiento hidráulicos y complementarias. Las memorias de cantidades se relacionan en el **“Anexo No. 8 Memorias de Cantidades”**.

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
29	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	6 DE OCTUBRE DE 2024	3.60	39.18	3.70	65.53	26.35
30	7 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	3.60	42.78	0.67	66.20	23.41
31	14 DE OCTUBRE DE 2024	20 DE OCTUBRE DE 2024	5.04	47.82	1.19	67.38	19.56
32	21 DE OCTUBRE DE 2024	27 DE OCTUBRE DE 2024	4.86	52.69	1.52	68.90	16.21

Tabla 7. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia.

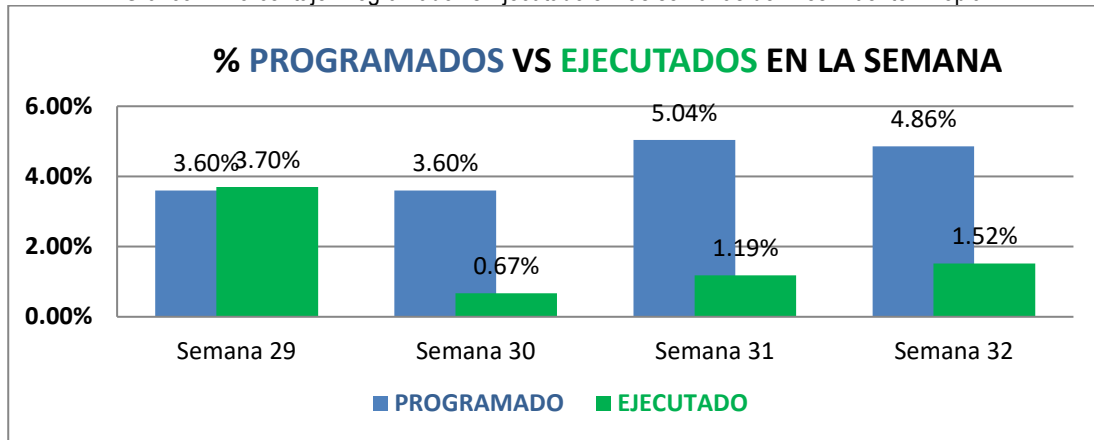


Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.


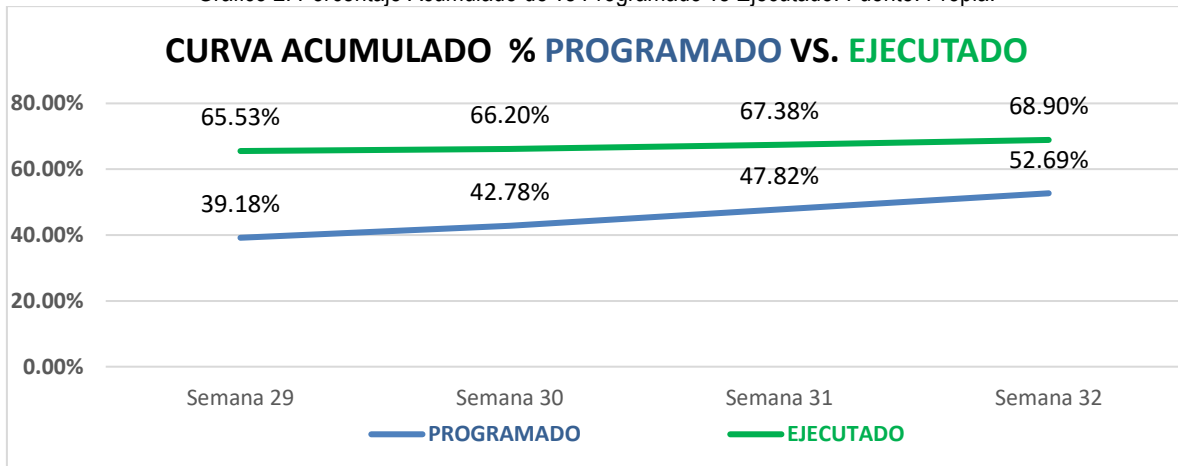


Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

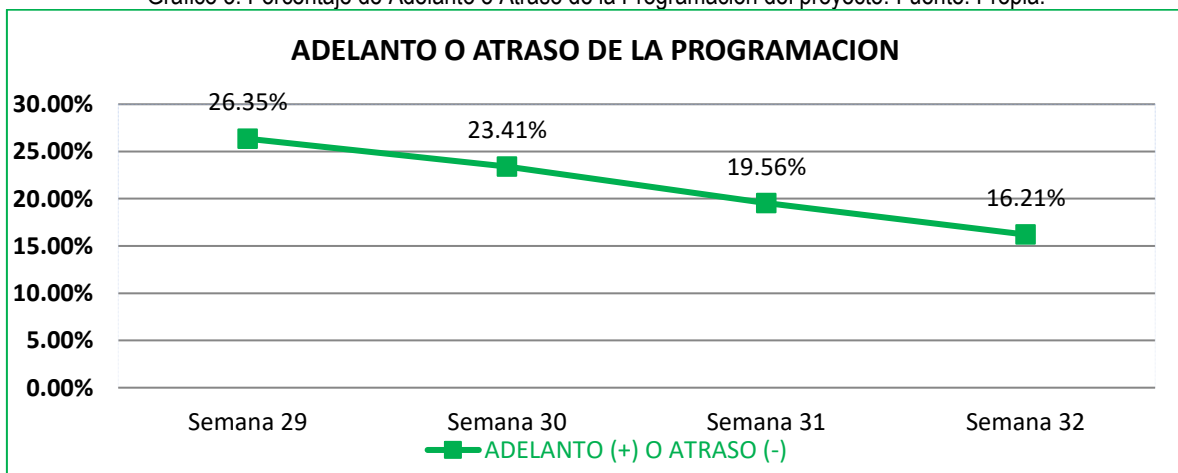

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023


4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al octavo mes se realizaron actividades de obra y complementarios. La Bitácora se relaciona en el **“Anexo No.3 Bitácora de Obra”**.

4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2024 hasta el 25 de octubre de 2024. Se relaciona la información registrada en el **“Anexo No.4 Estado General del Tiempo”**.

Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

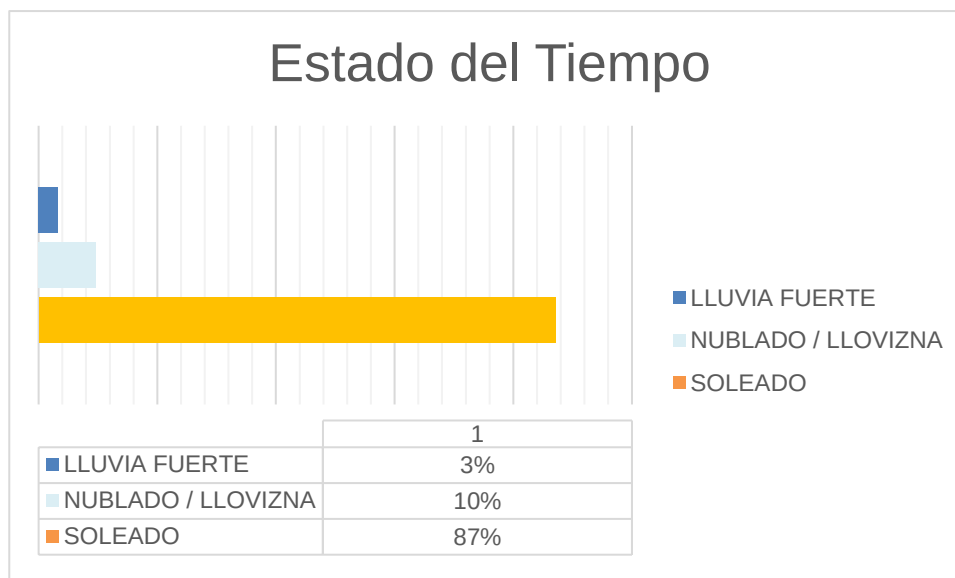

4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el **“Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra”**, adjunto en los anexos del presente informe.

4.1.10 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el **“Anexo No.6 Seguridad social del personal”** adjunto en los anexos del presente informe.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. DE POLIZA	CG-1051454		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO	19/03/2024	30/06/2025	\$ 887.347.736,60
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	13/03/2028	\$ 443.673.868,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2025	13/03/2027	\$ 175.177.646,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101050575		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
CONTRATISTA SUBCONTRATISTAS Y	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00

Tabla 8. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.6**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA 25 DE OCTUBRE DE 2024			
FECHA	REFERENCIA	CONSECUTIVO	ASUNTO
26/09/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-057	Monitoreo Río Gaira
28/09/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-058	Respuesta a Oficio ISM-070-2024 - Solicitud Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
28/09/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-059	Respuesta a Oficio ISM-069-2024 - Solicitud Informe Mensual No. 6
30/09/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-060	Respuesta a Oficio ISM-066-2024 - Solicitud Inicio de Actividades Pendientes
3/10/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-061	Respuesta a Oficio ISM-061-2024 - Solicitud Desglose AIU
7/10/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-062	Respuesta a Oficio ISM-077-2024 - Respuesta Oficio Inicio de Actividades Pendientes
7/10/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-063	Solicitud de acompañamiento en de medidas de control y erradicación de caracoles africanos ubicados en la ronda hidráulica del Río Gaira
8/10/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-064	Solicitud de acompañamiento en de medidas de control y erradicación de caracoles

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

			africanos ubicados en la ronda hidráulica del Río Gaira
23/10/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	ICASM-066	Respuesta a Oficio ISM-078-2024 - Solicitud Fichas Técnicas y Certificados de Calidad de Materiales e Insumos

Tabla 9. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

-.

- **25 de octubre de 2024**, se realizó recorrido de obra junto con el supervisor e interventoría en la Quebrada Bureche, petición solicitada por parte de Corpamag.
- **25 de octubre de 2024**, se realizó visita de campo al segundo punto de geocontenedores en le k4+200.00 con el Especialista hidráulico para la verificación de la implantación de la estructura.

4.3 ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL.

Se llevaron a cabo las actividades planteadas en las Medidas de Manejo Ambiental del contrato, tales como manejo de residuos sólidos, manejo de sustancias químicas, manejo de residuos líquidos peligrosos, y cobertura vegetal, protección de fauna y ecosistemas sensibles.

En el “Anexo No.9 Gestión Ambiental” se pueden encontrar El Informe De Seguimiento Ambiental No 3 AL PIMMA junto con sus anexos.

COMPONENTE SST

Durante el período actual, se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Se realizaron charlas dirigidas al personal de obra, se realizaron inspecciones de elementos de seguridad ubicados en los

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

equipos, orden y aseo, uso de EPP, y estado general, además de realizarse la entrega de los EPP necesarios.

En el “Anexo No.10 Componente SST” se pueden encontrar El Informe De Seguimiento No 3.

COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en la gestión social, incluyendo atención comunitaria, programa de comunicación y divulgación, atención de PQRS, ejecución de actas de vecindad.

En el “Anexo No.11 Componente Social” se pueden encontrar El Informe De Gestión Social No 3.


ACTIVIDADES DE RESCATE DE FAUNA

Durante el periodo se llevaron a cabo actividades de rescate y Ahuyentamiento en las zonas intervenidas.

En el “Anexo No.12 Rescate” se pueden encontrar El Informe de Manejo de Fauna Silvestre No.3.

4.4 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

Gráfico 5. Avance Financiero de Ejecutado Vs Pagado Mensual. Fuente: Propia.

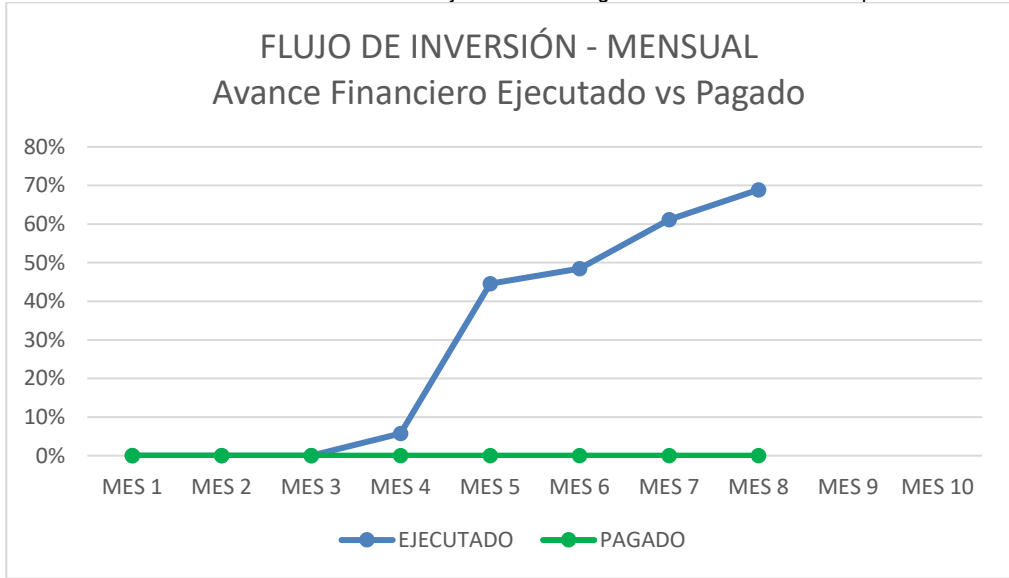

4.4.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO

-Acta de obra No.5 Mes de Octubre. **Ver “Anexo No. 13 Acta de obra”.**

4.4.1.1 Actas de Cobro de Contratista de Obra y cobros realizados

%	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	VALOR PAGADO	ESTADO
5.73	Mensual Junio	\$ 508,459,981.00	-	PENDIENTE
44.55	Mensual Julio	\$ 3,444,941,342.00	-	PENDIENTE
48.42	Mensual Agosto	\$ 342,831,585.00	-	PENDIENTE
61.82	Mensual Septiembre	\$ 1,189,469,446.00	-	PENDIENTE


Tabla 10. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°8	
	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el octubre mes de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 26 de septiembre del 2024 al 25 de octubre de 2024, en este, Se continua con la actividad de geocontenedores en el tramo de la k2+800.00 hasta la k2+900.00. continua con las Jornadas de sensibilización ambiental en las 3 comunidades seleccionadas.

Responsable:




LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV

ANEXO No.1
INFORMES SEMANALES - MES 8

INFORME SEMANAL No.29
(30 DE SEP - 6 DE OCT)

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA																	
CONTRATISTA DE OBRA: <u>CONSORCIO ICASM2023</u> CONTRATO No: <u>LP 006 DE 2023</u>																		
INTERVENTORIA: <u>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</u> CONTRATO No: <u>CM 007 DE 2023</u>																		
Semana Número: <u>29</u> Del: <u>30 de septiembre de 2024</u> Al: <u>6 de octubre de 2024</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>202</u> Días Supervisor Contrato: <u>Francisco Jairo Sanchez De la Hoz</u>																		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																		
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023																		
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL 3.60%</td><td>ACUMULADO 39.18%</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL 3.70%</td><td>ACUMULADO 65.53%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 319,815,227.25</td><td>\$ 3,476,657,937.91</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 328,744,063.00</td><td>\$ 5,814,446,418.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL 3.60%	ACUMULADO 39.18%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 3.70%	ACUMULADO 65.53%	Valor básico de la	\$ 319,815,227.25	\$ 3,476,657,937.91	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 328,744,063.00	\$ 5,814,446,418.00				
Obra programada (%)	SEMANAL 3.60%	ACUMULADO 39.18%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 3.70%	ACUMULADO 65.53%													
Valor básico de la	\$ 319,815,227.25	\$ 3,476,657,937.91	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 328,744,063.00	\$ 5,814,446,418.00													
CONTRATO DE OBRA																		
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 330,530,495,016.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 330,530,495,016.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 330,530,495,016.00	Valor Actualizado:	\$ 330,530,495,016.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023																	
Contrato No.	LP 006 DE 2023																	
Valor Inicial:	\$ 330,530,495,016.00																	
Valor Actualizado:	\$ 330,530,495,016.00																	
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA																		
<table><tr><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 23,163,036,792.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Ciento cuarenta y siete (147) meses</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>19 de junio 2036</td></tr></table>			Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00	Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00	Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036
Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																	
Contrato No.	CM 007 DE 2023																	
Valor Inicial:	\$ 23,163,036,792.00																	
Valor Actualizado:	\$ 23,163,036,792.00																	
Plazo Inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento:	19 de junio 2036																	
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)																		
<table><tr><td>Contratista:</td><td>CONSORCIO ICASM2023</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>LP 006 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 8,873,477,366.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			Contratista:	CONSORCIO ICASM2023	Contrato No.	LP 006 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00	Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00	Plazo Inicial:	Un (1) año	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024		
Contratista:	CONSORCIO ICASM2023																	
Contrato No.	LP 006 DE 2023																	
Valor Inicial:	\$ 8,873,477,366.00																	
Valor Actualizado:	\$ 8,873,477,366.00																	
Plazo Inicial:	Un (1) año																	
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)																		
<table><tr><td>Interventor:</td><td>INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>CM 007 DE 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 620,485,992.00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Un (1) año</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>19 de marzo 2024</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>31 de diciembre de 2024</td></tr></table>			Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S	Contrato No.	CM 007 DE 2023	Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00	Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00	Plazo Inicial:	Un (1) año	Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024	Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024		
Interventor:	INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																	
Contrato No.	CM 007 DE 2023																	
Valor Inicial:	\$ 620,485,992.00																	
Valor Actualizado:	\$ 620,485,992.00																	
Plazo Inicial:	Un (1) año																	
Fecha de Iniciación:	19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024																	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																		
<p>Se continua con la construccion del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800.00m hasta la k2+900.00m.</p> <p>Se hacen actividades de ahuyentamiento de fauna del sector</p> <p>Se instalaron los siguientes metros lineales de Muro en geocontenedor por nivel: N1:16ml, N2:14ml, N3: 12ml, N4: 12ml, N5: 16ml, N6: 20ml.</p> <p>Se realizó actividad de cargue y retiro de material de remocion. Se realizaron 281 viajes de Dobletroque.</p>																		
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
<p>Se continuara con las actividades de rescate y ahuyentamiento.</p> <p>Se continuara con las actividades de que permitan la construccion del muro en geocontenedor</p> <p>Se continuara con la actividad de cargue y retiro</p>																		
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES																		
<p>Se continua con el cierre de actas de los tramos ya intervenidos.</p> <p>Se realizan actividades de charlas de SST a comienzo de jornadas.</p>																		
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																		
<div><div>- Se realizan charlas diarias sst.</div><div>- Se realiza trabajo de construccion de muro en Geocontenedor.</div></div> <table><tr><td></td><td>%Programado</td><td>% Ejecutado</td></tr><tr><td>Avance semanal</td><td>3.60%</td><td>3.70%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>39.18%</td><td>65.53%</td></tr></table>		%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	3.60%	3.70%	Avance Acumulado	39.18%	65.53%	<div>Gráfica de Porcentaje de Ejecución</div>								
	%Programado	% Ejecutado																
Avance semanal	3.60%	3.70%																
Avance Acumulado	39.18%	65.53%																

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 3.70% para un total de 65.53% de avance acumulado. Se continua con actividad de contruccion de muro en Geoconenedor en el tramo k2+800,00 hasta el k2+900,00. Se reanudo el retiro de material proveniente de la remocion de sedimentos con volquetas.</p>		<div> Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div>
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	 	
Descripción: Implementacion de las sencibilizacion de medidas ambientales - Colegio Simon Bolivar de Gaira	Descripción: Cargue, Retiro y disposicion final de material de la actividad de remocion - Rio Gaira.	
		
Descripción: Instalacion de Camaras trampa para monitoreo - Rio Gaira	Descripción: Construccion de Muro en Geocontenedor - Rio Gaira	

INFORME SEMANAL No.30
(7 DE OCT - 13 DE OCT)



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA



CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO ICASM2023

CONTRATO No:

LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No:

CM 007 DE 2023

Semana Número:

30

Del:

7 de octubre de 2024

Al:

13 de octubre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

209

Días

Supervisor Contrato:

Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3.60%	42.78%	Obra Física Ejecutada (%)	0.67%	66.20%
Valor básico de la	\$ 319,815,227.25	\$ 3,796,473,165.16	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 59,359,663.00	\$ 5,873,806,081.00

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$

330,530,495,016.00

Valor Actualizado:

\$

330,530,495,016.00

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$

23,163,036,792.00

Valor Actualizado:

\$

23,163,036,792.00

Plazo Inicial:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Plazo Actualizado:

Ciento cuarenta y siete (147) meses

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Contratista:

CONSORCIO ICASM2023

Contrato No.

LP 006 DE 2023

Valor Inicial:

\$

8,873,477,366.00

Valor Actualizado:

\$

8,873,477,366.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

Interventor:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

Contrato No.

CM 007 DE 2023

Valor Inicial:

\$

620,485,992.00

Valor Actualizado:

\$

620,485,992.00

Plazo Inicial:

Un (1) año

Fecha de Iniciación:

19 de marzo 2024

Fecha de Vencimiento:

31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la construccion del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800.00m hasta la k2+900.00m.

Se hacen actividades de ahuyentamiento de fauna del sector

Se instalaron los siguientes metros lineales de Muro en geocontenedor por nivel: N2:6ml, N3: 10ml, N4: 12ml, N5: 8ml.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con las actividades de rescate y ahuyentamiento.

Se continuara con las actividades de que permitan la construccion del muro en geocontenedor

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Se continua con el cierre de actas de los tramos ya intervenidos.

Se realizan actividades de charlas de SST a comienzo de jornadas.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Se realizan charlas diarias sst.


- Se realiza trabajo de construccion de muro en Geocontenedor.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	3.60%	0.67%
Avance Acumulado	42.78%	66.20%


Gráfica de Porcentaje de Ejecución

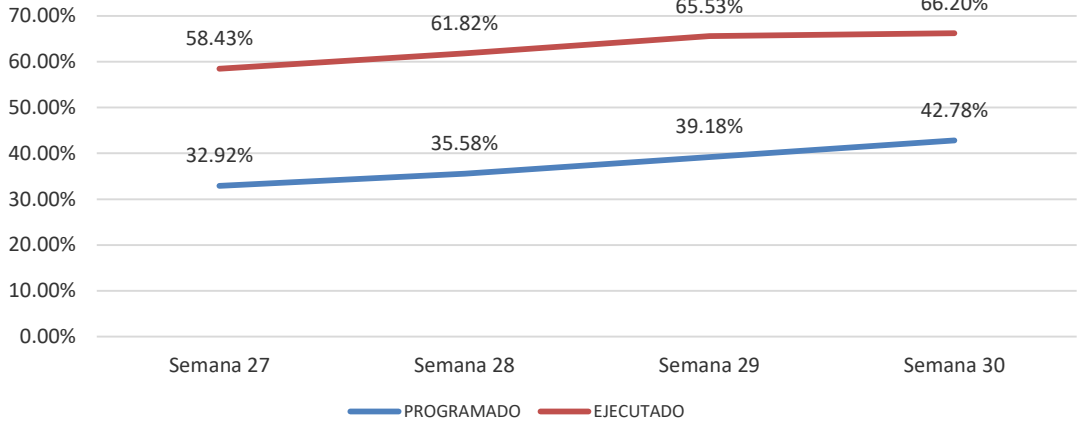


Semana	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)
Semana 27	32.92%	58.43%
Semana 28	35.58%	61.82%
Semana 29	39.18%	65.53%
Semana 30	42.78%	66.20%


	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 0.67% para un total de 66.20% de avance acumulado. Se continua con actividad de contruccion de muro en Geoconenedor en el tramo k2+800,00 hasta el k2+900,00.</p>		<div><div></div><div>Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div>
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descripción: Construccion de Muro en Geocontenedor - Rio Gaira	Descripción: Excavacion de trinchera para manto - Rio Gaira.	
		
Descripción: Instalacion de Camaras trampa para monitoreo - Rio Gaira	Descripción: Reparacion de via - Rio Gaira	


INFORME SEMANAL No.31
(14 DE OCT - 20 DE OCT)

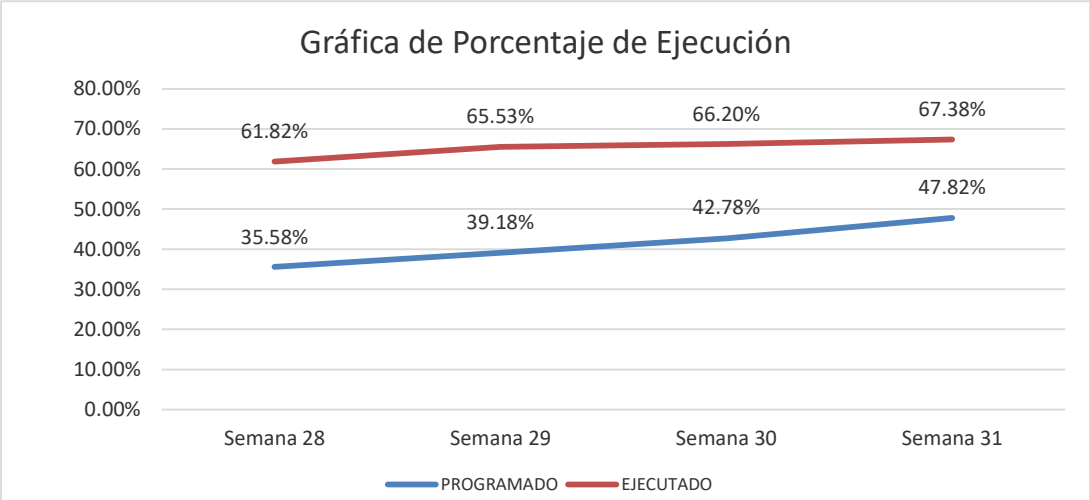	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA																			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 CONTRATO No: LP 006 DE 2023																				
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S CONTRATO No: CM 007 DE 2023																				
Semana Número: 31 Del: 14 de octubre de 2024 Al: 20 de octubre de 2024																				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 216 Días																				
Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz																				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																				
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023																				
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL 5.04%</td><td>ACUMULADO 47.82%</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL 1.19%</td><td>ACUMULADO 67.38%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 447,178,330.32</td><td>\$ 4,243,651,495.48</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 105,165,902.00</td><td>\$ 5,978,971,983.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL 5.04%	ACUMULADO 47.82%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 1.19%	ACUMULADO 67.38%	Valor básico de la	\$ 447,178,330.32	\$ 4,243,651,495.48	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 105,165,902.00	\$ 5,978,971,983.00						
Obra programada (%)	SEMANAL 5.04%	ACUMULADO 47.82%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 1.19%	ACUMULADO 67.38%															
Valor básico de la	\$ 447,178,330.32	\$ 4,243,651,495.48	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 105,165,902.00	\$ 5,978,971,983.00															
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA																	
Contratista: CONSORCIO ICASM2023			Interventor: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																	
Contrato No. LP 006 DE 2023			Contrato No. CM 007 DE 2023																	
Valor Inicial: \$ 330,530,495,016.00			Valor Inicial: \$ 23,163,036,792.00																	
Valor Actualizado: \$ 330,530,495,016.00			Valor Actualizado: \$ 23,163,036,792.00																	
Plazo Inicial: Ciento cuarenta y siete (147) meses			Plazo Inicial: Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Plazo Actualizado: Ciento cuarenta y siete (147) meses			Plazo Actualizado: Ciento cuarenta y siete (147) meses																	
Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024			Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento: 19 de junio 2036			Fecha de Vencimiento: 19 de junio 2036																	
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)			CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)																	
Contratista: CONSORCIO ICASM2023			Interventor: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S																	
Contrato No. LP 006 DE 2023			Contrato No. CM 007 DE 2023																	
Valor Inicial: \$ 8,873,477,366.00			Valor Inicial: \$ 620,485,992.00																	
Valor Actualizado: \$ 8,873,477,366.00			Valor Actualizado: \$ 620,485,992.00																	
Plazo Inicial: Un (1) año			Plazo Inicial: Un (1) año																	
Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024			Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024																	
Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024			Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024																	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																				
Se continua con la construccion del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800.00m hasta la k2+900.00m.																				
Se hacen actividades de ahuyentamiento de fauna del sector.																				
Se instalaron los siguientes metros lineales de Muro en geocontenedor por nivel: N1:12ml, N2: 4ml, N3: 4ml, N4: 4ml, N5: 8m, N6: 16ml.																				
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																				
Se continuara con las actividades de rescate y ahuyentamiento.																				
Se continuara con las actividades de que permitan la construccion del muro en geocontenedor																				
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES																				
Se continua con el cierre de actas de los tramos ya intervenidos.																				
Se realizan actividades de charlas de SST a comienzo de jornadas.																				
Se continua con las jornadas de implementacion de sensibilizacion de ambiental																				
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																				
<div><div>- Se realizan charlas diarias sst.</div><div>- Se realiza trabajo de construccion de muro en Geocontenedor.</div></div>			<div><div>Gráfica de Porcentaje de Ejecución</div><table><thead><tr><th>Semana</th><th>Programado (%)</th><th>Ejecutado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Semana 28</td><td>35.58%</td><td>61.82%</td></tr><tr><td>Semana 29</td><td>39.18%</td><td>65.53%</td></tr><tr><td>Semana 30</td><td>42.78%</td><td>66.20%</td></tr><tr><td>Semana 31</td><td>47.82%</td><td>67.38%</td></tr></tbody></table></div>			Semana	Programado (%)	Ejecutado (%)	Semana 28	35.58%	61.82%	Semana 29	39.18%	65.53%	Semana 30	42.78%	66.20%	Semana 31	47.82%	67.38%
Semana	Programado (%)	Ejecutado (%)																		
Semana 28	35.58%	61.82%																		
Semana 29	39.18%	65.53%																		
Semana 30	42.78%	66.20%																		
Semana 31	47.82%	67.38%																		
<table><thead><tr><th></th><th>%Programado</th><th>% Ejecutado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Avance semanal</td><td>5.04%</td><td>1.19%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>47.82%</td><td>67.38%</td></tr></tbody></table>				%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	5.04%	1.19%	Avance Acumulado	47.82%	67.38%									
	%Programado	% Ejecutado																		
Avance semanal	5.04%	1.19%																		
Avance Acumulado	47.82%	67.38%																		

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 1.19% para un total de 67.38% de avance acumulado. Se continua con actividad de contruccion de muro en Geoconenedor en el tramo k2+800,00 hasta el k2+900,00.</p>		<div><div></div><div>Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div>
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
<p>Descripción:</p> <p>Implementacion de las sencibilizacion de medidas ambientales - Colegio Simon Bolivar</p>	<p>Descripción:</p> <p>Instalacion de geoconenedor - Rio Gaira.</p>	
		
<p>Descripción:</p> <p>Reparacion de via - Rio Gaira</p>	<p>Descripción:</p> <p>Instalacion de manto geotextil - Rio Gaira</p>	

INFORME SEMANAL No.32
(21 DE OCT - 27 DE OCT)

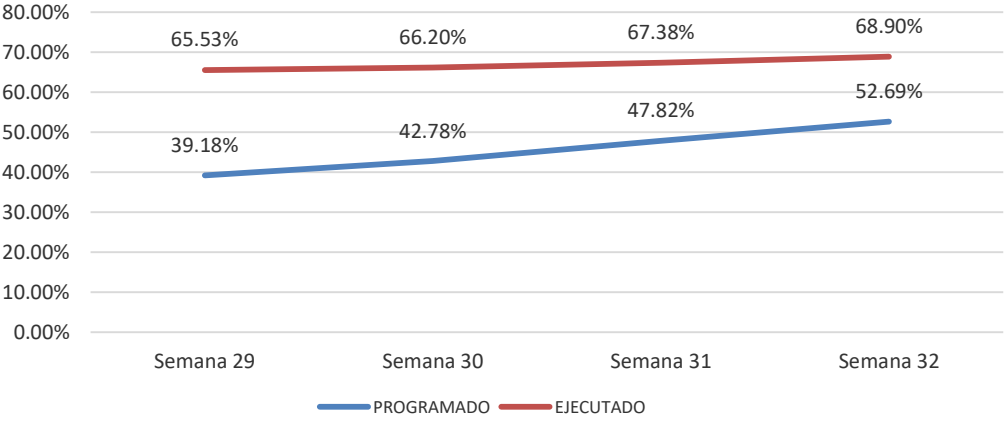	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA													
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 CONTRATO No: LP 006 DE 2023														
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S CONTRATO No: CM 007 DE 2023														
Semana Número: 32 Del: 21 de octubre de 2024 Al: 27 de octubre de 2024														
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 223 Días														
Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz														
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.														
OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023														
<table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL 4.86%</td><td>ACUMULADO 52.69%</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL 1.52%</td><td>ACUMULADO 68.90%</td></tr><tr><td>Valor básico de la</td><td>\$ 431,682,296.93</td><td>\$ 4,675,333,792.42</td><td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td><td>\$ 134,468,476.00</td><td>\$ 6,113,440,459.00</td></tr></table>			Obra programada (%)	SEMANAL 4.86%	ACUMULADO 52.69%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 1.52%	ACUMULADO 68.90%	Valor básico de la	\$ 431,682,296.93	\$ 4,675,333,792.42	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 134,468,476.00	\$ 6,113,440,459.00
Obra programada (%)	SEMANAL 4.86%	ACUMULADO 52.69%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 1.52%	ACUMULADO 68.90%									
Valor básico de la	\$ 431,682,296.93	\$ 4,675,333,792.42	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 134,468,476.00	\$ 6,113,440,459.00									
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Contratista: CONSORCIO ICASM2023			Interventor: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S											
Contrato No. LP 006 DE 2023			Contrato No. CM 007 DE 2023											
Valor Inicial: \$ 330,530,495,016.00			Valor Inicial: \$ 23,163,036,792.00											
Valor Actualizado: \$ 330,530,495,016.00			Valor Actualizado: \$ 23,163,036,792.00											
Plazo Inicial: Ciento cuarenta y siete (147) meses			Plazo Inicial: Ciento cuarenta y siete (147) meses											
Plazo Actualizado: Ciento cuarenta y siete (147) meses			Plazo Actualizado: Ciento cuarenta y siete (147) meses											
Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024			Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024											
Fecha de Vencimiento: 19 de junio 2036			Fecha de Vencimiento: 19 de junio 2036											
CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)			CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)											
Contratista: CONSORCIO ICASM2023			Interventor: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S											
Contrato No. LP 006 DE 2023			Contrato No. CM 007 DE 2023											
Valor Inicial: \$ 8,873,477,366.00			Valor Inicial: \$ 620,485,992.00											
Valor Actualizado: \$ 8,873,477,366.00			Valor Actualizado: \$ 620,485,992.00											
Plazo Inicial: Un (1) año			Plazo Inicial: Un (1) año											
Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024			Fecha de Iniciación: 19 de marzo 2024											
Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024			Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024											
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA														
Se continua con la construccion del muro en geocontenedor del tramo de la k2+800.00m hasta la k2+900.00m.														
Se hacen actividades de ahuyentamiento de fauna del sector.														
Se instalaron los siguientes metros lineales de Muro en geocontenedor por nivel: N1:4ml, N2: 16ml, N3: 16ml, N4: 16ml, N5: 16m, N6: 20ml.														
el 25 de octubre se realizo recorrido de la Quebrada bureche donde participaron, Supervision tecnica, Obra e Interventoria														
El 25 de octubre se realizo visita de campo con el Ingeniero Hidraulico en el segundo punto de Geocontenedor.														
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>														
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
Se continuara con las actividades de rescate y ahuyentamiento.														
Se continuara con las actividades de que permitan la construccion del muro en geocontenedor														
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>														
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES														
Se continua con el cierre de actas de los tramos ya intervenidos.														
Se realizan actividades de charlas de SST a comienzo de jornadas.														
Se continua con las jornadas de implementacion de sensibilizacion de ambiental														
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>														
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO														
<div><div>- Se realizan charlas diarias sst.</div><div>- Se realiza trabajo de construccion de muro en Geocontenedor.</div></div>			Gráfica de Porcentaje de Ejecución											
														
			<table><tr><td></td><td>%Programado</td><td>% Ejecutado</td></tr><tr><td>Avance semanal</td><td>4.86%</td><td>1.52%</td></tr><tr><td>Avance Acumulado</td><td>52.69%</td><td>68.90%</td></tr></table>				%Programado	% Ejecutado	Avance semanal	4.86%	1.52%	Avance Acumulado	52.69%	68.90%
	%Programado	% Ejecutado												
Avance semanal	4.86%	1.52%												
Avance Acumulado	52.69%	68.90%												

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE OBRA
<p>El avance que se evidencia en esta semana es del 1.52% para un total de 68.90% de avance acumulado. Se continua con actividad de contruccion de muro en Geoconenedor en el tramo k2+800,00 hasta el k2+900,00.</p>		<div><div>Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div>
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	<div>Descripción:</div> <div>Implementacion de las sencibilizacion de medidas ambientales - Colegio Simon Bolivar</div>	
	<div>Descripción:</div> <div>Recorrido de campo - Quebrada bureche</div>	
	<div>Descripción:</div> <div>Instalacion de geocontenedor - Rio Gaira.</div>	
	<div>Descripción:</div> <div>Instalacion de manto geotextil - Rio Gaira</div>	

Miércoles, 25 de Septiembre 2024: Clima: Se inició el día soleado - Sero, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se realizaron charlas de seguridad y salud en el trabajo. Se continúa con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 5 geocontenedores en el primer nivel y 2 geocontenedores en el segundo nivel. Se realiza el cargue, retro y disposición final del material proveniente de la excavación (52 viajes).

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) especialista hidráulico de obra, (1) especialista ambiental de obra, (1) comisión topográfica, (2) trabajadores sociales, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de interventoría, (1) especialista ambiental de interventoría, (1) especialista hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (3) operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (8) ayudantes de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial de obra. **Equipo:** computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipo de topografía, (3) excavadoras, (9) volquetas, máquina de coser, motobomba, herramientas menores, GPS.

[Firma]

[Firma]

Jueves, 26 de Septiembre 2024: Clima: Se inició el día nublado - con precipitaciones fuertes. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se realizaron charlas SST. Se continúa con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 3 geocontenedores en el primer nivel, 3 geocontenedores en el segundo nivel y 5 geocontenedores en el tercer nivel. Se realiza cargue, retro y disposición final de material proveniente de la excavación (58 viajes). Se realizó jornada de sensibilización Ambiental con la comunidad. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) Operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante.

(9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra **Equipo:** Computador portátil de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (9) volquetes, (1) GPS.

Viernes, 27 de septiembre 2024: clima: Se inicio el día soleado seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron cierre de Actas de vecindad. Se realizaron actividades de rescate de fauna silvestre. Se realizaron charlas SST. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 5 geocontenedores en el quinto nivel se realiza cargue, retiro y disposición final del material proveniente de la excavación (59 viajes). Se realizó jornada de sensibilización Ambiental con la comunidad. **Personal:** (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión Topográfica, (1) trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador Social de Interventoría, (3) operadores, (9) conductores de volquetes, (1) Veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) Maestro de obra, **Equipo:** Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (9) volquetes, (1) GPS.

Sábado, 28 de septiembre 2024: clima: Se inicio el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se realizaron charlas SST. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 3 geocontenedores en el primer nivel, 2 geocontenedores en el segundo nivel, 1 geo contenedor en el tercer nivel y 2 geocontenedores en el quinto nivel. Se realiza cargue, retiro y disposición final del material proveniente de excavación (57 viajes). **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra

(1) Residente de obra, (1) Especialista hidraulico de obra, (1) comision topografica, (1) trabajador social, (1) tecnico SISO, (1) Biologo, (1) Director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) Especialista Ambiental de Interventoria, (1) Especialista hidraulico de Interventoria, (1) trabajador social de Interventoria, (3) operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra
Equipo: Computador portatil de obra e Interventoria, vehiculo de obra e Interventoria, Equipo de topografia (3) Excavadoras, (9) volquetas, (1) GPS

F.H.F.C.E.

Phu

Domingo, 29 de septiembre 2024: NO se realizaron Actividades.

F.H.F.C.E.

Phu

Semana No. 29 (30 de septiembre de 2024 - 6 de octubre de 2024).

Lunes, 30 de septiembre 2024: Clima: Se inicio el dia nublado con precipitaciones leves. Actividades: Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecindad.

Se realizaron charlas SST. Se realizaron actividades de rescate de Fauna silvestre. Se continua con la construccion de muro en geocontenedor con la Instalacion de 6 geocontenedores en el primer nivel. 3 geocontenedores en el segundo nivel y un geocontenedor en el cuarto nivel. Se realiza cargue y retiro a disposicion final del material proveniente de la excavacion

(50 viajes) **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidraulico de obra, (1) comision topografica, (1) trabajadora social, (1) tecnico SISO, (1) Biologo, (1) Director de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) Especialista Ambiental de Interventoria, (1) Especialista hidraulico de Interventoria, (1) trabajador social de Interventoria, (3) operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) Maestro de obra. **Equipo:** Computador portatil de obra e Interventoria, vehiculo de obra e Interventoria, Equipo de topografia (3) Excavadoras (9) volquetas, (1) GPS.

F.H.F.C.E.

Phu

Martes, 1 de octubre 2024: Clima: Se inicio el día nublado - con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizan actividades de cierre de Actas de vecindad, se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se continua con la construcción de muro en geocontenedor, con la instalación de 4 geocontenedores en el tercer nivel, 3 geocontenedores en el cuarto nivel, 2 geocontenedores en el quinto nivel y 2 geocontenedores en el sexto nivel. Se realiza cargue retro y disposición final del material proveniente de la excavación (52 viajes). Se realiza jornada de sensibilización Ambiental, con la comunidad. Se realizan Actividades de limpieza manual de vegetación. **Personal:** (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (9) conductores de volquetes, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. **Equipo:** computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (9) volquetes, (1) GPS.

Miércoles, 2 de Octubre 2024: Clima: Se inicio el día soleado - seco sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecindad, se realizaron charlas SST. Se realizaron actividades de rescate de fauna silvestre. Se continua con la construcción de muro en geocontenedor, con la instalación de 6 geocontenedores en el primer nivel, 3 geocontenedores en el segundo nivel, 1 geocontenedor en el cuarto nivel, 1 geocontenedor en el quinto nivel y 2 geocontenedores en el sexto nivel. Se realiza cargue retro y disposición final del material proveniente de la excavación (54 viajes). Se realiza jornada de sensibilización con la comunidad, se realizaron Actividades de limpieza manual de vegetación.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo,

(1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador social de Interventoría, (3) operadores (1) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. **Equipo:** Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (9) volquetas, (1) GPS.

[Firma] *[Firma]*

Jueves, 3 de octubre 2024: clima: Se inicio el día soleado, seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron Actividades de cierre de Actos de veandad. Se realizaron charlas SST. Se realizaron Actividades de rescate de Fauna silvestre. Se continuó con la construcción de muro en gecontenedor, con la instalación de 1 gecontenedor en el segundo nivel, 2 gecontenedores en el tercer nivel, 1 gecontenedor en el cuarto nivel, 1 gecontenedor en el quinto nivel y 1 gecontenedor en el sexto nivel. se realizó jornada de sensibilización Ambiental con la comunidad. se realizaron actividades de limpieza manual de vegetación.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) ayudantes de obra, (1) maestro de obra. **Equipo:** Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (1) GPS.

[Firma] *[Firma]*

Viernes, 4 de octubre 2024: clima: se inicio el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de cierre de actos de veandad. Se realizaron charlas SST. Se realizaron Actividades de rescate de Fauna silvestre. Se realiza cargue, refo y disposición final del material proveniente de excavaciones (62 vigas)

Se realizó jornada de sensibilización con la comunidad

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (9) volquetas, (1) GPS.

Sábado, 5 de octubre 2024: clima: Se inició el día soleado - Seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan Actividades de cierre de actas de veracidad. Se realizaron Actividades de recorte de fauna silvestre. Se realiza el cargue, retro y disposición final del material proveniente de la excavación (63 viajes). Se realizó jornada de sensibilización ambiental con la comunidad.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (9) conductores de volquetas, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (9) volquetas (1) GPS.

Domingo, 6 de octubre 2024: No se realizaron Actividades

Semana No. 30 (7 de octubre de 2024 - 13 de octubre de 2024).

Lunes, 7 de octubre 2024: Clima: Se inicio el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecondad. Se realizaron charlas SST. Se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 1 geocontenedor en el primer nivel, 2 geocontenedores en el segundo nivel, 3 geocontenedores en el tercer nivel y 4 geocontenedores en el cuarto nivel.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador Social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, trabajador Social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (9) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Martes, 8 de octubre 2024: Clima: Se inicio el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan Actividades de cierre de Actas de vecondad. Se realizan charlas SST. Se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Se continua con la construcción del muro en geocontenedor con la instalación de 2 geocontenedores en el cuarto nivel y 2 geocontenedores en el quinto nivel. Personal:

(1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador Social, (1) técnico SISO, Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador Social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (8) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría. Equipo de topografía, (3) excavadoras

(1) GPS

Miércoles, 9 de Octubre 2024: Clima: Día soleado - seco sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecindad. Se realizaron charlas SST. Se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (8) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Jueves, 10 de Octubre 2024: Clima: Día soleado, seco, sin precipitaciones. Actividades Se realiza cierre de Actas de vecindad, se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Se realizan Actividades de limpieza manual de vegetación. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Viernes, 11 de octubre 2024: clima: Se inicio el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizaron charlas SST. Se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Se realizan actividades de limpieza manual de vegetación. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista hidráulico de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (1) GPS

L.H.J.C.E.

Quito

Sábado, 12 de octubre 2024: clima: Se inicio día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (1) GPS.

L.H.J.C.E.

Quito

Domingo 13 de Octubre 2024: clima: No se realizaron Actividades.

L.H.J.C.E.

Quito

Semana No. 31 (14 de octubre de 2024 - 20 octubre de 2024).

Lunes, 14 de octubre 2024: Clima: Se inicio el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de veeduría. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre se realizan actividades de limpieza manual de vegetación. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) Veterinario, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Martes, 15 de octubre 2024: Clima: Se inicio el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de veeduría. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se realiza jornada de sensibilización Ambiental con la comunidad. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (1) GPS.

Miércoles, 16 de Octubre 2024: clima: Se Inicio el día Soleado, seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan Actividades de cierre de Actas de vecindad. Se realizaron charlas SST. se realizan Actividades de rescate de fauna silvestre. se realiza jornada de sensibilización ambiental con la comunidad.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) Operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Jueves 17 de octubre 2024: clima: Se Inicio el día Soleado, seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se realiza jornada de sensibilización ambiental con la comunidad. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadoras, (1) GPS.

Viernes 18 de octubre 2024: Clima: Se inicio el dia soleado seco - sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se continua con la construccion del muro en geocontenedor, con la instalacion de 1 geocontenedor en el tercer nivel, 1 geocontenedor en el cuarto nivel, 2 geocontenedores en el quinto nivel y 4 geocontenedores en el sexto nivel. Se realizo jornada de sensibilizacion ambiental con la comunidad.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) director de obra, (1) residente de obra, (1) Especialista Hidraulico de obra, (1) comision topografica, (1) trabajador social, (1) tecnico SISO, (1) Biologo, (1) director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) Especialista Ambiental de Interventoria, (1) Especialista hidraulico de Interventoria, (1) trabajador social de Interventoria, (3) operadores, (1) Veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra, **Equipo:** computador portatil de obra e Interventoria, vehiculo de obra e Interventoria, Equipo de topografia, (3) Excavadoras, (1) 6 PS.

Sabado, 19 de octubre 2024: Clima: Se inicio el dia soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron Actividades de cierre de Actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se continua con la construccion del muro en geo contenedor con la instalacion de 7 Geocontenedores en el primer nivel. Se realizo jornada de sensibilizacion Ambiental con la comunidad.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidraulico de obra, (1) comision topografica, (1) trabajador social, (1) tecnico SISO, (1) Biologo, (1) director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) Especialista Ambiental de Interventoria, (1) Especialista Hidraulico de Interventoria, (1) trabajador Social de Interventoria, (3) operadores, (1) Veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra,

(1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras (1) GPS.

Domingo, 20 de octubre 2024: Clima: No se realizaron Actividades.

Semana No. 32 (21 octubre de 2024 - 27 octubre de 2024).

Lunes, 21 de octubre de 2024: Clima: Se inició el día soleado, seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades de cierre de acta de veracidad. Se realizan actividades de rescate de fauna silvestre. Se continúa con la construcción del muro en geocontenedores, con la instalación de 2 geocontenedores en el primer nivel, 6 geocontenedores en el segundo nivel, 2 geocontenedores en el tercer nivel y 2 geocontenedores en el cuarto nivel.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión Topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) Maestro de obra.

Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Martes 22 de octubre 2024: Clima: Se presentaron fuertes lluvias en el transcurso del día - Humedo, con precipitaciones.

Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de veracidad, se realizaron charlas SST. Se realizan Actividades de rescate de fauna silvestre. Se continúa con la construcción

del muro en geocontenedor con la instalación de 1 geocontenedor en el primer nivel, 1 geocontenedor en el segundo nivel, 6 geocontenedores en el tercer nivel, 4 geocontenedores en el cuarto nivel y 4 geocontenedor en el quinto nivel. Se realizó jornada de sensibilización Ambiental con la comunidad. Se realizó comité en campo entre el personal de obra e Interventoría. Se realizan actividades de limpieza manual de vegetación. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra, Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras (1) GPS.

Miércoles 23 de octubre 2024: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan Actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizaron charlas SST, se realizan actividades de rescate de Fauna silvestre. Se continúa con la construcción del muro en geo contenedor con la instalación de 3 geocontenedores en el cuarto nivel, 4 geocontenedores en el quinto nivel y 5 geocontenedores en el sexto nivel. Se realizó jornada de Sensibilización ambiental con la comunidad. Se realizan Actividades de limpieza manual de vegetación.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión topográfica, (1) trabajador social, 1 técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental

de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría,
 (1) trabajador social de Interventoría, (3) Operadores, (1) veterinario,
 (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra,
 Equipo: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo
 de obra e Interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadoras
 (1) GPS.

f. H. J. C. E.

Quito

Jueves 24 de Octubre 2024: Clima: Se inició el día soleado
 seco - Sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron Actividades
 de cierre de actas de veracidad. Se realizan actividades de
 rescate de Fauna silvestre, Se realizó jornada de sensibilización
 Ambiental con la comunidad. Se realizan actividades de limpieza
 manual de vegetación. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra,
 (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra,
 (1) coronel topógrafo, (1) trabajador social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo,
 (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de
 Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista
 Hidráulico de Interventoría, (1) trabajador social de Interventoría,
 (3) Operadores, (1) Veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra,
 (1) maestro de obra. Equipo: Computador portátil de obra e
 Interventoría, vehículo de obra e Interventoría, Equipo de
 topografía, (3) Excavadoras (1) GPS.

f. H. J. C. E.

Quito

Viernes 25 de octubre 2024: Clima: Se inició el día soleado
 - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan Actividades de
 cierre de Actas de veracidad. Se realizaron charlas SST. Se realizan
 actividades de rescate de Fauna silvestre. Se realizó jornada de
 sensibilización ambiental con la comunidad. Se realizó actividad
 de limpieza manual de vegetación. Se realizó comité en campo
 con especialista hidráulico en obra y adicionalmente, se realizó
 recorrido, entre el supervisor de la entidad contratante
 contratista de obra e Interventoría.

Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidraulico de obra, (1) comision topografica, (1) trabajador social, tecnico SISO, (1) Biologo, (1) Director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) Especialista Ambiental de Interventoria, (1) Especialista Hidraulico de Interventoria, (1) trabajador social de Interventoria, (3) operadores, (1) veterinario, (1) vigilante, (7) Ayudantes de obra, (1) Maestro de obra, Equipo: Computador portatil de obra e Interventoria, Vehiculo de obra e Interventoria, Equipo de topografia, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Sabado, 26 de octubre 2024: Clima: Se inicio el dia nublado - con precipitaciones leves. Actividades: Se realizan actividades de cierre de actas de vecindad. Se realizan actividades de rescate de faunas silvestre. Personal: (1) conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) comision topografica, (1) trabajador social, (1) tecnico SISO, (1) Biologo, (1) Director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) conductor de Interventoria, (1) trabajador social de Interventoria, (3) operadores, (1) vigilante, (1) veterinario, (7) Ayudantes de obra, (1) maestro de obra. Equipo: Computador portatil de obra e Interventoria, Vehiculo de obra e Interventoria, Equipo de topografia, (3) Excavadoras, (1) GPS.

Domingo 27 de Octubre 2024: Se realizo jornada de Sensibilización Ambiental con la comunidad - No se realizaron Actividades en obra.

	<div>ANEXO</div> <div>PERSONAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CONSORCIO ICASM2023.</div> <div>NIT: 901.782.970-2</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ENTIDAD EJECUTORA: <u>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MES DEL INFORME: <u>8</u> CONTRATO DE OBRA No. <u>LP 006 DE 2023</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO ICASM2023</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROYECTO: <div>INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE SUS CONDICIONES HIDRAULICAS Y AMBIENTALES.</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>CM 007 DE 2023</u> INTERVENTOR: <u>INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="3">NOMBRE</th><th rowspan="3">CARGO</th><th colspan="10">sep-24</th><th colspan="15">oct-24</th></tr><tr><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th></tr><tr><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th></tr><tr><td>ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO</td><td>Profesional SST</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA</td><td>Director de obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR</td><td>Residente de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ROSA ELVIRA VILLAMIZAR</td><td>Especialista Ambiental</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>DANILO GREGORIO ROGRIGUEZ CORREA</td><td>Especialista Hidraulico</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ</td><td>Trabajador Social</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO</td><td>Ing. Topografo</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>SANTIAGO JOSE OSPINO URUENA</td><td>Coordinador de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>CINDY RODRIGUEZ MEDINA</td><td>Ingeniero Ambiental</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DAXY NIZAYEN AGUAS BELENO</td><td>Ingeniero Ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO</td><td>Técnico SST</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ANDRES FELIPE PONTON ALBOR</td><td>Biologo</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO</td><td>Veterinario</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>LEONARDO RAFAEL NOGUERA CONSUEGRA</td><td>Topografo</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JOSE FELIPE VENECIA MONTENEGRO</td><td>Ayudante de topografia</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>RAFAEL EDUARDO PACHECO DE LEON</td><td>Inspector de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>DEISY ANDREA GIRALDO GIRALDO</td><td>Aux Trabajador Social</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>BELIZARIO ANTONIO BORNACELLY MARRIAGA</td><td>Inspector de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>YEISON ATENCIO BARRIOS</td><td>Oficial de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ</td><td>Oficial de Obra</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JOSE JORGE LINERO MACIAS</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EDGAR ENRIQUE RIVERA JULIO</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JHON MARTIN RUDAS TORRES</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JUAN JOSE CERVANTES ROMERO</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>GUSTAVO DANIEL HERNANDEZ MELENDEZ</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>RICARDO JOSE GUAL ALMARALES</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>RONALD ALBERTO MENDOZA RIVERA</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>SERGIO RAFAEL GRANADOS MORENOS</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>UBALDO ANTONIO GAVIRIA LEGUIA</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>ELBER ANTONIO CAMARGO ECHEVERRIA</td><td>Ayudante</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERA</td><td>Operador de Maquinaria</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>JOSUE ELI SAN JUAN REYES</td><td>Operador de Maquinaria</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>HAIDER URIELES CARRILLO</td><td>Operador de Maquinaria</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ</td><td>Conductor</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>EUGENIO ANDRES NINO ANGARITA</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ABIMELEC FLORES QUINTERO</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WILBER ENRIQUE OROZCO FLOREZ</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMERIS DE JESUS BERRIO RIVERA</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MANUEL ELIECER AVILA DE LA HOZ</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>HERNEY DEL CARMEN RUMBO MARTINEZ</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NORMAN ALBERTO SIERRA GARCIA</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FREDY ALBERTO MARRIAGA RADA</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MIGUEL ANTONIO CONTRERAS OSORIO</td><td>Conductor Volqueta</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			NOMBRE	CARGO	sep-24										oct-24															J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR	Residente de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ROSA ELVIRA VILLAMIZAR	Especialista Ambiental	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	DANILO GREGORIO ROGRIGUEZ CORREA	Especialista Hidraulico	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ	Trabajador Social	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	SANTIAGO JOSE OSPINO URUENA	Coordinador de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CINDY RODRIGUEZ MEDINA	Ingeniero Ambiental	X	X	X		X																								DAXY NIZAYEN AGUAS BELENO	Ingeniero Ambiental						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO	Técnico SST	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ANDRES FELIPE PONTON ALBOR	Biologo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO	Veterinario	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	LEONARDO RAFAEL NOGUERA CONSUEGRA	Topografo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JOSE FELIPE VENECIA MONTENEGRO	Ayudante de topografia	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	RAFAEL EDUARDO PACHECO DE LEON	Inspector de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	DEISY ANDREA GIRALDO GIRALDO	Aux Trabajador Social	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	BELIZARIO ANTONIO BORNACELLY MARRIAGA	Inspector de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	YEISON ATENCIO BARRIOS	Oficial de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ	Oficial de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JOSE JORGE LINERO MACIAS	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X																		EDGAR ENRIQUE RIVERA JULIO	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JHON MARTIN RUDAS TORRES	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JUAN JOSE CERVANTES ROMERO	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	GUSTAVO DANIEL HERNANDEZ MELENDEZ	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	RICARDO JOSE GUAL ALMARALES	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	RONALD ALBERTO MENDOZA RIVERA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	SERGIO RAFAEL GRANADOS MORENOS	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	UBALDO ANTONIO GAVIRIA LEGUIA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	ELBER ANTONIO CAMARGO ECHEVERRIA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERA	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JOSUE ELI SAN JUAN REYES	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	HAIDER URIELES CARRILLO	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ	Conductor	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	EUGENIO ANDRES NINO ANGARITA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				ABIMELEC FLORES QUINTERO	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				WILBER ENRIQUE OROZCO FLOREZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				EMERIS DE JESUS BERRIO RIVERA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				MANUEL ELIECER AVILA DE LA HOZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				HERNEY DEL CARMEN RUMBO MARTINEZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				NORMAN ALBERTO SIERRA GARCIA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				FREDY ALBERTO MARRIAGA RADA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																				MIGUEL ANTONIO CONTRERAS OSORIO	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																			
NOMBRE	CARGO	sep-24										oct-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		J			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR	Residente de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR	Especialista Ambiental	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DANILO GREGORIO ROGRIGUEZ CORREA	Especialista Hidraulico	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ	Trabajador Social	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SANTIAGO JOSE OSPINO URUENA	Coordinador de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CINDY RODRIGUEZ MEDINA	Ingeniero Ambiental	X	X	X		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DAXY NIZAYEN AGUAS BELENO	Ingeniero Ambiental						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO	Técnico SST	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANDRES FELIPE PONTON ALBOR	Biologo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO	Veterinario	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LEONARDO RAFAEL NOGUERA CONSUEGRA	Topografo	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JOSE FELIPE VENECIA MONTENEGRO	Ayudante de topografia	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RAFAEL EDUARDO PACHECO DE LEON	Inspector de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEISY ANDREA GIRALDO GIRALDO	Aux Trabajador Social	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BELIZARIO ANTONIO BORNACELLY MARRIAGA	Inspector de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
YEISON ATENCIO BARRIOS	Oficial de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ	Oficial de Obra	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JOSE JORGE LINERO MACIAS	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EDGAR ENRIQUE RIVERA JULIO	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JHON MARTIN RUDAS TORRES	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JUAN JOSE CERVANTES ROMERO	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GUSTAVO DANIEL HERNANDEZ MELENDEZ	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RICARDO JOSE GUAL ALMARALES	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RONALD ALBERTO MENDOZA RIVERA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SERGIO RAFAEL GRANADOS MORENOS	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UBALDO ANTONIO GAVIRIA LEGUIA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ELBER ANTONIO CAMARGO ECHEVERRIA	Ayudante	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERA	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
JOSUE ELI SAN JUAN REYES	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
HAIDER URIELES CARRILLO	Operador de Maquinaria	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ	Conductor	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EUGENIO ANDRES NINO ANGARITA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ABIMELEC FLORES QUINTERO	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
WILBER ENRIQUE OROZCO FLOREZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMERIS DE JESUS BERRIO RIVERA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MANUEL ELIECER AVILA DE LA HOZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
HERNEY DEL CARMEN RUMBO MARTINEZ	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NORMAN ALBERTO SIERRA GARCIA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FREDY ALBERTO MARRIAGA RADA	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MIGUEL ANTONIO CONTRERAS OSORIO	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<div><div>Firma </div><div>Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR Residente de Obra T.P. 08202-242612 ATL</div></div> <div><div>Firma </div><div>Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA Residente de Interventoria Matricula No.: 08202-181155 ATL</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



ANEXO - ESTADO GENERAL DEL TIEMPO



CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

FECHA 25 OCTUBRE 2024
(Día) (Mes) (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023 INFORME MENSUAL No. 8

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	sep-24					oct-24																												
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			Total	
Seco	23	24	24	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24			713	
Nublado / Llovizna				1	1	1												1									1						5	
Lluvia Fuerte	1																										1						2	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			720	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-242612 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL



ANEXO
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 8

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM 007 DE 2023 INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO	sep-24												oct-24												
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
EXCAVADORA R220LC-9S	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 1	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 2	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
GPS GNSS RTK	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
KNL-551	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-545	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-546	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-568	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-571	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-572	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
WLK-229	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-550	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
KNL-549	A	A	A		A	A	A	I	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: _____

CONVENCIONES: **ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.**

Firma
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO No.6
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL -
MES 8

DIRECTOR DE OBRA -
LUIS FERNANDO OCHOA
MARULANDA

Se certifica que LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S NI 806003450																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-10	2024-11	1049697765	9477023373	E	2024-11-14																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$7,194,000						\$1,151,100											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$7,194,000						\$36,000											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$7,194,000						\$36,000											
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	4.35%	\$7,194,000						\$313,000											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$7,194,000						\$287,800											
EPS		SANITAS		30	4%	\$7,194,000						\$287,800											

Este certificado se expide el día 2024-11-19 a las 08:03.

RESIDENTE DE OBRA –
JONATHAN ANTONIO CARO
ESCORBAR

Se certifica que JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR identificado(a) con CC 1129567184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1000000401	9477192886	E	2024-11-14																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,300,000						\$368,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,300,000						\$160,100										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,300,000						\$92,000										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,300,000						\$92,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 04:59.

**ESPECIALISTA AMBIENTAL –
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA**

Se certifica que ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA identificado(a) con CC 1082980516 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1088281146	9478241659	E	2024-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,000,000						\$320,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000						\$139,200										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,000,000						\$80,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,000,000						\$80,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 04:57.

ESPECIALISTA HIDRAULICO –
DANILO GREGORIO RODRIGUEZ
CORREA

PAGADO 18/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA		
Documento	CC85474247	Dirección	CL 20 #30 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4203020
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,CULTURAL HISTORICO	Departamento	MAGDALENA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	UAP	UAT	UOT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 85474247	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA	57	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 1.200	\$ 378.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

INGENIERO TOPOGRAFO –
ANGELA MARIA FERNANDEZ
FAJARDO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52934912	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO		CALL 163 59a-10 torre 1 apto 1305	3064561	AMAFEFA07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-10	2024-10	I	23/10/2024	81171283	TOTAL A PAGAR \$377.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	23/10/2024	81171283	\$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Cotom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	VS	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clases de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52934912	FERNANDEZ FAJARDO ANGELA MARIA	59	0			N																	231.001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

TRABAJADOR SOCIAL –
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ

Se certifica que ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ identificado(a) con CC 1082968730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970																				
Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
2024-10	2024-11	1000000401	9477192886	E	2024-11-14															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización									
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,300,000					\$208,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000					\$90,500									
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 04:58.

PROFESIONAL SST –
ANA MILAGRO MARENCO
CABALLERO

Se certifica que ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO identificado(a) con CC 1083009348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1088281146	9478241659	E	2024-12-02													L				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		5	16%	\$416,667						\$66,700										
AFP		PORVENIR		25	16%	\$2,083,334						\$333,400										
ARL		ARL SURA		5	0%	\$416,667						\$0										
ARL		ARL SURA		25	6.96%	\$2,083,334						\$145,100										
CCF		CAJAMAG		5	4%	\$416,667						\$16,700										
CCF		CAJAMAG		25	4%	\$2,083,334						\$83,400										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		5	4%	\$416,667						\$16,700										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		25	4%	\$2,083,334						\$83,400										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 04:55.

GERENTE DE PROYECTO –
EUGENIO JOSE PRADA DAZA

PAGADO 19/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA			
Documento	CC19145528	Dirección	CL 76 #54 - 11	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6692364	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		Departamento	ATLANTICO
Representante Legal			Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	AVP	VC	VC	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	59	02																		0	0	30	30	0		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 225.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400	\$ 1.900	\$ 236.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLAS ICASM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1000000401	9477192886	E	2024/11/20	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$9,677,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							\$30,703,337	\$4,912,900			\$32,203,337	\$1,288,500			\$32,504,864	\$1,300,500			\$32,203,337		\$2,175,800	\$0	\$0		\$9,677,700
Centro de Trabajo: Principal (24 Afiliados)																							\$30,703,337	\$4,912,900			\$32,203,337	\$1,288,500			\$32,504,864	\$1,300,500			\$32,203,337		\$2,175,800	\$0	\$0		\$9,677,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (24 Afiliados)																							\$30,703,337	\$4,912,900			\$32,203,337	\$1,288,500			\$32,504,864	\$1,300,500			\$32,203,337		\$2,175,800	\$0	\$0		\$9,677,700
1	CC 1051677523	AGUAS DAXY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
2	CC 1192808247	ATENCIO YEISON																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
3	CC 19588995	BORNACELLY BELIZARIO																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF33	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
4	CC 85457611	CAMARGO ELBER		X															X	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	CCFC55	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF33	25	\$1,168,195	\$46,800	14-11	25	\$1,083,334	6.960%	\$75,500	25	\$0	\$0	Si	\$339,100
5	CC 1129567184	CARO JONATHAN																		230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF33	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
6	CC 1004424744	CERVANTES DAYANA											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF33	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
7	CC 1004424744	CERVANTES DAYANA											X							230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF33	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
8	CC 1004424744	CERVANTES DAYANA																		230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS002	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF33	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	6.960%	\$75,500	25	\$0	\$0	Si	\$335,700
9	CC 1083018109	CERVANTES JUAN																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
10	CC 1083452974	GAVIRIA UBALDO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
11	CC 1082968730	GIRALDO ANDRES																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
12	CC 1020472827	GIRALDO DEISY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
13	CC 7601492	GRANADOS SERGIO		X															X	231001	25	\$1,083,334	\$173,400	ESSC07	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF33	25	\$1,200,695	\$48,100	14-11	25	\$1,083,334	6.960%	\$75,500	25	\$0	\$0	Si	\$340,400
14	CC 12618745	GUAL RICARDO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
15	CC 1004355782	HERNANDEZ GUSTAVO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
16	CC 1084792069	LINERO JOSE		X															X	230301	7	\$303,334	\$48,600	EP5037	7	\$303,334	\$12,200	CCF33	7	\$518,195	\$20,800	14-11	7	\$303,334	6.960%	\$21,200	7	\$0	\$0	Si	\$102,800
17	CC 1082875319	MENDOZA RONALD																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
18	CC 12626312	NOGUERA LEONARDO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
19	CC 1083019606	OSPINO SANTIAGO																		230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF33	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
20	CC 12542537	PACHECO RAFAEL																		0		\$0	\$0	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF33	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$224,400
21	CC 19597805	PADILLA JOSE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
22	CC 72247345	PERALTA ABDON																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
23	CC 1083003795	PONTON ANDRES																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF33	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
24	CC 7593881	RIVERA EDGAR																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
25	CC 1082858487	RUDAS JHON											X							25-14	2	\$86,667	\$13,900	ESSC07	2	\$86,667	\$3,500	CCF33	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
26	CC 1082858487	RUDAS JHON		X															X	25-14	8	\$346,667	\$55,500	ESSC07	8	\$346,667	\$13,900	CCF33	8	\$534,445	\$21,400	14-11	8	\$346,667	6.960%	\$24,200	8	\$0	\$0	Si	\$115,000
27	CC 1082986414	VENECIA JOSE													L					230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC24	15	\$650,000	\$26,000	CCF33	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$156,000
28	CC 1082986414	VENECIA JOSE																		230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC24	15	\$650,000	\$26,000	CCF33	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	6.960%	\$45,300	15	\$0	\$0	Si	\$201,300
Total Afiliados(24)																							\$30,703,337	\$4,912,900			\$32,203,337	\$1,288,500			\$32,504,864	\$1,300,500			\$32,203,337		\$2,175,800	\$0	\$0		\$9,677,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1000000401	9477192886	E	2024/11/20	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$9,677,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$4,912,900	\$0	\$0	\$4,912,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$381,400	\$0	\$0	\$381,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$485,400	\$0	\$0	\$485,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$3,422,100	\$0	\$0	\$3,422,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$2,175,800	\$0	\$0	\$2,175,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	\$2,175,800	\$0	\$0	\$2,175,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,300,500	\$0	\$0	\$1,300,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	24	\$1,300,500	\$0	\$0	\$1,300,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$1,288,500	\$0	\$0	\$1,288,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$147,400	\$0	\$0	\$147,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$164,800	\$0	\$0	\$164,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$112,100	\$0	\$0	\$112,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
TOTAL				24	\$9,677,700	\$0	\$0	\$9,677,700	

Se certifica que HAIDER FARID URIELES CARRILLO identificado(a) con CC 85372107 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22										X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$2,198,130						\$351,800										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,198,130						\$153,000										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,198,130						\$88,000										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$2,198,130						\$88,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:42.

Se certifica que JOSUE ELI SANJUAN REYES identificado(a) con CC 1082947445 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$2,054,587						\$328,800										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,054,587						\$143,000										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,054,587						\$82,200										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$2,054,587						\$82,200										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:42.

Se certifica que OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERAS identificado(a) con CC 1065574822 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,039,587						\$326,400											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,039,587						\$142,000											
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,039,587						\$81,600											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$2,039,587						\$81,600											

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:43.

Se certifica que ABIMELEC FLOREZ QUINTERO identificado(a) con CC 1066083536 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22											X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,213,334						\$194,200										
AFP		PORVENIR		2	12%	\$86,667						\$10,500										
ARL		ARL SURA		28	6.96%	\$1,213,334						\$84,500										
ARL		ARL SURA		2	0%	\$86,667						\$0										
CCF		COMFACESAR		28	4%	\$1,213,334						\$48,600										
CCF		COMFACESAR		2	0%	\$86,667						\$0										
EPS		CAJACOPI		28	4%	\$1,213,334						\$48,600										
EPS		CAJACOPI		2	0%	\$86,667						\$0										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:12.

Se certifica que EMERIS DE JESUS BERRIO RIVERA identificado(a) con CC 1128203831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000					\$90,500											
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:13.

Se certifica que EUGENIO ANDRES NIÑO ANGARITA identificado(a) con CC 1093741603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000					\$90,500											
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:06.

Se certifica que FREDY ALBERTO MARRIAGA RADA identificado(a) con CC 85460976 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																				
Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización									
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,300,000					\$208,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000					\$90,500									
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:16.

Se certifica que HERNEY DEL CARMEN RUMBO MARTINEZ identificado(a) con CC 77173471 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000						\$90,500										
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										
EPS		CAJACOPI		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:14.

Se certifica que MANUEL ELIECER AVILA DE LA HOZ identificado(a) con CC 85473036 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000						\$90,500										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										
EPS		EPS MUTUAL SER		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:14.

Se certifica que MIGUEL ANTONIO CONTRERAS OSORIO identificado(a) con CC 1081906657 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22	X													
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PROTECCION		16	16%	\$693,334				\$111,000									
ARL		ARL SURA		16	6.96%	\$693,334				\$48,300									
CCF		CAJAMAG		16	4%	\$693,334				\$27,800									
EPS		MUTUAL SER		16	4%	\$693,334				\$27,800									

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:17.

Se certifica que NORMAN ALBERTO SIERRA GARCIA identificado(a) con CC 91491681 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																				
Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización									
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,300,000					\$208,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000					\$90,500									
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000									

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:15.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 n0 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	42555309	9475930826	I	2024/11/06	2024/10/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	12552112	COTES GUSTAVO		0	\$0		EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	42555309	9475930826	I	2024/11/06	2024/10/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$162,500


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500

Se certifica que WILBER ENRIQUE OROZCO FLOREZ identificado(a) con CC 1128324300 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588


Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1068228461	9477196906	E	2024-11-22																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,300,000						\$90,500										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										

Este certificado se expide el día 2024-12-02 a las 05:09.

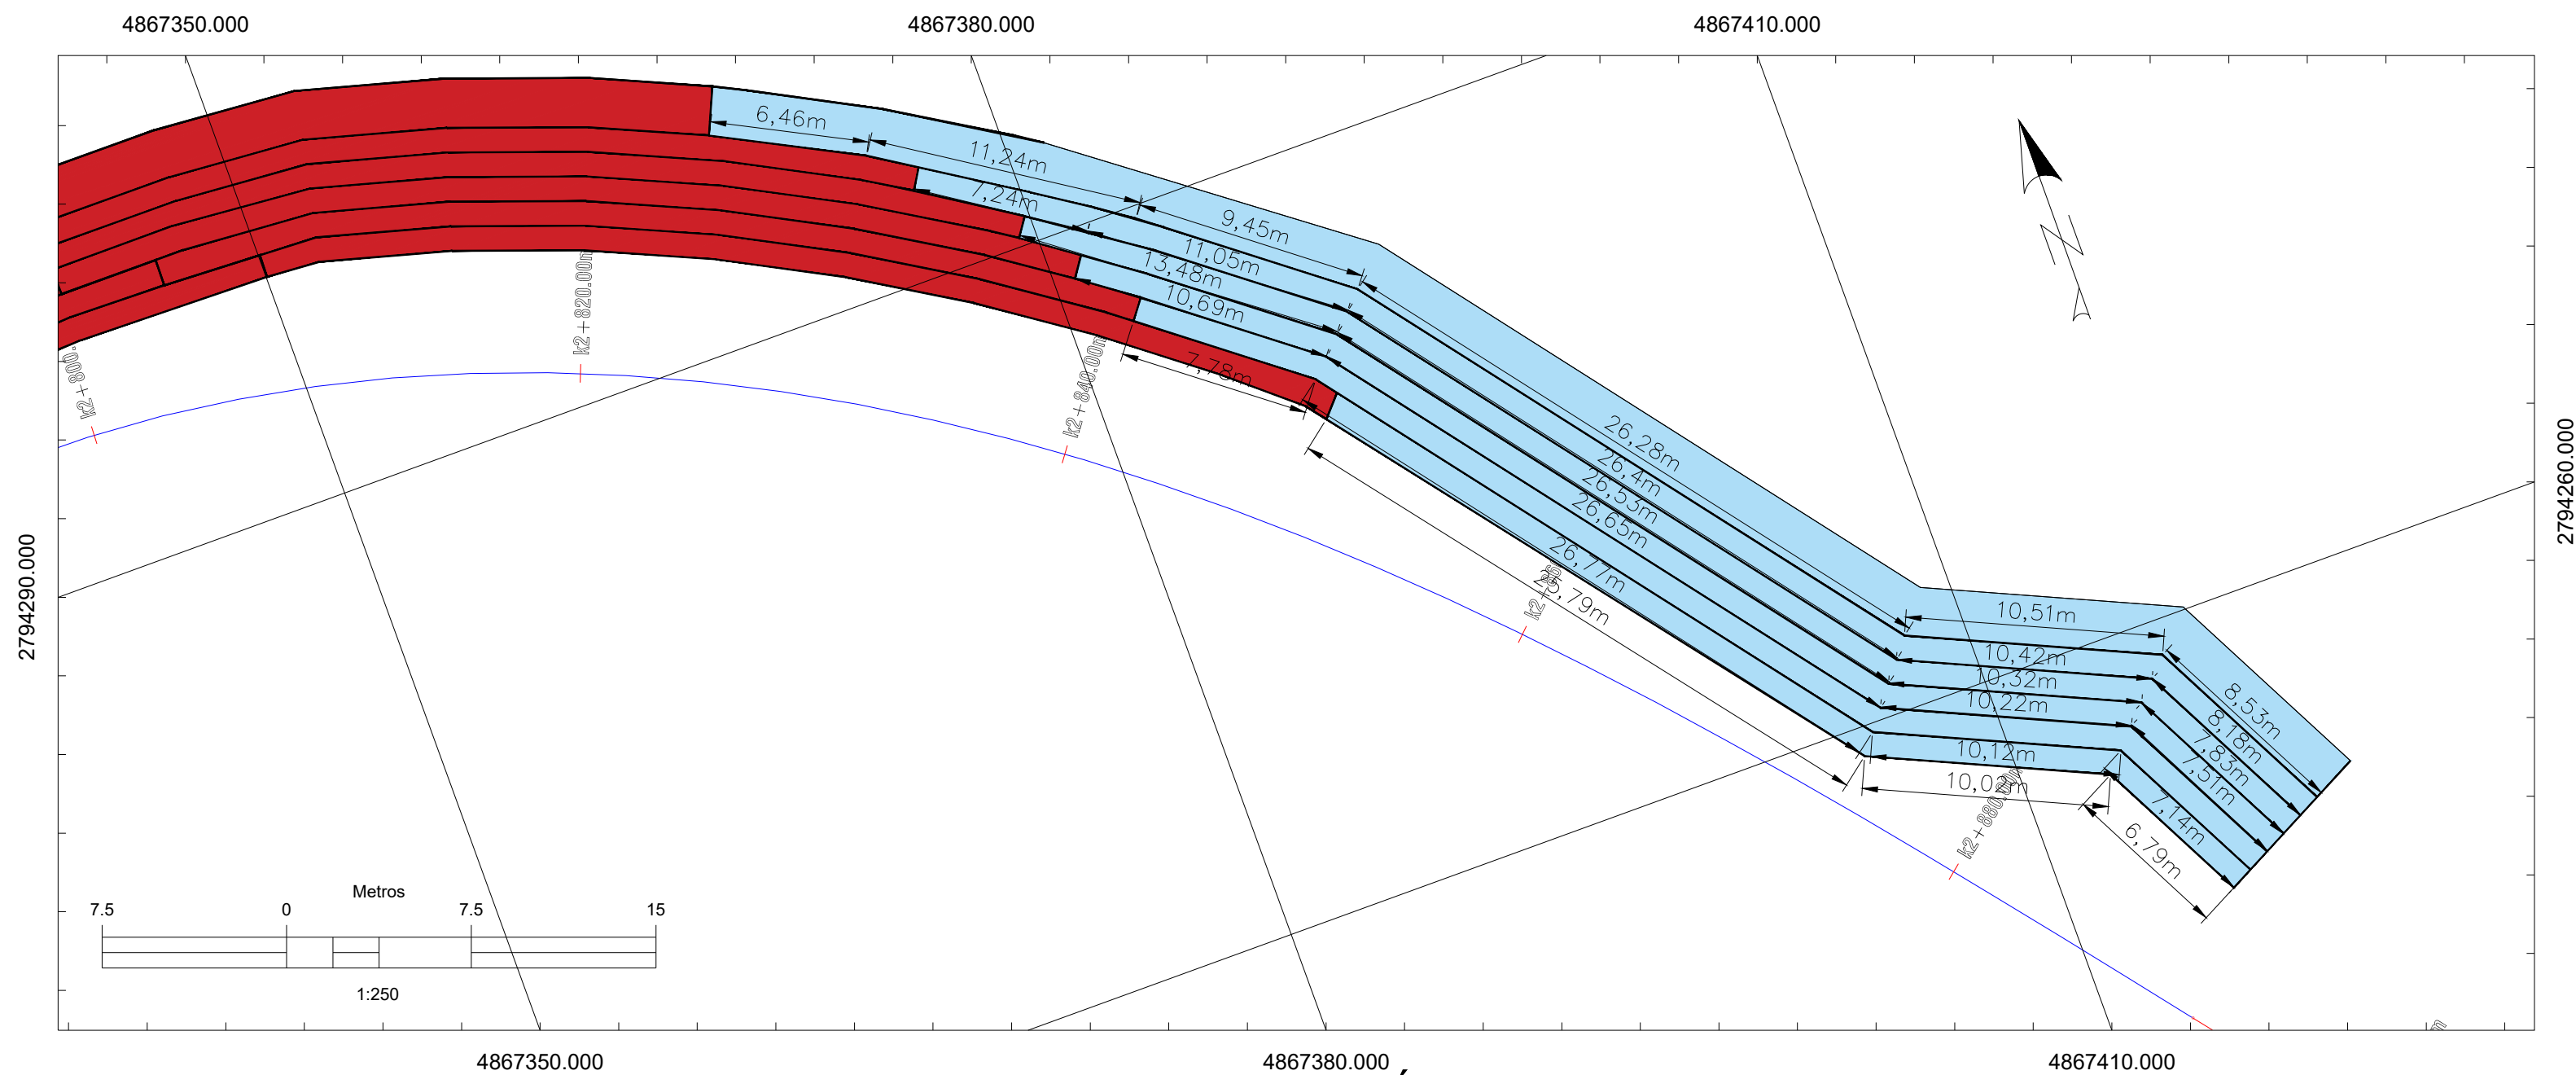

PLANTA GENERAL CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR

Nota: La altura de 1.45m de cada módulo de geocontenedor podrá variar después de su colocación teniendo en cuenta la deformación que se presentará después de retirar el sistema de formaletería.
Se estima que la altura definitiva de cada módulo sera aproximadamente 1.15m.

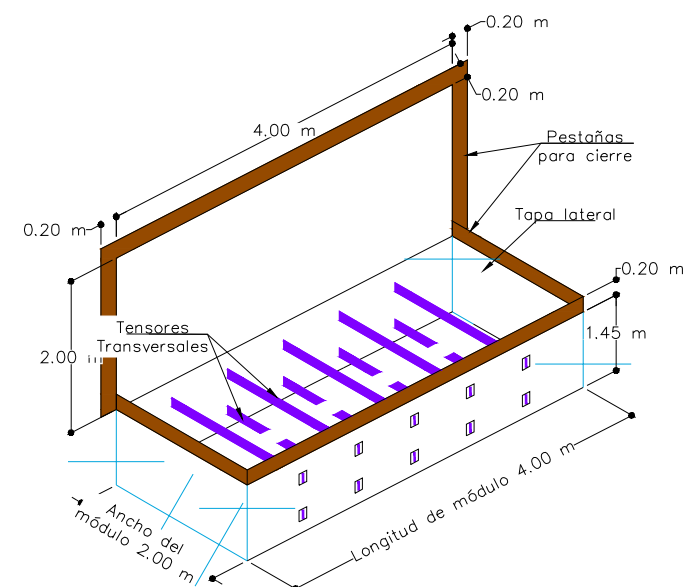

DETALLE 2. ISOMÉTRICO GEOCONTAINER 4.00X2.00X1.45M


Manto Antisacavación HYDROTEX 85
Funda para lastre llena con arena,
P = 2.00 m; L = 8.00 m

Recubrimiento de cara expuesta
en manto TERRATRAC TRM 50


Geocontainer 4.00x2.00x1.45m
H inicial=1.45m; H final=1.15m
en Hydrotex 150 (ver detalle 2)

Detalle 06: Sección 2+800 a 2+900


Trinchera de anclaje
(Ver detalle 1)

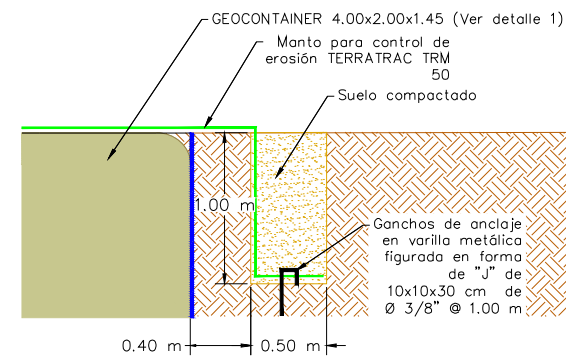

DETALLE 1. TRINCHERA DE ANCLAJE

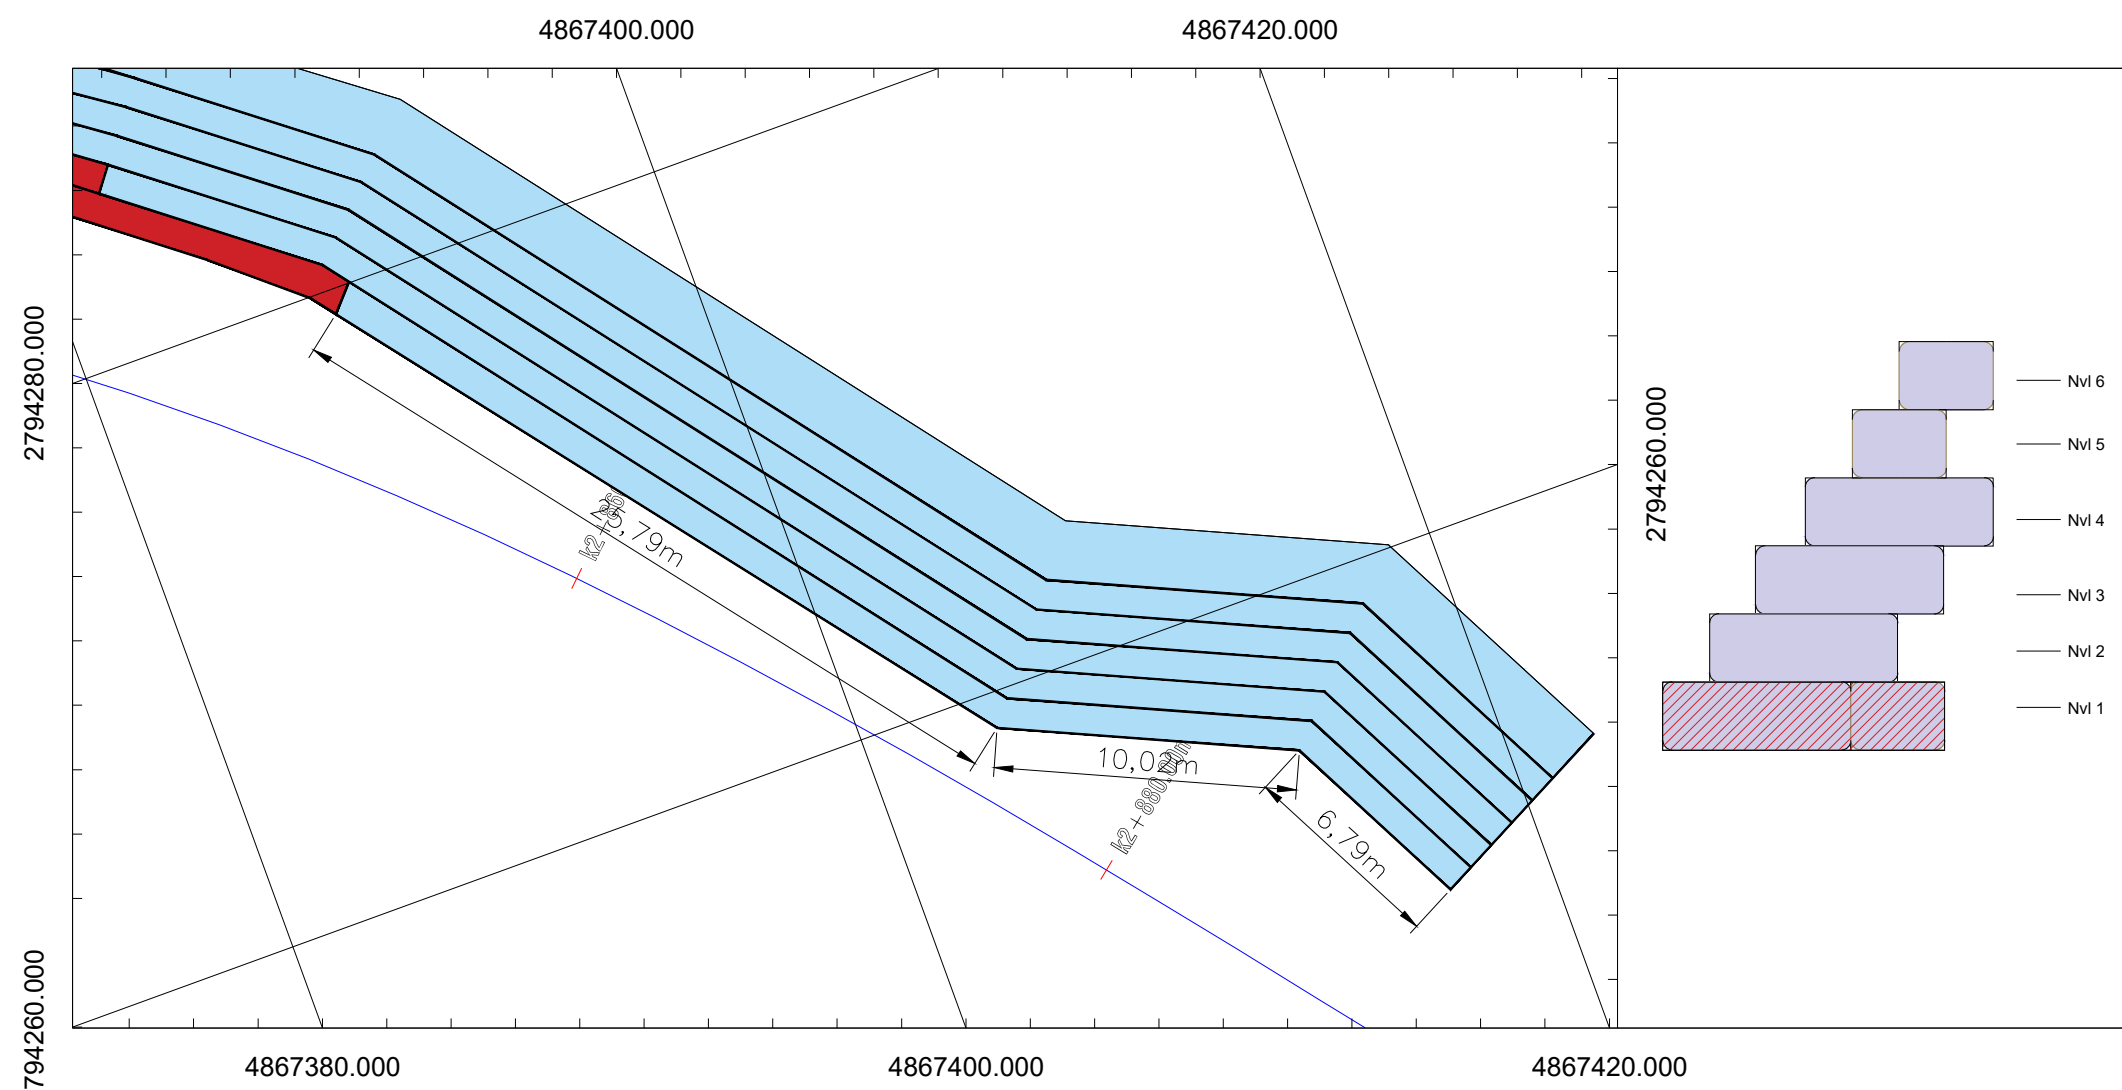

PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 01

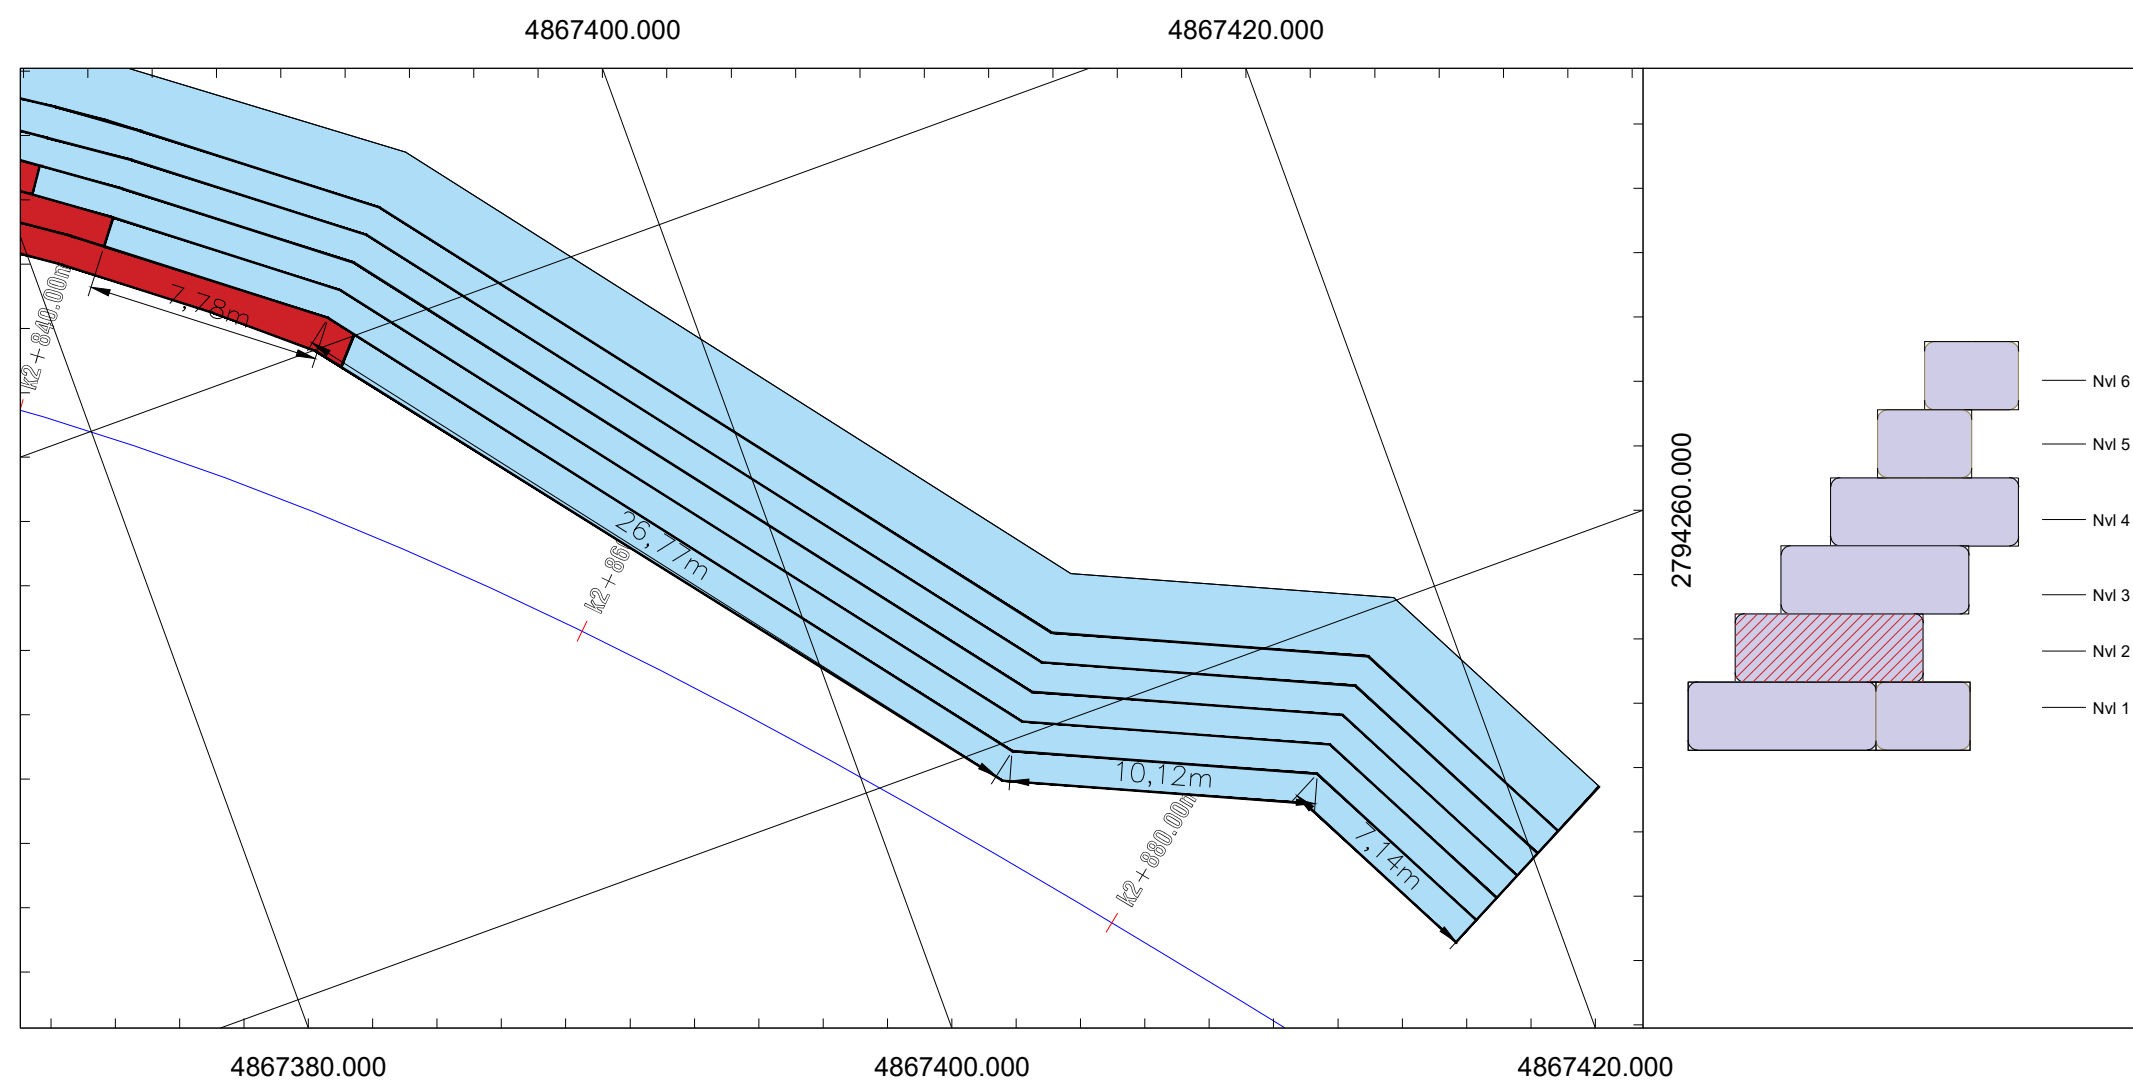

PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 02

ENTIDAD:



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL MAGDALENA

CONTRATISTA:

CONSORCIO ICASM2023

NIT: 901.782.970-2

CONTRATO DE OBRA No.: LP 006 DE 2023

INTERVENTOR:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 901.433.145-6

INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL PROYECTO:

INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS
CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTENIDO:

PL1 - GEOCONTENEDOR K2+800

LOCALIZACIÓN:

DISTRITO DE SANTA MARTA

Convenciones.

- EJE DEL TRAZADO
- DETALLES
- CURVA DE NIVEL PRINCIPAL (1.0 m)
- CURVA DE NIVEL SECUNDARIA (0.2 m)
- EJECUCIÓN
- DISEÑO
- TERRENO NATURAL

NOTAS:

- Levantamiento Topográfico realizado en el mes de marzo de 2024, referido al BM IGAC denominado NP70-N-5IGAC localizado en Santa Marta de coordenadas geodésicas en latitud Norte 11°11'13.52", Longitud Oeste 74°13'7.82", altura elipsoidal 4.699 metros en el marco de sistema cartográfico nacional MAGNA-SIRGAS, en proyección Transversa mercator, datum vertical Nivel Medio del Mar.
- Niveles en metros.
- Todas las dimensiones están dadas en metros.

FORMACION SOBRE CUADRICULA

ELIPSOIDE.....GRS80
CUADRICULA.....100 METROS
PROYECCIÓN.....TRANSV. DE MERCATOR
DATUM VERTICAL.....NIVEL MEDIO DEL MAR
DATUM.....MAGNA-SIRGAS-ORIGEN NACIONAL
HORIZONTAL.....NACIONAL
MERIDIANO CENTRAL 75°W.

MODIFICACIONES:

No - DD/MM/AAAA - MODIFICACIÓN

Levantamiento Topográfico:

Angela Fernandez Fajardo
T.P. 25335160128 GND

APROBO:

Luis Fernando Ochoa
T.P. 13202-33067 BLV

APROBO:

Ing. Francisco Fernandez
Rep. Ing. Interventores e Ingeniería S.A.S.

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE DE 2024

PLANO:

EJECUCIÓN


Plancha N°

1

De


2

Nota: La altura de 1.45m de cada módulo de geocontenedor podrá variar después de su colocación teniendo en cuenta la deformación que se presentará después de retirar el sistema de formaletería.
Se estima que la altura definitiva de cada módulo sera aproximadamente 1.15m.

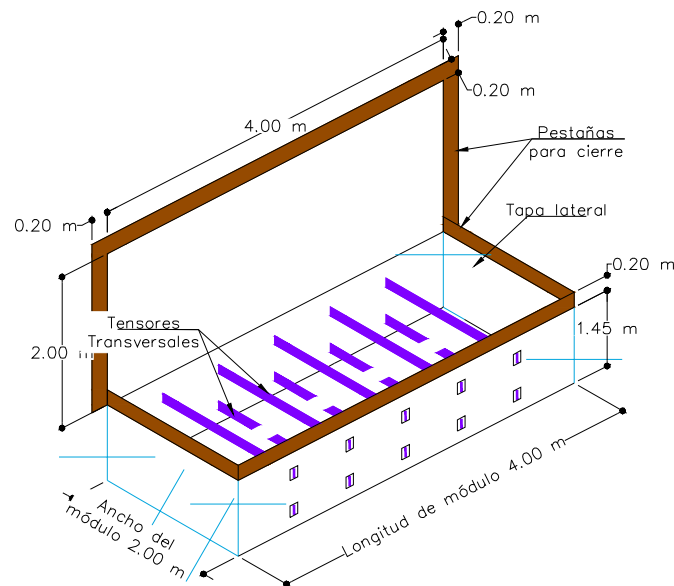


DETALLE 2. ISOMÉTRICO GEOCONTAINER 4.00X2.00X1.45M


Manto Antisocavación HYDROTEX 85
Funda para lastre llena con arena,
P = 2,00 m; L = 8,00 m

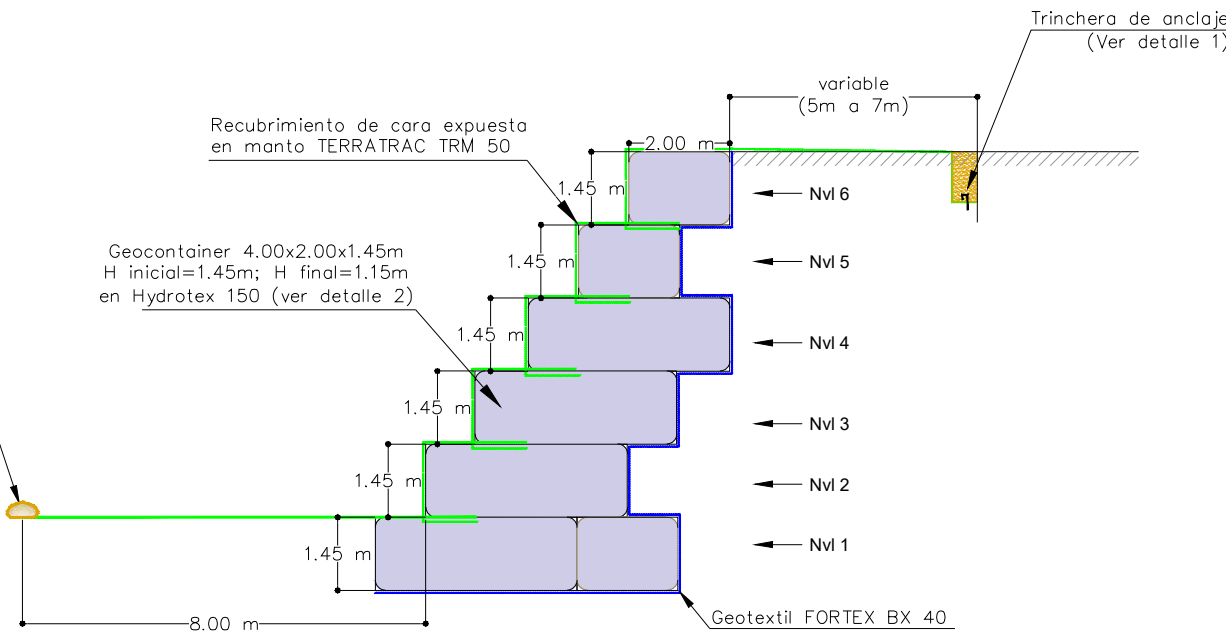


Detalle 06: Sección 2+800 a 2+900

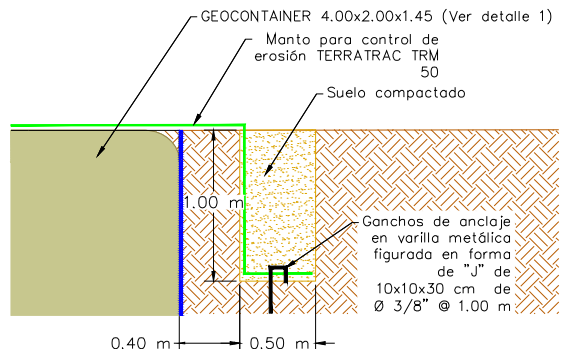


DETALLE 1. TRINCHERA DE ANCLAJE

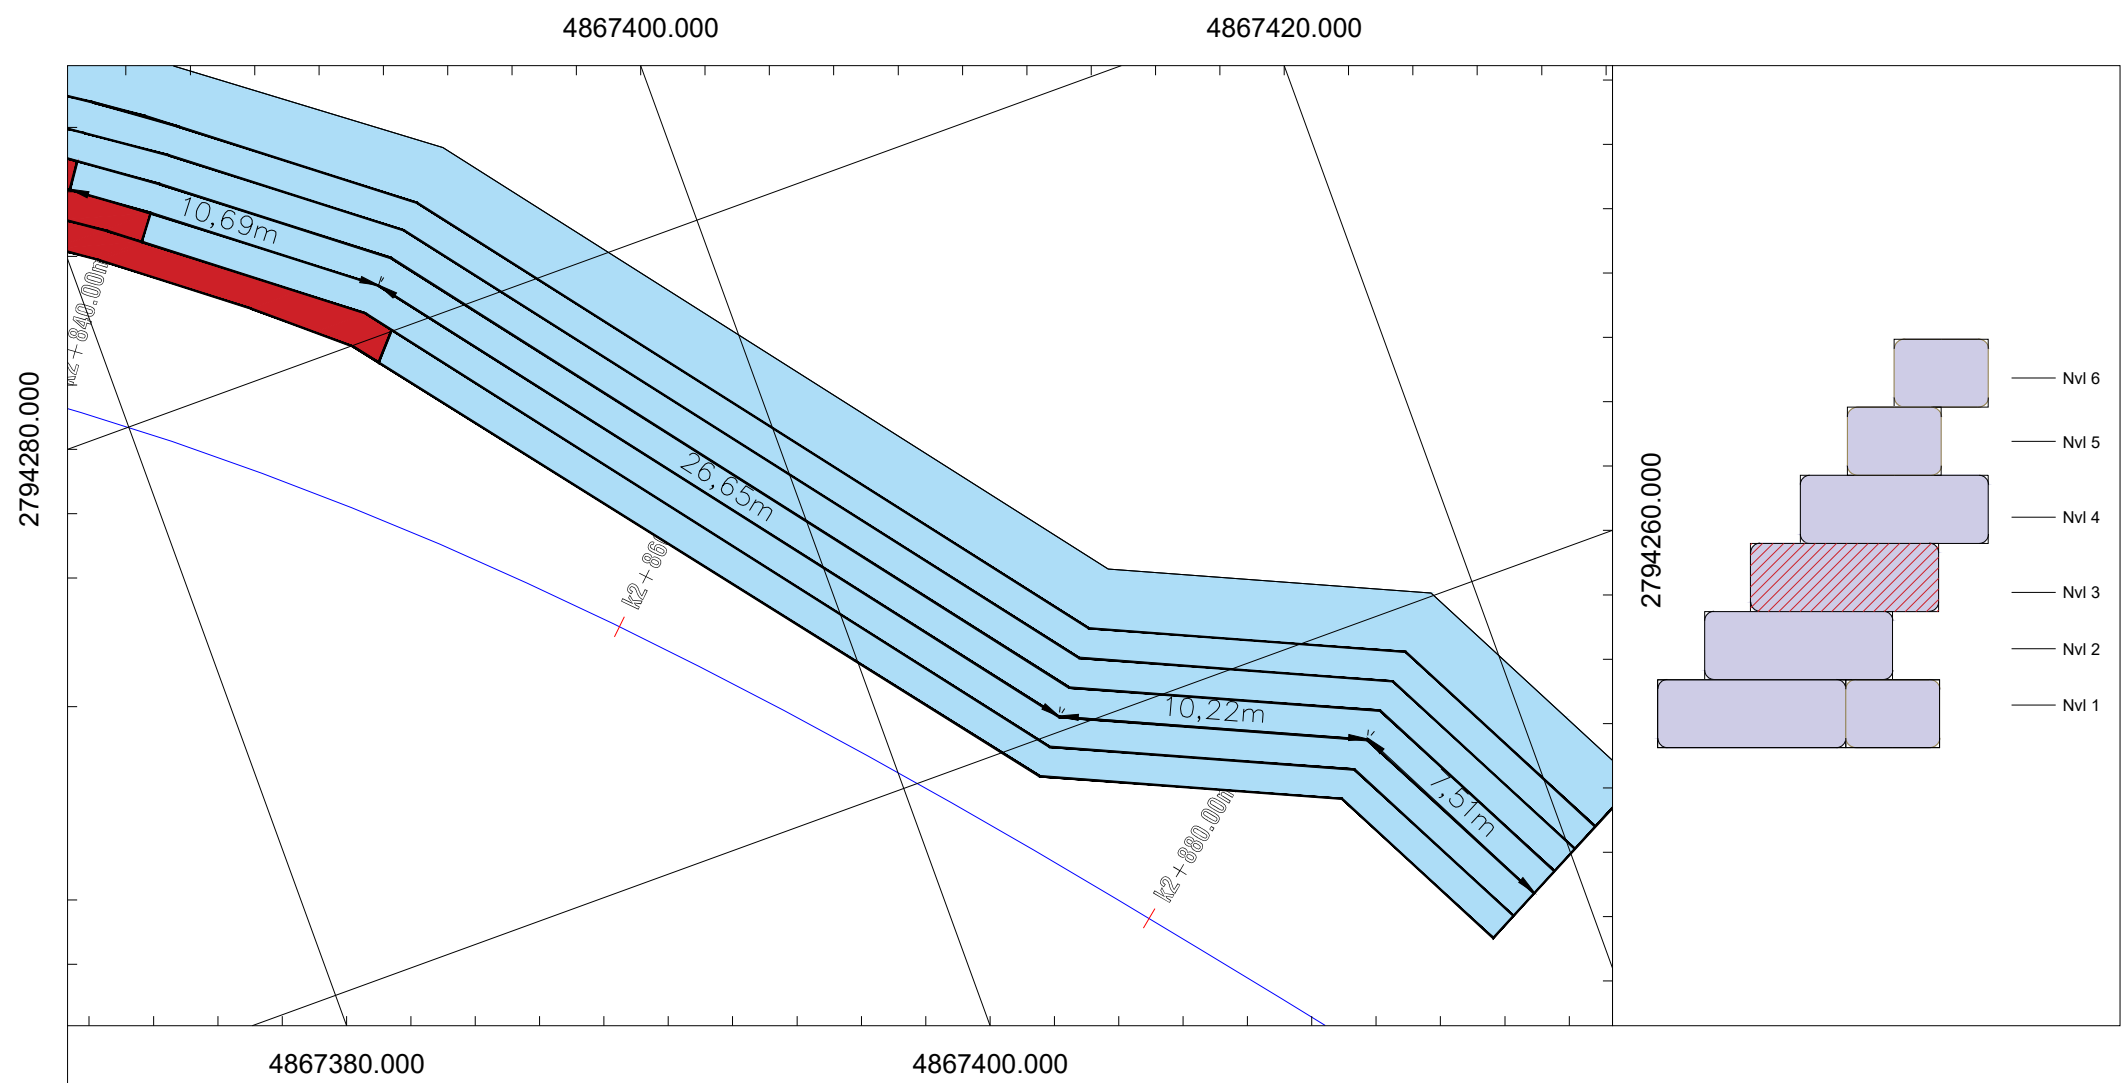


PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 03

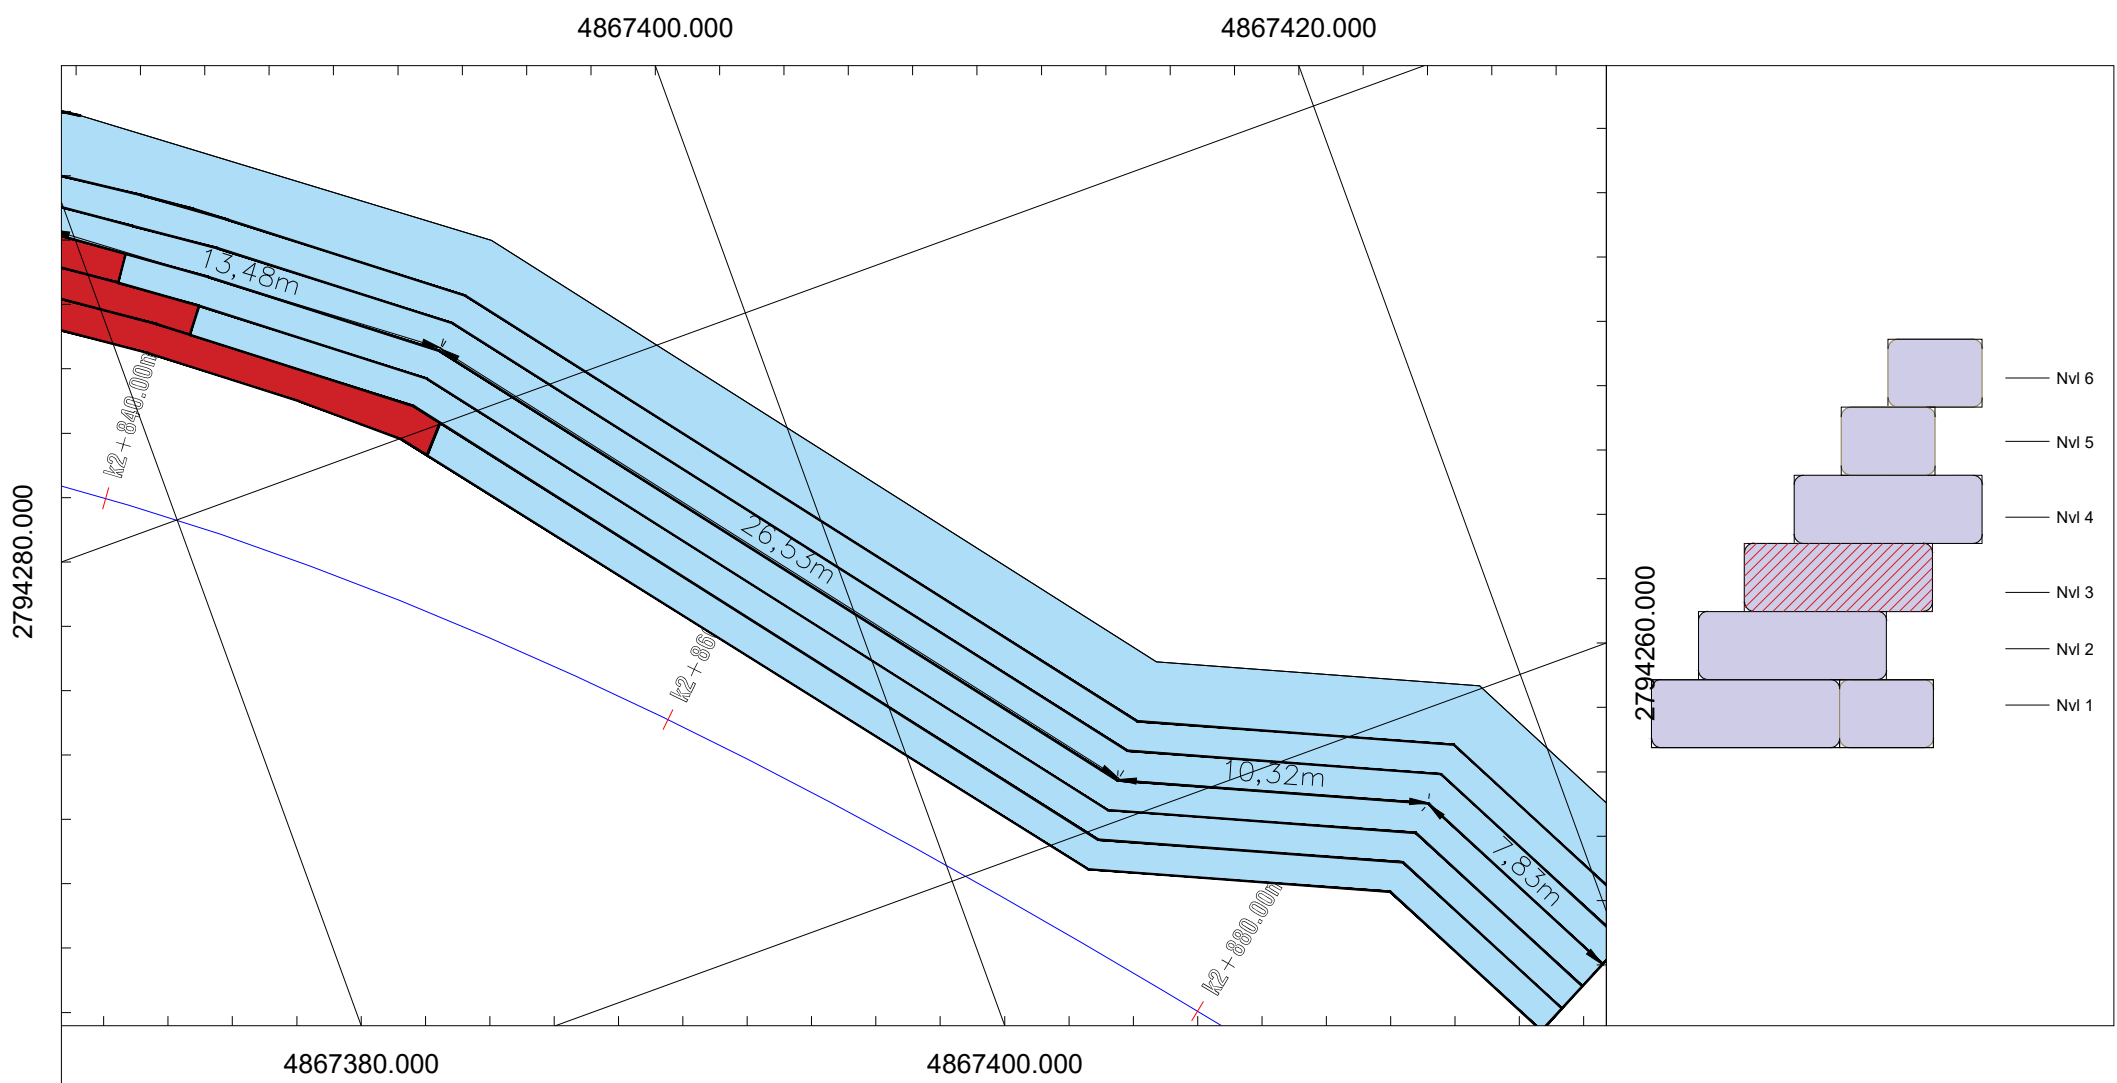

PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 04

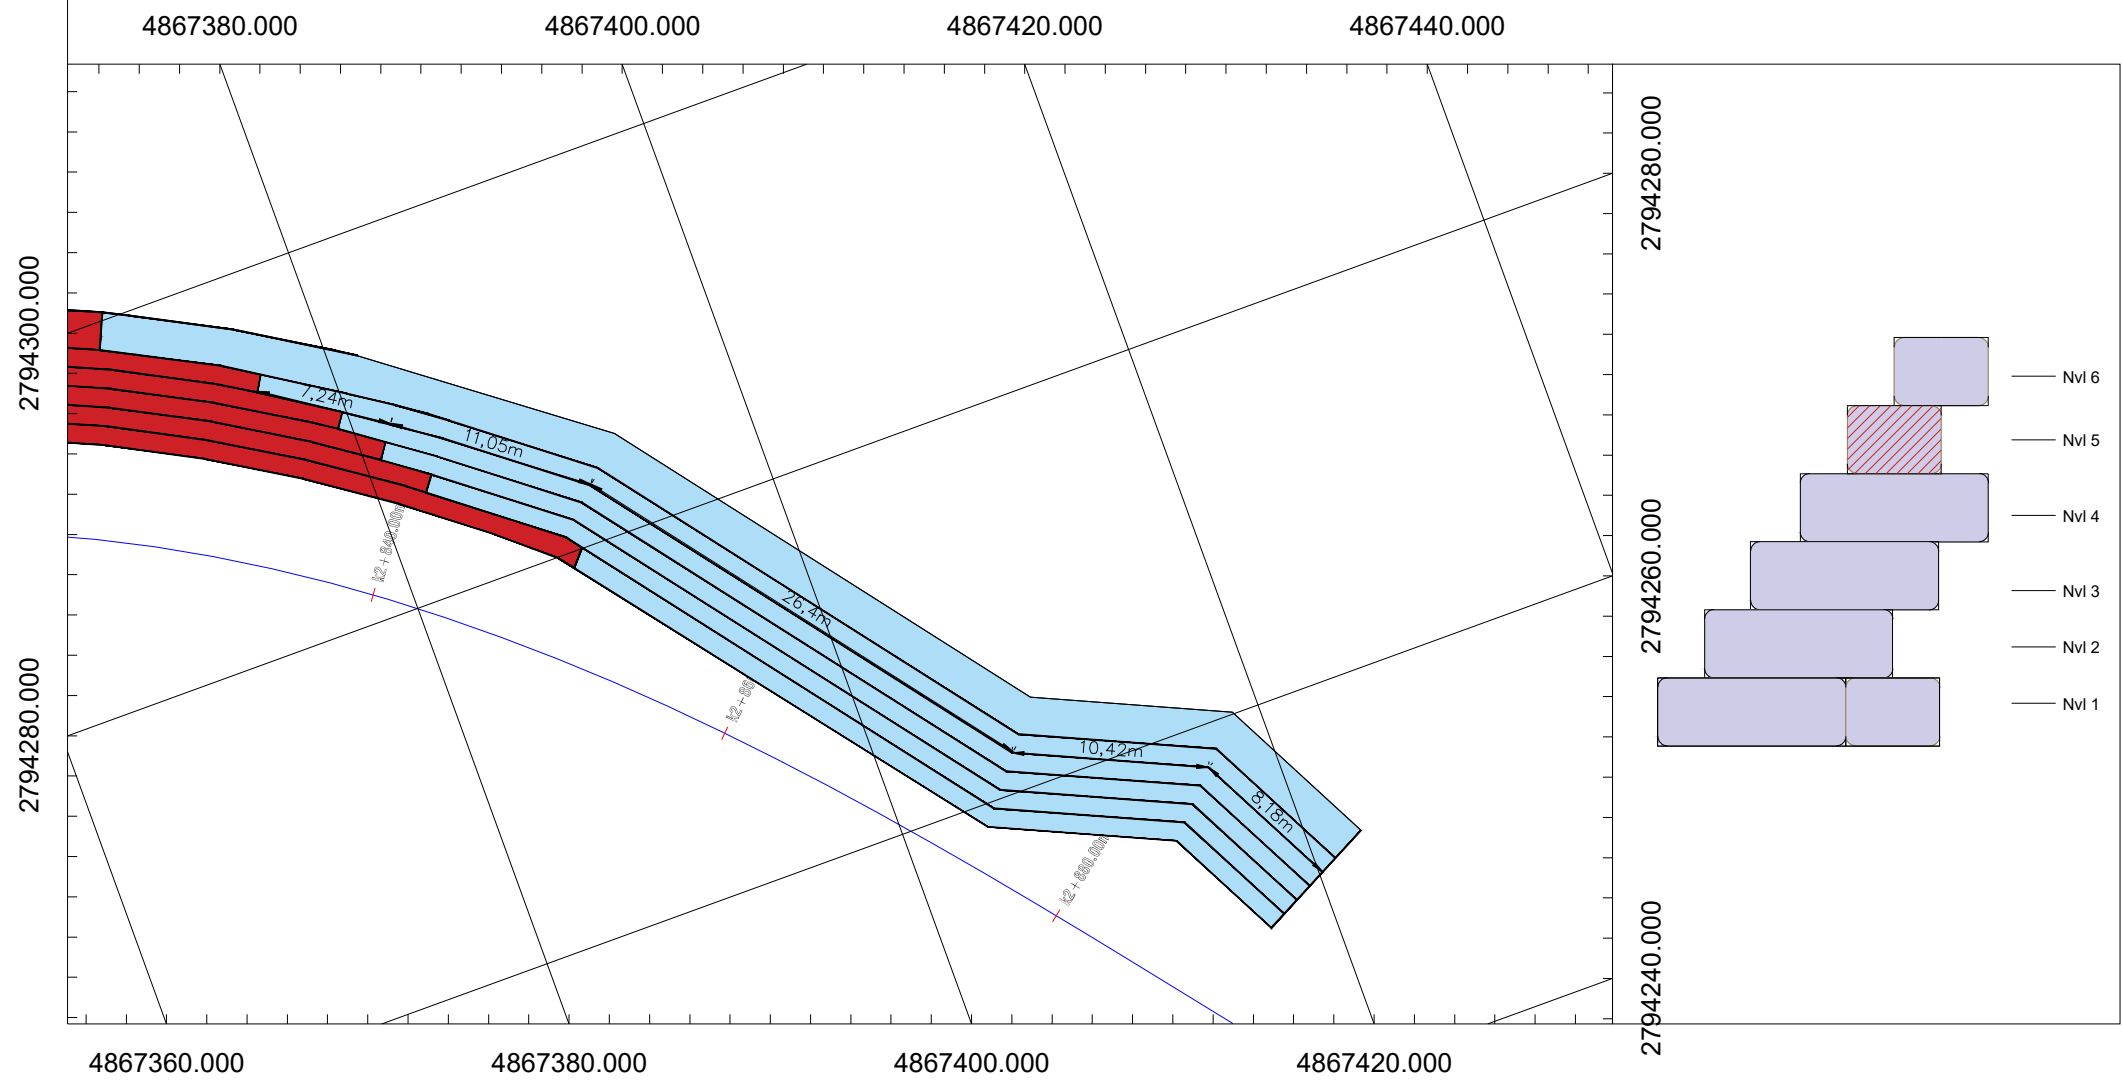

PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 05

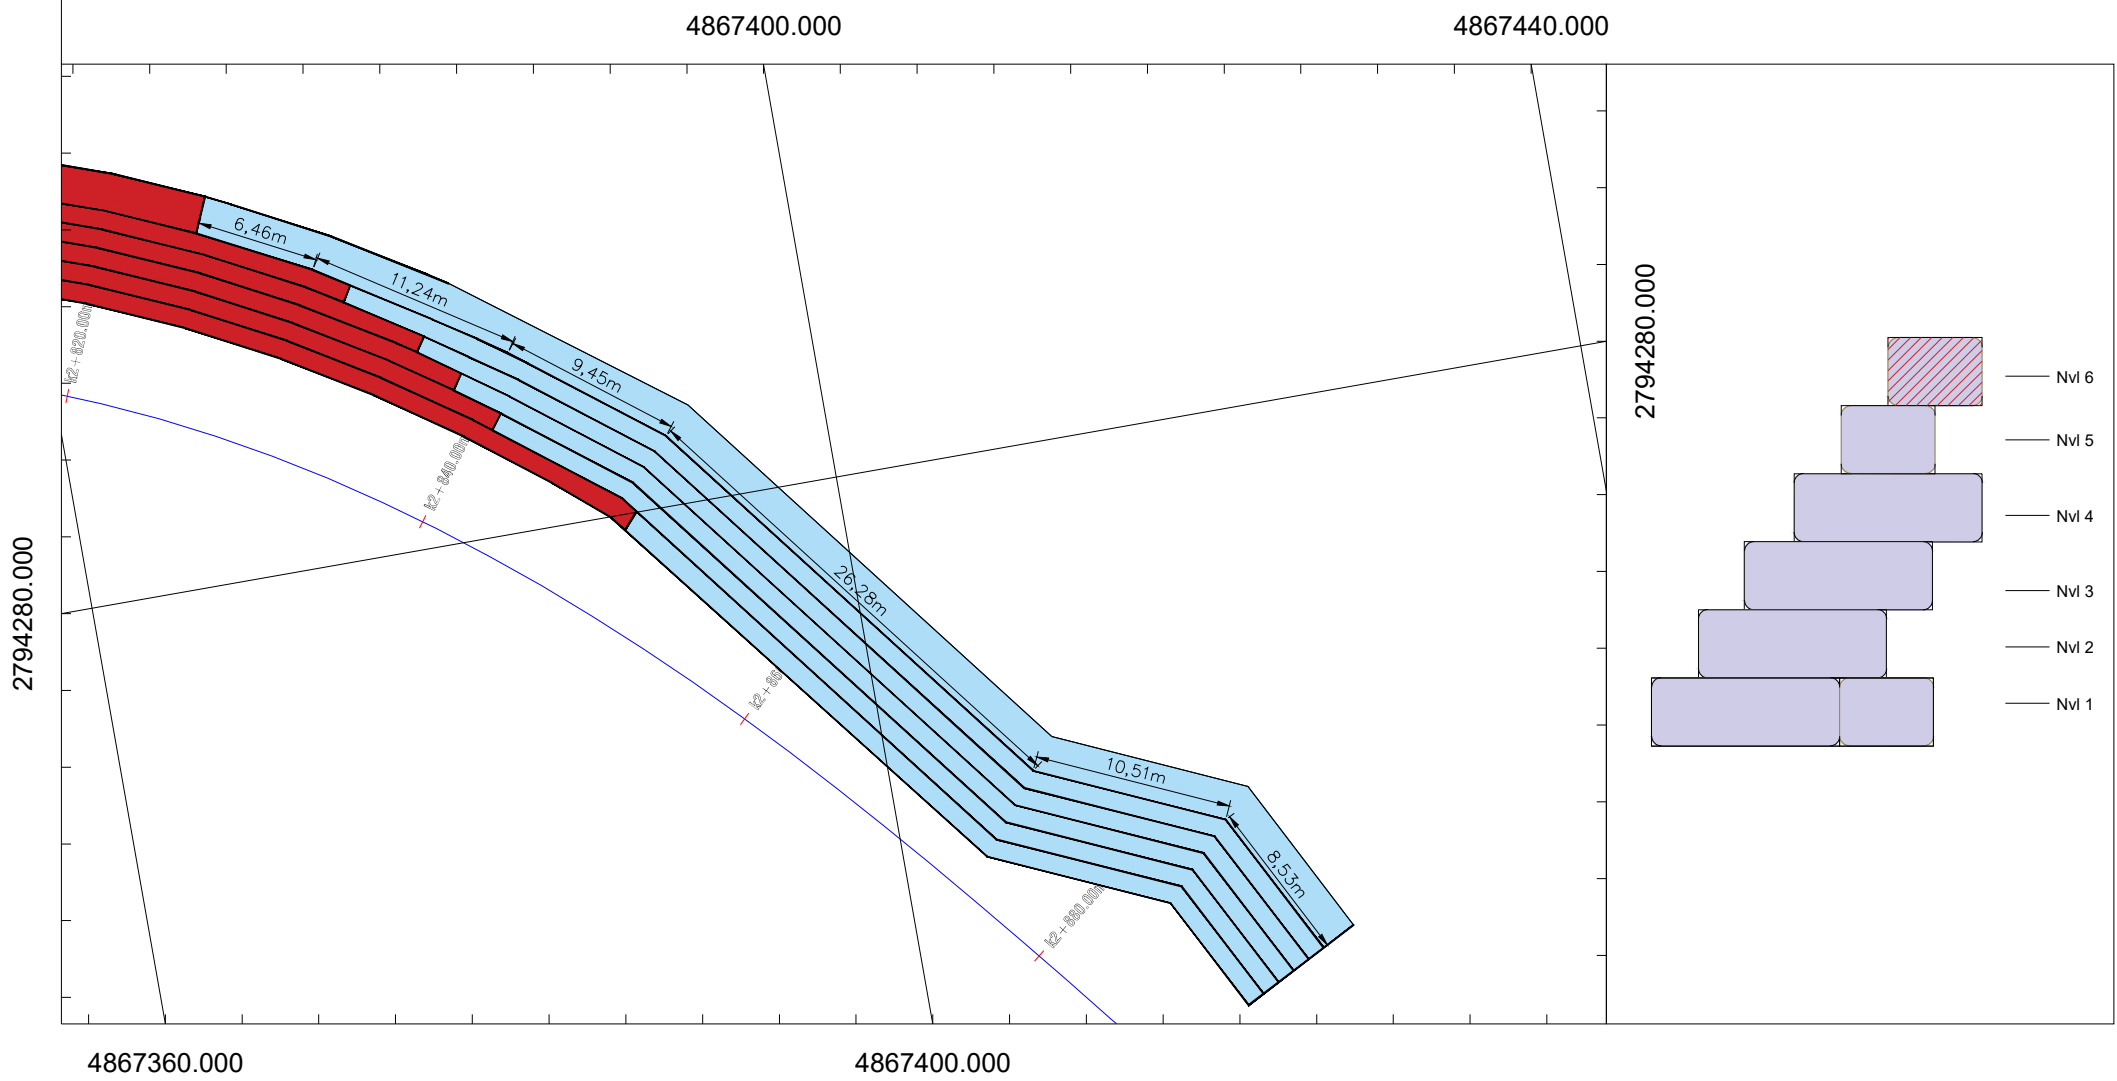

PLANTA CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDOR, NIVEL 06

ENTIDAD:



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL MAGDALENA

CONTRATISTA:

CONSORCIO ICASM2023
NIT: 901.782.970-2
CONTRATO DE OBRA No.: LP 006 DE 2023

INTERVENTOR:

INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 901.433.145-6

INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL PROYECTO:

INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS
CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTENIDO:

PL2 - GEOCONTENEDOR K2+800

LOCALIZACIÓN:

DISTRITO DE SANTA MARTA

Convenciones.

- EJE DEL TRAZADO
- DETALLES
- CURVA DE NIVEL PRINCIPAL (1.0 m)
- CURVA DE NIVEL SECUNDARIA (0.2 m)
- EJECUCIÓN
- DISEÑO
- TERRENO NATURAL

NOTAS:

- Levantamiento Topográfico realizado en el mes de marzo de 2024, referido al BM IGAC denominado NP70-N-5IGAC localizado en Santa Marta de coordenadas geodésicas en latitud Norte 11°11'13.52", Longitud Oeste 74°13'7.82", altura elipsoidal 4.699 metros en el marco de sistema cartográfico nacional MAGNA-SIRGAS, en proyección Transversa mercator, datum vertical Nivel Medio del Mar.
- Niveles en metros.
- Todas las dimensiones están dadas en metros.

FORMACION SOBRE CUADRICULA

ELIPSOIDE.....GRS80
CUADRICULA.....100 METROS
PROYECCIÓN.....TRANSV. DE MERCATOR
DATUM VERTICAL.....NIVEL MEDIO DEL MAR
DATUM.....MAGNA-SIRGAS-ORIGEN NACIONAL
HORIZONTAL.....MAGNA-SIRGAS-ORIGEN NACIONAL
MERIDIANO CENTRAL 75°W.

MODIFICACIONES:

No - DD/MM/AAAA - MODIFICACIÓN

Levantamiento Topográfico:

Angela Fernandez Fajardo
T.P. 25335160128 GND

APROBO:

Luis Fernando Ochoa
T.P. 13202-33067 BLV

APROBO:

Ing. Francisco Fernandez
Rep. Ing. Interventores e Ingeniería S.A.S.

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE DE 2024

PLANO:

EJECUCIÓN

Plancha N°

2

De

2

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN
No G052024-001

FECHA DE EXPEDICIÓN 20 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE VENCIMIENTO 20 NOVIEMBRE DEL 2024	PROXIMA VERIFICACIÓN 20 NOVIEMBRE DEL 2024
---	--	--

CLIENTE	B&P CONSTRUCCIONES SAS	INSTRUMENTOS	GPS
CC/NIT	900.481.955-6	MARCA/MODELO	STONEX/S980 - S900A
TÉLEFONO		SERIAL	S914CA148657065PKA-S914CA148657055PKA
DIRECCIÓN		CODIGO	L1/L2 Doble frecuencia (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS)

¿INSTRUMENTO NUEVO?
SI NO X

1. El laboratorio de C.I. ALARCONTOP S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS	1: CORRECTO	2: FALLA CORREGIDA	3: NO CORREGIDA	4: NO APLICA
----------------	--------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

INSPECCIÓN OPTOMÉCANICA	CORRECCIÓN	INSPECCIÓN OPTOMÉCANICA	CORRECCIÓN
1. LIMPIEZA DE EXTERIOR	2	2.1 AJUSTE DE NIVEL CIRCULAR	2
1.1 MANTENIMIENTO INTERNO	2	2.2 REGISTRO DE DATOS	1
1.2 REVISION DE PUERTOS	2	2.3 REVISIÓN DE ANTENA	1
1.3 BATERIA	1	2.4 REVISIÓN DE CANALES	1
1.4 REVISIÓN DE CABLES	1	2.5 POSTPROCESOS	1
1.5 CHEQUEO DEL TECLADO	2	2.6 AJUSTE DE PLOMADA ÓPTICA O LASER	2
1.6 RECEPCIÓN DE SATÉLITES	1	2.7 REVISIÓN DE FIRMWARE	1
1.7 CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE	1	2.8 PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS	2
1.8 ENTRADA Y SALIDA DE DATOS	1	2.9 OPERACIÓN DEL EQUIPO	1
1.9 AJUSTE DE CORDENADAS	1	3.0 VOLCADO DE MEMORIA	1
2.0 SISTEMA DE COORDENADAS	1	3.1 VOLCADO DE MEMORIA	1

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

No G052024-001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

TEST DE VERIFICACION DE POSICIONAMIENTO HORIZONTAL

PATRÓN REFENCIA (VERTICAL GEODÉSICO DE REFERENCIA) A-97-TC-5:			
DATOS PATRÓN	11° 09' 09.06868" N	72° 39' 09.40707" W	
DATOS GPS	11° 09' 09.06868" N	72° 39' 09.40707" W	
ERROR RMS	0.005m + 1ppm	ERROR M2	ENCONTRADO: 0.00 cm.

El equipo cumple bajo los parámetros de toleracion en la precisión de posicionamiento.

TEST DE VERIFICACION DE POSICIONAMIENTO VERTICAL

PATRÓN REFENCIA (VERTICAL GEODÉSICO DE REFERENCIA):	
PATRÓN	200627 m
LECTURA	200.636 m
ERROR ESTADISTICO EN ALTURA	+ / - 0.010m+1PPm

El equipo cumple bajo los parámetros de toleracion en la precisión de posicionamiento.

CI ALARCON TOP S.A.S, certifica que el instrumento se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: Estos procedimientos cumplen con estándares internacionales de calidad ISO 9001.


ANGEL RODRIGUEZ
TEC. PROFESIONAL EN ELECTRONICA
JEFE DE LABORATORIO


LUIS R. ALARCON P.
C.C. 77'153.216 de Codazzi Cesar.
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

No G052024-001

REGISTRO FOTOGRAFICO

CUIDADOS A TENER CON SU EQUIPO TOPOGRAFICO

1. Transportar su equipo siempre en su maleta, nunca montado en el trípode.
2. Cuando valla a nivelar el equipo, nivele el nivel circular primero con el trípode; después afine con los tornillos de nivelación.
3. No permita que nadie utilice la maleta del equipo como silla, no se siente sobre ella.
4. No apretar demasiado el tornillo del trípode que sujeta al equipo, puede dañar la rosca de la base del equipo.
5. No apretar demasiado los tornillos del trípode, simplemente dele el ajuste necesario.
6. No permita que personas no calificadas ajenas al topógrafo se acerquen y manipulen los equipos.
7. Recuerde que del buen estado del equipo también depende un buen resultado del trabajo.



MEMORIA DE CANTIDADES





OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023		ACTA	5		FECHA	31/10/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O.C.C.	901.782.970-2		CONTRATO	LP 006 DE 2023	
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O.C.C.	901.433.145-6		CONTRATO	CM 007 DE 2023	

CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO		ITEM	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada			UNIDAD	m3
	SEMANAL	DIA	VIAJES	CUBITAJE		VOLUMEN TOTAL		
		Sept - Oct						
	SEMANA 29	30-sep	50	17		850,00		
		1-oct	52	17		884,00		
		2-oct	54	17		918,00		
		3-oct	0	17		0,00		
		4-oct	62	17		1054,00		
		5-oct	63	17		1071,00		
						0,00		
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						67163,07		
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						63488,45		
CANTIDAD PRESENTE ACTA						4777,00		
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA (Nota:El APU tiene el volumen de retiro afectado por el factor de expansion 1.3)						3674,62		

Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL


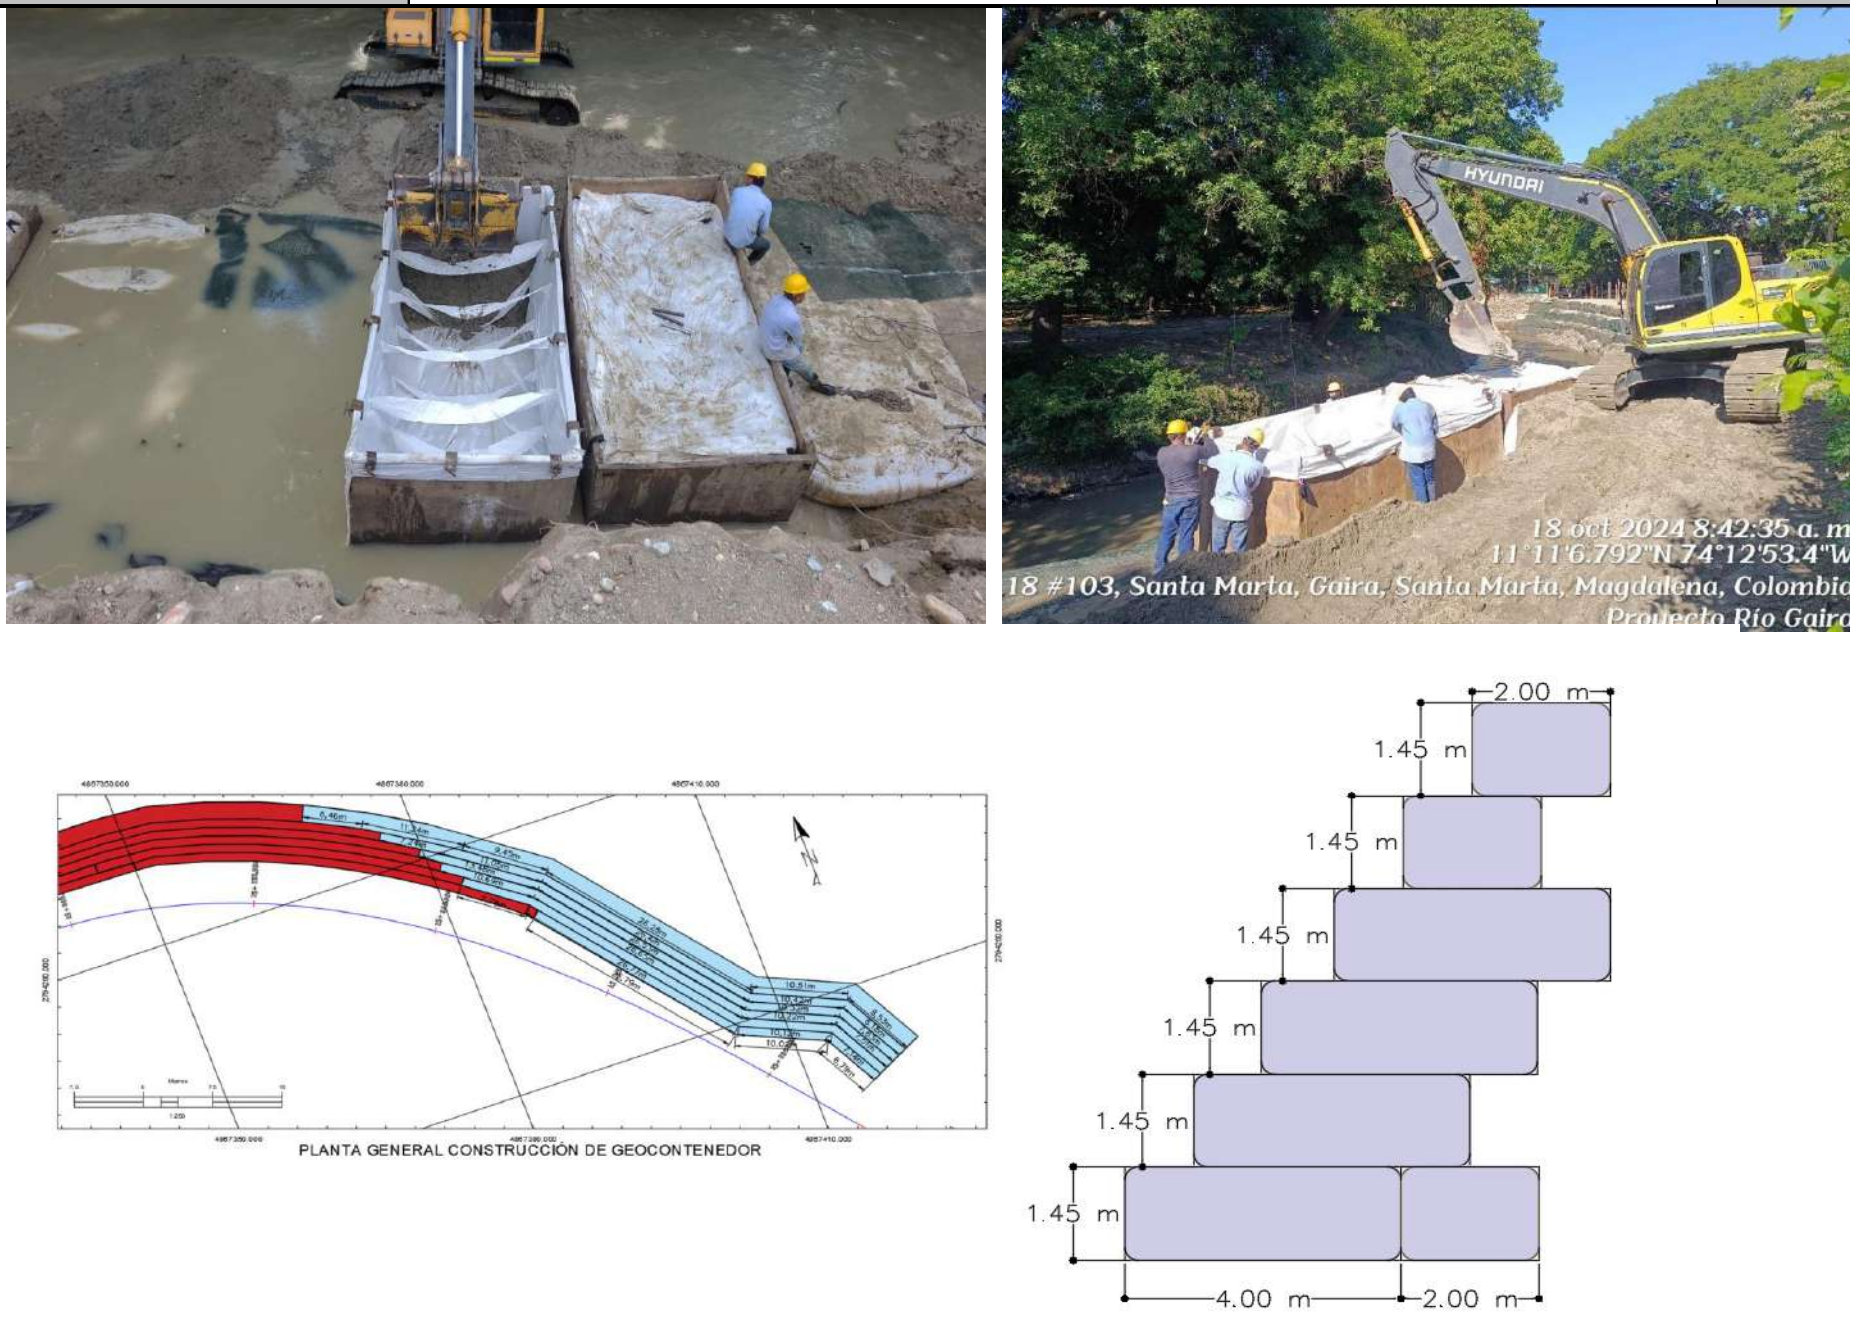
		MEMORIA DE CANTIDADES								
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023		ACTA	5	FECHA	31/10/2024			
CONTRATISTA		CONSORCIO ICASM 2023		901.782.970-2		CONTRATO	LP 006 DE 2023			
INTERVENTOR		INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.		901.433.145-6		CONTRATO	CM 007 DE 2023			
CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO		ITEM	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.		UNIDAD	M3			
				DESCRIPCIÓN		LONGITUD	AREA	VOLUMEN TOTAL		
				RIO GAIRA						
				NIVEL 1		32	8,7	278,40		
				NIVEL 2		40	5,8	232,00		
				NIVEL 3		42	5,8	243,60		
				NIVEL4		44	5,8	255,20		
				NIVEL5		48	2,9	139,20		
				NIVEL6		56	2,9	162,40		
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				3190,00		
				FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR				1879,20		
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA				1310,80						






Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV





Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023			ACTA	5		FECHA	31/10/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023		NIT O.C.C.	901.782.970-2		CONTRATO		LP 006 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.		NIT O.C.C.	901.433.145-6		CONTRATO		CM 007 DE 2023
CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO		ITEM	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.			UNIDAD	M2
			DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO		M2	
			RIO GAIRA					
			NIVEL 1	32	8		256,00	
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			800,00		
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR			544,00		
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA			256,00		
<div><div><p>Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA DIRECTOR DE OBRA Matricula No. 13202-33067 BLV</p></div><div><p>Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. 08202-187374 ATL</p></div></div>								

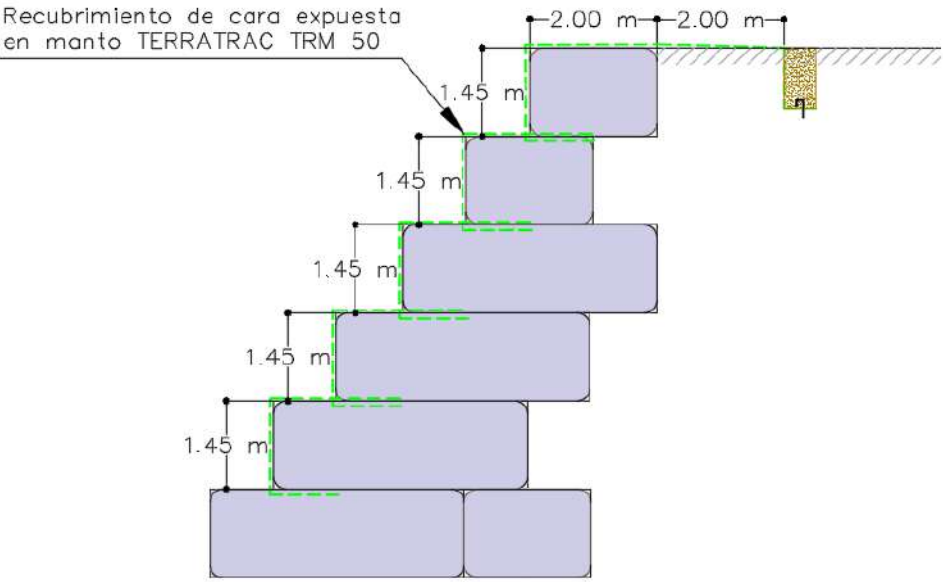		MEMORIA DE CANTIDADES					
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023			ACTA	5	FECHA	31/10/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM 2023	NIT O.C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	NIT O.C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		
CAPÍTULO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	ITEM	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50		UNIDAD	M2	
 	DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ANCHO		M2
	RIO GAIRA						
	NIVEL 1						
	NIVEL 2		40		4,45		178,00
	NIVEL 3		42		4,45		186,90
	NIVEL4		44		4,45		195,80
	NIVEL5		48		4,45		213,60
	NIVEL6		56		7,95		445,20
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR							1355,50
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA							1219,50
<div><div> Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA DIRECTOR DE OBRA Matricula No. 13202-33067 BLV</div><div> Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. 08202-187374 ATL</div></div>							

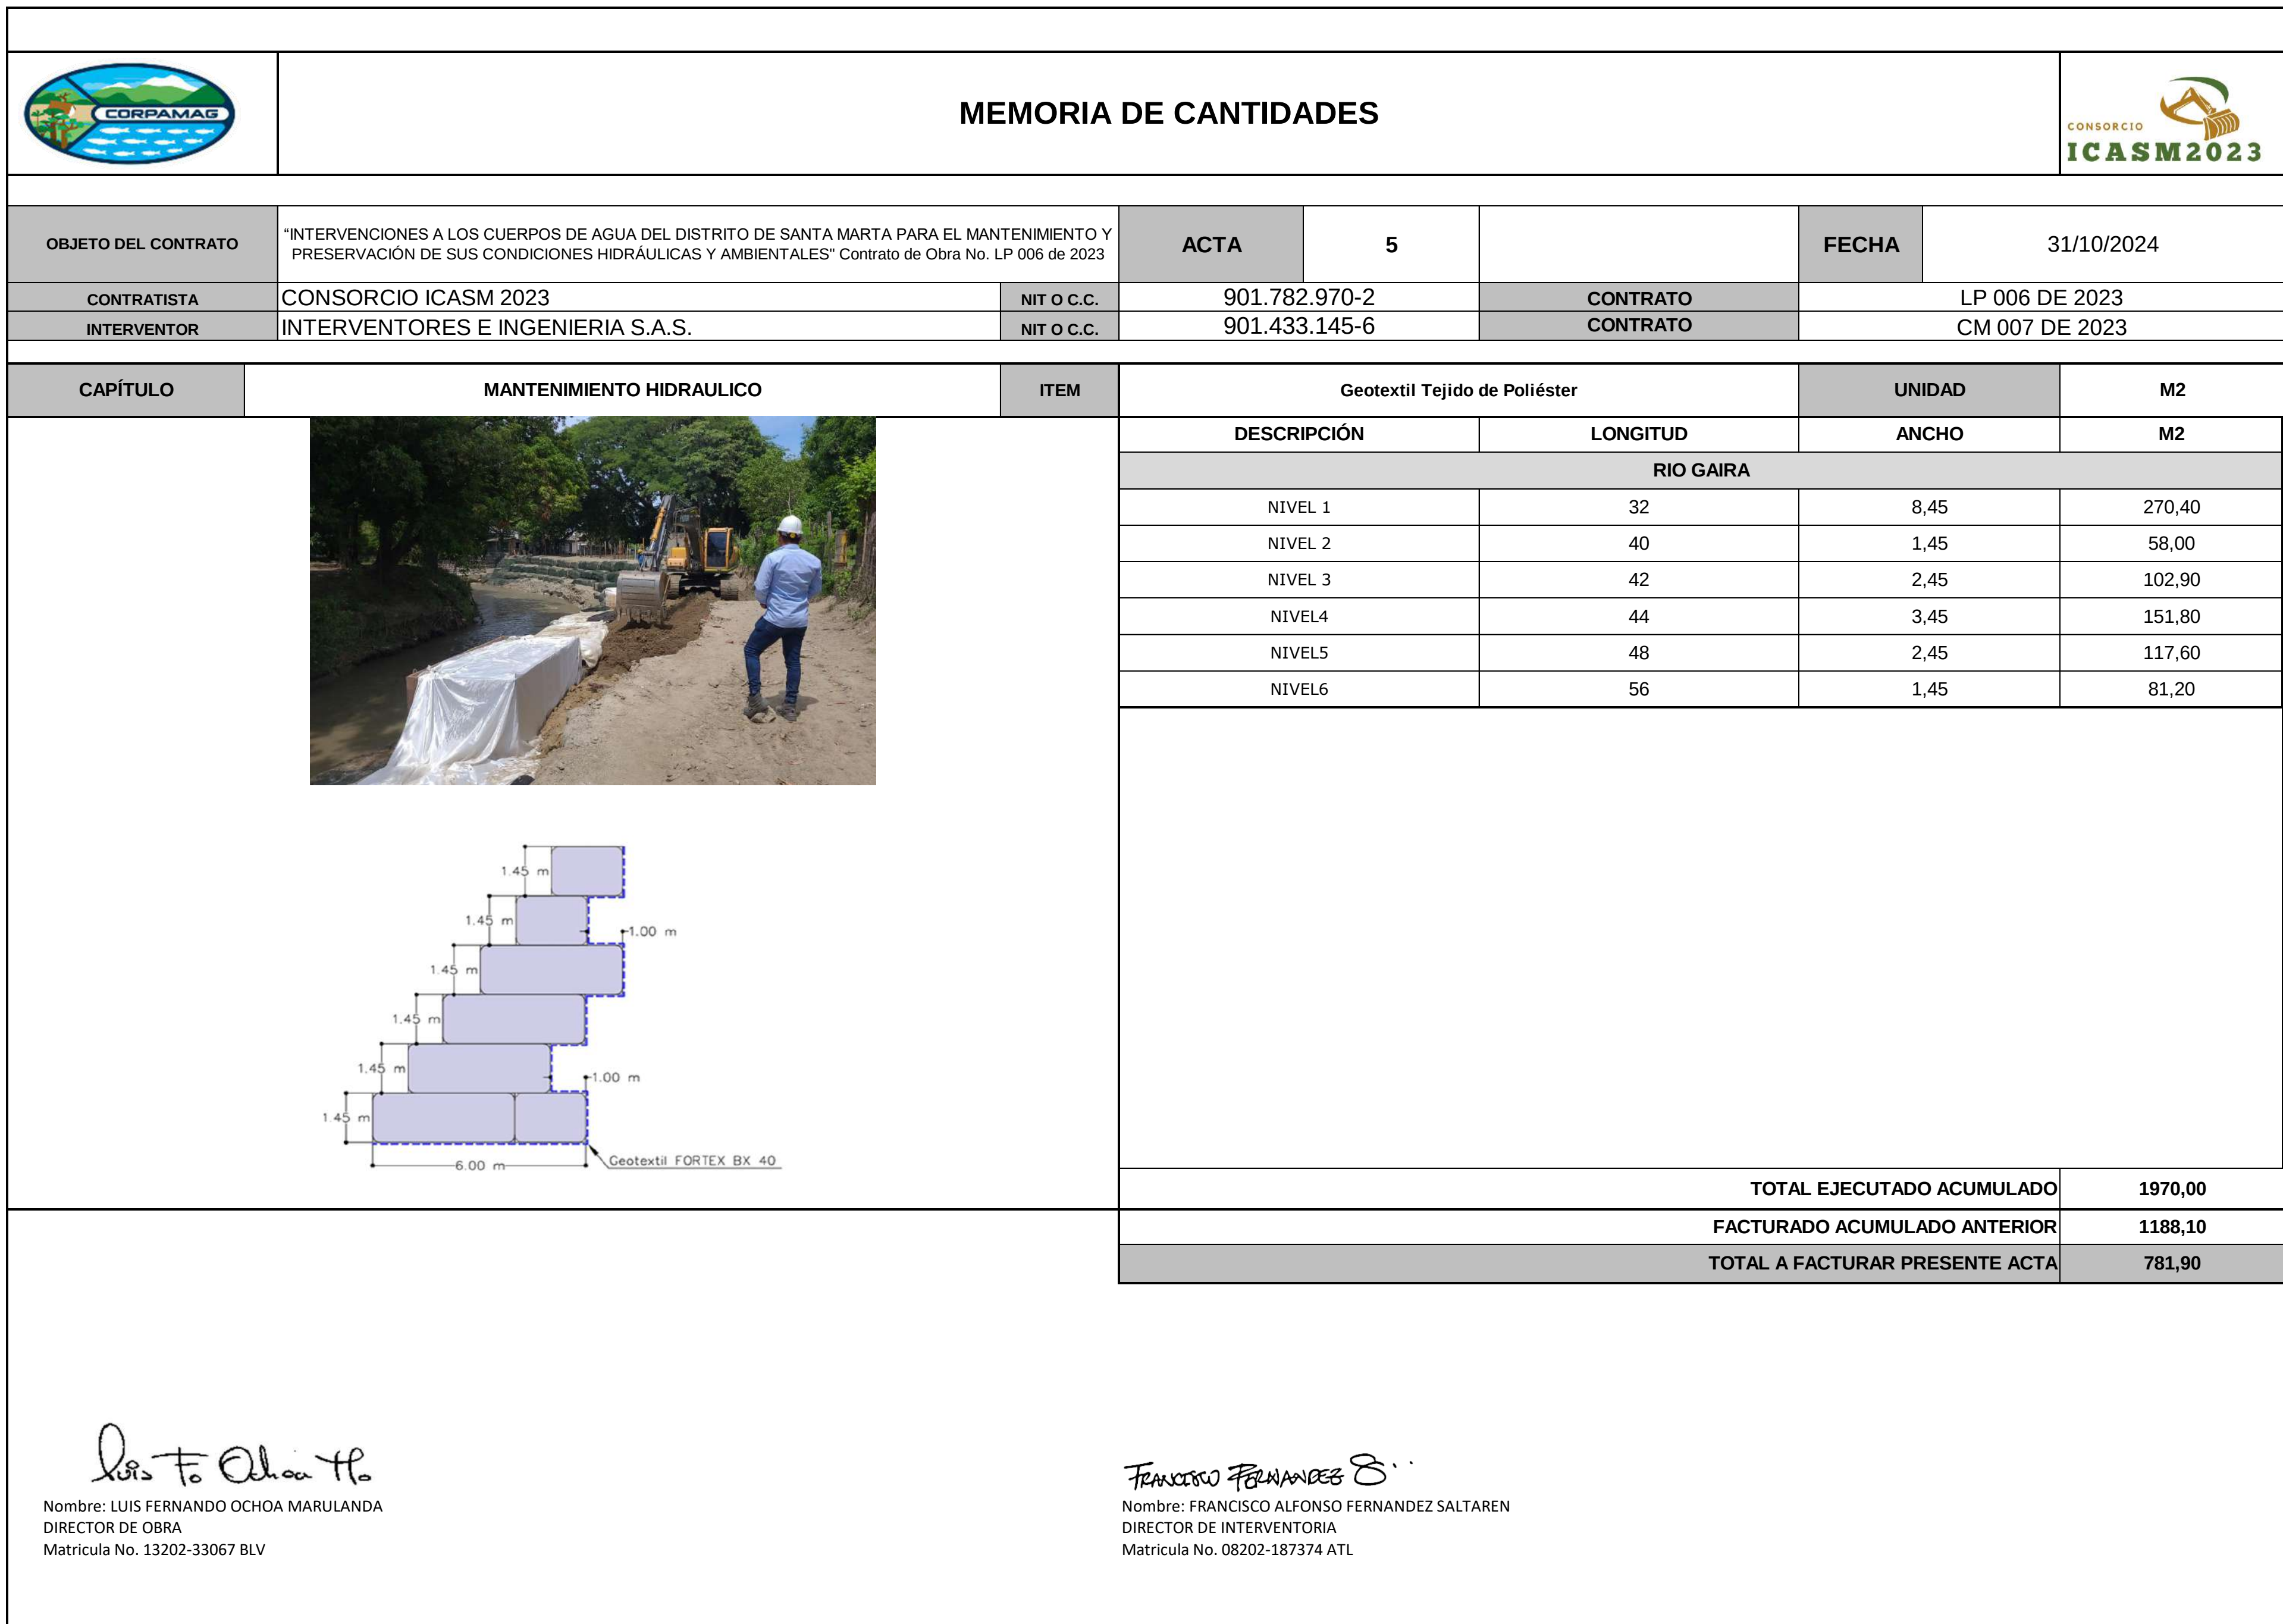

		MEMORIA DE CANTIDADES						
OBJETO DEL CONTRATO		OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023		ACTA	5	FECHA	31/10/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023		NIT O.C.C.	901.782.970-2		CONTRATO	LP 006 DE 2023	
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS		NIT O.C.C.	901.433.145-6		CONTRATO	CM 007 DE 2023	
CAPÍTULO	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ITEM	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre			UNIDAD	UND	
				MENSUAL			UNIDAD TOTAL	
				Octubre				
				Actividades mes de octubre 2024.				0,17
							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR			0,71		
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA			0,17		
<div><div> Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA DIRECTOR DE OBRA Matricula No. 13202-33067 BLV</div><div> Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. 08202-187374 ATL</div></div>								

	MEMORIA DE CANTIDADES						
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023			ACTA	5	FECHA	31/10/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O.C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O.C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		
CAPÍTULO	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ITEM	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto			UNIDAD	UND
				MENSUAL			UNIDAD TOTAL
				Octubre			
	Actividades mes de octubre 2024.					0,86	
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			0,96	
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR			0,10	
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA			0,86	
 Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA DIRECTOR DE OBRA Matrícula No. 13202-33067 BLV			 Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matrícula No. 08202-187374 ATL				

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta en este documento el informe de seguimiento al Programa de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental – PIMMA

EMPRESA CONSTRATISTA:
CONSORCIO ICASM2023

CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL
MAGDALENA – CORPAMAG.
INFORME AMBIENTAL No. 5

PROYECTO:

Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales.

Contrato de Obra No:
LP 006 de 2023

PERIODO REPORTADO:
Octubre del 2024

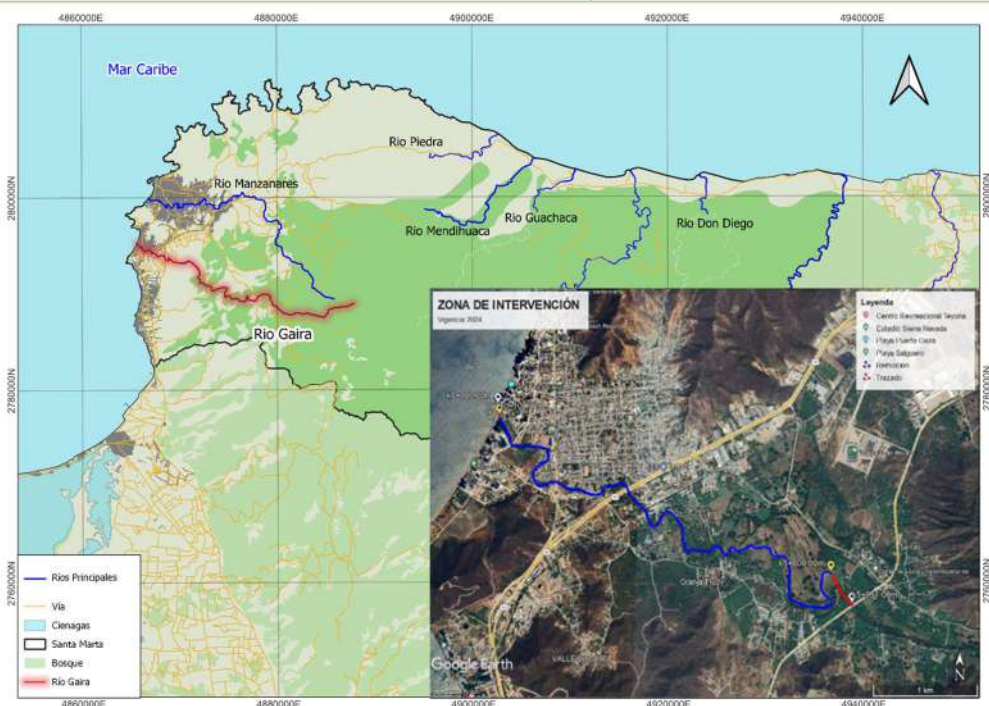


TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS.....	3
LISTA DE FIGURAS.....	4
1. PRESENTACIÓN.....	5
2. INTRODUCCIÓN	6
3. ALCANCE.....	7
4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	8
4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	9
4.2. AREA DE INTERVENCIÓN	9
5. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL DEL PIMMA	10
5.1. PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO	10
5.1.1. P-MA-P1 Programa de control de calidad de aire y ruido.....	10
5.1.2. P-MA-P2 Programa de protección de suelos.....	19
5.1.3. P-MA-P3 Programa de control de la calidad del agua superficial	23
5.2. PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO.....	26
5.2.1. P-MB-P1 Programa de protección de fauna y flora.	26
5.3. PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO.....	30
5.3.1. P-MS-P1 Programa socioeconómico y cultural	30
5.3.2. P-MS-P2 Programa de manejo de residuos.....	33
6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES.....	35
6.1. Rescate de Fauna Acuática y Terrestre	35
6.2. Implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto.....	35
7. CONTROL DEL DOCUMENTO	35
8. ANEXOS	35

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Información básica de la organización.	5
Tabla 2: Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del aire y ruido ..	10
Tabla 3: Ficha de seguimiento al Programa de control de protección de suelos.....	19
Tabla 4: Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del agua	23
Tabla 5: Ficha de seguimiento al Programa de protección de fauna y flora.	27
Tabla 6: Ficha de seguimiento al Programa socioeconómico y cultural	30
Tabla 7: Ficha de seguimiento al Programa de manejo de residuos.	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localización de la zona de estudio, Santa Marta, Magdalena.....	8
Figura 2: Localización de la Cuenca Rio Gaira	9
Figura 3: Maquinarias y equipos utilizados en el mes de septiembre.....	11
Figura 4: Preoperacionales realizados en el mes de octubre	12
Figura 5: Cargue de material de sedimento removido.....	14
Figura 6: Capacitación en temas ambientales	14
Figura 7: Punto ecológico en el frente de obra.....	16
Figura 8: Dotación y EPP para el personal de la obra.....	17
Figura 9: Abastecimiento de combustible.....	20
Figura 10: Contenedor de residuos peligrosos	21
Figura 11: Kits para el control de derrames.	21
Figura 12: Construcción de geocontenedores.....	24
Figura 13: Baterías sanitarias en el frente de trabajo	25
Figura 14: Actividades de ahuyentamiento en el área de influencia del proyecto.....	28
Figura 17: Jornada de capacitaciones ambientales	31
Figura 18: Levantamiento de actas de cierre de vecindad del proyecto	31
Figura 19: Valla informativa del proyecto	32
Figura 20: Actividades de aseo y limpieza del área de labores	34

1. PRESENTACIÓN

Mediante este documento se presenta el informe de seguimiento al Programa de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental – PIMMA del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES, como parte de los requerimientos para el CONSORCIO ICASM2023, en desarrollo del Contrato No. LP 006 DE 2023 suscrito con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

De igual forma en la **Tabla 1**, se presenta los datos básicos de la empresa que ejecuta el proyecto en el área:

Tabla 1: Información básica de la organización.

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	
Nombre	CONSORCIO ICASM 2023
Nit	901782970-2
Dirección	Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta.
Teléfono	3043862369
Representante legal	Chesman Hobbet Barros Pimienta
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	
Departamento	Magdalena
Municipio	Santa Marta

2. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de ingeniería se han convertido a través del tiempo en una solución a las diversas amenazas a las que están expuestas las poblaciones vulnerables de un territorio específico, las obras construidas contemplan muros de contención rígidos de diversos materiales priorizando cada vez más aquellos que no representan una alta contaminación para el medio ambiente y que contribuyen a solucionar la problemática presentada, otra opción que usada principalmente en los cuerpos de agua loticos, es aumentar la profundidad del lecho mediante remoción con maquinaria, de esta forma se garantiza el retiro de sedimentos o cualquier otro material que interfiera en la capacidad de transporte de agua.

Los ríos y humedales han sido señalados por los expertos como los mayores proveedores de servicios ecosistémicos. Son sumideros de carbono y estabilizadores climáticos esenciales a escala mundial. Ejercen un papel importante en la mitigación de las inundaciones y las sequías, nos proveen de aguas limpias, protegen las costas y recargan los acuíferos subterráneos, sustentan una gran geodiversidad, desempeñan un papel imprescindible en el paisaje al proporcionar hábitats únicos y en la prestación de servicios recreativos y culturales a la sociedad. Sin embargo, los ecosistemas acuáticos son los que más agresiones reciben en todo el mundo.

Es así como, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG elaboró las medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos negativos, atribuidos al desarrollo del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

De acuerdo con esto, surge la necesidad de construir el Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental que hace parte de los requerimientos para el CONSORCIO ICASM2023, en desarrollo del Contrato No. LP 006 DE 2023 suscrito con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG; que tiene como objeto la ejecución del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”.

En consecuencia, el presente documento contempla el informe de seguimiento al Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental con el propósito de garantizar una mejor calidad, supervisión, seguimiento y control en las etapas de ejecución y operación del proyecto.

3. ALCANCE

El presente documento comprende el seguimiento de los programas socioambientales establecidos en el Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental desarrollados en el proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES” para la vigencia del 2024 correspondiente al Rio Gaira, en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2024.


4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud norte y 74° 12' 06" de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km², de los cuales 55.10 Km² pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km² a zona rural.

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Figura 1: Localización de la zona de estudio, Santa Marta, Magdalena.

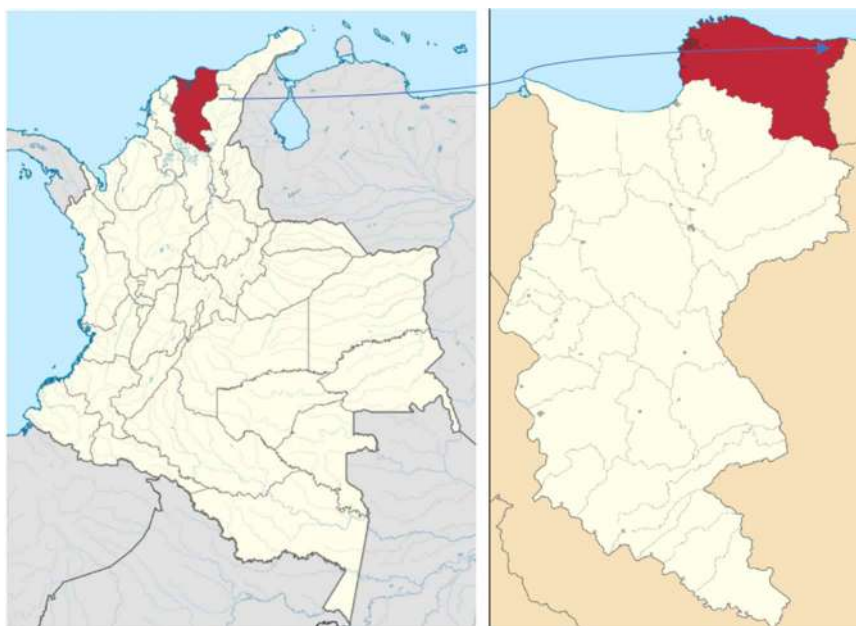

Fuente: Adaptado de Google Maps

La ciudad cuenta con una estructura ecológica principal biodiversa, con un 51,43% del territorio clasificado como áreas protegidas, que equivale a 120.751,6 Ha de éstos, el 2,14% son humedales, el 8,97% páramos, el 11,92% bosque seco, el 0,06% manglares y el 23,09% son ecosistemas estratégicos. El 82,42% del territorio está amenazado por fenómenos hidrometeorológicos y la mayor parte de los desastres en Santa Marta se deben a incendios forestales (47,92%) e inundaciones (46,88%).

El Distrito de Santa Marta hace parte de las cinco grandes subregiones socio-ecológicas en las que se encuentra dividido el Departamento, junto con Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo integran la subregión Marino – Costera, caracterizándose Santa Marta por una lata presión turística y problemas severos de erosión costera.

4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.2. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El proyecto se encuentra localizado en Santa Marta, mediante la intervención de los cuerpos de agua del Distrito.

Para la vigencia del 2024, la zona de intervención corresponde al Río Gaira, con un alcance de intervención en obras de 5, 9 km desde k0+000,00m hasta k5+951,08m (desde la desembocadura del Río Gaira hasta el puente de la vía alterna)

La cuenca del río Gaira se localiza en el Departamento del Magdalena en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva de la Biosfera, del Hombre y de la Humanidad, en su flanco norte, entre las coordenadas 11°05'N, 74°13'W y 11°13'N, 74°1'W. La cuenca limita al norte con la cuenca del río Manzanares y río Piedras, al este con la cuenca del río Guachaca, al sur con la cuenca del río Toribío y al oeste con el mar Caribe. El cauce principal de la cuenca es el río Gaira con una longitud aproximada de 29,9km. La cuenca tiene una gran variedad de pendientes y elevaciones, las que sumadas a las características geológicas de la zona condicionan los cauces de las corrientes de agua; hace parte de la Macrocuena Hidrográfica del Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Figura 2: Localización de la Cuenca Río Gaira



Fuente: Informe hidrológico e hidráulico del Río Gaira, 2024

La cuenca del río Gaira hace parte de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y de su Macrocuena del Caribe y en su parte baja se ubica en la ecorregión, Sistema Costero, dos de las cinco ecorregiones definidas por la Corporación Regional, CORPAMAG, para el territorio del Departamento del Magdalena. En ella se ubican las áreas municipales del Distrito de Santa Marta, el corregimiento de Gaira, y los caseríos de Mosquito, Los Novillos, El Limón, Minca, Marinca y La Victoria, entre otros. Una parte de la cuenca baja está urbanizada, perdiendo parte de su cobertura vegetal original, especialmente la boscosa, en ella se encuentran poblaciones, cultivos agroforestales,

parches de bosques y cultivos en general. La parte media presenta el mayor desarrollo rural debido a sus características naturales y climáticas para el cultivo del café y actividades afines y forestales, en el resto de la zona se encuentran cultivos permanentes y agroforestales con parches de bosque nativo; en la parte alta de la hoya hidrográfica aún predominan los espacios naturales boscosos intercalados con algunos parches de cultivos permanentes y arbóreos.

5. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL DEL PIMMA

Durante el desarrollo de este numeral se presentará la descripción de la ejecución de las fichas de manejo ambiental del Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental (PIMMA) del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”.

5.1. PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO

5.1.1. P-MA-P1 Programa de control de calidad de aire y ruido.

Tabla 2: Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del aire y ruido

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO						CODIGO: P-MA-P1	
Programa 1: Programa de control de la calidad del aire y ruido							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
1. Medidas para el control de la alteración de la calidad del aire							
1.1. <u>Mantenimiento de la maquinaria y equipos para maximizar la eficiencia de la combustión y minimizar la emisión de contaminantes.</u>							
Para el periodo reportado se manejó la maquinaria, equipos y vehículos que se relacionan a continuación:							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
DESCRIPCION	MARCA	MODELO/PLACA	SERIAL				
Retroexcavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	HBRR220CHE0001460				
Retroexcavadora	HYUNDAI	HX220S	HHKHK606VE0002147				
Retroexcavadora	HYUNDAI	R220LC-9SB	HBRR220CEE0001461				
Retroexcavadora	SANY	SY215H	SY021KCCX5838				
Dobletroque	FOTON	KNL-549					
Dobletroque	FOTON	KNL-545					
Dobletroque	FOTON	KNL-546					
Dobletroque	FOTON	KNL-551					
Dobletroque	FOTON	KNL-568					
Dobletroque	FOTON	KNL-571					
Dobletroque	FOTON	KNL-572					
Dobletroque	FOTON	KNL-550					
Dobletroque	FREGHTLINER	WLK-229					
GPS RTK topográfico de precisión	STONEX	S980	S989282100017				

GPS RTK topográfico de precisión	STONEX	S900	S911312121756
Controlador GPS	STONEX	BA5200	N.A.
Camioneta	NISSAN	2015 / SVR312	

Estos equipos fueron inspeccionados periódicamente bajo la supervisión del profesional ambiental y el SST, para determinar y/o verificar que se encontraran en condiciones adecuadas para las actividades a desarrollar. Así mismo, se anexan los correspondientes certificados de revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes vigentes de los vehículos a los cuales aplica tal requisito (Anexo No 1)

Los preoperacionales de la maquinaria se realizan por el operador previa ejecución de funciones, a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad.

Figura 3: Maquinarias y equipos utilizados en el mes de septiembre



Maquinarias y equipos
usados para las
actividades



El mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante al cumplir las 250 horas de uso fue ejecutado el 9 de mayo del presente año; por lo que en el Anexo No. 2 se adjunta el registro de este.

Figura 4: Preoperacionales realizados en el mes de octubre



Realización de preoperacionales de la maquinaria antes del inicio de actividades y Movilización de la maquinaria



1.2. Si el proyecto se llega a ejecutar en temporada seca, se mantendrán húmedas las áreas de trabajo para minimizar la dispersión de polvo.

Durante la ejecución de las labores se han presentado lluvias aisladas que han permitido el control de material particulado en suspensión producto de la ejecución de las actividades de movilización de vehículos hacia la zona de trabajo.

**FECHA DE
PRECIPITACIONES**

22/octubre/2024

1.3. Se establecerán lugares adecuados para almacenaje, mezcla y carga de los materiales y/o insumos, de modo que se evite la dispersión de polvo debido a dichas operaciones, igualmente se deberá controlar la altura de carga y descarga de materiales de modo que se minimice la dispersión de polvo al ambiente.

Para el periodo reportado no se realizó compra de algún material que requiriera el acopio en un área de almacenamiento temporal y la aplicación de medidas de prevención y control de material particulado.

1.4. Los camiones que transporten materiales o desechos que puedan emitir polvo serán cubiertos con lonas.

Para el periodo reportado se realizó el transporte y disposición de 3.927 m³ de material de sedimento removido entre el 1 al 05 de octubre. En el Anexo No. 3 se presentan los certificados de gestor autorizado de las volquetas dirigidas a realizar esta actividad y el certificado de disposición final en el predio Granja Tayrona autorizado por la Corporación Autónoma

Figura 5: Cargue de material de sedimento removido



Transporte de
material de sedimento
removido



1.5. Se cubrirán y confinarán los materiales almacenados para evitar el arrastre de polvo por acción de viento o lluvia.

Para el periodo reportado no se realizó compra de algún material que requiriera el acopio en un área de almacenamiento temporal y la aplicación de medidas de prevención y control de material particulado.

1.6. Se prohíbe realizar incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto

Dentro del programa de capacitaciones ambientales a los trabajadores, se les forma en lo relacionado a la disposición de residuos en el punto ecológico ubicado en la zona de labores. Así mismo, se les informa a cerca de la prohibición de quemas de cualquier tipo de residuo. En el Anexo No. 4 se relaciona el formato y contenido de las capacitaciones.

Figura 6: Capacitación en temas ambientales



Capacitaciones y charlas ambientales

2. Medidas para el control en la generación de olores molestos

2.1. Mantenimiento preventivo de la flota vehicular debidamente documentado, para maximizar la eficiencia de la combustión y minimizar la emisión de gases contaminantes que puedan generar olores molestos.

Para el control de los olores, se tiene en cuenta el estado de vehículos, maquinaria y equipos, los cuales emiten gases en su operación normal; por lo que, se realizan los mantenimientos correspondientes tal como se describió en el numeral 1.1. Sin embargo, las actividades se desarrollan en espacios abiertos; por ello, la concentración de olores de algún tipo en el área es mínima.

2.2. Se dispondrán de puntos ecológicos en los frentes de trabajo

En el frente de trabajo se cuenta con un punto ecológico con canecas de tres (3) colores: blanco, negro y verde; de acuerdo con la Resolución No 2184 de 2019, por medio de la cual se adopta el código de colores para la separación de residuos sólidos.

Figura 7: Punto ecológico en el frente de obra



Manejo de residuos sólidos generados durante el desarrollo de las actividades

3. Medidas para el control del incremento de los niveles de ruido

3.1 Limitar el tiempo de exposición del personal que se vea afectado por actividades considerablemente ruidosas.

La profesional de SST dirige el programa de pausas activas dentro de la jornada laboral, mediante la realización de diferentes tipos de ejercicios con el fin de prevenir lesiones osteo-musculares, la fatiga o tensión acumulada por el desarrollo de las labores.

3.2. Siempre que se pueda los trabajos deberán realizarse en horarios diurnos.

Las actividades del proyecto se ejecutan en horario diurno.

3.3. Evitar el uso innecesario de bocinas y sirenas.

Las actividades que se desarrollan no requieren del manejo de este tipo de elementos.

3.4. Proveer a los trabajadores de equipo personal de protección auditiva.

La profesional de SST realiza la entrega de los elementos de protección personal y dotación necesarios, conforme a las actividades desarrolladas por los trabajadores del frente de obra. Por otro lado, se encuentra con la señalización correspondiente en el área de labores.

Figura 8: Dotación y EPP para el personal de la obra



Entrega de elementos de protección personal y donación a trabajadores de la obra.



No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
2	Control de material particulado	X			
3	Lugares adecuados para manejo de los materiales y/o insumos			X	
4	Prohibición incineración	X			
5	Velocidad máxima de 15 Km/hora	X			
6	Disposición adecuada de residuos	X			
7	Prohibición quemas	X			
8	Proveer equipos de protección personal auditiva a trabajadores que lo requieran	X			
META		INDICADOR			OBSERVACIONES
Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento	$\frac{\text{No de mantemientos realizados}}{\text{No de mantenimientos programados}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			El proyecto cumple la meta establecida. Se adjunta soporte en el Anexo No 2	
Certificación del 100% de los vehículos	$\frac{\text{No de vehículos con SOAT y técnico – mecánica}}{\text{No total de vehículos}} \times 100$			El proyecto cumple la meta establecida. Se adjunta soporte en el Anexo No 1	

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

5.1.2. P-MA-P2 Programa de protección de suelos.

Tabla 3: Ficha de seguimiento al Programa de control de protección de suelos

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO							CODIGO: P-MA-P2
Programa 2: Programa de control de protección de suelos							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
4. Medidas para la conservación de suelos (erosión y sedimentación):							
4.1. <u>Realizar en la medida de lo posible, las operaciones de mayor movimiento y perturbación de tierras durante los periodos de menor lluvia (para evitar escorrentías) priorizando el inicio de estas operaciones en los sectores de mayor pendiente.</u>							
Las actividades para el periodo reportado se efectuaron con base al cronograma establecido.							
5. Medidas para el control de la compactación de suelos:							
5.1. <u>Restringir la operación de vehículos, maquinaria y equipo de movimiento de tierras al mínimo, concentrando su tránsito sobre el alineamiento de los caminos de acceso y que se restrinja al mínimo el número de vehículos a la zona directa de ejecución del proyecto.</u>							
En el lugar de operaciones circulan solo vehículos, maquinaria y equipos de trabajo para la de ejecución del proyecto.							
5.2. <u>Realizar la mayor cantidad de operaciones durante la estación seca, ya que al entrar la estación lluviosa la compactación de los suelos es mucho mayor.</u>							
Las actividades se están desarrollando según el cronograma establecido para el proyecto.							
6. Medidas para controlar la contaminación del suelo:							
6.1. <u>Mantenimiento del equipo rodante y maquinaria, de modo que no se produzcan fugas o pérdidas de combustible o lubricantes.</u>							
Para el control de fugas se realizan los mantenimientos correspondientes y preoperacionales tal como se describió en el numeral 1.1.							
6.2. <u>Los combustibles y lubricantes serán dispuestos en contenedores adecuados.</u>							
El proyecto cuenta con una caneca de 55 galones de color roja con el respectivo rotulo para realizar el almacenamiento temporal en el frente de obra de residuos peligrosos. Así mismo, se dispone de la prestación del servicio para suministro de combustible de la maquinaria a través del vehículo de la EDS El Líbano, el cual tiene una capacidad de almacenamiento en su tanque posterior de 2218 litros. La EDS cuenta con el plan de contingencias para tales fines, y mediante el Radicado No 230525008 presentó ante el DADSA la solicitud de evaluación del trámite; aun así, la entidad no ha dado respuesta oportuna al requerimiento. Así mismo, en el Anexo No. 6 se relaciona la autorización del Ministerio de Energía para la EDS como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del vehículo de placa TZW-137, como también el soporte de entrega y el pago por concepto de evaluación del plan ante la autoridad ambiental distrital.							

Figura 9: Abastecimiento de combustible



Sistema de
abastecimiento de
combustible a la
maquinaria

6.3. Recolectar los lubricantes y grasas, así como también los envases empaques y embalajes de estos después de las acciones de mantenimiento de equipos que sean necesarios, para disponerlos con gestores autorizados

El proyecto cuenta con una caneca de 55 galones de color roja para realizar el almacenamiento temporal en el frente de obra de residuos peligrosos. Una vez se generen estos residuos y se realice el llenado completo de la misma se procederá a disponer con un gestor autorizado.

Figura 10: Contenedor de residuos peligrosos



Contenedor para la
disposición de
residuos peligrosos
derivados de
actividades del
proyecto.

6.4. Se atenderá cualquier derrame de combustible o hidrocarburo inmediatamente

Para el periodo reportado no se presentó contingencia relacionada al derrame de combustible u otra sustancia de características peligrosas.

6.5. En caso de contaminación de agua por alguna contingencia de contaminación por sustancia química, se delimitará para evitar la contaminación de los suelos.

Para el periodo reportado no se presentó contingencia relacionada al derrame de combustible u otra sustancia de características peligrosas.

6.6. Se deberán realizar capacitaciones a todo el personal para que conozcan los procedimientos al respecto.

Se adjunta en el Anexo No 4 el formato de registro y contenido de las capacitaciones en temas ambientales impartidas al personal de la obra para el periodo reportado.

6.7. Manejar un kit de emergencia dentro de la maquinaria para el caso que se presenten derrames

Se cuenta en el frente de obra con tres (3) kits para el control de derrames, como se logra evidenciar en el registro fotográfico.

Figura 11: Kits para el control de derrames.



Kits antiderrames
para la maquinaria.



6.8. Se efectuará un monitoreo de calidad de sedimentos en tres (3) puntos previamente georreferenciados por cada cuerpo de agua a intervenir en dos (2) momentos, es decir, antes y después de la ejecución del proyecto.

Para el periodo reportado no se encontraban programadas tomas de muestras para medir calidad de sedimentos.

No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
2	Manejo apropiado de combustibles y lubricantes	X			
3	Kit para el control de derrames	X			
4	Atención de derrames			X	
5	Realizar la separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos y disposición final en los sitios autorizados	X			
6	Monitoreo a calidad de sedimentos			X	
META		INDICADOR			OBSERVACIONES

Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento	$\frac{\text{No de mantemientos realizados}}{\text{No de mantenimientos programados}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida. Se adjunta soporte en el Anexo No 2
Certificación del 100% de los vehículos	$\frac{\text{No de vehículos con SOAT y técnico – mecánica}}{\text{No total de vehículos}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida. Se adjunta soporte en el Anexo No 1
Instalación del 100% de puntos ecológicos requeridos	$\frac{\text{No de puntos ecológicos instalados}}{\text{No de puntos ecológicos requeridos}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida. En la figura 7 se evidencia la instalación del punto ecológico.
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.	$\frac{\text{No de actividades ejecutadas}}{\text{No de actividades programadas}} \times 100$ $\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.
Realización del 100% de los monitoreos de la calidad de sedimentos programados	$\frac{\text{No de monitoreos de calidad de sedimentos realizados}}{\text{No de monitoreos de calidad de sedimentos programados}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.

5.1.3. P-MA-P3 Programa de control de la calidad del agua superficial

Tabla 4: Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del agua

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO							CODIGO: P-MA-P3
Programa 3: Programa de control de la calidad del agua superficial							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
7. Medidas para mitigar la alteración del régimen de drenaje de las aguas							
7.1. <u>Los cortes y rellenos se realizarán de manera que no obstruyan el normal escurrimiento de las aguas superficiales</u>							
La actividad de remoción de sedimentos y construcción de geocontenedores se realiza con las precauciones técnicas necesarias, con el fin de evitar obstrucciones en el escurrimiento de las aguas.							

Figura 12: Construcción de geocontenedores



Actividades de construcción de geocontenedores

7.2. No se permitirá el vertimiento de basura, o cualquier otro tipo de desecho (troncos, maderas, hierba, etc.) que puedan represar las aguas de escorrentías.

Tal como se relaciona en el numeral 2.2. y se observa en la Figura 7, el proyecto cuenta con un punto ecológico en el frente de obra para manejar los residuos que se generan producto de las actividades.

7.3. Evitar la circulación de equipo pesado en áreas fuera de los sitios de trabajo, para evitar la compactación innecesaria de suelos ya que se impermeabilizan y aumenta la escorrentía.

La maquinaria usada se limita a realizar las labores dentro del cuerpo de agua intervenido.

8. Medidas para el control de la alteración del nivel freático local

8.1. No obstaculizar la infiltración natural de las aguas superficiales.

Las actividades se realizan con las precauciones técnicas necesarias, con el fin de evitar problemas con la infiltración del agua.

8.2. Construir las obras de drenaje y cunetas que sean estrictamente necesarias para evitar un escurrimiento acelerado de las aguas superficiales, de modo que no sea afectado el mecanismo de alimentación de las aguas subterráneas.

Para el periodo reportado no ha sido necesario construir obras de drenaje como tampoco cunetas.

9. Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales

9.1. Instalación de baterías sanitarias portátiles en los frentes de trabajo

Para el periodo reportado se contrató la prestación del servicio de alquiler y mantenimiento de dos (02) baños portátiles a la empresa Multitanques S.A.S. El servicio posee las siguientes características:

- Dos (02) mantenimientos semanales
- Succión de residuos a través de vehículo Vactor
- Limpieza interna con agua y jabón
- Aplicación de Químico Retrocho (desintegrador de olores)
- Suministro de Papel higiénico (1 Rollo por baño en cada mantenimiento)
- Transporte de entrega y recogida
- Personal Operativo idóneo

La empresa cuenta con el plan de contingencias para la recolección y el transporte de residuos peligrosos, no peligrosos y sustancias nocivas por parte de la autoridad ambiental distrital DADSA.

Figura 13: Baterías sanitarias en el frente de trabajo



Baterías sanitarias en el frente de obra para uso de los trabajadores

9.2. Evitar la acumulación de basura o desechos tóxicos que al contacto con el agua pueda contaminarla y esta a su vez al filtrarse en suelos pueda contaminar aguas subterráneas.

Como se relaciona en el numeral 6.3 y se observa en la Figura 10, el proyecto cuenta con un punto ecológico en el frente de obra para manejar los residuos que se generan producto de las actividades.

9.3. En el evento de realizar lavado de maquinarias se debe dirigir las aguas producto de esta actividad, a un sistema de retención de sedimentos y separador de grasas y aceites.

Para el periodo reportado no se ha requerido realizar lavado de la maquinaria amarilla usada para las actividades del proyecto.

9.4. Se suspenderá la operación de remoción, y se efectuará la reparación inmediata de las averías en la tubería de descarga o en sus uniones, que originen descargas incontroladas fuera del sitio aprobado para el vertimiento.

Para el periodo reportado se tomaron las acciones necesarias para evitar contingencias con las tuberías de conducción de gas que se encontraban en los tramos intervenidos.

9.5. Se efectuará un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en tres (3) puntos previamente georreferenciados por cada cuerpo de agua a intervenir en dos (2) momentos, es decir, antes y después de la ejecución del proyecto.

Para el periodo reportado no se encontraban programadas tomas de muestras para medir calidad de aguas.

No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	No se obstruirán pasos de agua	X			
2	Se instalarán baterías sanitarias portátiles	X			
3	Se dispondrá adecuadamente los residuos sólidos y líquidos	X			
4	Kit para el control de derrames	X			
5	Atención de derrames			X	
6	Supervisión del suministro de combustibles	X			
7	Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales	X			
8	Movilización y desmovilización de equipos	X			
META		INDICADOR			OBSERVACIONES
Realización del 100% de los monitoreos de la calidad del agua programados		$\frac{\text{No de monitoreos de calidad de agua realizados}}{\text{No de monitoreos de calidad de agua programados}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			El proyecto cumple la meta establecida.
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.		$\frac{\text{No de actividades ejecutadas}}{\text{No de actividades programadas}} \times 100$ $\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$			El proyecto cumple la meta establecida.

5.2. PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO

5.2.1. P-MB-P1 Programa de protección de fauna y flora.

Tabla 5: Ficha de seguimiento al Programa de protección de fauna y flora.

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO BIÓTICO								CODIGO: P-MB-P1
Programa 1: Programa de protección de fauna y flora.								
TIPO DE MEDIDA								
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	X	
10. Medidas para mitigar la afectación de la flora presente en el área de influencia								
<p>10.1. <u>Delimitación del área de labores del proyecto</u> Las actividades desarrolladas en el periodo reportado han requerido el movimiento constante de la maquinaria y equipos; por lo que, no se requirió de realizar una delimitación del área de labores.</p> <p>10.2. <u>Se determinarán los individuos forestales que podrían ser eliminados para la ejecución de las actividades que componente el proyecto.</u> Para el periodo reportado la corporación remitió al CONSORCIO ICASM2023 el concepto técnico de autorización para la intervención de los árboles relacionados en el inventario forestal presentado. Dentro del cual la CAR relaciona, aval para intervenir cincuenta (50) individuos forestales y un volumen de madera total de 19.63 m³</p> <p>10.3. <u>Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados.</u> Para el periodo no se reporta tala de árboles ni acumulación de material vegetal.</p> <p>10.4. <u>No depositar los restos vegetales en sitios donde se obstruyan cauces de agua y que finalmente pueden ser arrastrados hacia los cuerpos de agua.</u> Para el periodo reportado no se realizó la intervención individuos forestales.</p> <p>10.5. <u>En ninguna circunstancia se depositará vegetación en áreas donde se obstruyan canales de drenaje, sin embargo, en algunos casos se podrá utilizar la vegetación como barrera para control de erosión.</u> Para el periodo reportado no se realizó remoción de material vegetal en los tramos intervenidos.</p> <p>10.6. <u>Cuando sea estrictamente necesario la poda de árboles, las mismas se realizarán por personal capacitado</u> Para el periodo reportado no se realizó poda de árboles en los tramos intervenidos.</p>								
11. Medidas para el control a la perturbación de la fauna silvestre								
<p>11.1. <u>Realizar labores de preferencia en horarios diurnos, ya que durante la noche se incrementa el ruido</u> Para el periodo reportado todas las actividades se están ejecutando en horario diurno.</p> <p>11.2. <u>Dirigir las luces si se labora de noche, hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna.</u> Las actividades desarrolladas en el periodo reportado se llevaron a cabo en horario diurno.</p> <p>11.3. <u>Minimizar lo más posible la intensidad lumínica utilizada</u> Las actividades desarrolladas en el periodo reportado se llevaron a cabo en horario diurno.</p> <p>11.4. <u>Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.</u> Para el periodo reportado se llevó a cabo la actividad de ahuyentamiento sonoro por medio de disturbios prolongados de 5 minutos utilizando para tal una corneta o vuvuzela de amplio alcance, con el fin de determinar a su vez la presencia de la fauna dispuesta en el área del recorrido. Sin embargo, las labores diarias de remoción de sedimento se efectúan sin el uso de este tipo de herramientas.</p>								

Figura 14: Actividades de ahuyentamiento en el área de influencia del proyecto



Protocolo de
ahuyentamiento
ejecutado por el
equipo profesional

11.5. Mantener los equipos en buenas condiciones y disponer de sistemas de escapes adecuados y eficaces.

Tal como se describió en el numeral 1.1 la maquinaria utilizada en el proyecto diariamente es revisada por el personal operativo, información que es registrada en los formatos de preoperacionales efectuados.

11.6. Mantenimiento periódico a la maquinaria y equipos a motor que sean empleados durante las actividades del proyecto

Para el periodo reportado se relaciona el cumplimiento del mantenimiento preventivo cumplidas las 250 horas de trabajo de las maquinas.

12. Medidas para el control al incremento de la cacería furtiva

12.1. Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva

Dentro de las charlas desarrolladas en el mes reportado se informó en cuanto a la prohibición de prácticas que van en contra de la preservación y conservación de la flora y fauna silvestre.

12.2. Prohibir o regular el uso de armas de fuego dentro del área del proyecto.

Dentro de las charlas desarrolladas en el mes reportado se informó en cuanto a la prohibición de portes de armas de fuego dentro del frente de trabajo.

12.3. Coordinar con las autoridades competentes la vigilancia del área para evitar, en lo posible, la entrada de cazadores furtivos.

Para el periodo reportado no hubo presencia de cazadores furtivos.

12.4. Implementar un programa de capacitación y educación ambiental para los trabajadores, antes de iniciar los trabajos estos deben recibir información acerca de la normatividad referente a la importancia de la protección de los recursos naturales

Dentro de las charlas desarrolladas en el mes reportado se informó en cuanto a la importancia de proteger los recursos naturales.

13. Medidas para el rescate y salvamento de especies

13.1. Salvamento de especies, que brinde atención temporal a las especies.

El proyecto cuenta con un equipo profesional en campo que brinda atención oportuna a las especies que se rescatan en el área de labores.

13.2. Coordinar con la autoridad ambiental, para garantizar la reubicación inmediata y adecuada de especies.

Para el presente periodo no se realizó el rescate y reubicación en el área de influencia del proyecto.

13.3. Identificar y adoptar esquemas de cooperación, que faciliten el rescate, atención y rehabilitación de especies

Para esta actividad se acogió el Protocolo de CORPAMAG para el manejo de fauna silvestre, el cual fue adaptado para las obras ejecutadas por el CONSORCIO ICASM 2023, dentro del cual se contemplan las acciones desarrolladas para garantizar que se salvaguarde la fauna presente en el área de labores.

No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Demarcar el área de desarrollo de actividades	X			
2	Establecer avisos de conservación de fauna silvestre	X			
3	Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva	X			
4	Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados, y en lo posible mezclarla con el suelo para su aprovechamiento	X			
5	En caso de que se necesite podar individuos forestales, dicha actividad deberá efectuarse con personal idóneo.			X	Para el periodo reportado no se hizo necesario realizar poda de individuos arbóreos
6	En lo posible todas las labores serán realizadas en horarios diurnos, en caso de que sea necesaria la operación nocturna dirigir las luces hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna	X			
7	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
8	Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.	X			
9	Educación ambiental para los trabajadores sobre protección de los recursos naturales.	X			

10	En caso de intervenir árboles, se realizará la compensación forestal en una relación de 1:4	X			Se intervinieron siete (07) arboles, los cuales serán compensados según lo establecido por la CAR.
META		INDICADOR			OBSERVACIONES
Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento		$\frac{\text{No de mantenimientos realizados}}{\text{No de mantenimientos programados}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			El proyecto cumple la meta establecida. Se adjunta soporte en el Anexo No 2
Compensación forestal del 100% de los árboles extraídos		$\frac{\text{No de árboles intervenidos}}{\text{No de árboles inventariados}} \times 100$			Para este mes no se realizó intervención de individuos arbóreos
Utilizar como mínimo el 50% de la madera extraída		$\frac{\text{Volumen total de madera donada o usada para el proyecto}}{\text{Volumen total de madera extraída.}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			El proyecto cumple la meta establecida.
Contratar al 85% del personal de monitoreo del protocolo de ahuyentamiento y rescate fauna silvestre		$\frac{\text{Cantidad de personal contratado}}{\text{Cantidad de personal requerido}} \times 100$ $\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$			El ahuyentamiento de acuerdo con lo establecido en el protocolo se efectúa a través de la generación de ruido con cornetas o vuvuzela de amplio alcance. El informe con registro fotográfico de las técnicas de ahuyentamiento, así como la de rescate y reubicación de los individuos, es realizado y presentado por el Biólogo líder del equipo de fauna silvestre.
Ejecutar el 100% de los métodos de ahuyentamiento de la fauna silvestre presentes en las áreas de la obra		$\frac{\text{No de técnicas de ahuyentamiento efectuadas}}{\text{No de técnicas de ahuyentamiento propuestas}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			
Rescatar y reubicar el 100% de los individuos de fauna silvestre que no pudieron ser ahuyentados		$\frac{\text{No de especies reubicadas}}{\text{No de especies capturadas}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$			

5.3. PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

5.3.1. P-MS-P1 Programa socioeconómico y cultural

Tabla 6: Ficha de seguimiento al Programa socioeconómico y cultural

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO							CODIGO: P-MS-P1
Programa 1: Programa socioeconómico y cultural							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
14. Medidas para reducir el incremento en el riesgo de accidentes laborales							
14.1. <u>Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.</u>							
Para el periodo reportado se realizaron charlas y capacitaciones ambientales a los trabajadores, para lo cual se anexa el soporte del registro de asistencia							

Figura 15: Jornada de capacitaciones ambientales



Espacio para las capacitaciones impartidas al personal de obra

14.2. Uso de los elementos de protección individual.

Para el periodo reportado se entregó la dotación y elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad según las actividades desarrolladas y lo indicado por el área de seguridad y salud en el trabajo. Lo cual se soporta con la figura 8 del numeral 3.4.

14.3. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

Dentro de las charlas efectuadas a los trabajadores por la profesional SST se informa acerca de la prohibición de consumos de bebidas alcohólicas y de llegar bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

14.4. El personal debe contar con afiliación a una entidad prestadora del servicio de salud (EPS) y a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP).

Para el mes de agosto se realizó el ingreso del personal a los sistemas de seguridad social, ante lo cual se anexa el soporte de seguridad social.

14.5. Asistencia a las reuniones de socialización de proyecto.

Para el periodo reportado se levantaron actas de vecindad y se efectuaron socializaciones con los líderes y entidades públicas competentes en el área de influencia del proyecto. Los soportes se presentan adjuntos en el informe realizado por el área social del proyecto.

Figura 16: Levantamiento de actas de cierre de vecindad del proyecto



Levantamiento de actas de cierre



14.6. Se ubicará una valla fija (1) de tipo informativo en la cual se presentará el nombre del contratista, el tiempo de ejecución de las obras y los responsables del proyecto, etc (de acuerdo con especificaciones). Esta se instalará en un lugar de fácil visibilidad tanto para peatones como para los conductores de los diferentes vehículos que transiten por la zona.

Para el periodo reportado se realizó la instalación de la valla informativa. Y se está a la espera del permiso de publicidad exterior visual para el elemento publicitario por parte del DADSA.

Figura 17: Valla informativa del proyecto



Valla informativa de la obra en ejecución

15. Medidas para controlar la migración y el establecimiento de asentamientos humanos:

15.1. Prohibir que en las instalaciones del proyecto se mantenga personal que no ha sido contratado directamente para trabajar en la obra.

Para el periodo reportado no se presentaron inconvenientes en cuanto a la presencia de personas externas a la obra.

No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.	X			
2	Uso de los elementos de protección individual	X			
3	Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas	X			

4	Prohibido hacer fuego en el área de influencia del proyecto	X			
5	Afiliación del personal a EPS y ARP	X			
6	Asistencia a reuniones de socialización	X			
7	Contar con valla del proyecto	X			
8	Restricción de personal no contratado en zona de trabajo	X			
META		INDICADOR			OBSERVACIONES
Efectuar el 100% de las actividades establecidas		$\frac{\text{No de actividades ejecutadas}}{\text{No de actividades que aplican}} \times 100$ $\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$			N.A.

5.3.2. P-MS-P2 Programa de manejo de residuos.

Tabla 7: Ficha de seguimiento al Programa de manejo de residuos.

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO							CODIGO: P-MB-P2
Programa 2: Programa de manejo de residuos.							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
16. Manejo de residuos sólidos							
<p>16.1. <u>Formar a los trabajadores sobre residuos sólidos</u> Dentro del programa de capacitaciones ambientales a los trabajadores, se les forma en lo relacionado al manejo integral de residuos. Así mismo, se les informa a cerca de la prohibición de quemas de cualquier tipo de residuo.</p> <p>16.2. <u>Contar con puntos ecológicos en obra.</u> Como se constata en el numeral 2.2. la obra cuenta con la instalación de un punto ecológico para el manejo en campo de los residuos generados por los trabajadores.</p> <p>16.3. <u>Eliminación apropiada de residuos sólidos.</u> Para el periodo reportado los residuos generados fueron dispuestos en el contenedor cercano al frente de obra; toda vez que, por la cantidad generada el operador de aseo en el Distrito no presta el servicio de recolección.</p>							

Figura 18: Actividades de aseo y limpieza del área de labores



Jornada de aseo y limpieza en el frente de trabajo y disposición final de los residuos ordinarios

17. Manejo de residuos líquidos

17.1. Realizar manejo apropiado de los residuos sanitarios o aguas residuales se generarán como resultado de la actividad humana durante el proyecto.

Para el periodo reportado solo se generaron residuos líquidos de características domesticas por el uso de los baños por parte de los trabajadores, tal como se observa en el numeral 10.1.

18. Manejo de residuos peligrosos

18.1. Los residuos peligrosos deben ser recolectados de manera apropiada.

Para la fecha no se ha generado la cantidad de residuos para ser dispuestos. Por lo que, para el mes de septiembre se estará relacionando las acciones ejecutadas para la disposición final de estos.

18.2. En caso de que sea posible hacer devolución al proveedor de materiales y residuos que lo permitan.

Para el periodo reportado no se generó la cantidad suficiente de residuos a ser entregados para su aprovechamiento. No obstante, se tiene contemplado realizar la entrega de materiales plásticos como botellas a una empresa recicladora autorizada en la ciudad de Santa Marta.

No	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Realizar la separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos y disposición final en los sitios autorizados	X			
2	Se instalarán baterías sanitarias portátiles	X			

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.	$\frac{\text{No de actividades ejecutadas}}{\text{No de actividades programadas}} \times 100$ $\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida

6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

6.1. Rescate de Fauna Acuática y Terrestre


Para esta actividad se estableció el PROTOCOLO ADOPTADO PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM 2023, que es ejecutado por el equipo de fauna silvestre. Los cuales rinden informe mensual de las actividades desarrolladas para este ítem.

6.2. Implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto

El PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, se encuentra en ejecución.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha de elaboración: Octubre, 2024.

Elaboró	Revisó y Aprobó
	
DAXY NIZAYÉN AGUAS BELEÑO Ingeniera ambiental T.P. No. 021024-0605777 ATL	ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA Especialista ambiental T.P. No. 08260-347316 ATL

8. ANEXOS

Anexo No. 1 Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes

Anexo No. 2 Mantenimiento preventivo de la maquinaria.

Anexo No. 3 Certificado de disposición final del material removido en escombrera y certificados de gestor autorizado y habilitado para el transporte de RCD del mes de septiembre

Anexo No. 4 Formato de registro y contenido de capacitaciones ambientales del mes de octubre

Anexo No. 5 Autorización del vehículo para transportar combustible

Anexo No. 6 Tarjetas de registro de maquinaria

Anexo No. 7 Guías de movilización de maquinaria

Anexo No. 8 Permisos ambientales para las baterías sanitarias

Anexo No. 9 Certificado del servicio de las baterías sanitarias para octubre



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 168431026

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVISION MILENIO MADRID

NIT: 900255863

**No. de Certificado de
Acreditación:** 11-OIN-009

Fecha de expedición: 2023/09/15

Fecha de vencimiento: 2024/09/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SVR312

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2389

NRO. MOTOR: KA24-787116A

NRO. CHASIS: 3N6DD25T4ZK943144

VIN: 3N6DD25T4ZK943144

LÍNEA: D22/NP300

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE G. FAJARDO G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NEBELMI OROZCO OROZCO



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10030166472

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SVR312	NISSAN	D22/NP300	2015
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.389	PLATA	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	GASOLINA	1012
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
KA24-787116A	N	3N6DD25T4ZK943144	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6DD25T4ZK943144	N	3N6DD25T4ZK943144	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	C.C. 12552112		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE FECHA IMPORT.

PUERTAS

032015000953577

1 07/07/2015

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.


FECHA VENCIMIENTO

27/08/2015

04/10/2023

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT07002723564

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2023	09	12	2023	09	13		2024	09	12



SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310008311201	SVR312	CAMIONETA	PÚBLICO	2389	2015
PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA			
2	NISSAN	1 - ESTACAS			
LÍNEA VEHÍCULO	D22/NP300				
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
KA24-787116A	3N6DD25T4ZK943144	3N6DD25T4ZK943144	1.01		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE GUSTAVO FAJARDO GONZALEZ		3144804195	CC	80076044	BOGOTA D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
45268	9310	45268	9310008311201	BOGOTA	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	
310	\$537,000.00	\$279,200.00	\$2,100.00	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR				HASTA 263,13 ¹	
\$818,300.00				701,68 ²	
FIRMA AUTORIZADA				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	
				HASTA 8,77	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	
				HASTA 180	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	
				HASTA 750	
				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas**.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Dedo haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

		INFORMACIO DE REGISTRO EN CAMPO N°010			
MODELO	R220LC-9S	NOMBRE OPERADOR OSCAR			
SERIE MOT	36735132				
VIN	HBRR220CEE0001461				
FECHA	19/06/2024	HOROMETRO	4764,8	HOROMETRO PROCIOMO MANTENIMIENTO	5014,8
CODICIONES /FALLAS REPORTADAD POR EL OPERADOR					
MATENIMIENTO 250 HORAS					
CAUSAS Y DIAGOSTICO					
MANTENIMIENTO POR EL FABRICANTE					
CORRECCIONES Y ODSERVACIONES					
CABIOS DE ACEITE					

REPUESTOS CAMBIADOS			
CANTIDAD	NOMBRES	CANTIDAD	NOMBRES
1	FILTRO ACEITE MOTOR		
2	FILTRO COMBUSTIBLE SIN VASO		
1	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		
1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO		
1	M-DEL VAC MX ESP ACEITE 15W40		
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR		
1	FILTRO DERNADO TANQUE HIDRAULICO		

TENICO MECANICO : OSCAR



		INFORMACIO DE REGISTRO EN CAMPO N°010			
MODELO	HX220		NOMBRE OPERADOR OLIVER		
SERIE MOTO	84948443				
VIN	HHKHK606EE0002154				
FECHA	9/05/2024	HOROMETRO	4163,6	HOROMETRO PROCIOMO MANTENIMIENTO	4422,6
CODICIONES /FALLAS REPORTADAD POR EL OPERADOR					
MANTENIMIENTO 250 HORAS					
CAUSAS Y DIAGOSTICO					
MANTENIMIENTO POR EL FABRICANTE					
CORRECCIONES Y ODSERVACIONES					
CABIOS DE ACEITE					
REPUESTOS CANBIADOS					
CANTIDAD	NOMBRES		CANTIDAD	NOMBRES	
1	FILTRO ACEITE MOTOR				
2	FILTRO COMBUSTIBLE SIN VASO				
1	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO				
1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO				
1	M-DELVAC MX ESP ACEITE 15W40				
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR				
1	FILTRO DERNADO TANQUE HIDRAULICO				
TENICO MECANICO : HAIDER					
<div></div> <div></div>					

B-D

INFORMACIO DE REGISTRO EN CAMPO N°010

MODELO	R220LC-9S	NOMBRE OPERADOR OLIVER			
SERIE MOTO	36734672				
VIN	HBRR220CH0001460				
FECHA	9/05/2024	HOROMETRO	1550,8	HOROMETRO PROCIOMO MANTENIMIENTO	1800,4
CODICIONES /FALLAS REPORTADAD POR EL OPERADOR					
MANTENIMIENTO 250 HORAS					
CAUSAS Y DIAGOSTICO					
MANTENIMIENTO POR EL FABRICANTE					
CORRECCIONES Y ODSERVACIONES					
CABIOS DE ACEITE					

REPUESTOS CANBIADOS			
CANTIDAD	NOMBRES	CANTIDAD	NOMBRES
1	FILTRO ACEITE MOTOR		
2	FILTRO COMBUSTIBLE SIN VASO		
1	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		
1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO		
1	M-DEL VAC MX ESP ACEITE 15W40		
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR		
1	FILTRO DERNADO TANQUE HIDRAULICO		

TENICO MECANICO : OLIVER





CERTIFICADO No. 24047 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-551	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 ABO. 2024 EN SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN. 38

Paola Milena Gomez Bolaño
PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERA SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA	<i>[Signature]</i>
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA	<i>[Signature]</i>



CERTIFICADO No. 24048 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-545	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 AGO, 2024 EN SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN. *38*

Paola Milena Gómez Bolaño
PAOLA MILENA GÓMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN, SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA	<i>[Signature]</i>
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA	<i>[Signature]</i>



CERTIFICADO No. 24049 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-546	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 AGO. 2024 EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

Zada Golus
PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó.	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

[Signature]



CERTIFICADO No. 24050 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-568	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 ABO. 2024 EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) 38
MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

CERTIFICADO No. 24051 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-571	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6° y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 ABO. 2024 EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) ³⁸
MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

Paola Milena Gomez Bolaño
PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERA SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

CERTIFICADO No. 24052 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-572	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO **GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.**

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

12 AGO. 2024

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION _____ EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

Zaida Gómes
PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

CERTIFICADO No. 24053 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
WLK-229	FREIGHTLINER	15.3 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 AGO. 2024 EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) ³⁸
MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

Paola Gómez
PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERA SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,
CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-550	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012


SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 AGO. 2024 EN SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) ³⁸ MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.


PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA	
Aprobó:	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA	



CERTIFICADO No. 24055 - R

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL —
DADSA- DEL DISTRITO DE SANTA MARTA,

CERTIFICA

QUE LA VOLQUETA:

PLACAS	MARCA	CAPACIDAD	PROPIETARIO	NIT o CC	RADICADO
KNL-549	FOTON	15.5 TON	INVERSIONES BYD S.A.S	901361588	240809012

SE ENCUENTRA INSCRITO COMO GESTOR AUTORIZADO Y HABILITADO PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN — RCD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Que, según informe técnico practicado al vehículo mencionado por el funcionario de la entidad, este cumple con todas las características y condiciones para el transporte de RCD. Que el transportador se obliga a cumplir con todas las exigencias de transporte que señala el Decreto Distrital 063 del 29 de marzo de 2016. Resolución 0230 del 2 septiembre 2020 y Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, art 6º y 20.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION 12 ABO. 2024 EN
SANTA MARTA, PREVIA SOLICITUD, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTID DE SU EXPEDICIÓN.

PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
DIRECTORA GENERAL

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, NI OTORGA PERMISO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN. SOLO CERTIFICA COMO GESTOR AUTORIZADO DE TRANSPORTE SE DEBERÁ SOLICITAR EL CITADO PERMISO ANTE ESTA ENTIDAD, CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Proyectó:	Ing. Yandy R. Torres Velásquez	Contratista SGA
Aprobó	Ing. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado	Profesional Universitario SGA

	FORMATO INFORME DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO: AMB_INF_001
		VERSIÓN: 001
		FECHA: 25-06-2024

FECHA	23 de octubre de 2024	HORA	7:30 A.M.
TEMA	Capacitación en manejo adecuado de los residuos sólidos en obra, código de colores e importancia de las fuentes hídricas.		
OBJETIVO	Explicar a los trabajadores las herramientas y conocimientos necesarios para la gestión adecuada de los residuos sólidos generados en el proyecto.		
LUGAR	Cuenca del Río Gaira, abscisa K2+840		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	CARGO	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"		

PARTICIPANTES

Nombre de los participantes	Cargo
*Se anexa listado de asistencia	

DESARROLLO

En el marco del seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y de Implementar un programa de capacitación continua del personal en general de obra enmarcado en la Ficha No. 6 "Programa Manejo de residuos", se viene desarrollando un plan de capacitaciones que tienen como objetivo minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente, así como limitar la exposición a riesgos brindando la orientación sobre el manejo de residuos líquidos, sólidos y peligrosos en el área de influencia del proyecto: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES". El objetivo de esta actividad fue realizar una capacitación con su respectiva retroalimentación para el fortalecimiento en temáticas ambientales, específicamente manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos.

Desarrollo de la actividad:

1. Primero, se dio la bienvenida a los participantes y se explicaron los objetivos de la capacitación y la importancia del tema.
2. En segundo lugar, se explicó los diferentes tipos de residuos sólidos generados en la obra (orgánicos, inorgánicos, reciclables, etc.). Además, se mostraron ejemplos reales de los diferentes tipos de residuos.
3. Posteriormente, se explicó el sistema de código de colores para la separación de residuos sólidos. Luego, se realizó una demostración práctica de cómo clasificar los residuos utilizando los colores designados.
4. A continuación, se discutieron las prácticas correctas de manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos.

5. Finalmente, se explicó cómo la mala gestión de residuos puede afectar a las fuentes hídricas y el entorno. Asimismo, se proporcionaron ejemplos de prácticas que ayudan a proteger las fuentes hídricas cercanas.
6. Se designó un espacio de 20 minutos para el desarrollo de la actividad y para compartir un refrigerio.

La actividad se desarrolló con un total de 11 personas, incluyendo a trabajadores y encargados de obra. Cada uno de los participantes contribuyó activamente durante las distintas etapas de la capacitación, lo cual facilitó un ambiente de aprendizaje colaborativo y práctico.

Registro fotográfico



Foto No. 001
 Fecha: 23 de octubre de 2024
 Actividad: Bienvenida y socialización de la capacitación.



Foto No. 002
 Fecha: 23 de octubre de 2024
 Actividad: Capacitación en Manejo adecuado de los residuos sólidos en Obra, código de colores e importancia de las fuentes hídricas.



Foto No. 003
 Fecha: 23 de octubre de 2024
 Actividad: Demostración práctica de clasificación de residuos sólidos.



Foto No. 004
 Fecha: 23 de octubre de 2024
 Actividad: Demostración práctica de clasificación de residuos sólidos.

FORMATO REGISTRO CAPACITACIÓN

CÓDIGO: AMB_FRC_001

VERSIÓN: 001

FECHA: 25-06-2024

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

CONSECUTIVO No	15	No DE PARTICIPANTES	11	FECHA	23-10-24	HORA	07:30 am
TEMA	Capacitación en Manejo adecuado de los residuos sólidos en obra, código de colores e importancia de las fuentes hídricas.						
OBJETIVO	Explicar a los trabajadores de obra las herramientas y conocimientos necesarios para la gestión adecuada de los residuos sólidos.						
LUGAR	Rto Gaira - Abscisa K2+840						
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Belero			CARGO	Ingeniera Ambiental		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Ubaldo Gaviria Legua	1083452974	ayudante	Ubaldo Gaviria
2	Ricardo Gubilner	1218745	ayudante	Ricardo G.
3	José Ponilla	1954780545	Oficial	José Ponilla
4	Ronald Mendoza	1082875319	ayudante	Ronald Mendoza
5	Edgar Rivera	7593881	ayudante	Edgar
6	Yhose Sanjuar R.	1082947445	ayudante	Yhose S.
7	Oliver Barrio C.	1.065.524.82	ayudante	Oliver B.
8	Belizario Dornacelli	19.588.995	Inspector	B3
9	Leonardo Magueta E	12.626.312	Topografía	Leonardo N.
10	Yelison Arencio	1192808247	Oficial	Yelison A.
11	Andrés F. Pontón Albor	1083003795	Ofidgo	Andrés F.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				
23				
24				
25				

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

Daxy A.

Anexo: Registro fotográfico

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta

Email: consorcioicasm@gmail.com

Página 1 de 1

	FORMATO INFORME DE CAPACITACIÓN		CÓDIGO: AMB_INF_001
			VERSIÓN: 001
			FECHA: 25-06-2024

FECHA	31 de octubre de 2024	HORA	7:00 A.M.
TEMA	Capacitación en manejo de residuos peligrosos.		
OBJETIVO	Capacitar en el manejo adecuado de residuos peligrosos generados durante las actividades del proyecto, para minimizar los riesgos de salud y el impacto ambiental.		
LUGAR	Cuenca del Río Gaira, abscisa K2+840		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	CARGO	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"		

PARTICIPANTES

Nombre de los participantes	Cargo
*Se anexa listado de asistencia	

DESARROLLO

En el marco del seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y de Implementar un programa de capacitación continua del personal en general de obra enmarcado en la Ficha No. 6 "Programa Manejo de residuos", se viene desarrollando un plan de capacitaciones que tienen como objetivo minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente, así como limitar la exposición a riesgos brindando la orientación sobre el manejo de residuos líquidos, sólidos y peligrosos en el área de influencia del proyecto: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES". El objetivo de esta actividad fue realizar una capacitación específicamente manejo y disposición adecuada de los residuos peligrosos con su respectiva retroalimentación para el fortalecimiento en temáticas ambientales.

Desarrollo de la actividad:

1. Inicialmente, se dio la bienvenida a los trabajadores y se explicaron los objetivos de la capacitación y la importancia del tema que consiste en la importancia de una correcta gestión de residuos peligrosos para la seguridad y el medio ambiente.
2. Luego, se explicó la definición de residuos peligrosos y se presentaron ejemplos de los tipos de residuos que pueden generarse durante la ejecución de la obra. Se detallaron residuos como aceites usados, baterías, filtros de aceite y material absorbente, provenientes de los equipos implementados en el desarrollo de las actividades del proyecto, como la maquinaria amarilla presente.
3. A continuación, se socializó el manejo adecuado de estos residuos, abordando aspectos como la recolección y el resguardo en los almacenamientos temporales dentro de la obra, y resaltando la necesidad de un manejo responsable para asegurar que sea ambientalmente seguro.

4. Finalmente, se recordó la ubicación del área de almacenamiento dentro de la zona de trabajo para su disposición y eliminación final por parte de empresas debidamente licenciadas.
5. Se designó un espacio de 20 minutos para el desarrollo de la actividad y para compartir un refrigerio.

La actividad se desarrolló en la Cuenca del Río Gaira, abscisa K2+840 con un total de 11 personas, incluyendo a trabajadores y encargados de obra.

Registro fotográfico



Foto No. 001
 Fecha: 31 de octubre de 2024
 Actividad: Socialización de la capacitación en manejo de residuos peligrosos.



Foto No. 002
 Fecha: 31 de octubre de 2024
 Actividad: Explicación del código de colores para los residuos peligrosos y ejemplos.



Foto No. 003
 Fecha: 31 de octubre de 2024
 Actividad: Demostración práctica del contenedor de residuos peligrosos.



Foto No. 004
 Fecha: 31 de octubre de 2024
 Actividad: Demostración práctica sobre manejo y áreas de almacenamiento de los residuos peligrosos.

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

CONSECUTIVO No 16 No DE PARTICIPANTES 11 FECHA 31-10-24 HORA 09:00 am
TEMA Capacitación en manejo de residuos peligrosos
OBJETIVO Capacitar en el manejo adecuado de residuos peligrosos generados durante las actividades del Proyecto para minimizar el impacto ambiental
LUGAR Río Gaira - Abzasa K2+840
PROFESIONAL RESPONSABLE Daisy Aguas Belén CARGO Ingeniera Ambiental

REGISTRO DE ASISTENCIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Edgar Rivera	4593881	ayudante	Edgar
2	Yhosee Sanjuar N	1082947445	ayudante	Yhosee S.
3	Oliver Barrio C.	1065.574822	ayudante	Oliver B.
4	Belizario Bonnarcelli	19.588.995	Inspector	BB
5	Leonardo Noguera C	12.629.312	Oficial	Leonardo N.
6	Ubaldo Gaviria Legua	1083452974	ayudante	Ubaldo G.
7	Ricardo Guedes	1218745	ayudante	Ricardo G.
8	Jose P. Nillo	1954780545	Oficial	Jose P. Nillo
9	Ronald Mendoza	1082875319	ayudante	Ronald Mendoza
10	Yelson Atencio	1192808247	Oficial	Yelson A.
11	Andrés F. Pontón Albor	1083003795	Biologo	Andrés F.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE *Daisy A.*
Anexo: Registro fotográfico

[Consulta Automotores](#)[Realizar otra consulta](#)

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TZW137

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022145850

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

NHR

MODELO:

2021

COLOR:

BLANCO NIEBLA

NÚMERO DE SERIE:

9GDNLR771MB005199

NÚMERO DE MOTOR:

4L2053

NÚMERO DE CHASIS:

9GDNLR771MB005199

NÚMERO DE VIN:

9GDNLR771MB005199

CILINDRAJE:

2999

TIPO DE CARROCERÍA:

TANQUE

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **01/02/2021**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

2218

PESO BRUTO VEHICULAR:

4100

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1508005555754000	 19/12/2023	 20/12/2023	 19/12/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPañía DE SEGUROS	 VIGENTE
15651500117510	 16/12/2022	 17/12/2022	 16/12/2023	310	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
82346806	 06/12/2021	 07/12/2021	 06/12/2022	310	COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S A	 NO VIGENTE
80229380	 29/01/2021	 26/11/2020	 25/11/2021	310	COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S A	 NO VIGENTE

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM).

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	 17/02/2024	 17/02/2025	CDA SUPER CARS E.U.	SI	171856241	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 17/02/2023	 17/02/2024	CDA SUPER CARS E.U.	NO	164750273	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad



Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

EDICTO

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

HACE SABER

Que en relación con la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., el Director de Hidrocarburos profirió una resolución cuyo encabezamiento y parte resolutive se transcribe a continuación para notificar de acuerdo con el artículo 28 la Ley 10 de 1961.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00695 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021

Por la cual se autoriza a COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., C.C.G.C. S.A.S., como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial

EL DIRECTOR DE HIDROCARBUROS RESUELVE:

Artículo 1. Autorizar a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., con NIT 900.662.992-6, para que actúe como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del vehículo de placa TZW-137, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Parágrafo: El registro de posteriores vehículos que requiera la citada empresa para el desarrollo de la actividad de comercializador industrial, podrá hacerse bajo el trámite directo en el Sistema de Información de Combustibles, SICOM, allegando previamente los documentos pertinentes para la verificación del Grupo de Downstream de la Dirección de Hidrocarburos.

Artículo 2. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3.92 del Decreto 1073 de 2015 y demás normas que las modifiquen o sustituyan.

Artículo 3. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 31348 del 24 de julio de 2015, modificada por la Resolución 31100 del 16 de marzo de 2020, que establece los procedimientos y condiciones operativas del Sistema de Información de Combustibles, SICOM, expedida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y las demás normas que la modifiquen o sustituyan, en lo que aplique a la calidad de agente que aquí se autoriza.

Artículo 4. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá solicitar de manera oportuna a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, la aprobación de las modificaciones que se requieran respecto a la presente autorización, remitiendo los documentos pertinentes para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y posteriormente informar al SICOM.

Artículo 5. Por la Oficina Asesora Jurídica notificar a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., al correo ssgranabastos@hotmail.com de acuerdo con la información registrada en la solicitud y RUES.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Parágrafo. Si no pudiere llevarse a cabo la notificación personal, se surtirá por Edicto en la forma y por el lapso estipulado en el artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 6. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante este Despacho dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 7. En firme esta resolución, por el Grupo de Downstream remítase copia al Sistema de Información de Combustibles, SICOM, para la actualización correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FDO: JOSE MANUEL MORENO C.
Director de Hidrocarburos

Para notificar la anterior providencia se fija el presente Edicto en el lugar público (página web de Minminas) y su vigencia será por el término de cinco (05) días hábiles a partir del **VEINTE (20) de Octubre de 2021** a las 7:00 a.m., con la advertencia de que contra la providencia transcrita procede recurso de reposición el cual puede ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la presente notificación ante la Dirección de Hidrocarburos.


ALEXIS VLADIMIR ORTIZ S.
Auxiliar Administrativo
Of. Asesora Jurídica
19.10.2021

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 701 PRINCIPAL SANTA MARTA
Fecha : 19/09/2023 Hora : 09:20:46
Cajero : LEM Caja : 345
Control : 442847-I

755 DADSA

3.800.739,00

Ref1: 15300

Ref2: 900662992

Ref3: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBL

Ref4:

TOTAL 3.800.739,00

Efectivo. 3.800.739,00
Vlr. Recibido. 3.800.739,00
Vlr. Cambio. 0,00
Cant. Recaudos. 1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor
revise que el detalle de la transacción
registrado en este comprobante, est, correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este
recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s)

O ADMINISTRATIVO DISTRITAL
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"
NIT. 819.006.386-6
ERA 12 26-16 SAVARIA TEL:3015936801
7101 ENTIDAD OFICIAL.

SERVICIOS AMBIENTALES 15300

COMBUSTIBLES Y
72 B Santa Helena

FECHA DE EMISION : 2023/06/15
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/06/23

VENDEDOR : 01 10:48
DOCUMENTO CONTABLE : 10- 15300

A FACTURA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR SUBTOTAL
-----------	----------	--------------	-------------

08 JUNIO 2023

1,0 3,800,739.00 3,800,739.00

S SERVICIOS DE EVALUACION Y/O.
CULO 338 DE LA CONSTITUCION...
S LEY 633 DE 2020 Y RESOLUCION
DEL MEDIO AMBIENTE.....

SUBTOTAL : \$ 3,800,739.00
DESCUENTO: \$ 0.00
TOTAL : \$ 3,800,739.00

CANCELADA EN SU TOTALIDAD,...

I.V.A. : \$ 0.00
IMPOCON : \$ 0.00
RETENED : \$ 0.00
RETENED : \$ 0.00

OTICAR RETENCION EN LA FUENTE

A PAGAR : \$ 3,800,739.00

OS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO

OBSERVACIONES: CONSIGNAR EN CUENTA CTE No. 701001638 BANCO GNB SUDAMERIS.

FIRMA ENTIDAD

RECIBIDO

Fecha
Nombre
Firma cc.

SOFTWARE CONTABLE Y FACTURACION "ACON".AUTOR: JUAN CONTRADO MORENO NIT. 73118288-8.....

GNB SUDAMERIS OFI: 701 RECAUDO 345 CAJ LEM
19/09/23 / 09:20:45 / 50 / 505 / 1
CTA 701001638
TOTAL/\$ 3.800.739,00

Código:
TA-FT-001

Fecha efectiva:
17/03/2016

Fecha de cambio:
17/03/2016

Versión:
1

Señores

Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA
La Ciudad

Ref.: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN.

Información General

Nombre Completo: Comercializadora de combustibles y gases del Caribe SAS.	
C.C.: NIT: No. 900682992-6	De: Orlando José Palomero Llanas
Nombre del Representante Legal: Orlando José Palomero Llanas	
C.C. No. 72.302.495.	De: Barranquilla - Atlántico
Dirección de Correspondencia:	
Dirección de Correspondencia alterna:	
Teléfono: 605-3857899	Celular: 3207682431
Correo Electrónico:	

Datos del proyecto, obra o actividad que requiere el permiso

Lugar del Proyecto	Municipio: Santa Marta
Corregimiento: Mapalera	Comuna: 9- LIBANO.
Ubicación Geoespacial	Geográfica: 11,13531° N, 74,21300° O

Breve descripción del Proyecto	Estación de Servicio - Comercio al por menor de combustible para automotores.
--------------------------------	---

Valor del Proyecto* acuda al instructivo que se encuentra en el reverso para calcular el valor total del proyecto

Valor en números	1.100.000.000	Valor pesos colombianos
Valor en letras	Un mil cien millones de pesos m/c.	

Tipos de permisos requeridos a la corporación

Licencia ambiental y/o modificación de la licencia ambiental.
Planes de Manejo Ambiental.
Diagnóstico de Alternativas Ambientales.
Plan de manejo, recuperación o restauración ambiental – PMRRA.
Permiso de exploración de aguas subterráneas, Renovación o Modificación.
Concesión de aguas subterráneas. Renovación o Modificación.
Permiso de Vertimientos. Renovación o Modificación.
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV-.
Permiso de Ocupación De Cauces. Renovación o Modificación.
Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas Renovación o Modificación.

DADSA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado No. 230525008
Fecha. 25-marzo-2016
Hora. 10:55 am
Asunto. solicitud
No de Folios 15 + Libro
Radicado por Liliana G

Código:
TA-FT-001

Fecha efectiva:
17/03/2016

Fecha de cambio:
17/03/2016

Versión:
1

Adecuación y restauración de suelo.	
Permiso o autorización de tala, poda, transplante o reubicación de árboles.	
Permiso de aprovechamiento forestal.	
Permiso para aprovechamiento de fauna silvestre.	
Registro de operación de empresas forestales.	
Seguimiento al manejo de residuos peligrosos RESPEL.	
Evaluación y seguimiento de proyectos de instalación de antenas radioeléctricas o de telecomunicaciones, celulares o similares.	
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	
Seguimiento ambiental a proyectos de construcción de obra civil.	
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y flora silvestre.	
Evaluación de Planes de Contingencia.	✓
Evaluación de estudios de emisiones con miras a verificar el cumplimiento de las normas de emisiones.	
Certificación en materia de Revisión de Gases -por Equipo-.	
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	
Evaluación de estudios de ruido	
Viabilidad Ambiental. Decreto 2324 de 1.984 (DIMAR).	
Investigación científica.	
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).	
Permiso o autorización para el transporte y disposición final de material sobrante de excavación y construcción.	
Demás instrumentos de manejo y control ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.	

Atentamente,


Firma Representante Legal
C.C. 72302495


Firma Contador
C.C. 72315290
TP. 122828-7
Presentar copia de la tarjeta profesional.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122828-T

FABIO ENRIQUE
MORALES MARENGO
C.C. 72315290
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD C.U. DE LA COSTA

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 137898



FIRMA DEL TITULAR 43974

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



LOSOFORMS S.S. 1066 08/2006

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.302.495**

RETAMOZO LLAMAS

APELLIDOS

ORLANDO JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1977**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-JUN-1995 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00248481-M-0072302495-20100806

0023301138A 1

3510890126



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32

Recibo No. 10206972, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - CCGC
S.A.S.
Sigla: CCGC S.A.S.
Nit: 900.662.992 - 6
Domicilio Principal: Soledad

MATRÍCULA

Matrícula No.: 581.033
Fecha de matrícula: 08 de Octubre de 2013
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación de la matrícula: 31 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CL63 AV MURILLO CR1 300
Municipio: Soledad - Atlantico
Correo electrónico: ssgranabastos01@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3857899
Teléfono comercial 2: 3857837
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 110 AV.CIRCUNVALAR # 43C - 735
Municipio: Barranquilla - Atlantico



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32

Recibo No. 10206972, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

Correo electrónico de notificación: ssgranabastos01@hotmail.com

Teléfono para notificación 1: 3857899

Teléfono para notificación 2: 3857837

Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 03/09/2013, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/10/2013 bajo el número 260.364 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - CCGC S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

"QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN

INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

"

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1258 de 2.008, la sociedad podrá realizar cualquier tipo de actividad comercial o civil, lícita. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad desarrollará especialmente lo siguiente: 1) La distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a través de una estación de servicio o como comercializador industrial mediante estaciones de servicios o carro tanques, 2) La industria, comercialización e intermediación en el mercado de combustibles líquidos, grasas, aceites y demás productos derivados del petróleo destinados al servicio de automotores en todas sus manifestaciones y 2) La industria, comercio e intermediación en el mercado de automotores en todas sus manifestaciones. En consecuencia la sociedad podrá: a) comercializar a nivel industrial combustibles líquidos. b) Organizar, adquirir, crear, enajenar, dar o tomar en tenencia, posesión o administración, variar su ubicación, radicación, destinación o adherencia, integrar y desmembrar toda clase de bienes muebles, inmuebles o inmateriales, establecimientos mercantiles, civiles, fabriles, docentes y demás, tales como estaciones, subestaciones, redes y similares para la conducción y suministro de combustibles y aceites en general toda clase de elementos, derivados del petróleo o no, necesarios para el funcionamiento o mantenimiento de automotores de toda clase y naturaleza; estaciones de servicio de lavado, engrase y rectificación de motores, balanceo, cambio o suministro de llantas y demás, con destino a toda clase de vehículos automotores; talleres de diagnóstico; mantenimiento preventivo o correctivo, repotenciación y/o



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32

Recibo No. 10206972, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

reparación de toda clase de vehículos automotores, exhibición, compraventa, intermediación, administración de concesiones y demás tanto para vehículos automotores como elementos de refacción o mantenimiento de los mismos; tramitación de licencias, concesiones y similares para la conducción, administración y en general toda clase de actividades conexas, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. c) Crear, aceptar, avalar, fiar, endosar, reponer, cancelar, reivindicar, dar o recibir en garantía o procuración hacer efectivos, judicial extrajudicialmente, toda clase de títulos incorporativos, declarativos o representativos de valor y adquirir, ceder, endosar y hacer efectivos toda clase de obligaciones comerciales, civiles o administrativas, relativas al cumplimiento de sus objetivos y constituir cauciones o garantías sobre los mismos. d) Importar, exportar, definitiva o temporalmente, por todo sistema legalmente admisible, toda clase de bienes o servicios necesarios o productos de sus actividades para el cumplimiento de los anteriores objetivos. e) Adquirir enajenar o gravar, cuotas sociales de participación o de capital y acciones de toda clase de sociedades o entidades, mercantiles, civiles o administrativas, cuyos objetivos sean compatibles directa o indirectamente por similitud o complementariedad, con los propios o incorporadas o fusionarse con ellas, de acuerdo con los estatutos f) comprar, almacenar, distribuir y comercializar al por menor de Gas Natural comprimido para uso vehicular en los suitidores dispuestos para tal fin. g) comprar, vender, almacenar, distribuir y comercializar al por mayor de combustible, aceites, lubricantes, y demás relacionados, a nivel nacional e internacional h) comprar, vender, distribuir; importar y exportar aceites, lubricantes y toda clase de productos para el mantenimiento de vehículos automotores. i) En general, realizar o celebrar toda clase de actos o contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32
Recibo No. 10206972, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

ADMINISTRACIÓN: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes entre otras: Autorizar la enajenación, el arrendamiento o entrega a cualquier otro título de la totalidad o de parte sustancial de la empresa social. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo de un GERENTE. El Gerente tendrá Un (1) Suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. En caso de falta absoluta o temporal del Gerente, el Suplente, con las limitaciones establecidas en los presentes estatutos, llevará la representación legal de la compañía. Son funciones del Gerente las siguientes entre otras: Constituir para propósitos concretos los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente; celebrar todos los actos y contratos necesarios para que la empresa desarrolle planamente sus fines, sin restricción o limitación de ninguna naturaleza.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 03/09/2013, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/10/2013 bajo el número 260.364 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Retamozo Llamas Orlando Jose	CC 72302495
Suplente del Gerente	
Velez Angulo Luis Fernando	CC 72152170

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 6 del 28/11/2017, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 27/12/2017 bajo el número 335.700 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal	
Fernandez Vera Jorge Humberto	CC 72150668

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	6	28/11/2017	Asamblea de Accionista	335.701	27/12/2017	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32

Recibo No. 10206972, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.

Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4731

Actividad Secundaria Código CIIU: 4732

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

SUPER STATION GRANABASTOS

Matrícula No: 581.034

Fecha matrícula: 08

de Octubre de 2013

Último año renovado: 2023

Dirección: CL 63 AV MURILLO CR

1-300

Municipio: Soledad - Atlantico

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSC



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32

Recibo No. 10206972, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: 12.519.062.933,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4731

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14860630739



(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 6 2 9 9 2

6

Impuestos de Barranquilla

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - CCGC S.A.S.-

36. Nombre comercial

CCGC S.A.S.

37. Sigla

CCGC S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Atlántico

40. Ciudad/Municipio

Soledad

7 5 8

41. Dirección principal

CL 63 AV MURILLO CR 1 300

42. Correo electrónico

ssgranabastos01@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 6 7 0 2 1 0

45. Teléfono 2

3 6 7 0 2 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

2 0 1 3 1 0 0 4

4 7 3 2

2 0 1 3 1 0 0 4

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 06 / 20 : 07: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14860630789



(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 6 2 9 9 2

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.
67. Sociedades y organismos extranjeros.

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0 0 0

73. Fecha

2 0 1 3 0 9 0 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 3 1 0 0 8

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 5 8 1 0 3 3

78. Departamento

0 8

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 1 3 0 9 0 3

81. Hasta

9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14860630789



(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 6 2 9 9 2

6. DV

6

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 1 0 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 2 4 9 5
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RETAMOZO	105. Segundo apellido LLAMAS	106. Primer nombre ORLANDO
		107. Otros nombres JOSE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 1 0 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 2 1 5 2 1 7 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido ANGULO	106. Primer nombre LUIS
		107. Otros nombres FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14860630789



(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 6 2 9 9 2

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 5 0 6 6 8		7 0 8 9 9 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	FERNANDEZ	VERA	JORGE	HUMBERTO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 7, 1 2 2 7			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14860630789



(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 6 2 9 9 2 | 6

Impuestos de Barranquilla

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - EDS GRANABASTOS		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Soledad	7 5 8
165. Dirección CL 63 AV MURILLO 1 300		
166. Número de matrícula mercantil 5 8 1 0 3 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 1 0 0 8	
168. Teléfono 3 8 5 7 8 9 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - EDS LIBANO		
163. Departamento Magdalena	164. Ciudad/Municipio Santa Marta	0 0 1
165. Dirección CL 53 43 57 VIA ALTERNA AL PUERTO		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 8 4 3 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 7 0 8	
168. Teléfono 3 8 5 7 8 9 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 94438

Nº. DE REGISTRO

MC429294

MARCA

HYUNDAI

LINEA

R220LC-9S

AÑO MODELO

2022

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

EXCAVADORA

Nº. SERIE

HBRR220CEE0001461

COLOR(ES)

AMARILLO

Nº. MOTOR

36735132

RODAJE

ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

22500 Kg

ALTO

3030 mm

ANCHO

3090 mm

LARGO

9530 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

**PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA S.A.S**

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO

02-03-2022

FECHA EXPEDICIÓN

02-03-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN


IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

482022000060814

FECHA DE LEVANTE

17/02/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033879



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT. 880903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal CL 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3806181
www.navitrans.com.co



Sede de Venta: CL 30 14 101, SOLEDAD - COLOMBIA, Tel 387 88 86

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020

Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93

Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0 40%

En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002

En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014

En Medellín somos Autorretenedores

Autorización numeración de facturación No. 18784024150882 del 2022-01-17 vigente hasta 2023-07-17 del ATSD140001 al ATSD160000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT/Cédula: 900481955-6

CL 24 2 66 O F 709 - SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA

Teléfono

Tercero Relacionado: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S

Email

contabilidad@bypconstrucciones.com, facturacionelectronica@bypconstrucciones.com

Condición Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ATSD141501		FECHA GENERACIÓN 22/02/2022 17:06:16	FECHA VENCIMIENTO 22/03/2022	PEDIDO DE VENTAS OV-3125937	NUMERO DE PLANILLA 52325967	PAGINACIÓN 1 de 1
MARCA HYUNDAI	PLACA	LÍNEA R220LC-9SB	MODELO R220LC-9SB	CANTIDAD (UND) 1 00 (94)	TIPO DE MOTOR MOT-2	A. MODELO 2022
N° MOTOR 36735132	FECHA MFTO 31/01/2022	LEVANTE 48202200089830	No. ADHESIVO DE PAGO 92492200370511	SERIE No.	VIN HBR220CEE0001481	COLOR
CÓDIGO R220LC-9SB	DESCRIPCION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS R220LC-9SB		VALOR UNITARIO 560.084 033.00	DIVISA COP	TOTAL 542.016.807 00	
DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION 900481955 B&P CONSTRUCCIONES S.A.S				PORCENTAJE 100 00	VALOR 542.016.807 00	

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: Visite nuestro sitio web www.navitrans.com.co Fecha Venc. Vr. Cuota 22/03/2022 215000000,00 22/04/2022 215000000,00 22/05/2022 215000000,00	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	560.084.034,00
	IVA 19,00%	542.016.807,00	102.983.193,33	DESCUENTO	18.067.227,00
				IVA	102.983.193,33
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	845.000.000,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (<http://WWW.NAVITRANS.COM.CO>)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTÁ Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015380 DAVIVIENDA Recauda: 1000595

CUIFE:ae21e71b770ca704738a64124e260b31b283a80cfa8a8c01255376253976e465434a1d053ae61f00b086f56970d4b550

Fecha de Validación: 2022-02-22 17:10:15-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NE: 890.321.151-0



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 93266

No. DE REGISTRO

MC399296

MARCA

HYUNDAI

LINEA

HX220S

AÑO MODELO

2022

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

EXCAVADORA

No. SERIE

HHKHK606VE0002147

COLOR(ES)

AMARILLO

No. MOTOR

84948558

RODAJE

ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

21260 Kg

ALTO

3110 mm

ANCHO

2990 mm

LARGO

9570 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

**PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA S.A.S**

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO

08-02-2022

FECHA EXPEDICIÓN

08-02-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

352021000510095

FECHA DE LEVANTE

18/01/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033863



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT: 890903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal CL 11 SUR 50 50 MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3606181
www.navitrans.com.co



Sede de Venta: CL 30 14 101, SOLEDAD - COLOMBIA, Tel 367 86 86
Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020
Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%
En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
En Medellín somos Autorretenedores
Autorización numeración de facturación No. 18764024150892 del 2022-01-17 vigente hasta 2023-07-17 del ATSD140001 al ATSD160000
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT/Cédula: 900481955-6
CL 24 2 66 O F 709 - SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
Teléfono
Tercero Relacionado: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
Email
contabilidad@bypconstrucciones.com facturacionelectronica@bypconstrucciones.com
Condición Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ATSD140295		FECHA GENERACIÓN 25/01/2022 09:55:13	FECHA VENCIMIENTO 25/02/2022	PEDIDO DE VENTAS OV-3109538	NUMERO DE PLANILLA 62325967	PAGINACIÓN 1 de 1
MARCA HYUNDAI	PLACA	LINEA HX220S	MODELO HX220S	CANTIDAD (UND) 1.00 (B4)	TIPO DE MOTOR MOT-2	A. MODELO 2022
N° MOTOR 64948558	FECHA MFTO 27/12/2021	LEVANTE 352022000025048	No. ADHESIVO DE PAGO 92352102347223	SERIE No.	VIN F09KHK606VE0002147	COLOR
CÓDIGO HX220S	DESCRIPCIÓN EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HX220S		VALOR UNITARIO 543 277 310.00	DIVISA COP	TOTAL 514 285 714.00	
DISCRIMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 900481955 B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.				PORCENTAJE 100.00	VALOR 514 285 714.00	
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: Visite nuestro sitio web www.navitrans.com.co . Fecha Venc. Vr. Cuota 25/02/2022 204000000.00 25/03/2022 204000000.00 25/04/2022 204000000.00	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	543.277.311,00
	IVA 19,00%	514.285.714,00	97.714.285,66	DESCUENTO	28.991.597,00
				IVA	97.714.285,66
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	612.000.000,00

Esta factura de Venta es negociable según la Ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía. Igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S. no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S., lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con flujos de uso genérico, no aptos para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (<http://WWW.NAVITRANS.COM.CO>)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 91842 AV. VILLAS Recauda: 477692257 BANCO DE BOGOTÁ Recauda: 393088186 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63019390 DAVIVIENDA Recauda: 1000295

CUPE: 91646bdc2d90295f72591b3b584bcb1946da3ef32970eccacbd3d3e70717ebate7dd10e0fc2732f67e0cbea
Fecha de Validación: 2022-01-25 09:54:37-05:00
Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-0

Fecha de Impresión: 2022-01-18 16:57:00

20211971973450



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 94432

Nº. DE REGISTRO

MC429119

MARCA

HYUNDAI

LINEA

R220LC-9S

AÑO MODELO

2022

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

EXCAVADORA

Nº. SERIE

HBRR220CHE001460

COLOR(ES)

AMARILLO

Nº. MOTOR

36734672

RODAJE

ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

22500 Kg

ALTO

3030 mm

ANCHO

3090 mm

LARGO

9530 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

**PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA S.A.S**

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO

02-03-2022

FECHA EXPEDICIÓN

02-03-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

482022000060812

FECHA DE LEVANTE

17/02/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033878

20222963988389



RESOLUCIÓN NO. 1538
(04 SEP. 2023)

"Por medio de la cual se llevan a cabo una modificación del vehículo de placas MC429119"

El Suscrito **SECRETARIO DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE**, del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 312 del 29 de Diciembre de 2016, Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 769 de 2002, en sus Artículos 3 determina que en el ámbito distrital son autoridades de tránsito los organismos de tránsito de carácter Distrital.

Que el parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 769 de 2002 manifiesta al tenor: "**Parágrafo 3°. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo, serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.**"

Que los principios rectores del código nacional de tránsito son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización, tal como lo establece el artículo 1°. De la ley 769 de 2002.

Que el día **5/09/2023** solicitó **B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado(a) con C.C. **900481955** quien figura como propietario(a) del vehículo de placas **MC429119**; En el sistema RUNT **ACTUALIZAR INFORMACION DEL AUTOMOTOR EN MENCIÓN.**

DATOS ACTUALES				DATOS CORRECTOS			
NRO	IDENTIFICACIÓN	DEL	GPS	NRO	IDENTIFICACIÓN	DEL	GPS
863427042337411				358077093314645			
EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS: SPECTRUM GLOBAL CONTROL S.A.S.				EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS: TRACKING SOLUTION TSO MOBILE S.A.S			

Que la Circular Radicado MT No.20174000494331 del Ministerio de Transporte establece el procedimiento para corregir y completar la información cargada en el sistema RUNT de los vehículos de transporte terrestre y puntualiza en el punto 2 la necesidad de emitir un Acto Administrativo motivado para realizar dicha corrección.



RESOLUCIÓN NO. 1538

(04 SEP. 2023)

Que con el fin de no hacer más gravosa la situación, este despacho en mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese la corrección; **ACTUALIZAR NRO. IDENTIFICACIÓN DEL GPS 358077093314645, EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS: TRACKING SOLUTION TSO MOBILE S.A.S** del vehículo **MC429119**.

ARTICULO SEGUNDO: Se ordena a la concesión SIETT migre esta información al Registro Único Nacional de Transito "RUNT" para que se lleve a cabo los ajustes en el sistema con relación al tema en particular.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese de la presente decisión a **B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado(a) con C.C. 900481955 quien figura como propietario(a) del vehículo de placas **MC429119**, de acuerdo al artículo 67 de la ley 1437 del 2011.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

04 SEP. 2023

Dado en Santa Marta, a los _____ del mes de _____ de _____

ERNESTO MARIO CASTRO CORONADO

SECRETARIO DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Proyectó:	ARIANA SAUMET - JEFE DE SISTEMAS	
Revisó:		





MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

PORTAL WEB

NRO. de GUIA 490641

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 16:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 94432		TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 900481955
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.			NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC429119
VIN: HBRR220CHE0001460	CHASIS: HBRR220CHE0001460		MOTOR: 36734672
SERIE: HBRR220CHE0001460	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429520000		IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 4764383678
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 19/06/2024
ORIGEN: Magdalena - CONCORDIA	DESTINO: Magdalena - CONCORDIA		<div></div> <div>FIRMA FUNCIONARIO</div>
DESCRIPCION DE LA RUTA: CONCORDIA,SANTA MARTA.VIAS NACIONALES.			
COLOR: AMARILLO	USO: OBRA CIVIL		



MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

PORTAL WEB

NRO. de GUIA 490641

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 16:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 94432		TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 900481955
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.			NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC429119
VIN: HBRR220CHE0001460	CHASIS: HBRR220CHE0001460		MOTOR: 36734672
SERIE: HBRR220CHE0001460	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429520000		IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 4764383678
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 19/06/2024
ORIGEN: Magdalena - CONCORDIA	DESTINO: Magdalena - CONCORDIA		<div></div> <div>FIRMA FUNCIONARIO</div>
DESCRIPCION DE LA RUTA: CONCORDIA,SANTA MARTA.VIAS NACIONALES.			
COLOR: AMARILLO	USO: OBRA CIVIL		



MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

PORTAL WEB

NRO. de GUIA 498234

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 16:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 9443B		TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 900481955
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.			NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC429294
VIN: HBRR220CHE0001461	CHASIS: HBRR220CHE0001461		MOTOR: 36735132
SERIE: HBRR220CHE0001461	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429520000		IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 4764383678
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/07/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 19/07/2024
ORIGEN: DON DIEGO Magdalena	DESTINO: SANTA MARTA Magdalena		<div></div> <div>FIRMA FUNCIONARIO</div>
DESCRIPCION DE LA RUTA: DON DIEGO ,SANTA MARTA.VIAS NACIONALES.			
COLOR: AMARILLO	USO: OBRA CIVIL		



MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

PORTAL WEB

NRO. de GUIA 490265

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 16:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 93266		TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 900481955
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.			NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC399296
VIN: HHKHK606VE0002147	CHASIS: HHKHK606VE0002147		MOTOR: 84948558
SERIE: HHKHK606VE0002147	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429520000		IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 4764383630
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 10/06/2024
ORIGEN: Magdalena - CONCORDIA	DESTINO: Magdalena - SANTA MARTA		<div></div> <div>FIRMA FUNCIONARIO</div>
DESCRIPCION DE LA RUTA: CONCORDIA MAGDALENA - SANTA MARTA MAGDALENA			
COLOR: AMARILLO	USO: CONSTRUCCION		



MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD

PORTAL WEB

NRO. de GUIA 490265

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 16:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 93266		TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 900481955
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.			NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC399296
VIN: HHKHK606VE0002147	CHASIS: HHKHK606VE0002147		MOTOR: 84948558
SERIE: HHKHK606VE0002147	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429520000		IDENTIFICACIÓN DEL GPS: 4764383630
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 10/06/2024
ORIGEN: Magdalena - CONCORDIA	DESTINO: Magdalena - SANTA MARTA		<div></div> <div>FIRMA FUNCIONARIO</div>
DESCRIPCION DE LA RUTA: CONCORDIA MAGDALENA - SANTA MARTA MAGDALENA			
COLOR: AMARILLO	USO: CONSTRUCCION		

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALUA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS PRESENTADO POR LA EMPRESA MULTITANQUES S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 901.089.396-2”

La Directora General del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL-DADSA, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley 99 de 1993, y el Decreto Nacional 1076 del 2015, la Ley 768 de 2002, y en especial lo dispuesto en el Acuerdo Distrital N° 016 del 27 de noviembre de 2002, modificado por el Acuerdo Distrital N° 005 del 27 de noviembre de 2003 y Decreto Distrital 312 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia reconoce a todos los habitantes del territorio Nacional, el derecho a gozar de un medio ambiente sano y, en ese sentido el artículo 7° establece que es una obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales y, el artículo 58 garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, pero así mismo establece que la propiedad cumple una función social y como tal le es inherente la función ecológica, pues no se puede explotar un recurso natural violando claros preceptos que protegen el medio ambiente.

Que el Artículo 79 de la obra mencionada, consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que a su vez, el Artículo 80, ejusdem, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que en el Artículo 95 de la Constitución establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano.

Que en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se establecen las funciones de las Corporaciones Autónomas autoridades ambientales y en especial, en el numeral 11 dispone:

11. “Ejercer las funciones de valuación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables ... así como otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental...”

12. “Ejercer las funciones de valuación, control y seguimiento ambiental de los usos de agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables e impedir el desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que conforme al artículo 66 de la Ley 99 de 1993, refiere las competencias de grandes centros urbanos, que ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que en consonancia con lo expresado en las normas anteriores, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, se dio nacimiento a la autoridad ambiental urbana del Distrito de Santa Marta, y en el Acuerdo

RESOLUCIÓN N° : 0056 -1- FECHA: 25 FEB. 2021

Distrital 005 de 2003, se señalaron como funciones las propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, debidamente discriminadas, para ejercerse dentro del área urbana del Distrito.

ANTECEDENTES

Que mediante Oficio con radicado No. 200113011, del trece de enero del año 2020, por medio del cual la empresa MULTITANQUES S.A.S., presenta la documentación correspondiente al Plan de Contingencia.

Que mediante Auto No. 0008 del 17 de enero de 2020, "Por medio del cual se da inicio al trámite ambiental de obtención del permiso de plan de contingencia para el manejo, succión, recolección de residuos peligrosos, no peligrosos y saneamiento ambiental solicitado por la empresa MULTITANQUES S.A.S. con NIT No. 901.089.396-2".

Que por medio del concepto técnico No 014 del veintinueve (29) de enero del 2020 el cual hace parte integra del presente acto administrativo, proyectado por el Ingeniero Ambiental y Sanitario Manuel Andrés Fuentes Cuadrado, la Subdirección de Gestión Ambiental del DADSA, evaluó el plan de contingencia presentado, aplicando como método de evaluación la valoración objetiva del conjunto de actividades, estrategias, análisis, resultados y conclusiones, establecidos para el desarrollo del proyecto, esta valoración abordó los siguientes aspectos:

(...)

16.1 PLAN ESTRATEGICO:

16.1.1 Filosofía, Objetivos, Alcance del Plan de Contingencia

Evaluando la documentación aportada por la empresa MULTITANQUES S.A.S. correspondiente al plan de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas en Santa Marta, se encuentra la introducción, objetivo general, objetivos específicos del Plan de Contingencia, enmarcados en el desarrollo de las actividades de recolección y el transporte de residuos peligrosos, no peligrosos, y sustancias nocivas

16.1.2 Análisis de riesgo, priorización de escenarios

La empresa MULTITANQUES S.A.S. acorde a la información especificada en el documento establece que la metodología propuesta para el análisis de riesgos, se determina la Priorización de los riesgos que servirá de base para la definición de acciones en el proceso de reducción del riesgo.

16.2 PLAN OPERATIVO

La empresa MULTITANQUES S.A.S. acorde a la información especificada en el documento, definen algunos planes operativos, pero deberán ser más específicos con lo que se plantea, indicando las metas, los objetivos, procesos y procedimientos por desarrollar en un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, suministros y servicios por utilizar y los responsables

(...)

Que por medio de comprobante de ingreso N° 1 – 002726 del veintiuno (21) de enero del 2021, se verificó el pago de la liquidación N° 11151, por un valor de TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTITRÉS, por la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con Nit 901.089.396-2.

Que una vez verificada la información allegada a esta Autoridad Ambiental la empresa TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP TECNIAMSA, identificada con NIT 805.001.538-5, por medio de la cual la empresa MULTITANQUES S.A.S.. identificada con NIT 901.089.396-2., realiza la disposición a través de incineración de los residuos peligrosos y disposición en celdas de seguridad de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, además, TECNIAMSA S.A. E.S.P, OPERA el relleno de seguridad bajo la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución N° 946 de 2010 y el horno bajo Resolución N° 462 de 2009 AUTORIZADAS por la CRA, CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL TRÁMITE AMBIENTAL

El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 del 2015, en su artículo 2.2.3.3.4.14., modificado por el artículo 7° del Decreto 050 de 2018 dispone:

"Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinan, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames".

"(...)

"El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario contados a partir de la expedición de la presente.

"Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, podrán solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado.

"Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado.

Por su parte el Artículo 2.2.5.1.9.3 de la obra mencionada, "Obligación de planes de contingencia. Sin perjuicio de la facultad de la autoridad ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinan, transformen, procesen, transporten, o almacenen hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables o el ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños, que deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación".

De las normas anunciadas se pueden sacar las siguientes conclusiones:

La obligación de estar provistos de un PLAN DE CONTINGENCIA,

¿Quiénes? todos aquellos usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinan, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos.

presentar EL PLAN DE CONTINGENCIA, con 30 días de anticipación al inicio de actividades; siempre que las actividades no estén sujetas a licencia ambiental.

Estudio o evaluación del Plan de contingencia y forma de pronunciarse la autoridad ambiental: La autoridad ambiental en donde se presente el Plan de Contingencia, puede solicitar los ajustes que se requieran, conforme a los términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el pronunciamiento se hará mediante acto administrativo.

Qué debe contener el Plan de Contingencia. El artículo 2.2.5.1.9.3 señala lo que deben contemplar el PLAN DE CONTINGENCIA, destacando: i) todo el sistema de seguridad, ii) prevención, organización de respuesta, equipos, iii) personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y iv) reparación de daños, RESALTANDO que deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente PARA SU APROBACIÓN".

RESOLUCIÓN N° : **0056** FECHA: **25 FEB. 2021**

Que haciendo un análisis interpretativo, bajo el método sistemático, nos lleva a concluir que no obstante la modificación que hizo el artículo 7° del artículo 2.2.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, en el sentido de excluir LA FRASE: "...el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente". Esta obligación de ser aprobado quedó vigente, en los términos del artículo 2.2.5.1.9.3, quien expresa en su parte final que el Plan de contingencia, "deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación".

Que por medio de la Resolución 009 de 2013 de esta autoridad, se reglamentó el trámite relacionado con el PLAN DE CONTINGENCIA, el cual ha de adecuarse a las exigencias actuales proferidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ante esta disposición vigente, no queda más que concluir que el Plan de contingencia que presente los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deben presentar un PLAN DE CONTINGENCIA, 30 días antes del inicio de sus actividades ante la autoridad competente del lugar donde ha de desarrollarse la actividad, bajo el lleno de los requisitos o términos de referencia que disponga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ese entendido, ha de evaluar y definir su aprobación, siempre que llene los requisitos a que hemos hecho referencia. A más de esto, habrá de ordenarse el seguimiento ambiental correspondiente.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El artículo 7° del Decreto 050 de 2019 en su Parágrafo 2° señaló que la presentación del Plan de Contingencia tiene el objetivo, entre otros, de ser objeto de seguimiento ambiental, respecto a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por los usuarios en dichos planes.

El Decreto 1706 de 1999, dispone lo concerniente al Seguimiento Ambiental y señala que mediante auto que se proferirá en el mes de enero de año siguiente a la fecha de este acto, se proferirá auto ordenando el seguimiento y se facturará el servicio, el cual deberá cancelar dentro de los 10 días siguientes a su notificación. De no hacerlo, se procederá a ser ejecutado por las vías de cobro coactivo.

En mérito de lo expuesto, la Directora General del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA-,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA, presentado por la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, para la recolección y el transporte de residuos peligrosos, no peligrosos, y sustancias nocivas.

PARAGRAFO: En dado caso de realizar alguna modificación en el plan de contingencia el cual hace referencia el presente acto la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, estará obligada a presentar el Plan de Contingencia a esta Autoridad Ambiental, en cumplimiento a la Normatividad Ambiental Vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá dar cumplimiento de las observaciones generadas por la revisión del Plan de Contingencia para la recolección y el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, en base a los términos de referencia contenidos en la Resolución No. 1209 del 29 de junio de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RESOLUCIÓN N° : **0056** FECHA: **25 FEB. 2024**

ARTÍCULO TERCERO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá presentar en un termino de quince (15) días hábiles los siguientes ítems para complementar el plan de contingencia con los términos de referencias definidos en la Resolución No. 1209 del 29 de junio de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Deberá PRESENTAR el Ítem 4.5 Identificación de los hidrocarburos o sustancias nocivas transportadas.
- Deberá COMPLETAR el Ítem 4.7 Georreferenciación.
- Deberá COMPLETAR el Ítem 6.2 Plan Operativo.
- Deberá PRESENTAR el Ítem 6.8 Reporte a la autoridad ambiental.

PARAGRAFO – Requerir el cumplimiento obligatorio de los ítems arriba mencionados, so pena de vernos a avocados a revocar la aprobación que se está otorgado mediante el presente acto, y consecuencia proceder de conformidad en lo establecido en la ley 1333 de 2009 la cual regula el procedimiento sancionatorio en materia ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá cumplir con los lineamientos, principios, y organización establecidos en el Plan de Contingencias.

ARTÍCULO QUINTO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, en caso de presentarse una emergencia, deberá activar oportunamente el Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de la empresa, y la localización del incidente.

ARTÍCULO SEXTO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá presentar de forma anual un informe que presente:

- a. Las estadísticas de mercancías peligrosas almacenada, donde se relacionen los datos (clase de mercancía, nombre de la mercancía, número UN, cantidad, peso, nombre del contratante o remitente y municipio origen).
- b. El estado de ejecución del programa de capacitación, entrenamiento y simulacros.
- c. Desarrollo de actividades y participación en comités locales y regionales para la prevención y atención de desastres; en planes de contingencia locales y planes de ayuda mutua.

ARTÍCULO SEPTIMO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, en caso de ocurrir un incidente, deberá presentar, dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la atención de la emergencia, ante el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA, un informe final escrito que detalle las circunstancias de la emergencia y las operaciones de control. El informe debe contener: fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a entidades gubernamentales; fecha y hora de finalización de la emergencia; localización, origen y causa de la emergencia, determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones); determinación de las comunidades afectadas; plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la emergencia; descripción de las medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y restauración adoptadas; apoyo necesario (solicitado y obtenido); reporte efectuados a entidades gubernamentales; estimación de costos de descontaminación (contención, recolección, almacenamiento, recuperación y/o limpieza). Así mismo reportar en los tiempos y formatos establecidos en el Decreto 321 de 1999.

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá notificar al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA, con quince (15) días de anticipación la realización de simulacros.

RESOLUCIÓN N° : **0056** FECHA: **25 FEB. 2021**

ARTÍCULO NOVENO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá notificar oportunamente al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA, cualquier cambio o modificación del Plan de Contingencia revisado.

ARTÍCULO DECIMO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá establecer acciones con los Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo del distrito y Consejo Departamental de Gestión de Riesgo del Distrito de Santa Marta, para efectos de conocimiento del Plan de Contingencia, entrenamiento de los integrantes de los Comités, equipamiento adecuado para atención de emergencias, establecimiento de canales de comunicación, protocolos, rutas, etc. de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá socializar el Plan de contingencia con los requerimientos solicitados por esta autoridad a los diferentes actores como son: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (funcionarios municipales, cuerpos de bomberos y grupos de apoyo, entre otros) así como las entidades y/o empresas especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido involucradas por parte del usuario en el plan y allegar actas de socialización firmadas al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, deberá realizar al menos un simulacro en el año del plan de contingencias. Se debe realizar con el conocimiento y la colaboración de todas las personas y entidades involucradas en el plan, para la adecuada implementación de este. Se deberá informar y coordinar la fecha del simulacro con la Oficina para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta – OGRICC. Las lecciones aprendidas deberán ser incluidas en la próxima revisión del plan y considerarlas como objetivos para los futuros simulacros.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Se le advierte a la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acto administrativo elaborado, o aquellas estipuladas en la normatividad RELACIONADA, acarreará la imposición de las sanciones establecidas en la LEY previo cumplimiento del procedimiento estipulado en la Ley No. 1333 de 2009, o aquella que lo modifique o sustituya y a la suspensión del permiso que por medio de acto administrativo esta autoridad ambiental otorgue.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Se le **INFORMA** a la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, que el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA, podrá establecer además de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo, todas aquellas que sean necesarias con ocasión de las alteraciones o impactos negativos sobre el ambiente natural y social no identificados o evaluados en su real magnitud en los documentos presentados por la entidad peticionaria, en virtud de la ejecución del conjunto de obras para la realización del proyecto.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: NOTIFIQUESE a la empresa MULTITANQUES S.A.S., identificada con NIT 901.089.396-2, el presente acto administrativo o a quien esta autorice por los medios legales conforme a los términos señalados en el artículo 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO : Contra el presente acto administrativo solo procede recurso de reposición ante la Directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA-, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, de conformidad con lo señalado en los artículos 74,76,77 y subsiguientes de la ley 1437 del 2011, por medio del cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo de y lo Contencioso Administrativo.

RESOLUCIÓN N° : **0056** FECHA: **25 FEB. 2021**


ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: PUBLIQUESE en la Página Web oficial del Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental - DADSA, el contenido de la parte resolutive del presente acto administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Santa Marta D.T.C.H, a los **25 FEB. 2021**



CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR
Directora General

Proyectó	Alvaro Andres Ibata Perez		Fecha: 22/02/21
Revisó	Jhonatan López González		Fecha:
Revisó	Jorge Saltaren Villegas		Fecha:





CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE MULTITANQUES S.A.S Y ECO GREEN RECYLING S.A.S E.S.P.

Lugar y fecha de celebración:	Barranquilla, 01 Enero de 2024
Domicilio contractual:	Barranquilla

CONTRATISTA	Nombre y/o Razón social	ECOGREEN RECYCLING SAS ESP
	Identificación	900.226.891-1
	Representante Legal	ANTONIO CARLOS ESPINOSA ESPINOSA
	Dirección	CRA 15 SUR No 80-132
CONTRATANTE	Nombre y/o razón social	MULTITANQUES S.A.S
	Identificación	901.089.396-2
	Representante Legal	MISAEAL ALBERTO BONETT OSPINO
	Dirección	CALLE 24 N 8B-31 BAVARIA-SANTAMARTA

Entre los suscritos, de una parte **ANTONIO CARLOS ESPINOSA ESPINOSA**, mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de Barranquilla, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.045.749.520 de Barranquilla, en nombre y representación de la sociedad y/o establecimiento denominada **ECO GREEN RECYLING S.A.S. E.S.P.**, con Nit. 900.226.891-1., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, de otra parte **MISAEAL ALBERTO BONETT OSPINO**, mayor de edad, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 85.459.933 actuando en nombre y representación de la sociedad y/o establecimiento denominado **MULTITANQUES S.A.S**, con Nit. 901.089.396-2, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, celebran por medio de este documento contrato de prestación, que se regirá por las norma civiles y comerciales que regulan la materia. En desarrollo del presente contrato, por las siguientes clausulas:

PRIMERA –OBJETO-: EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con diligencia y responsabilidad a favor del contratante, las actividades aquí pactadas, bajo la dirección y responsabilidad de este, entre ellas: Recolección, transporte, recepción de aguas residuales domésticas, oleosas o industriales, combustibles residuales o fuera de especificaciones y los que se deriven del giro ordinario de sus actividades, disposición de residuos sólidos misceláneos y/o peligrosos y se haga entrega para disposición final de conformidad al anexo técnico. **SEGUNDA- DURACIÓN-:** El termino será de un año (1) año contado a partir de la firma del mismo y podrá ser renovado automáticamente, si ninguna de las partes manifiesta con un preaviso de (1) mes antes del vencimiento, la voluntad de no seguir adelante con la renovación del mismo. **TERCERO-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-** Este se obliga: 1. Recepcionar en las fechas correspondientes el desecho, residuo, o sustancia relacionada en el anexo técnico que forma parte integral del presente contrato. 2. Darle disposición final a los desechos que ha recolectados y transportado, bajo estricto cumplimiento de las obligaciones que le

han sido impuestas por la autoridad competente. 3. Para el desarrollo de las actividades contratadas, deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones, que dispongan las autoridades competentes. 4. Deberá expedir los certificados de recepción o disposición final de los desechos relacionados en el anexo técnico y la de refrendar dichos certificados ante quien lo solicite.

. CUARTA:- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE- 1. EL CONTRATANTE deberá colocar los desechos convenidos, ubicados en los sitios de almacenamiento y empaques, con estricta observación de las normas que lo regulan para este fin. **2. EL CONTRATANTE**, deberá contar con todas las autorizaciones de tipo legal para el desarrollo de su actividad económica, en especial a todo lo concerniente al origen de los productos, sustancias, materias primas que para ella utiliza. **3. EL CONTRATANTE** es responsable ante el contratista, ante las autoridades y ante terceros de la procedencia y uso de los desechos que motivan este contrato. **4. EL CONTRATANTE**, se obliga a informar al momento de la cotización los días en los que se programará la recolección de los desechos. **QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.** Las partes se comprometen mutuamente a guardar estricta reserva de las condiciones y de lo que se conozca de procesos productivos de las partes que haya sido necesario exponer en alguna fase pre, contractual o post contractual. Solo se puede levantar esta reserva previa orden judicial. **SEXTA: SUPERVISIÓN.** Contratante, su delegado o representante, supervisarán la ejecución del servicio encomendado y tendrá plena capacidad para formular observaciones por inconformidades en la prestación del servicio. **SEPTIMA: PRECIO-** El valor del presente contrato se pacta en la cotización aceptada por el cliente, la cual se anexa al contrato y hace parte integral del mismo. **OCTAVA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE** se obliga con el contratista a cancelar los valores facturados por el servicio prestado, dentro de los treinta (30) días posteriores a la entrega de la factura o como se celebre el acuerdo de comercialización. **PARAGRAFO:** Se entiende que se constituye en mora, cuando los pagos no se adelanten dentro del plazo establecido en la factura o facturas adeudadas, en consecuencia deberá pagar intereses moratorios a la tasa legal vigente, la aceptación del pago por fuera de estas fechas en ningún caso puede ser tomado como modificación a lo que se ha pactado en el contrato y esto sin perjuicio que la reiterada mora, conlleve a la terminación unilateral del contrato por incumplimiento. **NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes y por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Si alguna de las partes se ve afectada por una circunstancia en la que opere fuerza mayor, caso fortuito o hecho de tercero, esta obligada la parte a notificarla por escrito dentro de los (5) días al acontecimiento del hecho generador, de establecerse por ambas partes la ocurrencia del hecho, se pactará los términos de la suspensión del contrato o la terminación del mismo. El presente contrato seguirá generando obligaciones para las partes, aun después de expirado el término duración o su prorrogación, hasta cuando se termine la ejecución de los servicios y las partes cumpla con la totalidad de sus deberes y obligaciones, para proceder a expedir el paz y salvo contractual, este último se expedirá una vez las partes den por satisfechos los compromisos pactados. El presente contrato, sus anexos y los documentos incorporados a él se tienen como: **“EL CONTRATO”**, el cual recoge el acuerdo total de las partes, en consecuencia sustituye cualquier negociación verbal o escrita que anteceda al mismo. Cualquiera modificación al presente contrato solo cobra validez con la firma de ambas partes. **DECIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El contratista actúa a nombre propio, por su propia cuenta y autonomía absoluta. Su personal no estará sometido a subordinación laboral con el contratante, y sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza

del contrato, en este sentido tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratante y el pago de los servicios aquí pactados. **DECIMA PRIMERA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN**

LABORAL. Por la naturaleza del presente contrato, el cual se rige por legislación civil y comercial vigente en Colombia, se descarta que exista vinculación laboral o subordinación entre las partes.

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO. El contratista no podrá ceder total, ni parcialmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa notificación y respectiva aceptación expresa por parte del contratante. **DECIMA TERCERA :** En caso de incumplimiento en la ejecución del presente contrato, la parte que resulte afectada, podrá exigir la cancelación de perjuicios mediante un proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria. Desde este contrato se fija que la parte que incumpla las obligaciones que le subsistan del mismo, renuncia desde ya a la formalidad de aceptación del documento, siendo suficiente la exhibición del presente contrato, junto a la declaración que se encuentra adeudando perjuicios causados. Quedando con esto constituido un pleno título ejecutivo.

Para constancia y perfeccionamiento del presente contrato, se suscribe por las partes, en la ciudad de Barranquilla el 01 de enero de 2024, se expiden dos (2) ejemplares de igual valor, que será entregado a las partes.

CONTRATISTA:



ANTONIO CARLOS ESPINOSA ESPINOSA

C.C. 1.045.749.520 de Barranquilla (Atlántico)

CONTRATANTE:

MISAEAL ALBERTO BONETT OSPINO

C.C. N° 85.459.933

20 OCT 2014

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LICENCIA AMBIENTAL A LA SOCIEDAD
ECOGREEN RECYCLING S.A.S

La Directora General del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Dama Barranquilla – DAMAB, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2.002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 2820 de 2010, la Resolución 1110 de 2.002 y el Decreto No. 0208 de 2.004, expedida por el Alcalde Distrital de Barranquilla y,

CONSIDERANDO

Que el DAMAB, mediante Resolución No 00978 de Septiembre 10 de 2009, otorgó licencia ambiental a la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING LTDA, la cual se transformó en una Sociedad de acciones simplificadas, quedando su razón social así: ECO GREEN RECYCLING S.A.S., identificada con el Nit No, 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 sur No. 80-132 Av. Circunvalar de éste Distrito, para almacenamiento, transporte y proceso de reciclaje de residuos fluidos aceitosos de las operaciones de mantenimiento industrial, petrolera marítima y de automotores a nivel nacional.

Que el Señor Alvaro Padilla en su condición de Representante Legal de la mencionada Sociedad hace entrega del complemento del Estudio de Impacto Ambiental y ajuste del plan de manejo ambiental para la modificación de la licencia ambiental aprobada mediante la Resolución No 00978 de Septiembre 10 de 2009, para almacenamiento, transporte y proceso de reciclaje de residuos fluidos aceitosos de las operaciones de mantenimiento industrial, petrolera marítima y de automotores a nivel nacional.

Fue procedente la evaluación del documento por parte de funcionarios adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental del DAMAB, quedando plasmado en el Concepto Técnico No. 2243 de Octubre 08 de 2014, que la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S., presenta complemento del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para incluir en su licencia ambiental la actividad relacionada con la recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores, bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22 y que pretende incluir en su licencia ambiental vigente, otorgada mediante Resolución 00978 de Septiembre 10 de 2009.

Que mediante Auto No. 0947 del 10 de Octubre de 2014, el DAMAB inició el trámite de modificación de la Licencia ambiental a la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S., el cual canceló la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (\$ 1.834.000.00) en la cuenta corriente No. 33436205 del Banco GNB SUDAMERIS, de ésta ciudad, a nombre del DAMAB, por concepto de costos de evaluación del complemento del estudio de impacto ambiental, de acuerdo a la consignación aportada el día 16 de Octubre de 2014.

Que funcionarios de la Oficina de Control y Vigilancia del DAMAB, procedieron a evaluar el complemento del estudio de impacto ambiental presentado por el representante legal de la Sociedad en mención, emitiendo el Concepto Técnico No. 2243 del 08 de Octubre de 2014, en el cual se establecieron los siguientes:

ASPECTOS ENCONTRADOS

La Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S presenta complemento del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para incluir en su licencia ambiental la actividad relacionada con la recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores, bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22 y que pretende incluir en su licencia ambiental vigente.

Se manifiesta en el complemento del EIA detalla que proyecto se encuentra localizado al sur del Distrito de Barranquilla, frente a la vía Circunvalar, se caracteriza por alto tráfico vehicular, al Norte del proyecto se encuentran los barrios 7 de Abril, Santo Domingo y Santa María, al sur limita con el barrio Las Granjas.

En los últimos años ésta zona se ha convertido en cordón industrial de lado y lado de la vía Circunvalar, se encuentran sinnúmeros de empresas dentro de las cuales se encuentran: MILEN LTDA, DEFAN, RITOPLAST, PETROMIL, LAS GRANJAS, entre otras.

En lo que respecta a la estimación del área de influencia indirecta del proyecto el complemento de EIA revela que se ubicó en cartografía de división política administrativa (Distrital) del Departamento de Atlántico y las coordenadas del proyecto y se observó la división política municipal coincidente con el mismo, encontrándose un Distrito. Igualmente con base en las actividades del proyecto y la condición socioeconómica del Municipio, se estimó si éste proveían al proyecto de los bienes y servicios y mano de obra calificada y no calificada necesarios para su desarrollo, encontrándose que si los provee y que no se requiere de otros municipios.

En el mismo orden de ideas para estimar el área de influencia directa del Proyecto, se revisó el documento de acuerdo del POT del Distrito de influencia indirecta y su cartografía de división política, posteriormente en la ubicación del proyecto, se identificó los barrios 7 de Abril, Santo Domingo y Santa María, al sur el barrio las Granjas otros proyectos de gran impacto como son la ampliación de la vía circunvalar hecho de ineludible impacto de la zona y en campo se verificó con GPS y con las entrevistas a los dirigentes comunitarios y funcionarios de la Secretaría de planeación su existencia y pertenencia al área de estudio. Igualmente, se verificó en campo si para el desarrollo de las actividades del proyecto se afectaban otros barrios por fuera del área de influencia, encontrándose que no se afectan otros barrios o centros poblados.

El complemento de EIA establece la siguiente clasificación del área de influencia:

- Área de Influencia Directa: Se ha tomado como criterios de selección el área de influencia directa la zona en la cual los efectos de las operaciones de la empresa modifiquen a muy corto plazo las condiciones del entorno físico, biológico y humano. Además de esto, hasta donde sea posible la calificación y cuantificación por cualquier método de evaluación que se determine de éstos efectos.

- Área de influencia Indirecta (AI): La determinación del área de influencia indirecta, se efectúa teniendo como base especialmente los cambios que se puedan presentar sobre el componente socioeconómico y cultural, más que sobre los elementos físico y biótico, puesto que en éstos últimos, generalmente los efectos se manifiestan de forma puntual.

Dentro de la descripción de las actividades objeto de modificación, la Sociedad ECO GREEN RECYCLING S.A.S presenta todos y cada uno de los pasos que seguirá en la actividad relacionada con la recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores, bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22 .

Los pasos que reseñamos en el párrafo anterior son:

1. Firma del contrato u orden del servicio.
2. Recolección de los aparatos en el punto de acopio del cliente; si en él sitio se encuentra otro tipo de residuos peligrosos diferentes a RAEE, que requieran un tratamiento especializado como incineración, tratamiento en planta de aguas residuales, químicas, emulsionadas u oleosas, serán transportados hasta la planta de Ecogreen Recycling S.A.S. para su tratamiento, Dicho servicio se cotiza a parte especificando el detalle de cada operación y el costo por kilogramo o galón a tratar.
3. En las instalaciones de almacenamiento y de cargue se toman registros fotográficos de los aparatos a recoger mientras son clasificados, pesados y acomodados dentro del furgón en cajas de madera o de cartón grueso montadas sobre estibas (palets).
4. Una vez que son debidamente cargados, se transportan en un furgón de carga seca habilitado por el Decreto 1609 de 2002 hasta la planta de reciclaje en la Avenida circunvalar Carrera 15 Sur No. 80-132. *Los aparatos eléctricos y electrónicos mientras se encuentren en sus estructuras originales, no requieren un transporte de residuos peligrosos. El manifiesto de transporte de carga por cada viaje realizado deberá ser emitido por el proveedor.*
5. Al llegar a la planta, los aparatos, partes y otros residuos se bajan en el área de descargue, en algunos casos con la ayuda de un montacargas. Se separan los lotes de cada generador o cliente, y se les asigna un número, marcando las estibas con aerosol amarillo encima del papel film o mediante un código de barras, que eventualmente se les puede asignar a cada aparato.
6. Luego cada lote pasa al área de pesaje y clasificación donde con el uso de una bascula se pesan los aparatos y demás residuos, se toman fotos a cada elemento pesado y se registran otros datos como la marca, y otras características físicas del equipo, luego son marcados con un stickers, con la identi-

cación del equipo para que puedan ser ubicados y monitoreados durante el proceso de desensamblaje, ésto permite saber la cantidad de materias primas recicladas y residuos peligrosos resultantes de cada cliente. En ésta fase, se determina cuál equipo o parte será reciclado y cuál puede reacondicionarse, el triage se realiza en base a las características físicas y estructurales del equipo y su tecnología.

7. Luego se realiza la clasificación (por tipo de aparato y por el grado de peligro de las partes), residuos como las baterías y las lámparas fluorescentes que tienen un tratamiento y/o una disposición final definida, pasan al área de almacenamiento temporal o al de almacenamiento de Respel.

8. Para el tratamiento de las lámparas fluorescente se utiliza el Bulb Eater que extrae el gas de mercurio mediante unos filtros y un sistema de succión que tritura el vidrio dentro del tanque, que se mezcla con las partes metálicas de las lámparas. Los filtros usados con contenido de mercurio que utiliza la maquina, se envían a disposición final en relleno de seguridad, mientras que la mezcla de aluminio y vidrio que contiene el tanque se puede someter a un proceso de separación por densidad con mallas, ya que las partículas del vidrio triturado son muy pequeñas.

9. Para los demás aparatos según su clasificación el tratamiento posterior es el desmontaje o desarme manual para extraer las partes contaminadas con residuos peligrosos para evitar que se mezclen con los recuperables en el siguiente proceso, y luego son destinadas al área de almacenaje de compuestos peligrosos para su posterior eliminación, tratamiento y disposición final. Las partes de plásticos, metales ferrosos y no ferrosos, circuitos, cables, etc. o mezclas de las mismas ya separados, pasan a una limpieza final, donde se retiran componentes más pequeños, se examinan y descartan partes.

10. En éste punto se separan y clasifican los distintos tipos de plásticos identificándolos por los símbolos de reciclaje, colores y su rigidez o flexibilidad, como los polietileno PS, polipropileno PP, poli cloruró de vinilo PVC, ABS entre otros, ya que al estar separados se valorizan.

11. Luego las partes pasan a la pre molienda, luego salen por una cinta de carga, donde las partes grandes de metal son extraídas por obreros situados a lado y lado de la cinta que transporta. El resto de partes pasan a un detector de metal que advierte la existencia de partes más pequeñas de metales ferrosos y no ferrosos, dejando solo las partes de plásticos en la cinta para que pasen al proceso de trituración final y pele tizado según el caso, dejando los distintos plásticos al tamaño requerido por el cliente según tipo y color de plástico, embalados en sacos de 20 y 40 kg normalmente. Cada método será llevado a cabo cumpliendo las normas de seguridad industrial y al previo estudio de carga de fuego y de Instalaciones eléctricas, y bajo inspección de la autoridad ambiental, sanidad, bomberos y bajo la observación de supervisores

res de la empresa y siguiendo el manual de seguridad propio de la empresa a fin de minimizar cualquier tipo de riesgo laboral.

12. Terminado todo el proceso de clasificación y desmontaje selectivo, se procede al embalaje por separado de dichos subproductos para su venta. El acopio del material reciclado de plásticos, metales ferrosos, metales no ferrosos, circuitos impresos, cables, conectores, motores, etc. se hace en bolsos o cajas, montados en estibas para su fácil manipulación y traslado dentro de la planta, los productos debidamente pesados e inventariados pasan al área de almacenamiento de productos, el producto recuperado se almacena hasta tener de 1 a 20 toneladas para ser vendidos.

13. Luego del proceso de embalaje con un montacargas o con las estibadoras hidráulicas se carga la mercadería a un contenedor con todos los permisos vía a refinerías de gran escala operativa en Europa o Estados Unidos o en el mercado interno a recicladores (metalurgias, vidrieros, etc.) y/o a exportadoras de metales. Estos procedimientos pueden ser la incineración/ fundido/ refinado (metales), o bien procesos químicos de extracción de metales preciosos para lograr mayor grado de pureza. Lo que logrará finalmente la obtención de subproductos aptos para su utilización, como materia prima en otros procesos (metales ferrosos, no ferrosos, vidrios y plásticos).

El complemento del EIA establece en detalle el manejo y comercialización del material recuperado así:

- Metales ferrosos y no ferrosos: Hierro, ferrita, lata, acero, cobre, bronce, aluminio, zinc, plomo, níquel, estaño, antimonio y otras aleaciones, en piezas y partes. se selecciona, se limpia, organiza y se destina a la fundición y fabricación de lingotes.
- Plásticos: Las partes o piezas de plástico se separan de los aparatos y se clasifican según su composición, luego pasan por un molino, para ser embalados en costales. resultan varios tipos de termoplásticos (abs, aps+pc, abs+fr, abs-fr) y plásticos pvc, abs y pp. cada tipo de plástico tiene características físicas y precios diferentes, por lo tanto la clave es separarlos al momento del desensamble, para evitar mezclarlos en el proceso de molienda mecánica.

Dice además que Los plásticos rígidos se separan y seleccionan, se limpian, se pasan por el molino mecánico y se embalan en sacos para enviarlos a recicladores de plásticos. Los plásticos blandos (PVC) resultantes de los cables, se aglutinan y se entregan a recicladores para inyección.

- Vidrios: con alto y bajo contenido de plomo. los vidrios con bajo o cero contenidos de plomo se rompen y embalan en sacos de 50 kilos, estos serán comercializados.
- Componentes y partes: Cables mezclados (cobre y aluminio), fuentes de poder, chatarra, transformadores, cartuchos de toners, bobinas de cobre, ventiladores, carcasa de dd, conectores, interruptores, unidades drive de

disco flexible y disco duro, piezas fundidas de aluminio grueso, tarjetas de circuito (tci) y metales preciosos.

Otro aspecto importante que relaciona el complemento de EIA evaluado guarda relación con la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales

- Aguas Residuales: Manifiesta la Sociedad solicitante que la actividad no utilizará agua por tanto no generará aguas residuales industriales, que en otras actividades del proyecto se generaran aguas residuales tipo domésticas e industriales, las cuales serán tratadas antes de su descarga al alcantarillado Distrital.
- Recurso suelo: Dice el Complemento del EIA, que La actividad de recolección, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores y que pretende incluir en su licencia ambiental vigente ECO GREEN RECYCLING S.A.S se desarrollará en una zona intervenida y un local ya existente es evidente que no habrá afectación al suelo, sin embargo es posible que un mal manejo relacionado con la gestión Integral de los residuos sólidos pudiera afectar éste componente y también recursos como aire y agua.
- Recurso aire: El complemento del EIA revela textualmente que éste recurso podría verse afectado por la emisión de Ruido, pero para ello ECO GREEN RECYCLING S.A.S , tendrá en cuenta el cumplimiento de la Resolución 627 del 2006 artículo 9, y el artículo 17 para ruido y ruido ambiental, tanto de día, como de noche, así mismo para comprobar que se estén cumpliendo con los decibeles máximos permisibles, se realizará un estudio de ruido cada año calendario, cumpliendo el artículo 16 de la Resolución 627 del 2006 y se comprará con el aquí anexo para verificar sus posibles variaciones.
- Residuos Sólidos Comunes: Se generan en las actividades diarias de la operación del proyecto en menor escala en la fase de adecuación, éstos se manejaran a través de programas de separación en la fuente..
- Residuos Sólidos Peligrosos : La disposición final de Respel mediante encapsulamiento en celdas de seguridad se realizara con la empresa Eco-Green Recycling S.A.S y/o con un tercero que preste este servicio, a donde se llevará mediante transporte autorizado por el DAMAB.

Otro ítem importante relacionado en el documento es que la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S presenta una propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental

En ésta propuesta de ajustes al Plan de Manejo se plantean las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes. Con éste fin se describen las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de

las actividades, en cuanto a los procedimientos de producción y comercialización considerando los cánones de protección del medio ambiente.

Para la formulación del ajuste al plan de manejo que presenta el Complemento del respectivo EIA tiene en cuenta los siguientes principios:

- Normativo: Todas las actividades que realice ECO GREEN RECYCLING S.A.S, deben cumplir con las normas establecidas con respecto a controles de ruido, emisiones de gas, manejo de residuos Peligrosos y domésticos, manejo de aguas residuales industriales, gestión social, control de emergencias y plan de contingencia contempladas en el EIA aprobado para su licencia.
- Institucional: En ésta propuesta de ajuste del plan de manejo establecerá los mecanismos para armonizar y comprometerse con las instituciones Gubernamentales (Autoridad Ambiental y Alcaldía Municipal entre otras), y a la comunidad en general a la implementación, vigilancia, control y monitoreo de las normas sobre ECO GREEN RECYCLING S.A.S.
- Monitoreo y vigilancia: Todo plan de manejo debe contemplar los programas de control, monitoreo y vigilancia, a partir de la identificación de variables, parámetros e indicadores como se contempló en el EIA inicial
- Evaluativo: La evaluación del plan de Manejo Ambiental se realiza a partir de la eficacia, eficiencia y efectividad de la utilización del recurso humano y económico con relación a los resultados esperados.
- Revisión y ajustes: Todo plan de manejo debe estar sometido a revisiones y ajustes a partir de los resultados del monitoreo, control y vigilancia, con el fin de realizar los ajuste pertinentes con respecto a los cambios introducidos y a la capacidad del ecosistema para aceptar éstos. En éste sentido el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para ECO GREEN RECYCLING S.A.S, busca ordenar las respuestas de manejo a los diferentes impactos identificados de acuerdo con la importancia calificada en la evaluación, considerando medidas preventivas, de mitigación, correctivas y compensatorias.

El complemento del EIA dice que ajuste del PMA que se presenta en éste documento se elaboró partiendo de la identificación de los efectos ambientales potenciales que pueden generar las diferentes acciones que debe acometerse para llevar a término las nuevas actividades de Recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22 .y que pretende incluir en su licencia ambiental ECO GREEN RECYCLING S.A.S, los efectos se entienden como el reflejo de una situación ambiental probablemente alterada, cuya atención requiere respuestas para evitar que sucedan o atenuarlos y corregirlos si no es posible evitarlos.

El objetivo del ajuste al plan de manejo ésta vez tiene como objetivo identificar las posibles consecuencias ambientales sobre el entorno físico, biótico y social, de las diversas actividades Recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22 . y de residuos de pilas y/o acumuladores, se reformula el Plan de Manejo Ambiental que se relaciona con cada una de las actividades desarrolladas.

Para el logro del objetivo anterior es importante según el documento:

1. Identificar los problemas ambientales existentes a lo largo del área de influencia, tanto directa como indirecta.
2. Definir las medidas de acción a nivel de control y operación que se deben seguir en cada uno de los componentes ambientales, cuya ejecución permite reducir y/o evitar los efectos sobre el medio natural.
3. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental.
4. Crear responsabilidades en la ejecución de acciones ambientales y en las labores respectivas de supervisión de las mismas.
5. Los Programas del presente Plan de manejo ambiental, han sido enmarcados en las fases de adecuación y operación de la empresa.

El ajuste del plan de manejo comprende tres fichas:

- a) Ficha No.1 Licencias, permiso y trámites
- b) Ficha No. 2 Manejo de residuos comunes y peligrosos
- c) Ficha No. 3 Manejo y control del ruido.

Cada ficha presenta los siguientes aspectos:

- d) Objetivos
- e) Impactos potenciales a mitigar
- f) Localización
- g) Componentes de la aplicación
- h) Norma aplicable
- i) Medidas de mitigación
- j) Acciones a desarrollar
- k) Indicador
- l) Responsable
- m) Monitoreo y control
- n) Fichas complementarias

Que el valor para implementar la nueva actividad es \$ 80.000.000

EVALUACIÓN

Para ésta evaluación nos enmarcaremos a lo que se establece en la norma vigente, en éste caso el Decreto 2820 del 05 de Agosto del año 2010 que en a su Título Quinto que su artículo 29 que dice que la licencia podrá ser modificada en los siguientes casos, entonces en el numeral uno establece textualmente: Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales a los ya identificados en la licencia ambiental.

Que efectivamente ALVARO PADILLA en calidad de representante legal de la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S titular de la Licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0978 del 10 de Septiembre del año 2009 pretende incluir una actividad que modifica el proyecto inicialmente licenciado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio ambiente

Barranquilla.- DAMAB.

Ahora bien la misma norma en su Artículo 30, establece los requisitos para la modificación de la licencia ambiental y comprende entre otros:

1. Solicitud suscrita por el titular de la Licencia.
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación.
3. El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda.

La evaluación establece que el documento presentado por el Señor Álvaro Padilla representante legal de la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S titular de la Licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0978 del 10 de Septiembre del año 2009, cumple también a cabalidad lo requerido en los numerales 1,2 y 3 del Artículo 30 del Decreto 2820 del año 2010.

Que partir de la fecha de radicación de ésta solicitud y dándose el lleno de los requisitos establecidos para el efecto, DAMAB cuenta con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de modificación el cual se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

El Decreto 2820 de 2010, dispone que la licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, la misma impone al beneficiario de ésta, el cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación a prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada; que mediante acto administrativo se otorgará licencia ambiental y el contenido de dicho acto, así:

“Artículo 28. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá:

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quién se autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón social, documento de identidad y domicilio.
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental.

5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso.
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad.
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente"

Que Los proyectos, las obras o actividades sujetos a la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales tal como lo dispone el Artículo 39 del Decreto 3930 de 2010.

Que de conformidad al Concepto Técnico No. 2243 del 08 de Octubre de 2014, se determina que es técnicamente procedente modificar la licencia ambiental en cuanto a agregar la actividad relacionada con la recolección, Transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores, bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22, a la Licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 978 del 10 de Septiembre de 2009. En virtud de lo antes expuesto se dispone que debido a la magnitud del proyecto se practicasen dos (02) visitas anuales de seguimiento ambiental a la pluricitada Sociedad, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, tal como quedará dispuesto en la parte resolutive.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 0208 de 2.004 en sus artículos 2 y 4, el DAMA BARRANQUILLA – DAMAB, es la máxima autoridad ambiental en el Distrito de Barranquilla.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0978 del 10 de Septiembre de 2009 a la Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S., identificada con el Nit No, 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 sur No. 80-132 Av. Circunvalar de éste Distrito, en el sentido de adicionar la actividad relacionada con la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores, bombillas de mercurio y sodio SAO_CFC 11, CFC 12 y HCFC 22. .

PARAGRAFO: La modificación de la licencia ambiental se entiende por la vida útil del proyecto, cobijará las fases de construcción montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación del mismo, de conformidad con el Artículo 6° Del Decreto 2820 De 2010.

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad denominada ECO GREEN RECYCLING S.A.S., identificada con el Nit No, 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 sur No.

80-132 Av. Circunvarar de éste Distrito, deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá dar cumplimiento a todas las fichas ambientales de la licencia ambiental y presentar los ICA cada seis (06) meses al DAMAB.
2. Deberá garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos, producto de la actividad económica que desarrolla.
3. Deberá dar estricto cumplimiento a lo contemplado en su plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos.
4. Deberá seguir contando con los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
5. Deberá comprometerse a mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 4741 de 2005.
6. Deberá capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgos que éstos residuos representan para la salud y el ambiente, además brindar el equipo para el manejo de éstos y la protección al personal necesaria para ello.
7. Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 4741 de 2005.

ARTICULO TERCERO: La Sociedad mencionada será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

ARTÍCULO CUARTO: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMAB- supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia, en los contenidos en el EIA. El incumplimiento de las mismas, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: En caso de presentarse durante el tiempo de operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, la Sociedad mencionada, como beneficiaria de la Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos u operaciones e informar de manera inmediata al DAMAB, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de las anteriores medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes

ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad mencionada, deberá avisar cualquier cambio que realicen en su empresa con respecto a su actividad productiva, dirección o política ambiental.

ARTICULO SEPTIMO: La presente providencia deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del DAMAB, a costas del interesado, quien deberá consignar el valor de

tres y medio salarios mínimos legales diarios por cada folio del presente acto administrativo, para un total de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. (\$862.428,00) en la cuenta corriente del DAMAB, No. 033436205 del Banco GNB SUDAMERIS, de éste Distrito, los cuales deberán ser cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la misma y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1.993.

La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata éste artículo, será causal suficiente para revocar y dejar sin efectos el presente acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO: El DAMAB, se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de la Sociedad mencionada, cuando lo considere necesario.

ARTICULO NOVENOO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante legal de la Sociedad mencionada y/o a su apoderado debidamente constituido.

ARTICULO DECIMO: La licencia ambiental otorgada a la Sociedad en mención, podrá ser modificada, cedida y estará vigente de conformidad a lo expuesto en los Artículos 28 a 37 del Decreto 2820 de 2010.

ARTICULO DECÍMO PRIMERO: Contra la presente providencia solo procede el recurso de Reposición ante la Directora General del DAMAB, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECÍMO-SEGUNDO: La presente providencia rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.



Dada en Barranquilla, a los 20 OCT. 2014


JACKELINE REINA SENIOR
Directora General- DAMAB

 Proyectó: Sandra S.
Revisó: Rita N.
Aprobó: Sara B. R. M.

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Barranquilla D.E.I.P a los 21 SET. 2014 días del mes _____ de 2014, se notificó personalmente de la presente Resolución No. 1845 de fecha 20 OCT. 2014 al señor (a) ALVARO ANGEL PADILLA MONTALVO identificado con cédula de ciudadanía No. 73.569.897 de Cartagena a quien se le entregó copia íntegra, auténtica y gratuita del mencionado proveído y se le informó que contra está procede legalmente el recurso de Reposición ante la Directora General del DAMAB dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


EL NOTIFICADO
EL NOTIFICADOR

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA- BARRANQUILLA

DAMAB
RESOLUCION No 1054
FECHA: 30 JUN. 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS
LÍQUIDOS Y SE IMPONEN UNAS OBLIGACIONES.

La Directora General del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla DAMAB, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, Decreto No. 0208 de 2.004, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla y el Decreto 3930 de 2010 y,

CONSIDERANDO

A través del Auto No. 0451 de fecha 16 de Junio de 2016, el DAMAB inicia el trámite de renovación de un permiso de vertimientos líquidos a la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit No.900.226.891-1, ubicada en la CARRERA 15 SUR No. 80-132 AV CIRCUNVALAR de éste Distrito.

Que el usuario en mención, canceló la suma de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 1.545.366), por concepto de costos de seguimiento del permiso de vertimientos líquidos y el valor de la gaceta de publicación del Auto No. 0451 del 16 de Junio del 2016.

Que Mediante Radicado No. 2969 de fecha 14-06-16, el representante legal de la empresa Ecogreen Recycling s.a.s, el señor ALVARO PADILLA, solicita visita de inspección técnica para renovación del permiso de vertimientos líquidos.

Que por parte de funcionarios adscritos a la Oficina de Control y Vigilancia del DAMAB, se practicó la respectiva visita el día 29 de Junio de 2016, en las instalaciones de la sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S, profiriéndose el Concepto Técnico No. 000954 del 29 de Junio de 2016 en el cual se establece:

ASPECTOS ENCONTRADOS

La actividad económica consiste en la recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos industriales y domésticos.

Para el tratamiento de las aguas residuales industriales y domesticas recogidas a terceros; cuentan con un sistema de tratamiento el cual consta de las siguientes unidades : Cribado y Trampas de grasas, Tanque de sedimentación, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente, Filtro multimedia y desinfección.

Se adjunta a la visita copia del pago del auto No. 0451 de fecha 16 de Junio de 2016.

EVALUACION

Se infiere que uno de los impactos ambientales que produce la sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S, se encuentra enmarcado en materia de residuos líquidos provenientes de las actividades de Tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas a terceros, los cuales son tratados mediante una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas (PTAR).

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA- BARRANQUILLA

DAMAB
RESOLUCION No 1054

FECHA:

30 JUN. 2016

providencia.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

El Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, dispone:

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años."

Que de acuerdo al Concepto Técnico No. 000961 del 29 de Junio de 2016, es procedente otorgar el permiso de vertimientos líquidos e imponer el cumplimiento de unas obligaciones, tal como se expresará en la parte resolutive de la presente providencia.

Que el Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la Ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1.993, la Ley 633 de 2.000 la Resolución 1110 de 2002, la expedición de los permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones ambientales establecidas en la Ley y normas reglamentarias deberán ser pagados a la autoridad ambiental los costos de trámite de los mismos por concepto de servicio de evaluación y seguimiento de acuerdo al sistema de cálculo de tarifas establecidas.

Que el Decreto No 0208 de Junio 7 del 2.004, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla creó al DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA BARRANQUILLA DAMAB, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones, las de recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar sus montos con base a las tarifas y sistemas de cálculos que fije la Ley.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos líquidos provenientes del tratamiento de residuos líquidos industriales y domésticos a terceros, a la sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit No.900.226.891-1, ubicada en la CARRERA 15 SUR No. 80-132 AV CIRCUNVALAR de éste Distrito, por el término de doce meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit No.900.226.891-1, ubicada en la CARRERA 15 SUR No. 80-132 AV CIRCUNVALAR de éste Distrito, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un término de treinta (30) días:

1. Deberá realizar anualmente y presentar al DAMAB, la caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado, de conformidad con la norma de vertimientos vigente.

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA- BARRANQUILLA
DAMAB

RESOLUCION No 1054

FECHA:

30 JUN. 2016

miento de aguas residuales. documento que podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente

ARTICULO TERCERO: La Sociedad en mención, deberá avisar al DAMAB, cualquier cambio que realice con respecto a su actividad productiva, dirección o política ambiental.

ARTICULO CUARTO: La Sociedad en mención, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución, en cumplimiento del principio de publicidad, deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del DAMAB, a costa del interesado, quien deberá consignar el valor de tres y medio salarios mínimos legales diarios por cada folio del presente acto administrativo, para un total DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L (\$241.308), en la cuenta corriente del DAMAB N° 033436205 del Banco GNB-SUDAMERIS, los cuales deberán ser cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del mismo.

ARTICULO SEXTO: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla DAMAB, se reserva el derecho de realizar visitas en las instalaciones del usuario, cuando lo considere necesario.


ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al representante legal de la Sociedad mencionada, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Directora General del DAMAB, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO: La presente providencia rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 30 JUN. 2016


SARA BELEN RODRIGUEZ MANZUR
Directora General

Proyecto: Sandra S.
Revisó: Rita N.
Aprobó: Sara B. R. M.


DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA- BARRANQUILLA


DAMAB
RESOLUCION No 1054

FECHA: 30 JUN. 2016

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Barranquilla D.E.I.P., a los 13 del mes de Julio 2016 del 2015, se notifico personalmente de esta decisión el Señor(a) ALVARO PAZILLA MONTAÑO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 73.569.891 de CAABOYENA y T.P. No. 0 de 0 a quien se le entrego copia de la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y se le informo que contra esta procede legalmente el recurso de reposición ante la Directora del DAMAB, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


EL NOTIFICADO


EL NOTIFICADOR

RESOLUCION No.
FECHA

0842
15 JUN. 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE UNA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS A LA SOCIEDAD ECOGREEN RECYLING S.A.S. Y SE IMPONEN UNAS OBLIGACIONES

La Directora General del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1993, el Decreto 0351 de 2014 y el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado No. 2565 de abril 27 de 2018, el señor ALVARO PADILLA, en su calidad de representante legal de la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, solicita visita de verificación e inspección técnica a los vehículos de placas T-2396, T-3314 y DHM-525 y VWA662, con el fin de que se avale su cumplimiento con todos los términos dispuestos para el desarrollo de las actividades de transporte de residuos peligrosos y succión.

Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en el título II "De los derechos, las garantías y los deberes", capítulo III "De los derechos colectivos y del ambiente", artículo 80, consagra que: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,...

Que mediante el Decreto 1609 de 2002 se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, norma que incluye el transporte de residuos peligrosos.

Que la Ley 1252 de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones", en su artículo 8 dispone: "El (...) transportador de un producto o sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la presente ley se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes, transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga y recepción en el destino final, residuos del producto o sustancia y elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos".

Que el Decreto 780 de 2016, en su artículo 2.8.10.7., establece: "Son obligaciones de las empresas que transporten desechos o residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes: 1) Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, reglamentario del Sector Transporte, o la norma que la modifique o sustituya. 2) Capacitar y entrenar en los procedimientos operativos normalizados y de seguridad al personal que interviene en las operaciones de transporte, cargue y descargue, de conformidad con el programa de capacitación y entrenamiento diseñado, adoptado e implementado por la empresa. 3) Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar. 4) Transportar residuos generados en la atención en salud y otras actividades que estén debidamente clasificados, embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 5) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido por el generador. 6) Realizar las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en que se hayan transportado residuos o desechos peligrosos en lugares que cuenten con todos los permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar. 7) En casos en que la empresa preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 8) Asumir el costo del almacenamiento, tratamiento, y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, que se encuentre transportando, si una vez efectuada la verificación de la autoridad competente, no se encuentra en capacidad de demostrar quién es el remitente y/o propietario de los mismos. 9) Entregar al generador un comprobante de recolección de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. 10) Contar con un plan de

RESOLUCION No.

FECHA

0842

15 JUN. 2018

contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente en el transporte de residuos y personal capacitado y entrenado para su implementación. 11) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades...”

Que igualmente el artículo 2.2.6.1.3.6 del Decreto 1076 de 2015 establece: “Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el transportador debe: a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar; b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya; c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al gestor o receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador; d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente; e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio; f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles; g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar; h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos...”

Que lo establecido en los artículos expresados en el acápite anterior se toman como base para realizar la inspección técnica a este tipo de vehículos de empresas encargadas de la recolección y transporte de residuos peligrosos y verificar que cumplan con los lineamientos normativos requeridos para el transporte de residuos peligrosos.

Que la Ley 99 de 1993, asigna a las autoridades ambientales las funciones de otorgar permisos, autorización, y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio ambiente.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Que el día 29 de mayo de 2018, funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental del EPA Barranquilla Verde se trasladó hasta las instalaciones de la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., identificada con Nit. 900.226.891-1, ubicada en la carrera 15 SUR No. 80 – 132 de éste Distrito, emitiendo el Concepto Técnico No. 000822 del 07 de junio de 2018, en el cual consigna lo siguiente:

“(...

ASPECTOS ENCONTRADOS

Se realizó visita de inspección técnica en las instalaciones de la empresa ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con el fin de verificar condiciones ambientales a los vehículos de propiedad de la citada empresa, de lo cual se observaron los siguientes aspectos:

Matrícula	Marca	Modelo	Color	Tipo	Carrocería	capacidad
T 2396	Mack	1998	Blanco	Camión-vactor		8351 kg
T 3314	INTERNATIONAL	1998	Blanco-rojo	Camión-vactor		2000 galones

RESOLUCION No.
FECHA

0842
15 JUN. 2018

DHM-525	HINO	2012	Blanco	camión	furgón	5,5 toneladas
WWA-662	MACK	2014	Blanco	Tracto-camión	SRS	

Los vehículos presentan las siguientes características:

kit de carreteras
kit de derrame (pala antichispas, cinta demarcación, material absorbente entre otros).
Presentan logo de la ONU y rombos NFPA.
Luces laterales con sistema reflectivo.
E.P.P (mascarillas, guantes, gafas de seguridad, botas entre otros).
Plan de emergencia en ruta.
Sistema de poleas de aseguramiento para tanques (vehículo DHM-525).
Extintores.
Dispositivo sonoro de marcha en reversa.
Equipos de comunicación
Tecnícomecánica y documentos de tránsito.

La citada sociedad debe catalogarse como usuario de moderado impacto ambiental.

EVALUACION

La autoridad ambiental E.P.A BARRANQUILLA VERDE, realiza inspección técnica a éste tipo de vehículos de empresas encargadas de la recolección y transporte de residuos peligrosos, con el fin de verificar que éstos vehículos cumplan con normas de seguridad y contingencias requeridas para el transporte de residuos peligrosos.

Luego de la inspección realizada a los vehículos presentados por la sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S; se pudo corroborar que éstos cuentan con las características técnicas establecidas en la normatividad ambiental Decreto 1609 de 2002 y Artículo 2.2.6.1.3.6. Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos Decreto 1076 de 2015; en lo referente a las obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos por carretera.

Lo anterior debido a que éstos vehículos inspeccionados por el E.P.A BARRANQUILLA VERDE, están dotados con elementos de protección adecuados y cumplen con las características externas e internas del medio de transporte en lo concerniente a medidas de seguridad y contingencias.

Que de acuerdo con el Concepto Técnico en comento, el Establecimiento Publico Ambiental BARRANQUILLA VERDE, considera viable autorizar a la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, representada legalmente por el señor ALVARO PADILLA, para la recolección y transporte de residuos peligrosos en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla en los vehículos de placas T-2396, T-3314, DHM-525 y WWA-662, descritos en los acápites anteriores y se le imponen además unas obligaciones, las cuales se indicarán en la parte resolutive.

Que le artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la Ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por medio del cual se modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, establece que las autoridades ambientales cobrarán por los servicios de evaluación y de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla el establecimiento público ambiental

RESOLUCION No.

FECHA

0842
15 JUN. 2018

BARRANQUILLA VERDE, es la máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones la de recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, representada legalmente por el señor ALVARO PADILLA, para la recolección y transporte de residuos peligrosos en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla en los vehículos de placas T-2396, T-3314, DHM-525 Y VWA-662, la presente autorización se otorga por el término de un año contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la sociedad ECOGREEN S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, a través de su representante legal señor ALVARO PADILLA, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- 1) Brindar un manejo seguro y adecuado de los residuos y desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
- 2) Expedir al generador una certificación indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para lo cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes.
- 3) Contar con el personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos peligrosos.
- 4) Indicar el tipo de actividad, tipo de residuos o desechos peligrosos, que esta autorizado a manejar.
- 5) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar;
- 6) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya.
- 7) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador.
- 8) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
- 9) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de éstos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;
- 10) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles;
- 11) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de

RESOLUCION No. 0842

FECHA 15 JUN 2018

los mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar;

- 12) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.

ARTICULO TERCERO: El establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, podrá supervisar o verificar en cualquier momento lo dispuesto en la presente resolución. Cualquier contravención a la misma, acarreará las sanciones a que hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO: Ordénese a la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, a través de su representante legal la cancelación de los costos de evaluación de los vehículos para otorgar la Autorización Ambiental de recolección y transporte de residuos peligrosos la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$ 4.949.800.00), en el Banco BBVA de ésta ciudad, en la Cuenta corriente No 302-00883-4 a nombre del establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, en virtud del cálculo de la tarifa establecida, en un término de cinco (5) días, a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá ser notificado al representante legal de la sociedad ECOGREEN RECYCLING S.A.S., con Nit. 900.226.891-1, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

ARTICULO SEXTO: La presente providencia deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del Establecimiento Público BARRANQUILLA VERDE, a costas del interesado, quien deberá consignar el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$ 455.720.00), equivalentes a tres y medio salarios mínimos por cada folio del acto administrativo en la cuenta N° 302.00883 - 4 del BBVA de ésta ciudad a nombre del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.


PARAGRAFO: La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata éste artículo será causal suficiente para revocar y dejar sin efectos el presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia solo procede el recurso de Reposición ante el Director General del establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en los Artículos 74 y 76 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los

15 JUN 2018


SARA BELEN RODRIGUEZ MANZUR
DIRECTORA GENERAL BARRANQUILLA VERDE

RESOLUCION No. 0842
FECHA 15 JUN. 2018

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Barranquilla D.E.I.P a los 19 días del mes Junio del 2018, se notificó personalmente de la presente Resolución No. 0842 de fecha 15 Junio 2018 al señor (a) Alvaro Padilla Monrealvo identificado con cédula de ciudadanía No 73.569.897 de Cartagena a quien se le entregó copia íntegra, auténtica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informó que contra esta procede legalmente el recurso de Reposición ante el Director General del establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal, o a la notificación por Aviso, según lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

EL NOTIFICADO

Jorge Del Castillo
EL NOTIFICADOR

RESOLUCIÓN **18 83**
FECHA
10 DIC. 2018

**POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA LA RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS**

La Directora General del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 1076 de 2.015 y el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, y

CONSIDERANDO

Que Mediante escrito radicado bajo el No 5988 de Septiembre 24 de 2018 el Señor ALVARO PADILLA MONTALVO en calidad de Gerente de la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S Con Nit No 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, solicitó al EPA BARRANQUILLA VERDE, visita de inspección técnica a un vehiculo de placa WGV-383.

Que funcionarios adscritos al Grupo de Inspección Vigilancia y Control del EPA BARRANQUILLA VERDE, realizaron el día 30 de Octubre de 2018 visita técnica a las instalaciones de la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, en el cual emitieron el Concepto Técnico No 02211 de fecha noviembre 29 de 2018, en el cual se establece lo siguiente:

ASPECTOS ENCONTRADOS:

Se realizó visita de inspección técnica en las instalaciones de la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S con el fin de verificar condiciones ambientales a vehiculo de propiedad de la citada Sociedad, de lo cual se observaron los siguientes aspectos:

Matricula	Marca	Modelo	Color	Tipo	Carroceria	Capacidad
WGV-383	CHEVROL ET	2016	Blanco	Camión	Furgon	8100Kg

El vehiculo presenta las siguientes características:

Kit de carreteras
Kit de derrames (pala antichispas, cinta demarcación, material absorbente entre otros)
presentan logo de la ONU y rombos NFPA
Luces laterales con sistema reflectivo
E.P.P (mascarillas, guantes, gafas de seguridad botas entre otros)
Plan de contingencia en ruta.
Sistema de poleas de aseguramiento para tanques extintores.
Dispositivo sonoro de marcha en reversa.
Equipos de comunicación.
Tecnico comenica soat y documentos de tránsito.

Que teniendo en cuenta lo establecido en los Aspectos Encontrados, los funcionarios del EPA BARRANQUILLA VERDE evaluaron lo siguiente:

EVALUACIÓN

La autoridad ambiental EPA BARRANQUILLA VERDE, realiza inspección técnica a este tipo de vehiculos de empresas encargadas de la recolección y transporte de residuos peligrosos con el fin de verificar que estos vehiculos cumplan con normas de seguridad y contingencias requeridas para el transporte de residuos peligrosos.

Luego de la inspección realizada al vehiculo presentado por la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S se pudo corroborar que estos cuentan con las

RESOLUCIÓN
FECHA

18 83
10 DIC. 2018

características técnicas establecidas en la normatividad ambiental Decreto 1609 de 2002 y Artículo 2.2.6.1.3.6 Obligaciones del transportadores de residuos o desechos peligrosos Decreto 1076 de 215 en lo referente a las obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos por carretera.

Lo anterior debido a que este vehículo inspeccionado por el EPA BARRANQUILLA VERDE, esta dotado con elementos de protección adecuados y cumplen con las características externas e internas del medio de transporte en lo concerniente a medidas de seguridad y contingencias.

Que este Despacho considera procedente Otorgar una autorización para la recolección y transporte de residuos peligrosos en el Distrito de Barranquilla, en el vehículo de placas WGV-383 a la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S Con Nit No 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito por el termino de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Que la Resolución 1215 de octubre 31 de 2017, expedida por el EPA BARRANQUILLA VERDE, por medio del cual se establece el procedimiento y tarifa de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental.

Que la Ley 99 de 1993 creó las autoridades ambientales en Colombia y les asignó unas competencias dentro de las cuales se encuentra la de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, éstas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones la de recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

En merito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una autorización para la recolección y transporte de residuos peligrosos en el Distrito de Barranquilla, en el vehículo de placas WGV -383 a la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S Con Nit No 900.226.891-1 ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito por el termino de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

RESOLUCIÓN **1883**
FECHA **10 DIC. 2018**

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, deberá darle cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- a) Brindar un manejo seguro y adecuado de los residuos y desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
- b) Expedir al generador una certificación indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para lo cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes.
- c) Contar con el personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos peligrosos.
- d) Indicar el tipo de actividad, tipo de residuos o desechos peligrosos, que esta autorizado a manejar.
- e) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar.
- f) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya.
- g) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador.
- h) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
- i) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999.
- j) Realizar las actividades de lavado de vehiculos que hayan transportado residuos desechos peligrosos o sustancias o productos que puedan conducir a la generación de los mismos solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar.
- k) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia por derrame o el esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.

ARTICULO TERCERO: La Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, deberá avisar al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, cualquier cambio que realice con respecto a su actividad productiva, dirección o política ambiental.

ARTICULO CUARTO: La Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, representado legalmente por el Señor ALVARO PADILLA MONTALVO, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

RESOLUCIÓN

FECHA

18 83
10 DIC. 2018

ARTICULO QUINTO: EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, se reserva el derecho de realizar visitas en las instalaciones de la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, a través de su representante legal o quien haga sus veces cuando lo considere necesario.

ARTICULO SEXTO: Ordenese a la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur no 80-132 de este Distrito, la cancelación de los costos de seguimiento para la autorización del vehículo: WGV 383 para recolección y transporte de residuos peligrosos deberá cancelar la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 874.342.00), de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente providencia, los cuales deberá pagar en la cuenta de Ahorro No 027000088016 del Banco Davivienda de ésta Ciudad, Numero de convenio 1173707 (Referencia 1) Numero de identificación (cedula o Nit del usuario), (Referencia 2) Número de factura o recibo indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera, del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, cancelados dentro de los cinco (05) días hábiles a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante legal de la Sociedad denominada ECOGREEN RECYCLING S.A.S ubicada en la Carrera 15 Sur No 80-132 de este Distrito, a través de su representante legal o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, según lo establecido en el Artículo 76 del C.P.A-CA.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia solo procede el Recurso de Reposición ante la Directora General del Establecimiento Público BARRANQUILLA VERDE, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del artículo 74 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los

10 DIC. 2018



SARA BELEN RODRIGUEZ MANZUR
DIRECTORA GENERAL – BARRANQUILLA VERDE.

Proyectó: Milena Caballero Ochoa Abogado Contratista

Revisó: Rita Navarro – Jefe Oficina Jurídica


Aprobó: Sara Rodríguez Manzur

RESOLUCIÓN **18 83**
FECHA

10 DIC. 2018

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

En Barranquilla D.E.I.P. a los 25 días del mes Enero de 2018¹⁹ se notificó personalmente del contenido de la presente Resolución No 1883 de fecha 10-Diciembre-2018 al Señor Alvaro Pachillo M. identificado con cédula de ciudadanía No 13.569.897 de Colombia a quien luego de leerla, se le entrego copia íntegra, autentica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informo que contra esta procede legalmente el Recurso de Reposición ante el Director General del Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Notificación personal, según lo establecido en el Numeral 1 del artículo 74 del C.C.A.


EL NOTIFICADO


EL NOTIFICADOR.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL
MEDIO AMBIENTE DAMA BARRANQUILLA DAMAB

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA		00969
CONCEPTO TECNICO N°		
FECHA	:	17 JUN. 2010
DE	:	OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA
PARA	:	OFICINA LEGAL AMBIENTAL
RAZON SOCIAL	:	ECO GREEN RECYCLING S.A.S
DIRECCION DE NOTIFICACION	:	Cra 72 78-37
NIT	:	900.226.891-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	ALVARO ANGEL PADILLA MONTALVO
ASUNTO	:	EVALUACION DE DOCUMENTO DONDE SE HACE UNA SOLICITUD DE CORRECCION A LA RESOLUCIÓN 0978 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

1. ANTECEDENTES.

Mediante Radicado N° 08005 del 02 de octubre 2008, el señor ALVARO ANGEL PADILLA MONTALVO en representación de **ECO GREEN RECYCLING**, solicita autorización para el transporte, tratamiento y reciclaje de fluidos aceitosos y similares

Mediante vista de inspección la oficina de control y vigilancia levanta acta oficial de vista el día 09 de octubre de 2008, la cual fue atendida por los señores ALVARO ANGEL PADILLA MONTALVO y PEDRO CANTILLO ORTIZ.

Mediante comisión del 03 de agosto se presenta a oficina de control y vigilancia el EIA de la sociedad **ECO GREEN RECYCLING Ltda.**

Mediante Resolución 0978 del 10 de septiembre de 2009 se otorgo licencia Ambiental a **ECO GREEN RECYCLING Ltda.** Hoy **ECO GREEN RECYCLING S.A.S.** para el proyecto de consistente en la recolección, transporte, almacenamiento tratamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final de los siguientes residuos o desechos peligrosos:

1. **Aceite usado**
 - o Aceite gastado
 - o Aceite quemado
 - o Aceite sucio
 - o Aceite contaminado
 - o Filtros contaminados con aceite usado
2. **Agua contaminada con hidrocarburo**
 - o Agua contaminada con aceite
 - o Agua contaminada
 - o Agua con combustible
3. **Agua de mar contaminada**
 - o Agua marina
4. **Baterías plomo ácido**
 - o Acumuladores de desecho
 - o Baterías usadas
 - o Baterías de desecho secas

8. Lodos con hidrocarburos

- Lodos y material de relleno
- Lodos
- Lodos provenientes de limpieza de fosa separadora

9. Pilas de desecho

- Baterías de desecho
- Baterías zinc-carbono
- Baterías alcalinas
- Baterías níquel-cadmio
- Baterías de mercurio
- Baterías recargables

10. Químicos gastados

- Químicos caducos

11. Residuos de grafito

- Polvo de grafito

12. Residuos de hidrocarburos

- Hidrocarburos contaminados
- Combustible, gasolina o diesel contaminado
- Turbina
- Residuos de diesel

13. Solvente residual

- Thinner de desecho
- Thinner con aceite
- Thinner contaminado
- Solvente gastado (thinner)
- Residuos de thinner sucios

14. Sosa cáustica

- Hidróxido de sodio
- Residuo de dilución de sosa cáustica
- Solución de hidróxido de sodio
- Lodos de sosa cáustica

15. Tambor con residuos de aceite industrial

Que según el representante legal, el EIA de impacto ambiental contemplaba además de lo anterior, la inclusión de actividades de incineración de residuos peligrosos y disposición final en celdas de seguridad.

2. ASPECTOS ENCONTRADOS

Revisado el documento presentado se encuentra que se solicita la inclusión en la licencia ambiental de los siguientes tipos de residuos:

Residuos peligrosos incinerables:

- Residuos líquidos y sólidos con contenidos de hidrocarburos aromáticos como bifenilos (PCB), pesticidas, organoclorados o pentaclorofenol, menor o igual a 50 mg/Kg.
- Residuos líquidos y sólidos combustibles no explosivos
- Residuos de aditivos de aceites lubricantes
- Madera o retal de esta, tratada con compuestos órgano halogenados y organofosforado
- Residuos domiciliarios
- Residuos de destilación y conversión de las refinerías de petróleo y residuos del craqueo de la nafta.

Residuos peligrosos destinados a celdas de seguridad

- Residuos industriales en general
- Cenizas de horno
- Catalizadores
- Canecas contaminadas con materiales tóxicos y peligrosos
- Baterías gastadas
- Residuos de plaguicidas
- Lodos contaminados
- Metales pesados que se encuentren en estado sólido o semi sólido
- Materiales sólidos que estén impregnados de tales sustancias y sus cenizas.

Revisado el EIA es importante resaltar que El proyecto contempla la fase de incineración, pero en relación a colocar residuos en celdas de seguridad, el documento ya evaluado no manifiesta el lugar donde estarían ubicadas estas celdas de seguridad.

Debido a la variedad de residuos también es importante el tipo de vehículo a utilizar, a la solicitud de **ECO GREEN RECYCLING Ltda.** Hoy **ECO GREEN RECYCLING S.A.S.** se le anexó cuatro (4) fotografías de un vehículo tipo estaca con placas EUS 449 y el cual presenta la simbología exigida para el transporte de residuos peligrosos.

3. EVALUACION

Es evidente que a la fecha se esta dando una variación de las condiciones existentes al momento que se otorgó la licencia ambiental, en relación a inclusión de nuevos residuos peligrosos relacionados con procesos de incineración y de colocación en celdas especiales.

La evaluación de todo esto, permite establecer que se necesita complementar el estudio de impacto ambiental, en donde se debe incluir la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales que podrían darse en las fases de incineración y encapsulamiento de residuos peligrosos y los ajustes a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental contemplado un plan de contingencia de transporte de residuos peligroso por carreteras.

4. CONCEPTO

Decisión

La oficina de Control y Vigilancia de la subdirección de Gestión Ambiental del **DAMAB**, considera:

1. Que acorde con los criterios evaluados en la solicitud de corrección de la Resolución 0978 del 10 de septiembre de 2009, es evidente que estas responden a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no implican impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, presentado en el año 2009, por lo cual consideramos que se haga la corrección solicitada por **ECO GREEN RECYCLING Ltda.** Hoy **ECO GREEN RECYCLING S.A.S.** que no es necesario adelantar

3. Presente ante la autoridad ambiental el o los vehículos destinados para la recolección de. Residuos hospitalarios provenientes de la prestación de servicios de salud y su correspondiente PGIRSH.

El siguiente concepto es proyectado en la Oficina de Control y vigilancia el día 15 de junio del año 2010, después de revisado, aprobado y firmado por las partes aquí involucradas, se fecha y se numera para su envío a la subdirección jurídica a la cual se le solicita copia de la resolución motivada que se derive de este.

Por la naturaleza y características del proyecto considérese una empresa de alto impacto.

La subdirección jurídica deberá tener en cuenta que el profesional firmante de este concepto está en una categoría superior a la reseñada en la resolución adoptada para este tipo de cobros, por tanto como es de su competencia es necesario que se consulten y se actualicen los honorarios dispuestos en la norma nacional que fija dichos honorarios de acuerdo a la experiencia (categoría del profesional).

- Categoría en la resolución de cobro del DAMAB (04)
- Categoría real del Profesional evaluador (01).

Es concepto de:



Ing. HERNANDO CARRETERO P.
Profesional Universitario



VoBo RAFAEL MEJIA DE LA HOZ.
Subdirector de Gestión Ambiental



Calle 24 No. 8B-31 * 4312172 * 3013341002
email:gerenciamentanques@hotmail.com
Santa Marta - Colombia

Día	Mes	Año
010	010	24

Hora:

No.

ORDEN DE SERVICIO

6667

Nombre/Razón Social:

Consortio ICASM 2023

Nit:

Dirección:

GAIRA

Tel:

SERVICIO PRESTADO

CANT.	UN.	DESCRIPCIÓN
200		Entrega de Baño(s) Portátil(es)
		Mantenimiento de Baño Portátil
		Descargue de Poza Séptica
		Limpieza Trampa de Grasa
		Destape de Tuberías
		Limpieza de Sifones
		Limpieza de Registros
		Lavado de Albercas y/o Tanques
		Mantenimiento de Campanas

Otros:

PLACA

SK993

USO ADMINISTRATIVO

F

R

M

S

Pagado

SI

NO

OBSERVACIONES:

Conductor
Responsable

Operario
Responsable

DARWIN CERVANTES
JESSE DURAN

DARWIN CERVANTES

Quien Recibe el Trabajo

C.C. 1.004.424744



Calle 24 No. 8B-31 * 4312172 * 3013341002
email:gerenciamultitanques@hotmail.com
Santa Marta - Colombia

Día	Mes	Año
29	010	24

Hora:

ORDEN DE SERVICIO

No. **6948**

Nombre/Razón Social: CONSORCIO ICASH Nit: _____
Dirección: TEYUNA Tel: _____

SERVICIO PRESTADO

CANT.	UN.	DESCRIPCIÓN
1		Entrega de Baño(s) Portátil(es)
2	Dos	Mantenimiento de Baño Portátil
		Descargue de Poza Séptica
		Limpieza Trampa de Grasa
		Destape de Tuberías
		Limpieza de Sifones
		Limpieza de Registros
		Lavado de Albercas y/o Tanques
		Mantenimiento de Campanas

Otros: _____

PLACA CBSO 681

Pagado ☐ SI ☐ NO ☐

USO ADMINISTRATIVO
F ☐
R ☐
M ☐ S ☐

OBSERVACIONES: _____

Conductor Responsable	<u>DARWIN CORDOBA</u>
Operario Responsable	<u>JUAN DURAN</u>

Andrés Pontón A

Quien Recibe el Trabajo
C.C. 1093003775

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 8

PROYECTO

“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO ICASM 2023

SANTA MARTA MAGDALENA

OCTUBRE DE 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION	3
2. ALCANCE	3
3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	3
3.1 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO	3
3.2 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	3
3.3 REPORTE DE LICENCIAS, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL PROYECTO	4
3.3.1 Reporte de licencias	4
3.3.2 Reporte de accidentes laborales.	4
3.3.3 Reporte de enfermedades laborales presentadas.	4
3.3.4 Reporte de enfermedades no laborales presentadas.	4
3.3.5 Reporte de incapacidades médicas.	4
3.4 PERFIL DEMOGRÁFICO	4
3.5 PROGRAMA DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	6
3.5.1 Entrega De Elementos De Protección Personal	6
3.6 CHARLAS DE SEGURIDAD	7
3.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA	10
3.8 LIMPIEZA, ORDEN Y ASEO	12
3.9 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA	13
3.9.1 Inspecciones preoperacionales	13
3.10 INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES	14

1. INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo, representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores de una empresa, mediante la aplicación de las medidas establecidas en un plan de seguridad y salud en el trabajo, se logra una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos y seguros para los trabajadores.

El Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El presente documento, es el soporte documental de la gestión SST desarrollada durante el periodo No.8 de seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo; integrando registros fotográficos, soportes escritos e indicadores que permiten evaluar la gestión en cada uno de los programas y subprogramas SST establecidos para el proyecto.

2. ALCANCE

El presente documento comprende el seguimiento de todos los programas SST establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES. En el periodo comprendido del 1 de octubre 2024 al 31 de octubre del año 2024.

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

A continuación, se presenta el reporte de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo reportado del mes de octubre de 2024.

3.1 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

En el periodo reportado del mes de octubre de 2024 no se realizaron exámenes de ingreso de ningún trabajador para el proyecto Rio Gaira.

3.2 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo reportado del mes de octubre de 2024 no hubo nuevas afiliaciones para el proyecto Rio Gaira.

3.3 REPORTE DE LICENCIAS, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

3.3.1 Reporte de licencias

Durante el periodo se reportó una (1) licencia de paternidad

3.3.2 Reporte de accidentes laborales.

Durante el periodo no se reportaron ningún accidente laboral.

3.3.3 Reporte de enfermedades laborales presentadas.

Durante el periodo no se presentan enfermedades relacionadas con la actividad desarrollada por los trabajadores del proyecto.

3.3.4 Reporte de enfermedades no laborales presentadas.

Durante el periodo se reportó dos (3) enfermedades no laborales en el proyecto

3.3.5 Reporte de incapacidades médicas.

Durante el periodo se presentaron las siguientes incapacidades:

Incapacidad médica, reportada de un colaborador quien, sufrió una enfermedad no laboral a causa de un resfriado común, donde se reporta una incapacidad la cual empezó el día 04-10-2024 y finalizó el 05-10-2024.

Incapacidad médica, reportada de un colaborador quien, sufrió una enfermedad no laboral a causa de un dolor torácico donde se reporta una incapacidad la cual empezó el día 18-10-2024 y finalizó el 19-10-2024.

Igualmente se reporta otra incapacidad médica, reportada por un trabajador, donde sufrió una enfermedad no laboral causada por una sensación de boca dormida donde se reporta una incapacidad la cual empezó el día 22-10-2024 y finalizó el 24-10-2024.


Anexo 1 Epicrisis e incapacidad médica.

3.4 PERFIL DEMOGRÁFICO

Durante del periodo reportado de septiembre se reporta MOC y MONC que hacen parte de la empresa CONSORCIO ICASM 2023 y subcontratistas:

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD
AYUDANTE DE OBRA	10
ESPECIALISTA HIDRAULICO	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA SST	1
INGENIERO RESIDENTE	1
DIRECTOR DE OBRA	1
COORDINADOR DE OBRA	1
AUXILIAR AMBIENTAL	1
INSPECTOR DE OBRA	1
AUXILIAR SST	1
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	3
RESIDENTE DE OBRA	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TRABAJADORA SOCIAL	1
ING. TOPOGRAFO	1
TOPOGRAFO	1
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	1
BIOLOGO	2
VETERINARIO	1
CONDUCTOR	1
Total, general	32


CANTIDAD



AYUDANTE DE OBRA
 ESPECIALISTA HIDRAULICO
 ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ESPECIALISTA SST
 INGENIERO RESIDENTE
 DIRECTOR DE OBRA
 COORDINADOR DE OBRA
 AUXILIAR AMBIENTAL
 INSPECTOR DE OBRA
 AUXILIAR SST
 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
 RESIDENTE DE OBRA
 RESIDENTE SOCIAL
 TRABAJADORA SOCIAL
 ING. TOPOGRAFO
 TOPOGRAFO
 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
 BIOLOGO
 VETERINARIO
 CONDUCTOR

El proyecto **INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**, lo conforman su mayoría hombres ocupando un 84% en la conformación de personal del proyecto.

SEXO	CANTIDAD
H	27
M	5
TOTAL	32



3.5 PROGRAMA DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Durante el periodo del mes de octubre del 2024 no se reportó el ingreso de ningún colaborador

3.5.1 Entrega de elementos de protección personal

Durante el periodo de reporte se realizo la reposición de elementos de protección personal a los colaboradores del CONSORCIO ICASM 2023

- Guantes (caucho, nitrilo, baqueta o carnaza según la actividad)

Anexo 2 soportes de entrega reposición de elementos de protección personal



Ilustración 1 Entrega de reposición de elementos de protección personal

3.6 CHARLAS DE SEGURIDAD.

Se realizaron charlas al personal de obra con el fin de abarcar temas de importancia que contribuyan a mejorar el desempeño de manera segura de cada uno de los trabajadores. Con forme a eso apoyando a cada una de las actividades realizadas en la obra.

Organizando el cronograma de actividades logramos trasmitirle al trabajador conocimientos y que identifiquen riesgos en obra, para cada una de las actividades establecidas.

Anexo 3 Registro de Asistencia Charlas diarias

CHARLAS Y CAPACITACIONES	FECHA
Trabajo en equipo 	02 octubre 2024
consumo de alcohol tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos y prevención.	3 octubre 2024



Riesgos silenciosos

04 octubre 2024



Riesgo público

7 octubre 2024



Los riegos del uso del celular en el trabajo

8 octubre 2024



<p>Pausas activas</p> 	<p>9 octubre 2024</p>
<p>Pausas activas (Dinámica de las frutas)</p> 	<p>11 octubre 2024</p>
<p>Protección Ocular y cuidado de la vista</p> 	<p>16 octubre 2024</p>
<p>Visita de la ARL sura</p> 	<p>18 octubre 2024</p>

<p>Enfermedades causadas por el calor</p> 	<p>22 octubre 2024</p>
<p>Capacitación en Manejo adecuado de los residuos en Obra, código de colores, importancia de fuentes hídricas</p> 	<p>23 octubre 2024</p>
<p>Importancia de una buena hidratación</p> 	<p>25 octubre 2024</p>

Tabla 1 Charlas y capacitaciones

3.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Señalización y demarcación

Se garantizó la instalación y permanencia de la señalización requerida en obra, las cuales fueron ubicadas según el criterio de los profesionales ambientales y de seguridad del proyecto.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.	Versión No 1 Año: 2024
--	--	-------------------------------

SEÑALIZACION USO DE CASCO Y USE PROTECCION DE OIDOS.

		<p>Señalización “Use de casco y Use protección de oídos”, lugar de instalación: Santa Marta Magdalena.</p>
---	---	--

Tabla 2 Señalización de obra – Uso de casco y protección de oídos

SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE

		<p>Señalización “Cinta de Peligro no pase”, lugar de instalación: Santa Marta, Magdalena, ubicados al inicio y fin de la obra.</p>
--	--	--

Tabla 3 Señalización de obra – Cinta de Peligro no pase

SEÑALIZACION RIESGO DE CAIDAS

	<p>Señalización “Riesgo de caídas”, lugar de instalación: Santa Marta, Magdalena por el edificio “Gaira”.</p>
---	---

Tabla 4 Señalización de obra – riesgo de caída

Se garantizó la presencia de los elementos de emergencia:

- Camilla, extintor y botiquín de primero auxilios



Ilustración 2 Camilla extintor y botiquín

3.8 LIMPIEZA, ORDEN Y ASEO

Se realizaron jornadas de orden y aseo en el área de trabajo y en las instalaciones temporales usadas por el proyecto, actividades que fueron desarrolladas por los colaboradores bajo la supervisión del profesional ambiental y SST.

JORNADAS DE LIMPIEZA EN LA OBRA



Jornadas de limpieza, orden y aseo en la obra durante el mes de octubre.

Tabla 5 jornadas de limpieza, orden y aseo

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria, equipos y vehículos presentes en el proyecto durante el periodo del mes de septiembre de 2024.

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA	
MAQUINA	CANTIDAD
Excavadoras	3
TOTAL	3

Tabla 6 Maquinaria en obra

3.8.1 Inspecciones preoperacionales



Ilustración 3 Vigilancia de inspecciones preoperacionales

Anexo 4 diligenciamiento de inspecciones preoperacionales

3.9 INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES

Durante el periodo de reporte, se garantizó la presencia e inspección periódicas de kit básico para el control de derrames, los cuales se ubican en los frentes de obra e instalaciones temporales usadas por el proyecto.



Ilustración 4 inspección de kit antiderrames

Anexo 5 Inspección de kit antiderrames

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.	Versión No 1 Año: 2024
---	---	-------------------------------

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Entrega de reposición de elementos de protección personal.....	7
Ilustración 2 Camilla extintor y botiquín	12
Ilustración 3 Vigilancia de inspecciones preoperacionales	13
Ilustración 4 inspección de kit antiderrames	14

TABLAS

Tabla 1 Charlas y capacitaciones.....	10
Tabla 2 Señalización de obra – Uso de casco y protección de oídos.....	11
Tabla 3 Señalización de obra – Cinta de Peligro no pase.....	11
Tabla 4 Señalización de obra – riesgo de caída	11
Tabla 5 jornadas de limpieza, orden y aseo	12
Tabla 6 Maquinaria en obra.....	13

ANEXOS

Anexo 1 Epicrisis e incapacidad médica.	4
Anexo 2 soportes de entrega reposición de elementos de protección personal	6
Anexo 3 Registro de Asistencia Charlas diarias	7
Anexo 4 diligenciamiento de inspecciones preoperacionales	13
Anexo 5 Inspección de kit antiderrames	14



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución	602 CIRUGIA
--------------------	-------------

2. DIAGNOSTICOS

Dx Ingreso	O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA
Dx Salida	O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA
Dx Egreso 1	O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA
Dx Egreso 2	O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA

3. INTERVENCIONES - PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y/O ESPECIALES

CIRUGIAS

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Grp QX
1	665001	SALPINGECTOMIA BILATERAL TOTAL POR LAPAROTOMIA	S07
Médico: EVER ANTONIO MELENDEZ CAP Especialidad: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Via:			
1	740001	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL	I01
Médico: EVER ANTONIO MELENDEZ CAP Especialidad: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Via:			

DESCRIPCION CIRUGIA

Medico	ME018	EVER ANTONIO MELENDEZ CAPELLA	Esp.	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	
Diagnostico Preoperatorio:	O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA			
Diagnostico Postoperatorio:	O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA			
Tipo de Herida:	LIMPIA CONTAMINADA	Tipo de Anestesia:	RAQUIDEA	Tipo de Cirugia:	PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado:	0 ml.	Via:	UNICA VIA		
Realizacion Acto Quirurgico:	16/10/2024	Hora Inicio	08:50:00	Hora Final	09:40:00
Tiempo de Perfusión:	0,00 min.	Tiempo de Clamp:	0 min.		
Descripcion Quirurgica:					
CESAREA MAS SALPINGEGTOMIA BILATERAL: 1.- incision pfannenstiell x planos hasta cavidad,					
2.- histerotomia kerr					
3.- se extrae feto unico vivo cefalico placenta completa sexo femenino apgar de 9 al minuto					
4.- histerotorrafia en dos planos con vicryl 1					
5.-peritonizacion visceral.					
6.-se visualiza trompa izquierda realizandose fimbrectomia bilateral.					
7.- se visualiza trompa derecha realizandose fimbrectomia bilateral.					
8.- con cuenta completa de material, verificacion de hemostasia.					
9.- cierre de pared abdominal por planos. cierre de piel					
con catgut simple 00.					
tejidos enviados a anatomia patologia:					
trompas de falopio					
Complicacion: SI ☐ NO ☐					
Tejidos enviados a patología SI ☒ NO ☐					
TROMPAS DE FALOPIO					



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	
Pabellon Evolución 602 CIRUGIA			

ME018 EVER ANTONIO MELENDEZ CAPELLA
Reg. 3529
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

4. EGRESO

CONDICIONES DEL USUARIO AL SALIR VIVO

5. ATENCION

A. CONDICIONES AL INGRESO - MOTIVO DE CONSULTA

CIRUGIA PROGRAMADA

B. RESUMEN (ANAMNESIS Y ANTECEDENTES) CONDICIONES DE INGRESO - ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD G21 CON EMBARAZO DE 38 SEMANAS POR ECOGRAFIA- QUIEN
INGRESA PARA REALIZACION DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CESAREA SEGMENTARIA + SALPINGECTOMIA
BILATERAL POR EL SERVICIO DE GINECOLOGIA
PATOLOGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
QX: CESAREA
RH: O +/- A+
CP: SI
PERFIL INFECCIOSO: NEGATIVO

REVISION POR SISTEMAS

C. EXAMEN FISICO, PROCEDIMIENTOS Y EVOLUCION

EVOLUCIONES

Realizada por : MD016 JOSE FERNANDO LORA SERRANO Especialidad MEDICINA DE URGENCIAS Y DOMICILIARIA 16/10/2024 17:17:47

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA
16/10/2024 HORA: 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR
-TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90
LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -PTE CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE
,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX
NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN
ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE
CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE
INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA X Sonda VESICAL .-
EXTREMIDADES EUTÓFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE.
PACIENTE CON POP DE CESÁREA INMEDIATA, DIURESIS +,ORINA CLARA POR Sonda,
VIGILAR LOQUIOS, Y BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD, ,CONTROL DE CIFRAS TENSIONALES Y SÍNTOMAS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución 602 CIRUGIA

NEUROHIPERTENSIVOS. RETIRAR Sonda vesical en 12 HOAS POSTERIORES A COLOCACIÓN SI PRESENTA ORINA CLARA , SI PRESENTA ORINA HEMATURICA AVISAR Y NO RETIRAR Sonda, PROBAR VÍA ORAL 12 HORAS POSTERIORES A POST-OPERATORIO CON LÍQUIDOS CLAROS. CONTINUAR IGUAL MANEJO DADO POR GINECÓLOGO TRATANTE...CSV Y AC .-PACIENTE QUIEN FUE VALORADO CON TODOS LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ,UTILIZACIÓN CORRECTA DE EPP, ADECUADO LAVADO DE MANOS EN SU 5 MOMENTOS.

Realizada por : MD016 JOSE FERNANDO LORA SERRANO Especialidad MEDICINA DE URGENCIAS Y DOMICILIARIA 16/10/2024 18:10:20

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -PTE CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA X Sonda vesical .- EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PACIENTE CON POP DE CESÁREA INMEDIATA, DIURESIS +,ORINA CLARA POR Sonda, VIGILAR LOQUIOS, Y BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD, ,CONTROL DE CIFRAS TENSIONALES Y SÍNTOMAS NEUROHIPERTENSIVOS. RETIRAR Sonda vesical en 12 HOAS POSTERIORES A COLOCACIÓN SI PRESENTA ORINA CLARA , SI PRESENTA ORINA HEMATURICA AVISAR Y NO RETIRAR Sonda, PROBAR VÍA ORAL 12 HORAS POSTERIORES A POST-OPERATORIO CON LÍQUIDOS CLAROS. CONTINUAR IGUAL MANEJO DADO POR GINECÓLOGO TRATANTE...CSV Y AC .-PACIENTE QUIEN FUE VALORADO CON TODOS LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ,UTILIZACIÓN CORRECTA DE EPP, ADECUADO LAVADO DE MANOS EN SU 5 MOMENTOS.

Realizada por : MD012 GINO JOSÉ PEDRAZA RIASCOS Especialidad MEDICINA GENERAL 17/10/2024 10:12:29

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -PTE CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA .- EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PTE ESTABLE SE CONTIUA MANEJO MEDICO

Realizada por : ME016 ARMANDO ENRIQUE SOLANO GAMEZ Especialidad GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 17/10/2024 11:36:52

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución 602 CIRUGIA

SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -PTE CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA .- EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PTE ESTABLE SE CONTIUA MANEJO MEDICO CON LEV ANALGESICO DIETA VIGILAR SANGRADO

Realizada por : MD016 JOSE FERNANDO LORA SERRANO Especialidad MEDICINA DE URGENCIAS Y DOMICILIARIA 17/10/2024 16:01:29

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- EN SU 1ER DIA DE POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3-RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -SE REFIERE LA PACIENTE QUIEN PASO BUENA NOCHE LEVE DOLOR SITIO QUIRURGICO SANGRADO VAGINAL ESCASO CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA .- EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PTE ESTABLE SE CONTIUA MANEJO MEDICO CON LEV ANALGESICO DIETA VIGILAR SANGRADO

Realizada por : ME170 KARINA MILENA VARELA SMITH Especialidad PEDIATRIA

18/10/2024 06:44:12

NOTA RECIEN NACIDO:

TODO RECIEN NACIDO EN LA CLINICA DE LA MUJER ES ATENDIDO Y VALORADO AL MOMENTO DE NACER POR MEDICO PEDIATRA O NEONATOLOGO . DURANTE SU SEGUNDO DIA DE VIDA Y ESTANCIA HOSPITALARIA AL LADO MATERNO SE REVALORA AL RECIEN NACIDO . REVISO RNT SEXO FEMENINA PRODUCTO DE MADRE DE 27 AÑOS NACE POR CESAREA A LAS 37.3 SEMANAS , APGAR 9/10, SILVERMAN ANDERSON 0 PUNTOS, LIQUIDO AMIOTICO CLARO, MEDIDAS ANTROPOMETRICAS: PESO 3340 GRS TALLA 50CM PC 35CM .. QUE SE ENCUENTRA NORMOTERMICO , ROSADO , EN SUFICIENCIA CARDIORESPIRATORIA , SIN MALFORMACIONES APARENTES ** AL EXAMEN FISICO SE REALIZA TAMIZAJE DE CARDIOPATIA CONGENITA SEGUN LINEAMIENTOS DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO , OBTENIENDO SATURACION MAYOR DE 95% EN MANO DERECHA Y PIE RECIBE ALIMENTACION CON LECHE MATERNA CON BUEN REFLEJO DE SUCCION, PRESENTA DIURESIS Y DEPOSICIONES + , GRUPO SANGUINEO A RH POSITIVO, VDRL NO REACTIVO, PACIENTE EN CONDICIONES DE EGRESO HOSPITALARIO CON CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE LA EPS EN 3 A 5 DIAS .

RECOMENDACIONES

1. REGISTRAR AL RECIEN NACIDO
2. RECLAMAR RESULTADO DE TSH EN LA EPS DURANTE LA CITA DE CONTROL
3. ALIMENTAR AL BEBE CON LECHE MATERNA , CONSTATANDO QUE EL BEBE ORINE (DEBE MOJAR MINIMO 5 PAÑALES AL DIA) Y REALICE DEPOSICIONES , EN CASO CONTRARIO CONSULTA AL PEDIATRA
4. DORMIR BOCA ARRIBA O DE MEDIO LADO

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DRAPELO



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución 602 CIRUGIA

5. EVITAR EL CONTACTO CON HUMO DE CIGARRILLO Y PERSONAS CON GRIPE
6. LAVARSE LAS MANOS PARA TOCAR AL BEBE
7. CONSULTAR POR URGENCIAS SI EL BEBE PRESENTA FIEBRE, NO SE ALIMENTA BIEN O PRESENTA CAMBIOS EN EL COLOR DE LA PIEL .
8. EVITAR VISITAS
9. LLEVAR AL BEBE A CONTROL A LA EPS ENTRE EL 3 Y 5 DIA DE VIDA
10. REALIZAR OTOEMESIONES ACUSTICAS Y/O POTENCIALES EVOCADOS
11. RECLAMAR TSH POR EPS DURANTE LA CITA DE CONTROL
12. REPETIR EXAMEN VISUAL EN CONSULTA DE SEGUIMIENTO

Realizada por : MD012 GINO JOSÉ PEDRAZA RIASCOS Especialidad MEDICINA GENERAL

18/10/2024 08:31:14

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % -PTE CONSCIENTE ,ORIENTADA ,NORMOENSDA,HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ,AFEBRIL,CCC NORMOCEFÁLICA, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN BLANDO ,GLOBOSO, ÚTERO EN INVOLUCIÓN ADECUADA A NIVEL DE CICATRIZ UMBILICAL SE PALPA BOLO DE SEGURIDAD DE PINARD. ÚTERO DE CONSISTENCIA LEÑOSA, HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA NO SECRECIONES,NO SANGRADO , NO SIGNOS DE INFECCIÓN FOCAL G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FÉTIDOS DIURESIS + ORINA CLARA .- EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN EDEMA. SNC SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PTE ESTABLE

Realizada por : ME022 JORGE JAVIER ROCHA ROJAS Especialidad GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

18/10/2024 09:01:29

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD GRUPO SANGUINEO O RH (+) IDX: 1- POP DE CESÁREA + SALPINGECTOMIA BILATERAL 16/10/2024 HORA: 09+04 2.-PUERPERIO QUIRÚRGICO. 3- RNT DE SEXO FEMENINA -PESO: 3340 GR -TALLA:50 CM -APGAR: 9/10. GRUPO SANGUÍNEO: A RH_(+) ACTUALMENTE PACIENTE MANIFIESTA SENTIRSE BIEN NIEGA DOLOR EX FÍSICO SV-TA: 120/80 MMHG. -FC 90 LPM. -FR 18 RPM. SAT 99 % NORMOCEFALO, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS, TORAX NORMOEXPANSIBLE CON RCRS RSRs SIN AGREGADOS PULMONARES ABDOMEN CON INVOLUCION UTERINA ADECUADA A NIVEL UMBILICAL UTERO DE CONSITENCIA LEÑOSA , G/U _ LOQUIOS ESCASOS NO FETIDOS DIURESIS ESPONTANEA CLARA EXTREMIDADES SIN EDEMS SNC SIN DEFICIT APARENTE BUENAS CONDICIONES GENERALES NORMOTENSA SIN SIRS CON BUENA EVOLUCION CLINICA EN SUS PRIMERAS 24 HORAS DE SU POSPARTO TOLERNADO OXIGENO AMBIENTE, TOLERANDO VIA ORAL , DIURESIS ESPONTANEA CLARA , SE DECIDE DAR ALTA POR MEJORIA CLINICA CON RECOMENDACIONES SIGNOS DE ALARMA, FORMULACION Y CITA CONTROL EN 8 DIAS CON GINECOLGIA.

ALTA CON:

*FORMULACION

- CITA CONTROL POR CONSULTA EXTERNA CON GINECOLOGIA EN 8 DIAS CON GINECOLOGIA Y PEDIATRIA PARA RECIEN NACIDO.

*RECOMENDACIONES ECOMENDACIONES:

1.REALIZAR LAVADO DE HERIDA Q1UIRURGICA SOBRE LA CINTA DE FIXOMUL (CINTA BLANCA) SIN QUITARLA, LAVADO POR ENCIMA DE LA CINTA CON JABON LIQUIDO Y AGUA SECAR CON PAÑOS DESECHABLES,

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DRAPELO



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución 602 CIRUGIA

Y POSTERIORMENTE APLICAR ALCOHOL DEJAR SECAR A AIRE AMBIENTE.

2.GUARDAR REPOSO PARA EVITAR DEHISCENCIA DE SUTURA ,NO REALIZAR FUERZAS

3.TOMAR MEDICACION EN HORARIOS Y CANTIDAD INDICADOS

4.ASISTIR A CONTROL CON GINECOLOGIA POR CONSULTA EXTERNA EN 8 DIAS

5.PACIENTE DEBE LACTAR AL BEBE O ORDEÑARSE LAS MAMAS PARA EVITAR MASTITIS(ENROJECIMIENTO,DOLOR, TUMEFACCION DE LAS MAMAS , FIEBRE)

6.NO CONSUMIR ALIMENTOS COMO PLATANO GUINEO, FRIJOLES COMIDA PESADA O CONDIMENTADA QUE PUEDA PRODUCIR GASES O CONSTIPACION

7.DEAMBULAR EN CASA (CAMINAR) PARA QUE EL INTESTINO SE MUEVA Y NO PRESENTE OBSTRUCCION INTESTINAL O DIFICULTAD PARA LA DESPOSICION

*SIGNOS DE ALARMA

1,SECRECION FETIDA(MAL OLIENTE) ENROJECIMIENTO, CALOR, TUMEFACCION AL REDEDOR DE HERIDA QUIRURGICA O APERTURA DE LA MISMA DEBE RECONSULTAR POR URGENCIAS

2.SI PRESENTA DOLOR DE CABEZA INTENSO,ALTERACIONES VISUALES(VE LUCES) OYE RUIDOS EXTRAÑOS(ZUMBIDOS PITOS) TOMAR LA PRESION SI SALE ELEVADA RECONSULTA POR URGENCIAS

3,SANGRADO VAGINAL INTENSO O DE MAL OLOR,

4. FIEBRE SIN EXPLICACION APARENTE

5. PRESION ARTERIAL ELEVADA

6. IMPOSIBILIDAD PARA ORINAR , DOLOR ABDOMINAL INTENSO, DISTENCION ABDOMINAL INTENSA,CONSTIPACION AUSENCIA DE EDEPOSICIONES RECONSULTAR POR URGENCIAS.

EVOLUCION SOAP MEDICO

ANALISIS

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD G21 CON EMBARAZO DE 38 SEMANAS POR ECOGRAFIA- QUIEN INGRESA PARA REALIZACION DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CESAREA SEGMENTARIA + SALPINGECTOMIA BILATERAL POR EL SERVICIO DE GINECOLOGIA

PATOLOGICOS: NIEGA

ALERGIAS: NIEA

QX: CESAREA

RH: O +/- A+

CP: SI

PERFIL INFECCIOSO: NEGATIVO

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES ,CONSCIENTE, ORIENTADA, AFEBRIL, HIDRATADA, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, EUPNEICA SAT 98% - INDICA PREPARAR PARA CIRUGIA

Realizada por : MD073 ADRIANA PAOLA TRAVECEDO ALZATE Especialidad: MEDICINA GENERAL - Fecha: 16/10/202

6. EXAMEN DE APOYO Y DIAGNOSTICO

Cant.	Descripción	Observaciones
1	<u>HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES NEONATAL</u>	
Fecha de Orden: 16/10/2024		
1	<u>TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMA</u>	
Fecha de Orden: 16/10/2024		



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	Sexo Femenino
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución 602 CIRUGIA

FECHA Y HORA DE APLICACION:16/10/2024 08:38:12 REALIZADO POR: PIEDAD SOFIA NOCHES AHUMADA

Realizada por : MD073 ADRIANA PAOLA TRAVECEDO ALZATE Especialidad: MEDICINA GENERAL - Fecha: 18/10/202

INTERPRETACIÓN

HEPATITIS B, ANTÍGENO DE SUPERFICIE (AG-HBS) TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA

RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 VIH, 1 Y 2 ANTICUERPOS TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA RESULTADO: NEGATIVO

1 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS

Fecha de Orden: 16/10/2024

SE REALIZA LABORATORIO CLINICO AL PACIENTE SEGUN LO ORDENADO POR EL MEDICO

FECHA Y HORA DE APLICACION:16/10/2024 08:38:13 REALIZADO POR: PIEDAD SOFIA NOCHES AHUMADA

INTERPRETACIÓN

HEPATITIS B, ANTÍGENO DE SUPERFICIE (AG-HBS) TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA

RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 VIH, 1 Y 2 ANTICUERPOS TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA RESULTADO: NEGATIVO

1 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS]

Fecha de Orden: 16/10/2024

FECHA Y HORA DE APLICACION:16/10/2024 08:38:14 REALIZADO POR: PIEDAD SOFIA NOCHES AHUMADA

INTERPRETACIÓN

HEPATITIS B, ANTÍGENO DE SUPERFICIE (AG-HBS) TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA

RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA PRUEBA RÁPIDA RESULTADO: NEGATIVO VALIDADO EN: 16/10/2024 8:37 VIH, 1 Y 2 ANTICUERPOS TÉCNICA: INMUNOCROMATOGRFÍA RESULTADO: NEGATIVO

1 PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL

Fecha de Orden: 16/10/2024

FECHA Y HORA DE APLICACION:16/10/2024 11:27:41 REALIZADO POR: PIEDAD SOFIA NOCHES AHUMADA

INTERPRETACIÓN

HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INV RECIÉN NACIDO TÉCNICA: AGLUTINACION GRUPO SANGUINEO: A FACTOR

RH: POSITIVO TIPO DE MUESTRA: CORDÓN UMBILICAL VALIDADO EN: 16/10/2024 11:25 SEROLOGIA POR RPR
TÉCNICA: AGLUTINACION RESULTADO: NO REACTIVO

1 HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] EN TUBO

Fecha de Orden: 16/10/2024



EPICRISIS



1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACION

HISTORIA CLINICA No. 1083029054		G. Etareo 7	Edad 27 AÑOS
Cedula	1083029054	DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ	
INGRESO Fec: 16/10/2024 06:43:26		EGRESO Fec: 18/10/2024 09:08:14	
Atn. Ingreso TRATAMIENTO ESPEC		Atn. Egreso HOSPITALIZACION	

Pabellon Evolución	602 CIRUGIA
--------------------	-------------

FECHA Y HORA DE APLICACION:16/10/2024 11:27:41 REALIZADO POR: PIEDAD SOFIA NOCHES AHUMADA

INTERPRETACIÓN

HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INV RECIÉN NACIDO TÉCNICA: AGLUTINACION GRUPO SANGUINEO: A FACTOR

RH: POSITIVO TIPO DE MUESTRA: CORDÓN UMBILICAL VALIDADO EN: 16/10/2024 11:25 SEROLOGIA POR RPR

TÉCNICA: AGLUTINACION RESULTADO: NO REACTIVO

1 ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO

TROMPAS DE FALOPIO

Fecha de Orden: 16/10/2024

7. MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS

Cantidad	Descripción
7,00 BOLSA	LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) 500 CC
2,00 FRASCO VIAL	CEFAZOLINA 1 GR POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE
2,00 BOLSA	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% SOLUCION INYECTABLE X 500 ML
2,00 GRAMO	CEFAZOLINA 1 GR POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE
2,00 AMPOLLA	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE
1,00 TABLETA	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
1,00 TABLETA	IBUPROFENO 400 MG TABLETA
2,00 TABLETA	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA

ME022 JORGE JAVIER ROCHA ROJAS

Reg. 12235

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA



**INCAPACIDAD MEDICA
CLINICA DE LA MUJER S.A.
NIT: 819000364-7
COD. HAB: 470010040601**

Código:
FR-DM-007-01

Fecha de emisión:
10/05/2017


Versión: 001

Fecha de Actualización:
29/11/2022

NOMBRE DE PACIENTE: DANIELA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ
FECHA: 18/10/24
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: PT__ RC__ TI__ CC__ X__ PAP CE__ OTRO__ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083029054
LUGAR DE EXPEDICIÓN: SANTA MARTA EMPRESA EPS (EAPB): SANITAS
DIAGNOSTICO: PARTO UNICO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACIÓN CODIGO CIE 10: O809
FECHA INICIO INCAPACIDAD: 16/10/24 FECHA FINAL 18/02/2025 DIAS DE INCAPACIDAD: 126 DIAS
GRUPO DE SERVICIOS: CONSULTA EXTERNA__ APOYO DX CLÍNICO__ INTERNACIÓN__ X__ QUIRURGICO ATENCIÓN INMEDIATA__
MODALIDAD: INTRAMURAL CAUSA O MOTIVO DE ATENCIÓN (ORIGEN COMÚN O LABORAL): LICENCIA DE MATERNIDAD X
INCAPACIDAD RETROACTIVA: SI NO
EMBARAZO DE 37.6 SEMANA
NOMBRE DEL MÉDICO: JOSE FERNANDO LORA SERRANO REGISTRO MÉDICO: 289
NÚMERO DE CEDULA: 12622658

FIRMA

Este documento es propiedad de la Clínica de la Mujer S.A., las versiones vigentes y aprobadas se encuentran publicadas en la red interna de la Clínica.



CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL



NÚMERO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO


24102611167726

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DEL NACIMIENTO Departamento MAGDALENA		Municipio SANTA MARTA	
ÁREA DEL NACIMIENTO Área Cabecera Municipal		Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío)	
FECHA DEL NACIMIENTO Año - Mes - Día 2024-10-16		HORA DEL NACIMIENTO Hora - Minutos 09:04:00	
SEXO DEL NACIDO VIVO Femenino	HEMOCLASIFICACIÓN DEL NACIDO VIVO Grupo sanguíneo A		Factor RH Positivo
IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE Tipo de documento Cédula de ciudadanía		Número de documento 1083029054	
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DE LA MADRE (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)			
Primer apellido SANCHEZ	Segundo apellido LOPEZ	Primer nombre DANIELA	Segundo nombre CAROLINA
DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL NACIDO VIVO ES RECONOCIDO POR SUS PADRES COMO			
Pertenencia étnica Ninguno de los anteriores		¿A cuál pueblo indígena pertenece?	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL NACIDO VIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR Tipo de documento Cédula de ciudadanía		Número de documento 12622658	
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR			
Primer apellido LORA	Segundo apellido SERRANO	Primer nombre JOSE	Segundo nombre FERNANDO
PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO Médico		REGISTRO PROFESIONAL 289	
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Departamento MAGDALENA		Municipio SANTA MARTA	
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Año - Mes - Día 2024-10-16		FIRMA DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO 	

NIT: 800185449 - 9
Sede: Clínica Avidanti Santa Marta
Código Habilitación: 470010153901
Cra 4 No. 26 A - 71, Santa Marta - MAGDALENA - Tel: 5-4237123



PACIENTE: DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO (1004424744)

Plan de tratamiento

DEFINIR CONDUCTA
SS EKG
SS RX DE TORAX
SS HEMOGRAMA, PCR, TROPONINA
TRAMADOL 50MG IV EN 250CC DE SSN
METOCLOPRAMIDA IV EN 100CC DE SSN
ASA TAB AHORA
REVALORAR
CSV Y AC

Diagnóstico de Ingreso

DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO(Principal)

Impresión Diagnóstica

R074

Tratamiento, consultas y evoluciones

Evolución Urgencias. Ubicación: CASM-Urgencias

Profesional: ANDREA SOFIA GOEZ RODRIGUEZ (Medicina General), Fecha: 18-oct.-2024 17:54

Subjetivo

REPORTE DE PARACLINICOS

Análisis médico

SE REVALORA PACIENTE EN SALA DE OBSERVACION QUIEN REFIERE LEVE MEJORÍA DE CUADRO CLINICO INICIAL, NIEGA NUEVA SINTOMATOLOGIA. AL MOMENTO HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO VÍA ORAL Y OXÍGENO AMBIENTE, SIGNOS VITALES EN METAS. SE RECIBEN PARACLINICOS: RX DE TORAX: CENTRADA, NO SIGNOS DE CONSOLIDACION, EKG: RITMO SINUSAL, NO SIGNOS DE ISQUEMIA, PACIENTE CON PERSISTENCIA DE CEFALEA POR LO CUAL INDICO ANALGESIA, PENDIENTE TROPONINA

Plan de tratamiento

OBSERVACION
DIPIRÓNA 2GR IV EN 100CC
DEXAMETASONA 8MG IV EN 100CC
PEND. TROPONINA
CSV Y AC

Otros eventos

Egreso

Profesional: DIANYS PAOLA ESCORCIA BOLAÑO (Medicina General)

Fecha: 18-oct.-2024 21:18

Ubicación: CASM-Urgencias

Fecha de ingreso: 18-oct.-2024 13:37

Servicio de egreso: Urgencias

Subjetivo

ME SIENOT BIEN

Análisis médico

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir los protocolos de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal, aplicados por el personal de salud ***

Imprime: DIANYS PAOLA ESCORCIA BOLAÑO Fecha Imp: 18/10/2024 9:19:00 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Rango social: WELHI COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

AVIDANTI S.A.S.
NIT: 800185449 - 9
Sede: Clínica Avidanti Santa Marta
Código Habilitación: 470010153901
Cra 4 No. 26 A - 71, Santa Marta - MAGDALENA - Tel: 5-4237123



PACIENTE: DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO (1004424744)

ADMISION No. 1358835

Identificación	CC 1004424744	Sexo al nacer	Mujer	Fecha Ingreso	18/10/2024 1:37:00 p. m.
Fecha nac.	3/01/2000	Edad	24 años	Ubicación	CASM-Urgencias
Tel.	0000 - 3145549966	Ingreso		Clase de Ingreso	Urgencias
Dirección	KRA 18A 1 N 29C-27			Origen	DERIVADO DE URGENCIAS
Municipio	Santa Marta			Servicio	Urgencias
Departamento	MAGDALENA			Grupo de servicios	Atención inmediata
Tipo de zona	Zona Urbana			Contrato	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SU
Acomp.	DIANA GIRALDO - Madre			NIT	800130907
				Plan	CONTRIBUTIVO- Cotizante

EPICRISIS UBICACIÓN: CASM-URGENCIAS. FECHA EVENTO: 18/10/2024 9:19:00 p. m.
Ingreso

Fecha de ingreso: 18-oct.-2024 13:37

Ubicación de ingreso: CASM-Urgencias

Servicio de ingreso: Urgencias

Profesional: ANDREA SOFIA GOEZ RODRIGUEZ (Medicina General)

Fecha: 18-oct.-2024 13:42

Ubicación: CASM-Urgencias

Fecha de ingreso: 18-oct.-2024 13:37

Motivo de consulta

Servicio de ingreso: Urgencias

REFIERE " TENGO DOLOR EN EL PECHO "

Enfermedad actual

PACIENTE FEMENINA DE 24 AÑOS DE EDAD QUIEN INGRESA A SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE 6 HORAS DE EVOLUCION DADO POR:
DOLOR TORACICO IRRADIADO A MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO TIPO PUNZADA DE INTENSIDAD 9 - 10 EN LA ESCALA ANALOGA DEL DOLOR, NAUSEAS, ADINAMIA, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA, POR LO QUE CONSULTA

ANTECEDENTES

GINECOLOGICOS: G0

PATOLOGICOS: NIEGA

FARMACOLOGICOS: NIEGA

ALERGICOS: NIEGA

TOXICOLOGICOS: NIEGA

QUIRURGICOS: EXTRIPACION DE FIBROADENOMA SENO DERECHO

HEMOCLASIFICACION: O+

VACUNA COVID 19: 3 DOSIS

Análisis médico

PACIENTE FEMENINA QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO ANTERIORMENTE DESCRITO, ACTUALMENTE PACIENTE CLINICAMENTE ESTABLE, TOLERANDO VIA ORAL Y OXIGENO AMBIENTE, AFEBRIL, NORMOTENSA, SIN SIGNOS DE SIRS, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN NEUROLÓGICA, AL EXAMEN FÍSICO: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, TAQUICÁRDICOS, LEVE DOLOR ABDOMINAL A LA PALPACIÓN EN EPIGASTRIO. SE INGRESA PARA MANEJO MÉDICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. SE LE EXPLICA PROCEDER MÉDICO A PACIENTE QUIEN MANIFIESTA COMPRENDER Y ACEPTAR, SUJETO A EVOLUCIÓN CLÍNICA.

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicados por el personal de salud ***

Impreso: DIANYS PAOLA ENCERRIA BOLANO Fecha Imp: 18/10/2024 9:19:00 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELB COLOMBIA SAS NIT: 900.713.696-3

AVIDANTI S.A.S.
NIT: 800185449 - 9
Sede: Clínica Avidanti Santa Marta
Código Habilitación: 470010153901
Cra 4 No. 26 A - 71, Santa marta - MAGDALENA - Tel: 5-4237123



PACIENTE: DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO (1004424744)

ADMISION No. 1361993

Identificación	CC 1004424744	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	22/10/2024 1:38:00 p. m.
Fecha nac.	3/01/2000	Edad	24 años	Ubicación	CASM-Urgencias
Tel.	3145549966 - 3145549966	Ingreso		Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	KRA 18A 1 N 29C-27			Origen	DERIVADO DE URGENCIAS
Municipio	Santa marta			Servicio	Urgencias
Departamento	MAGDALENA			Grupo de servicios	Atención inmediata
Tipo de zona	Zona Urbana			Contrato	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SU
Acomp.:	DIANA GIRALDO - Madre			NIT	800130907
				Plan	CONTRIBUTIVO- Cotizante

EPICRISIS UBICACIÓN: CASM-URGENCIAS. FECHA EVENTO: 22/10/2024 1:50:00 p. m.
Ingreso

Fecha de ingreso: 22-oct.-2024 13:38

Ubicación de ingreso: CASM-Urgencias

Servicio de ingreso: Urgencias

Profesional: JOSE MIGUEL PEREZ BARON (Medicina General)

Ubicación: CASM-Urgencias

Fecha de ingreso: 22-oct.-2024 13:38

Servicio de egreso: Urgencias

Fecha: 22-oct.-2024 13:43

Motivo de consulta

SE ME ESTÁ DOBLANDO LA BOCA COMO UN TIC NERVIOSO

Enfermedad actual

FEMENINA DE 24 AÑOS CON MARCADO ANIMO ANSIOSO, CON ANTECEDENTES DE TRASTORNO MIXTO ANSIEDAD Y DEPRESION, CONSULTA POR CUADRO CLINICO DE 4 HORAS DADO POR SENSACIÓN DE BOCA DORMIDA, ANTERIORMENTE CONSULTÓ POR CRISIS DE ANSIEDAD CON DOLOR TORÁCICO, CONSIDERO CONTRACTURA MUSCULAR DE MUSCULOS DE LA CARA, RECOMIENDO MANEJO AMBULATORIO CON RELAJANTE Y CONTINUAR ATENCIÓN DE PATOLOGIA PSIQUIATRICA CON SU ESPECIALIDAD TRATANTE.

-PATOLÓGICOS: TRASTORNO MIXTO ANSIEDAD Y DEPRESION
-FARMACOLÓGICOS: NIEGA
-FAMILIARES: NIEGA
-ALERGIAS: NIEGA
-TÓXICOS: NIEGA
-HEMOCLASIFICACIÓN: O+
-QUIRÚRGICOS: RESECCION DE FIBROADENOMA MAMA DERECHA 2016
-OCUPACIÓN: SUPERVISORA SYSO
-RELIGION: CATOLICO
-INMUNIZACIÓN CONTRA COVID-19: 3 DOSIS
SE ATIENDE PACIENTE CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Análisis médico

INGRESA PACIENTE FEMENINA CON CUADRO CLÍNICO YA DESCRITO, ACTUALMENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICA Y VENTILATORIAMENTE, SIN SIGNOS DE SIRS, AFEBRIL, NO ABDOMEN AGUDO, NO DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE, ANIMO PREDOMINANTEMENTE ANSIOSO, SIN FARMACOTERAPIA PSIQUIATRICA EN LA ACTUALIDAD, SIN IDEACION SUICIDA EN LA ACTUALIDAD, NO REQUIERE SEGUIMIENTO POR URGENCIAS, MOTIVO

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención personal en la institución. Por tanto, se recomienda seguir los medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal, así como el uso de mascarilla.

Impreso: JOSE MIGUEL PEREZ BARON Fecha Imp: 22/10/2024 1:52:00 p. m.
Generado por: COMEDISYS - Rueda social: WELLI COLOMBIA SAS NIT: 906.723.696-3

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Santa Marta

Código Habilitación: 470010153901

Cra 4 No. 26 A - 71, Santa marta - MAGDALENA - Tel: 5-4237123



PACIENTE: DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO (1004424744)

Identificación CC 1004424744
Fecha nac. 3/01/2000
Tel. 3145549966 - 3145549966
Dirección KRA 18A 1 N 29C-27
Municipio Santa marta
Departamento MAGDALENA
Tipo de zona Zona Urbana
Acomp.: DIANA GIRALDO - Madre

Sexo al nacer Mujer
Edad 24 años
Ingreso

ADMISION No. 1361993
Fecha ingreso 22/10/2024 1:38:00 p. m.
Ubicación CASM-Urgencias
Clase de ingreso Urgencias
Origen DERIVADO DE URGENCIAS
Servicio Urgencias
Grupo de Atención inmediata
servicios SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE
Contrato SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL
REGIMEN SU
NIT 800130907
Plan CONTRIBUTIVO- Cotizante

INCAPACIDAD UBICACIÓN: CASM-URGENCIAS. FECHA EVENTO: 22/10/2024 1:53:00 p. m.

Incapacidad

No 114039

Modalidad del servicio Intramural
Origen de incapacidad Común
Diagnostico principal F412
Fecha de inicio 22 - oct. - 2024
Días 3
Fecha hasta 24 - oct. - 2024
Dirigido a A QUIEN CORRESPONDA

JOSE MIGUEL PEREZ BARON

CC 1083037135

MEDICINA GENERAL

R.M. 1083037135

AVIDANTI S.A.S.

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Santa Marta

Código Habilitación: 470010153901

Cra 4 No. 26 A - 71, Santa marta - MAGDALENA - Tel: 5-4237123



PACIENTE: DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO (1004424744)

ADMISION No. 1358835

Identificación	CC 1004424744	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	18/10/2024 1:37:00 p. m.
Fecha nac.	3/01/2000	Edad ingreso	24 años	Ubicación	CASM-Urgencias
Tel.	0000 - 3145549966			Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	KRA 18A 1 N 29C-27			Origen	DERIVADO DE URGENCIAS
Municipio	Santa marta			Servicio	Urgencias
Departamento	MAGDALENA			Grupo de servicios	Atención inmediata
Tipo de zona	Zona Urbana			Contrato	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SU
Acomp.:	DIANA GIRALDO - Madre			NIT Plan	800130907 CONTRIBUTIVO- Cotizante

INCAPACIDAD UBICACIÓN: CASM-URGENCIAS, FECHA EVENTO: 18/10/2024 9:21:00 p. m.

Incapacidad

No 113553

Modalidad del servicio	Extramural domiciliaria
Origen de incapacidad	Común
Diagnostico principal	R074
Fecha de inicio	18 - oct. - 2024
Días	2
Fecha hasta	19 - oct. - 2024
Dirigido a	A QUIEN CORRESPONDA


Dianys Escorcia

DIANYS PAOLA ESCORCIA BOLAÑO

CC 1221980581

MEDICINA GENERAL

R.M. 1221980581-CC1221980581



VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD ***A causa de la pandemia por SARS COV2 - COVID 19 y a pesar que la Clínica Avidanti ha seguido todos los lineamientos y protocolos para evitar la propagación del virus, se genera un riesgo de contagio de esta enfermedad al momento de recibir atención presencial en la institución. Por tanto, se recomienda seguir las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de equipos de protección personal indicada por el personal de salud.***

Imprime: DIANYS PAOLA ESCORCIA BOLAÑO Fecha Imp: 18/10/2024 9:21:00 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3



Centros Hospitalarios del Caribe
Nit.900520510 0
EVOLUCIÓN MÉDICA

Caso: 792947

PACIENTE: 1082858487 - JHON MARTIN RUDAS TORRES

Consecutivo: 977562-3

No. de Caso: 792947	Nombre del Paciente JHON MARTIN RUDAS TORRES	Edad 19 AÑOS	Sexo MASCULINO	Identificación 1082858487
Servicio: URGENCIAS				

Fecha y Hora

04/10/24 - 14:00

DIAGNOSTICOS

RESFRIADO COMUN

NOTA DE LA EVOLUCION MEDICA

REVALORO PACIENTE DE 19 AÑOS QUIEN REFIERE MEJORIA EN SU CUADRO CLINICO CON RESPECTO A SU ESTADO DE INGRESO.

IDX:

1- RESFRIADO COMUN

AL EXAMEN FISICO SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO GENERAL

TA 120/80 FC 85 FR 18 T 36.5°C SO2:98%

NORMOCEFALO, PINRAL, MUCOSA ORAL HUMEDA,

CUELLO MOVIL SIMETRICO SIN ADENOPATIAS PALPABLES,

TORAX SIMETRICO, EXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN AGREGADOS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS

SIN SOPLOS NI AGREGADOS,

ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO VISCEROMEGALIAS, EXTREMIDADES

EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR NORMAL,

SNC: NO DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

FORMULA MEDICA:

** N-ACETILCISTEINA (FLUMOCIL) SOBRES 200 MG, TOMAR 1 SOBRE EN AGUA DIARIO POR 5 DÍAS (SUMINISTRO FAMILIAR)

** ACETAMINOFÉN 500 MG TAB # 20

TOMAR 1 TAB VO CADA 6 HORAS EN CASO DE FIEBRE DURANTE 5 DIAS

** LORATADINA TAB 10 MG # 10

TOMAR 1 TAB VO CADA 12 HORAS POR 5 DÍAS

*RECOMENDACIONES:

- ABUNDANTES LÍQUIDOS,

- JUGOS CÍTRICOS O VITAMINA C,

- BEBIDAS CALIENTES - DULCES (EN MIEL DE ABEJAS),

- LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD ES POR VARIOS DÍAS 3 A 5, CON DISMINUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS A MEDIDA QUE PASAN LOS DÍAS.

*SIGNOS DE ALARMA:

- DOLOR DE OÍDO,

- DIFICULTAD PARA TRAGAR,

- DIFICULTAD PARA RESPIRAR,

- BABEO,

- AUMENTO EN LA FRECUENCIA RESPIRATORIA,

- EXPECTORACIÓN SANGUINOLENTA,

- HUNDIMIENTO DE LAS COSTILLAS AL RESPIRAR O RUIDOS RESPIRATORIOS ANORMALES.



Centros Hospitalarios del Caribe

Nit.900520510 0

REPS.470010107801

FORMATO DE INCAPACIDAD

Caso No. 792947

4/10/2024 SANTA MARTA / MAGDALENA

Paciente: JHON MARTIN RUDAS TORRES

Edad: 19 Años

Tipo Doc: CC

No.1082858487

Sexo: Masculino

Entidad Promotora de Salud (EPS) o Entidad Adaptada: -

Grupo Servicios: Atención inmediata

Modalidad Prestación de Servicios: Intramural

Diagnostico principal: J00X : RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

Origen Incapacidad: COMÚN

Causa Que Motiva La Atención: ENF. COMÚN

Duracion: (2) DOS DIAS Desde 04-oct.-2024 Hasta 05-oct.-2024

Prorroga: NO

Incapacidad Retroactiva:

Incapacidad Valida solo con la Firma del Medico.

Firma Medico:

ALESSANDRO DEL PIERO LUBO CHAIN

CC 1234093993

Reg. Med. 1234093993

Direccion: Pbx:

CM

ALUBO: ALESSANDRO DEL PIERO LUBO CHAIN

Fecha Impresión: 4/10/2024

ENILSAP

Page 1 of 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR	N° IDENTIFICACIÓN	FECHA DE ENTREGA	CABEZA, FACIAL Y VISUAL	AUDITIVA	RESPIRATORIA	CORPORAL	MANOS	PIES	OTRO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DEL COLABORADOR
			CASCOS DE SEGURIDAD BANDERILLO PARA ASEGURAR MARCHA EN CUESTA PARA PROTECCIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTESALDOS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CAPOTA SIN FILTROS	DIRECCIÓN EMB TIPO CORPA	MASCARILLA FLESA MATERIA MASCARILLA NEGRA CARA CON	PANTALON EN JEAN CAMISA EN CUELLO MANGA LARGA CHALECO CHUBETERA PETO Y BARRAS DE CALAMAZA DIVISION SEPARABLE	GUANTE CAJANA GUANTE VAGUETA	GUANTES DE CAUCHO GUANTES DE NYLON GUANTES DE CUERO	BOTA DE SEGURIDAD BOTA DE SEGURIDAD CAUCHO		
YEISON ATENCIO	7192815319	19/10/24					X			DAYANA C	Yelison
JOSE PAOLINA	71597805	19/10/24					X			DAYANA C	José Paola
UGAIDO GAVIRIA	7083432914	19/10/24					X			DAYANA C	Ugaido
GUSTAVO HERNANDEZ	7004355782	19/10/24					X			DAYANA C	Gustavo

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: SANTA MARIA - 02/10/24 Ubicación: PO CAIPA

TEMA (S): TRABAJO EN EQUIPO

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 1 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	José Pineda	14597805	OFICIAL	José Pineda
2	Juan Cármones	1083018159	OFICIAL	Juan Cármones
3	José Antonio	1192809217	OFICIAL	José Antonio
4	Gustavo Hernández	1004355782	OFICIAL	Gustavo Hernández
5	Andrés Pontón Alvar	1083003795	OFICIAL	Andrés Pontón Alvar
6	Alvaro de la Hoz	122964601	SSTN	Alvaro de la Hoz
7	Ronald Mendoza	10822775319	OFICIAL	Ronald Mendoza
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: SANTA MARTA - 03/10/24 Ubicación: RIO GAIPA

TEMA (S): CONSUMO DE ALCOHOL TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, RIESGO Y PREVENCIÓN

INSTRUCTOR: DAYANA CERVANTES TIEMPO (MINUTOS) 4 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Andres Porton Alvar	1083003795	Bidón	
2	JOSÉ PEREZ	11597805	OFICIN	José Pérez
3	Juan Reyes	1083018109	ayudante	Juan Reyes
4	YOSUN A. PINO	1192808217	OFICIN	Yosun
5	Guillermo Hernández	1004355782	ayudante	Guillermo
6	Rafael Montenegro	1082986414	topo	Rafael
7	ALVARO De la Hoz	1229164602	SS TINI	Alvaro de la Hoz
8	Rafael Mendoza	1082875319	Ayudante	Rafael Mendoza
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: SANTA MARIA - 4/10/24 Ubicación: RIO GIRALDO

TEMA (S): RIESGOS SILENCIOS

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 10 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Custodio Hernandez	1004355781	Agua de	Custodio
2	Andres Pontin Alvar	1003003705	Biologo	Andres
3	Jose Delfino	14597805	Oficial	Jose Delfino
4	Juan Pantoja	ayuden lo	1003003705	Juan Pantoja
5	Felipe Vengem	1082986414	1082986414	Felipe M
6	Yerson Atencia	1197808212	Oficial	Yerson
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE



REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 7/10/24 Ubicación: RIO GAIPA
TEMA (S): RIESGO PUBLICO.

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 1 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Gerardo Hernandez	1204355782	Gerente	Gerardo Hernandez
2	Yosun A. Pardo	1142809247	Gerente	Yosun A. Pardo
3	Andrés Rabin Abur	1003003795	Gerente	Andrés Rabin Abur
4	DOSO PABLO	141597808	OFICIN	DOSO PABLO
5	Juan Carlos	1043018104	ayudante	Juan Carlos
6	Felipe Valencia	1082986414	gerente	Felipe Valencia
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: SANTA MARTA - 8/10/24 Ubicación: PO GARA

TEMA (S): LOS RIESGOS DEL USO DEL CELULAR EN EL TRABAJO.

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 1 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	José Peralta	14547805	Oficial	José Peralta
2	Juan Cuamates	1083015109	ayudante	Juan Cuamates
3	José Peralta	1147809017	Oficial	José Peralta
4	Guillermo Hernández	1004355782	Muchacho	Guillermo Hernández
5	Andrés Pastor Alvar	1083003795	Briador	Andrés Pastor Alvar
6	ALVARO de la Hoz	122964601	SSTN	ALVARO de la Hoz
7	Ronald Mendoza	10822775319	Milario	Ronald Mendoza
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C

RESPONSABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 9/10/24 Ubicación: RIO GAIPA
TEMA (S): PAUSA ACTIVAS

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 10 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Guillermo Hernández	1004355782	Ayudante	Guillermo H
2	Vivian Arana	1197807242		Vivian A
3	Ronald Mendoza	1082715319	Musante	Ronald D Mendoza
4	Andrés Portón Alar	1093003795	Bidgero	Andrés P
5	Dosó Portón	141591805	Oficial	Dosó Portón
6	Juan Cortez	1093018109	Ayudante	Juan Cortez
7	Felipe Valencia	102186414	Topo	Felipe M
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE



REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	☒	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otro	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	------	--------------------------

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 11/10/24 Ubicación: RIO GAIPA
 TEMA (S): PAUSAS ACTIVAS (DINAMICA DE LAS FRUTAS)

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 1 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Carlos Henriquez	1004355782	Asistente	[Firma]
2	Yolanda Alvarado	1192808107	OTU	[Firma]
3	Anhel Parra Alvar	1007003745	Balayo	[Firma]
4	Ronald Mendoza	1032815319	Asistente	Ronald Mendoza
5				
6	Rosio Padilla	14547805	OFICIA	Rosio Padilla
7	Juan (Ceniza)	1083013109	Operate	Juan Ceniza
8	Felipe Valencia	1082986414	topo	Felipe M
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE



REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 16/10/24 Ubicación: RIO GAIPA
 TEMA (S): PROTECCION OCULAR Y CUIDADO DE LA
USTA

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Ronald Mendoza	1082815319	Asistente	Ronald Mendoza
2	Yolanda Alvarado	1192908219	Asistente	Yolanda Alvarado
3	Cesario Hernandez	1004355122	Asistente	Cesario Hernandez
4	Felipe Tenorio	100300379	Asistente	Felipe Tenorio
5	Edgar Rivera	1082986414	Asistente	Edgar Rivera
6	Jose Padilla	1865322	Asistente	Jose Padilla
7	Juan Carlos	14547805	Asistente	Juan Carlos
8		1083018109	Asistente	Juan Carlos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias ☒ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otro ☐

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 22/10/24 Ubicación: RIO GAIPA

TEMA (S): ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CALOR

INTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Cayetano Hernandez	1004355780	ayuda	Cayetano
2	Ramiro Mendoza	1082815319	ayuda	Ramiro Mendoza
3	Ramiro	1083003995	B. de	Ramiro
4	BEIZARI BORNACHEA	1620207	ayuda	BEIZARIO
5	Yusef Alario	1192909247	ayuda	Yusef
6	Felipe Venecia	1082986414	ayuda	Felipe
7	José Padilla	19597805	ayuda	José Padilla
8	Juan Cejigales	1085018109	ayuda	Juan Cejigales
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE



REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	☒	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otro	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	------	--------------------------

CIUDAD Y FECHA: STA MTA - 23/10/24 Ubicación: RIO GAIPA
 TEMA (S): CAPACTACION EN MANEJO ADECUADO EN OBRA, CODIGO DE COLOR.

INSTRUCTOR: DAYANA C TIEMPO (MINUTOS) 1 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Carolina Hernandez	100455782	Asistente	[Firma]
2	Ylson Alvarado	1142809747	Asistente	[Firma]
3	Andrés Roldán Alvar	1003003305	Asistente	[Firma]
4	José María	141547805	Asistente	[Firma]
5	Juan Carlos	1003003305	Asistente	[Firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

DAYANA C
RESPONSABLE

FECHA: 1/10/24 al 5/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Jhosue sanjuan

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 01

UBICACIÓN: RIO GAIPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				1/10/24			2/10/24			3/10/24								
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X			X			X								
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				X			X			X								
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X			X			X								
INDICADORES				X			X			X								
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X			X			X								
ESPEJOS LATERALES				X			X			X								
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X			X			X								
PITO Y BATERIA				X			X			X								
CONTROL DE FUGAS				X			X			X								
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X			X			X								
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X			X			X								
ESTADO DEL BALDE				X			X			X								
CINTURON DE SEGURIDAD				X			X			X								
BOTIQUIN				X			X			X								
EXTINTOR				X			X			X								
FIRMA DIARIA OPERADOR				[Firma]			[Firma]			[Firma]								
FIRMA DIARIA SST				DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C								
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		
Jhosue sanjuan			DAYANA C															
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO			NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST															

FECHA: 4/10/24 al 12/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Josue Sanjuan

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 02

UBICACIÓN: QAD GAIRA.

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			
	4/10/24			5/10/24						7/10/24			11/10/24						
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X						X			X						
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X						X			X						
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X						X			X						
INDICADORES	X			X						X			X						
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X						X			X						
ESPEJOS LATERALES	X			X						X			X						
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X						X			X						
PITO Y BATERIA	X			X						X			X						
CONTROL DE FUGAS	X			X						X			X						
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X						X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X						X			X						
ESTADO DEL BALDE	X			X						X			X						
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X						X			X						
BOTIQUIN	X			X						X			X						
EXTINTOR	X			X						X			X						
FIRMA DIARIA OPERADOR	[Firma]			[Firma]						[Firma]									
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C						DAYANA C			DAYANA C						
OBSERVACIONES:																			
LUNES																			
MARTES																			
MIÉRCOLES																			
JUEVES																			
VIERNES																			
SÁBADO																			

Josue Sanjun
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERUANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 14/10/24 al 19/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Joshua Sanjuan

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 03

UBICACIÓN: RD 6A1RA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
							16/10/24						18/10/24			19/10/24		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO							X						X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS							X						X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO							X						X			X		
INDICADORES							X						X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS							X						X			X		
ESPEJOS LATERALES							X						X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO							X						X			X		
PITO Y BATERIA							X						X			X		
CONTROL DE FUGAS							X						X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO							X						X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS							X						X			X		
ESTADO DEL BALDE							X						X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD							X						X			X		
BOTIQUIN							X						X			X		
EXTINTOR							X						X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR							[Firma]						[Firma]			[Firma]		
FIRMA DIARIA SST							DAYANA C						DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Joshua Sanjuan
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERUANES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 28/10/24 al 31/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Inosue San Juan

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 05

UBICACIÓN: R10 GALPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	28/10/24			29/10/24			30/10/24			31/10/24								
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X			X								
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
INDICADORES	X			X			X			X								
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X			X								
ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X								
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
PITO Y BATERIA	X			X			X			X								
CONTROL DE FUGAS	X			X			X			X								
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X			X								
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X			X								
ESTADO DEL BALDE	X			X			X			X								
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X								
BOTIQUIN	X			X			X			X								
EXTINTOR	X			X			X			X								
FIRMA DIARIA OPERADOR	[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]								
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C								
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Inosue San Juan
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: SEMANA 1/10/24 - 5/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: OLIVER

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA: 01

UBICACIÓN: RIO GAIPA.

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	2/10/24			3/10/24			4/10/24											
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X			X											
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				X			X											
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X			X											
INDICADORES				X			X											
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X			X											
ESPEJOS LATERALES				X			X											
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X			X											
PITO Y BATERIA				X			X											
CONTROL DE FUGAS				X			X											
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X			X											
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X			X											
ESTADO DEL BALDE				X			X											
CINTURON DE SEGURIDAD				X			X											
BOTIQUIN				X			X											
EXTINTOR				X			X											
FIRMA DIARIA OPERADOR				Oliver B			Oliver											
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C											
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		
Oliver Burrrios						DAYANA CERUANTES												
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO						NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST												

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

CONSORCIO
ICASM 2023

FECHA: 4/10/24 - 12/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Oliver B

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 02
UBICACION: 210 GAIPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGUN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X			X									
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X			X									
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X			X									
INDICADORES	X			X			X			X									
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X			X									
ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X									
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X			X									
PITO Y BATERIA	X			X			X			X									
CONTROL DE FUGAS	X			X			X			X									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X			X									
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X			X									
ESTADO DEL BALDE	X			X			X			X									
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X									
BOTQUIN	X			X			X			X									
EXTINTOR																			
FIRMA DIARIA OPERADOR	Oliver B			Oliver B			Oliver B			Oliver B									
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C									
OBSERVACIONES:																			
LUNES																			
MARTES																			
MIÉRCOLES																			
JUEVES																			
VIERNES																			
SÁBADO																			

0 Oliver B

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 14/10/24 - 19/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Oliver B

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 03

UBICACIÓN: RIO GAIPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				15/10/24			16/10/24			17/10/24			18/10/24			19/10/24		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
LUCEFRONTALES Y TRASERAS				X			X			X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
INDICADORES				X			X			X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X			X			X			X			X		
ESPEJOS LATERALES				X			X			X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
PITO Y BATERIA				X			X			X			X			X		
CONTROL DE FUGAS				X			X			X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X			X			X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X			X			X			X			X		
ESTADO DEL BALDE				X			X			X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD				X			X			X			X			X		
BOTIQUIN				X			X			X			X			X		
EXTINTOR				X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR				Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver		
FIRMA DIARIA SST				DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Oliver Burrios
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERUANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST



PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: *21/10/24 - 26/10/24*

NOMBRE DEL OPERADOR: *OLIVER B*
NOMBRE INSPECTOR SST: *DAYANA C*

SEMANA *04*
UBICACIÓN: *RIO GAIPA*

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	21/10/24			22/10/24			23/10/24			24/10/24								
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X			X								
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
INDICADORES	X			X			X			X								
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X			X								
ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X								
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X			X								
PITO Y BATERIA	X			X			X			X								
CONTROL DE FUGAS	X			X			X			X								
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X			X								
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X			X								
ESTADO DEL BALDE	X			X			X			X								
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X								
BOTIQUIN	X			X			X			X								
EXTINTOR																		
FIRMA DIARIA OPERADOR	Oliver			Oliver			Oliver			Oliver								
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA			DAYANA C			DAYANA C								
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		
O - I - A - A - R - E - A - N - T - E - S																		

Oliver Burrios
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA GERANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 1/10/24 al 31/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: Haider Uribeles

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 01

UBICACIÓN: RIO GALPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	7/10/24			7/10/24			7/10/24			7/10/24								
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X			X			X								
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				X			X			X								
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X			X			X								
INDICADORES				X			X			X								
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X			X			X								
ESPEJOS LATERALES				X			X			X								
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X			X			X								
PITO Y BATERIA				X			X			X								
CONTROL DE FUGAS				X			X			X								
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X			X			X								
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X			X			X								
ESTADO DEL BALDE				X			X			X								
CINTURON DE SEGURIDAD				X			X			X								
BOTIQUIN				X			X			X								
EXTINTOR				X			X			X								
FIRMA DIARIA OPERADOR				Luis H			Luis H			Luis H								
FIRMA DIARIA SST				DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C								
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Haider Uribeles
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA C
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 7/10/24 al 12/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: HAIDER URILES

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 02

UBICACIÓN: RD GAIPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	7/10/24			8/10/24			9/10/24						11/10/24					
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X						X					
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X						X					
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X						X					
INDICADORES	X			X			X						X					
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X						X					
ESPEJOS LATERALES	X			X			X						X					
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X						X					
PITO Y BATERIA	X			X			X						X					
CONTROL DE FUGAS	X			X			X						X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X						X					
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X						X					
ESTADO DEL BALDE	X			X			X						X					
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X						X					
BOTIQUIN	X			X			X						X					
EXTINTOR	X			X			X						X					
FIRMA DIARIA OPERADOR	Haider Uriles			Haider Uriles			Haider Uriles						Haider Uriles					
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C			Dayana C						Dayana C					
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Haider Uriles
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA C
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 14/10/24 al 19/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: HAIDER URILES

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 03

UBICACIÓN: RIO GUA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				15/10/24									18/10/24			19/10/24		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X									X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				X									X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X									X			X		
INDICADORES				X									X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X									X			X		
ESPEJOS LATERALES				X									X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X									X			X		
PITO Y BATERIA				X									X			X		
CONTROL DE FUGAS				X									X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X									X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X									X			X		
ESTADO DEL BALDE				X									X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD				X									X			X		
BOTIQUIN				X									X			X		
EXTINTOR				X									X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR				Haider Uriles									Haider Uriles			Haider Uriles		
FIRMA DIARIA SST				DAYANA C									DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SABADO																		

Haider Uriles
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA C
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 21/10/24 al 26/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: HAIDER URUELES

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 04

UBICACIÓN: P10 GAIRA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	27/10/24						25/10/24			25/10/24			26/10/24			27/10/24		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X						X			X			X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X						X			X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X						X			X			X			X		
INDICADORES	X						X			X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X						X			X			X			X		
ESPEJOS LATERALES	X						X			X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X						X			X			X			X		
PITO Y BATERIA	X						X			X			X			X		
CONTROL DE FUGAS	X						X			X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X						X			X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X						X			X			X			X		
ESTADO DEL BALDE	X						X			X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD	X						X			X			X			X		
BOTIQUIN	X						X			X			X			X		
EXTINTOR	X						X			X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR	[Firma]						[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C						DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Haider Utes
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA C
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

FECHA: 18/10/24 a 13/10/24

NOMBRE DEL OPERADOR: HAIDER UÑALES

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA C

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 05

UBICACIÓN: RIO GALPA

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	18/10/24			19/10/24														
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X														
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X														
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X														
INDICADORES	X			X														
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X														
ESPEJOS LATERALES	X			X														
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X														
PITO Y BATERIA	X			X														
CONTROL DE FUGAS	X			X														
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X														
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X														
ESTADO DEL BALDE	X			X														
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X														
BOTIQUIN	X			X														
EXTINTOR	X			X														
FIRMA DIARIA OPERADOR	H. Uñales			H. Uñales														
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C														
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Haider Uñales
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

Dayana CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST



FORMATO DE INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES - CONSORCIO ICASM 2023

CÓDIGO: SST-FT-020

VERSIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2024

FECHA: 11-09-2024

ACOMPANAMIENTO INSPECCIÓN:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: DAYANA CERVANTES

ALVARO DE LA HOZ

CARGO: AUXILIAR SST

CARGO: INTERVENTOR

Marque con una C (cumple), NC (no cumple) o NA (No aplica)

Item	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CANTIDAD	C / NC / NA	OBSERVACIONES
1	Barrete Absorbentes (Rollos)	1	C	
2	Mascara de protección respiratoria	1	C	
3	Paños Absorbentes	10	C	
4	Cordones absorbentes	3	C	
5	Botas con punta de acero	1	C	
6	Gafas de seguridad	1	C	
7	Pala antichispa	1	C	
8	Gautes de nitrilo	1	C	
9	Sustrato absorbente particulado no reactivo	1	C	
10	Martillo antichispa	1	C	
11	Soga	1	C	
12	Cinta Señalización	1	C	
13	Desengrasante	1	C	
14	Bolsa para Residuos (rojas)	10	C	
15	Maletín o Contenedor (Protege los Elementos del Kit)	1	C	

FIRMA

Dayana C.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.



CONTRATO DE OBRA No. LP 006 de 2023

**OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y
AMBIENTALES”.**

**CONTRATISTA
CONSORCIO ICASM2023
NIT. 901.782.970-2**

INFORME SOCIAL

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA.....	6
2. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL.....	8
2.1. IDENTIFICACION ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
Rio Gaira (Santa Marta – Magdalena).....	8
2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO.....	11
3.2 Componente No.2 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.	12
3.2.1 PIEZAS DE DIVULGACIÓN.....	12
3.2.2 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN.....	13
3.2.3 ATENCIÓN DE PQRSF.....	35
3.2.4 ACTAS DE VECINDAD.....	35
5.4 Componente No.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	38



Índice de tablas.

Tabla 1. Identificación de los Impactos Sociales.

Tabla 2. Directorio de actores.

Tabla 3. Componente Comunicación, Divulgación, Acompañamiento Social.

Tabla 4. Componente Mano de Obra en la Zona.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene el propósito de dar a conocer las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2024, estas actividades son contempladas en el marco del Proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”.

Por medio del componente social se lleva a cabo constantemente el desarrollo de estrategias que contribuyan a mitigar el impacto social negativo que pudieran ocasionar las actividades de dragado en las comunidades próximas al área de influencia del presente proyecto.

A continuación, se detallan cada una de las actividades realizadas este mes con sus respectivos productos.

CONTRATO DE OBRA:	No. LP 006 de 2023
OBJETO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”.
LOCALIZACIÓN:	Santa Marta
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATISTA:	Consortio ICASM2023
INTERVENTORÍA:	Interventores e Ingeniería S.A.S
NIT CONSORCIO ICASM2023:	901.782.970-2
VALOR INICIAL:	7303.05 SMMLV
PLAZO INICIAL:	Vigencia 2024
FIRMA DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2023
ACTA DE INICIO:	19 de marzo de 2024
PRORROGA:	NINGUNA

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización general

DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA.

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud norte y 74° 12' 06" de latitud oeste.

El municipio se encuentra limitado por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur con los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar.

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

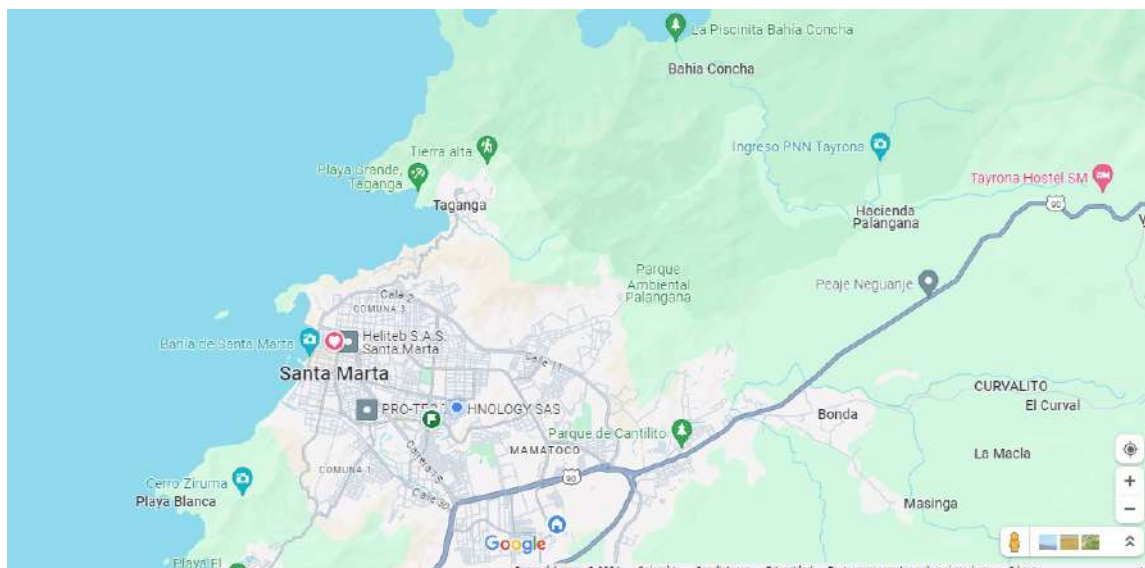


Ilustración 1 Localización general Santa Marta D.T.C.H.

Localización general del cuerpo de agua a intervenir

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

2. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL

2.1. IDENTIFICACION ÁREA DE INFLUENCIA

Rio Gaira (Santa Marta – Magdalena).

La degradación hidráulica y ambiental de este río, está asociada principalmente en la cuenca baja, donde se encuentra asentada la mayor parte de la población urbana; esto se ha generado por diferentes procesos históricos de desplazamiento y a su vez de invasión de manera no planificada en terrenos que generalmente no cuentan con condiciones físicas, ambientales, geográficas. Estas comunidades han invadido la cuenca de este importante afluente, año tras año ante situaciones ambientales relacionada con las épocas de inviernos torrenciales de la región son vulnerables a los procesos de inundación por los desbordamientos del río, ocasionándoles afectaciones en sus viviendas. Sumado a eso, está la ausencia de cultura ambiental por parte de las poblaciones asentadas en la ronda hídrica del río, evidenciado en el manejo de las excretas y desechos arrojados permanentemente al cauce; situación que muestra claramente la falta de pertenencia de las comunidades asentadas en la cuenca del río, lo que además de contribuir a la pérdida de la capacidad hidráulica, contribuye al deterioro paisajístico de este sector de la ciudad y ocasiona que las comunidades aledañas a la zona tengan una percepción negativa de este afluente. Por otra parte, este cumulo de basuras y desechos impactan negativamente en el ecosistema marino. Es preciso indicar que como consecuencia de factores meteorológicos como lo son grandes precipitaciones o deshieles, el caudal de los ríos aumenta repentinamente produciendo desbordamientos e inundaciones, afectando a las poblaciones aledañas. Estas situaciones climáticas cuando los ríos aumentan su cauce y arrastran de aguas arriba gran cantidad de lodos que se alojan en las desembocaduras, ocasiona sedimentación de las cuencas bajas, en el caso del río Gaira estas cantidades de sedimento interrumpen la interconexión natural entre este afluente y el sistema marino, lo que ocasiona un detrimento en la fauna del ecosistema estuarino de este importante sector, evidenciándose en el detrimento de la actividad pesquera en estos ecosistemas y, por ende, afectando económicamente a la población dedicada a esta actividad. Es por eso por lo que la población ha percibido el río como un problema durante años, ya que este se encuentra asociado a procesos como las inundaciones que año tras año se sufren en la ciudad. El invierno y la deforestación en la parte media de la cuenca, es una de las causas importantes de las inundaciones, la ruptura de boquetes y bermas que permiten el paso del agua hacia áreas residenciales provocando la pérdida de estos y el direccionamiento del agua hacia las comunidades dejando como resultado pérdidas materiales del patrimonio de la población. La extracción de materiales forestales de manera ilegal es una de las problemáticas que mayor se resaltan en la cuenca sobre todo en la parte media y baja, donde personas foráneas compran a los finqueros y parceleros madera y los transportan y disponen sobre el cauce del rio Gaira. Además de la utilización de la madera para las cocinas de los lugareños. Es importante mencionar que en la cuenca se observa un mal manejo de

los residuos sólidos y líquidos, sobre todo en la parte mayor poblada correspondiente a la cuenca baja del río Gaira. Sobre todo, en la desembocadura, los escombros productos de las construcciones hoteleras, son mal ubicados en los márgenes del río. Debido a lo anterior, se presentan entonces cambios del uso del suelo en áreas de uso público, reduciendo las posibilidades de restauración ecológica y conservación, comprometiendo la viabilidad de objetivos de protección ligados a las comunidades ubicadas en la zona de intervención. Información tomada de los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS del contrato, presentada al área de la subdirección técnica de CORPAMAG 2024.

Registros fotográficos del cuerpo de agua Río Gaira





2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO

La identificación de los riesgos socioeconómicos, culturales, ambientales que pueden ser causados por la ejecución de actividades de dragado nos permite identificar los impactos ya sean positivos o negativos y su efecto en las comunidades. Por tanto, es importante identificar las situaciones que puedan afectar el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto durante su ejecución.

RIESGO	EVENTO	NIVEL DE IMPACTO
1	Conflictos con comunidades conflictivas o que muestren desinterés por el proyecto y entidades ubicadas en el área conflictivas – No dejan realizar actividades.	Muy Alto - Negativo
2	Presencia y/o aumento de reasentamientos.	Muy Alto – Negativo
3	Atención de PQRSF por impactos generados de las actividades de dragado por parte de la comunidad y/o partes interesadas.	Muy Alto - Negativo
4	Contratación de Mano de Obra Local	Muy Alto - Positivo
5	Cambios en el tránsito de embarcaciones menores que transitan realizando su faena de pesca.	Muy Alto - Negativo
6	Afectación en caminos o vías destapadas por el paso de los equipos transportadores.	Muy Alto - Negativo
7	Ubicación y/o tránsito de equipos en áreas donde afecten cultivos.	Muy Alto - Negativo

Tabla 1. Identificación de los Impactos Sociales

2.1.3 DIRECTORIO DE ACTORES

El directorio de actores se convierte en una herramienta práctica, donde se recopila información como los datos personales, contactos y ubicación de cada uno de los actores o de las partes interesadas, el cual es verificado y actualizado periódicamente en el desarrollo del Proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. CONTRATO NO. LP-006-2023.

3.2 Componente No.2 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

Se realizan actividades para propiciar la interacción continua y permanente con las comunidades del área de influencia del proyecto y servir de enlace con estas no solo para brindar información sino además vincularlos a los diferentes procesos acompañamiento y participación social; y así mismo, recibir y atender sus inquietudes derivadas de la intervención en el marco del presente proyecto.

3.2.1 PIEZAS DE DIVULGACIÓN

Cartelera informativa: Se deberá establecer dentro del P.A.C un punto de fácil visualización, para las acciones de información y difusión donde se instalará una cartelera en la que se exponga información que contenga los aspectos más relevantes del proyecto, como avances de la obra, notas informativas, mecanismos de recepción de PQRSF y cualquier aspecto que se considere relevante. Dicha información deberá ser actualizada semanalmente.



Valla informativa del proyecto: Se realiza la instalación de la valla informativa con información del contrato tal como objeto y número del contrato, Contratista, Interventoría, y plazo de ejecución. La valla informativa se ubica en un lugar estratégico en el barrio Paraíso Rodadero sobre el puente de la carrera 4 con calle 24.



3.2.2 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN

Se realizaron las siguientes actividades:


- Se realizó el 25 de septiembre la socialización de las jornadas y talleres de educación ambiental en el marco de la implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental con la comunidad educativa del colegio IED Simón Bolívar de Gaira en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 25 de septiembre se realiza la socialización en la comunidad Avenida Licorera de Gaira, actual zona de construcción de los geocontenedores, de las jornadas y talleres de educación ambiental.



- Se realizó el 26 de septiembre la socialización de las jornadas y talleres de educación ambiental en el marco de la implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental en la comunidad de Villa Leidy en compañía de la profesional social de la interventoría.

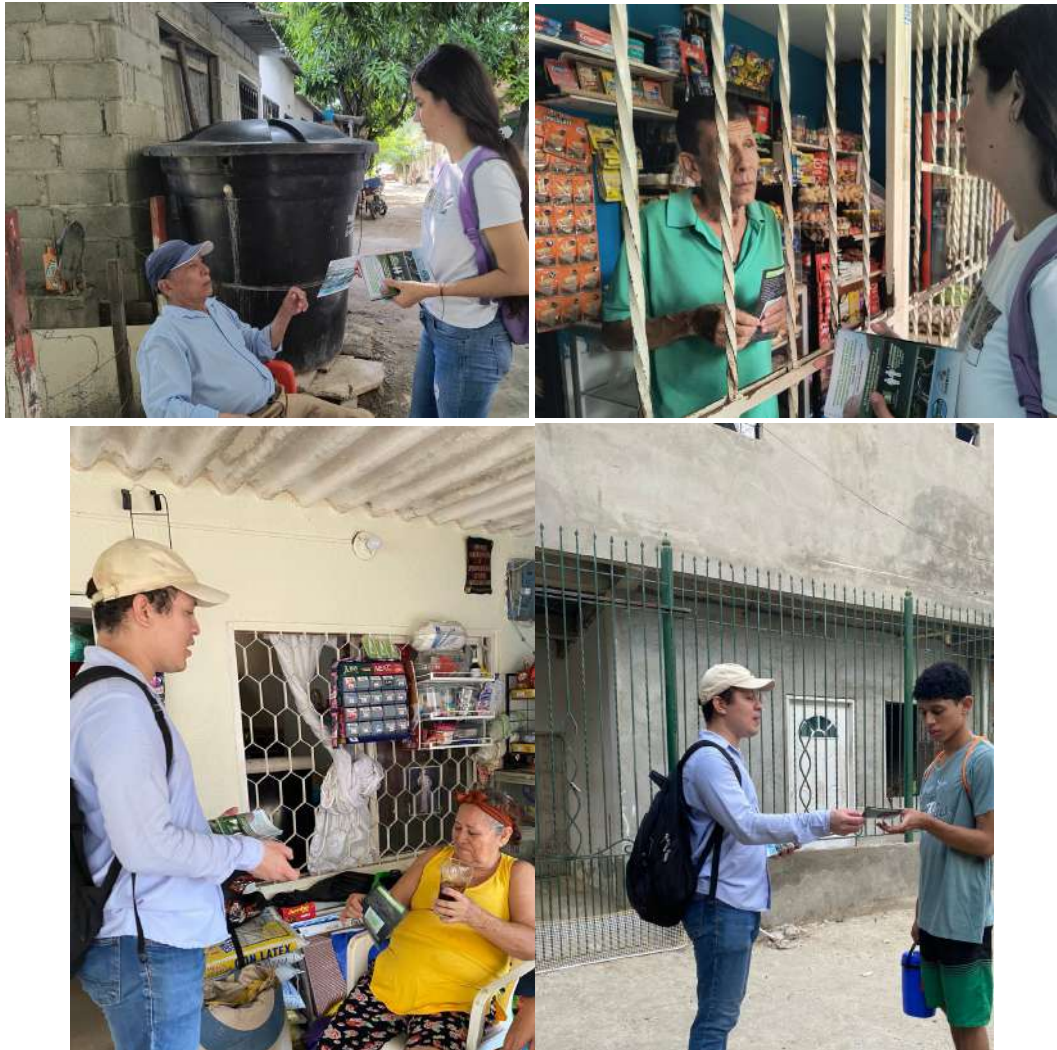

- El día 26 de septiembre se realiza acompañamiento en los talleres de educación ambiental en el sector de la Coquera de Gaira con los líderes sociales y miembros de esta comunidad, en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 27 de septiembre se realiza acompañamiento en los talleres de educación ambiental en la comunidad de Villa Leidy con los líderes sociales y moradores en compañía de la profesional social de la interventoría.





- El día 30 de septiembre se realiza la gestión de los espacios para la programación de las jornadas y talleres educativo-ambientales en el colegio y en las comunidades de Gaira.





- El día 1 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales con la comunidad educativa del colegio IED Simón Bolívar en compañía de la profesional social de la interventoría.





- Se realiza el día 2 de octubre la resocialización del proyecto y la atención de PQRSF de la Fundación Grupo Integra en compañía del ingeniero y social residente de la interventoría.



- El día 2 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales con la comunidad educativa del colegio IED Simón Bolívar en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 3 de octubre se realizan las jornadas de educación ambiental con la entrega a las comunidades de los contenedores para la recolección de las tapas plásticas (Tapatón) a fin de cumplir con la actividad de construcción de los murales ecológicos.



- El día 4 de octubre se realiza el cierre de actas de vecindad en la comunidad de Villa Leidy en compañía de la profesional social de la interventoría.





- Se realiza el día 4 de octubre acompañamiento en la ejecución de los talleres educativo-ambientales en la comunidad de Villa Leidy en compañía de la profesional social de la interventoría.





- El 8 y 9 de octubre se realiza el levantamiento de las actas de cierre en la comunidad de Villa Leidy, en compañía de la profesional social de la interventoría.





- Se realiza el día 10 de octubre reunión con la analista de asuntos culturales de la biblioteca del Banco de la República para gestionar el grupo de danza teatro que se presentará en el cierre general del proyecto para esta vigencia.



- El día 11 de octubre se realiza acompañamiento en la jornada de limpieza por parte del equipo de obra en la comunidad de Villa Leidy en compañía de su presidenta de la Junta de Acción Comunal.



- El día 15 de octubre se realiza la gestión de los espacios y programación de talleres educativo- ambientales con el líder social de la comunidad de Gaira.



- El día 16 de octubre se realiza acompañamiento a la jornada de limpieza frente al colegio IED Simón Bolívar de Gaira por parte del equipo de obra, en compañía del rector, la coordinadora de la institución educativa y la profesional social de la interventoría.





- El día 16 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales con la comunidad educativa del colegio IED Simón Bolívar en compañía de la profesional social de la interventoría.





- El día 17 de octubre se realiza resocialización del proyecto en la vereda Ojo de Agua y solicitud de permisos para el ingreso de equipos y/o maquinarias en los predios próximos a la zona de construcción de geocontenedores No. 2 (Finca Bellavista), en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 17 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales en la comunidad de La Coquera de Gaira con líderes sociales y moradores en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 18 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales en la comunidad de Villa Leidy con líderes sociales y moradores, en compañía de la profesional social de la interventoría.



Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com



- El día 21 de octubre se realiza el cierre de actas de vecindad y la socialización de las jornadas y talleres de educación ambiental en el marco de la implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental en las comunidades de Gaira en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 22 de octubre se realiza la entrega a la comunidad de Villa Leidy de los implementos para la jornada de limpieza programada, en compañía de la presidenta de la JAC y los moradores.



- El día 24 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales a miembros de las comunidades de Gaira, en compañía de la profesional social de la interventoría.



- El día 25 de octubre se realiza el cierre de actas de vecindad de los predios ubicados en la zona de construcción de geocontenedores No. 1 (Avenida Licorera).





- El día 25 de octubre se realiza acompañamiento en los talleres educativo-ambientales con la comunidad educativa del colegio IED Simón Bolívar, en compañía del contratista de la oficina de subdirección técnica de CORPAMAG.



3.2.3 ATENCIÓN DE PQRSF

Durante la ejecución del presente mes del Proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. CONTRATO NO. LP-006-2023, se atendió una petición manifestada por los administrativos de la Fundación Grupo Integra, solicitando extender las obras de protección realizadas en la zona hasta su predio debido a la afectación de sus gaviones por acción del río, en discordancia a lo contemplado en el diseño del proyecto, para lo cual se realizaron unas propuestas y acuerdos pero estos decidieron realizar una solicitud de directa a CORPAMAG.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

3.2.4 ACTAS DE VECINDAD

Se levantará una información teniendo en cuenta que el área directa de la intervención es el mismo cuerpo de agua Río Gaira, se considerara área de relacionamiento las estructuras que se encuentren a lado y lado del río, esta información se consignará en un documento llamado Acta de Vecindad la cual será aprobada por la interventoría, a su vez funcionara ante alguna situación de manifestación por parte de la comunidad y/o estructuras encontradas en el río que puedan poner en riesgo el libre desarrollo del proyecto. Al finalizar el proyecto se levantará las actas de vecindad de cierre la cual contará con la firma a satisfacción del propietario de las estructuras encontradas.

Para este periodo, no se realizó apertura de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto, se llevaron a cabo el cierre de actas en las zonas donde el proyecto ya hizo su intervención.

ACTAS DE CIERRE MES OCTUBRE

No.	PROPIETARIO/ENCARGADO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	TIPO DE PREDIO
1	Valentina Rey	Cra 2c No. 22 – 31 Villa Leidy	Valor normal
2	Lilibeth Mejía	Cll 23 No. 2ª – 14 Villa Leidy	Valor normal
3	Gloria Gómez Requena	Cll 23 No. 2C – 05 Villa Leidy	Valor normal
4	Lucy Requena Aguas	Cll 23 No. 2B – 41 Villa Leidy	Valor normal
5	Mirtha Reyes de Hernández	Cll 23 No. 2C – 05 Apto 2 Villa Leidy	Valor normal
6	Benjamin Condiza Cardozo	Cll 23 Cra 2 – 58 Casa 1 Villa Leidy	Valor normal
7	Benjamin Condiza Cardozo	Cll 23 Cra 2 – 58 Casa 2 Villa Leidy	Valor normal
8	Yasbleidis Rivera Cortes	Cll 23 No. 2B – 54 Villa Leidy	Valor normal
9	Teresa de Núñez Andrade	Cll 23 No. 3 – 19 Rodadero Sur	Valor normal

10	Ramon Navarro Gutiérrez	CII 23 No. 3 – 15 Rodadero Sur	Valor normal – en construcción
11	Edgar Rivera Julio	CII 23 No. 3 – 08 Villa Leidy	Valor normal
12	Carlos Humberto Quintero Martínez	CII 23 A Cra 3 – 10 Villa Leidy	Valor normal
13	Elvia Gómez Mancilla	CII 23 Cra 4 No. 3 – 11 Villa Leidy	Valor normal
14	Mayerlis Monroy Pertuz	CII 23 Cra 3 No. 3 – 52 Apto 2 Villa Leidy	Valor normal
15	Yury Mendoza Mercado	CII 23 No. 2ª – 05 Villa Leidy	Valor normal
16	Zuleima Rivera Camargo	CII 23 No. 2B – 17 Villa Leidy	Valor normal
17	Danny Ojeda Mejía	CII 23 B No. 2 B – 29 Villa Leidy	Valor normal
18	Griselda Chica Padilla	CII 23 B No. 2B – 36 Villa Leidy	Valor normal
19	Hecdy Leal Espinoza	CII 23 B No. 2B – 48 Villa Leidy	Valor normal
20	Gilberto Gómez	CII 23 B No. 2B – 54 Villa Leidy	Valor normal
21	Leslie Ruiz Henríquez	CII 2 C No. 22 – 20 Villa Leidy	Valor normal
22	Amauricio Quiroz Rico	Cra 2 No. 22 – 06 Villa Leidy	Valor normal
23	Fernan Vitalis Gómez	CII 23 A No. 2B – 45 Villa Leidy	Valor normal
24	Nellys Ortega Vergara	CII 23 B No. 2B – 09 Villa Leidy	Valor normal
25	Eduardo Arévalo	CII 23 No. 3 – 69 Villa Leidy	Valor normal
26	Dinora Gómez	CII 23 B No. 2 – 49 Villa Leidy	Valor normal
27	Esperanza Torres Flórez	CII 23 No. 2 B – 48 Villa Leidy	Valor normal
28	Luisa Peñaloza Marín	Cra 2 B No. 23 C – 25 Villa Leidy	Valor normal
29	Luisa Peñaloza Marín	Cra 2 B No. 23 C – 29 Villa Leidy	Valor normal
30	Julia Campo	Cra 2 B No. 23 C – 41 Villa Leidy	Valor normal
31	Jader Fernández	CII 23 Cra 3 No. 2B – 55 Villa Leidy	Valor normal
32	Gabriela Rojas García	CII 23 No. 2 B – 51 Villa Leidy	Valor Normal
33	Manuel Cervantes Sining	Villa Leidy	En construcción
34	Dinora Gómez	CII 23 B No. 2 – 49 Villa Leidy	Valor normal
35	Juan Cervantes	Casa 1 Villa Leidy	Valor normal
36	Juan Cervantes	Casa 2 Villa Leidy	Valor normal
37	Sandra Muñoz	CII 27 No. 2ª – 02 Paraíso	Valor normal
38	Diana Quintero	CII 27 No. 2ª – 05 Apto 101 Paraíso	Valor normal
39	Paulino Camargo	CII 26 No. 2B – 05 Paraíso	Valor normal
40	Maria Elena Paez	Detrás del salón comunal - Paraíso Rodadero	Valor normal
41	Kelly Romero	Cra 2B No. 27 – 36 Paraíso	Valor normal
42	Alberto Palmera	CII 26 cra 2B No. 2 – 01	Valor normal
43	Gilberto Vélez	CII 27 No. 2ª – 11 Paraíso	Sin Edificar
44	Humberto Viloria	CII 27 No. 2ª – 04 Paraíso	Valor normal
45	Gilberto Gómez Toledo	Cra 2 No. 24 – 20 salón comunal del Paraíso	Valor normal
46	Valentina Rey	Villa Leidy	Sin edificar
47	Elber Camargo	Finca La Claridad Avenida Licorera	Valor normal

48	Liliana Legía	Cll 19 Cra 10 – 102 Apto AK697 Finca Inversiones Gnecco S.A. Avenida Licorera	Valor normal
49	Sergio Granados	Finca La Guagua Avenida Licorera	Valor normal

Componente No.3 CAPACIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Para este periodo se tuvo en cuenta la contratación de mano de obra local calificada y no calificada que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por el proyecto, así como los servicios locales que se requieran. A la fecha se cuenta nueve (12) personas contratadas para los siguientes cargos:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

No.	NOMBRE	CARGO	RESIDENCIA
1	Ronald Alberto Mendoza Rivera	Ayudante de obra	CALLE 13 # 16 - 85 BARRIO GAIRA
2	Gustavo Daniel Hernández Meléndez	Ayudante de obra	AV LICORERA – GAIRA
3	Sergio Granados Moreno	Celador	AV LICORERA – GAIRA
4	Ricardo José Gual Almarales	Ayudante de obra	AV LIC VIEJA CON PROL CALLE 10 - GAIRA
5	Edgar Rivera Julio	Ayudante de obra	VILLA LEIDY
6	José Linero Macias	Ayudante de obra	RODADERO SUR
7	Andres Pontón Albor	Biólogo	LIBANO
8	Juan José Cervantes Romero	Ayudante de obra	VILLA LEIDY
9	Jhon Rudas	Ayudante de obra	VILLA LEIDY
10	Yeison Atencio Barrios	Ayudante de obra	
11	Ubaldo Gaviria Legía	Ayudante de obra	AV LICORERA – GAIRA
12	Elber Camargo	Celador	AV LICORERA – GAIRA

También se tiene en cuenta la contratación de bienes y servicios donde se promueve la economía local mediante compra de insumos en ferreterías, estación de servicios, alquiler de viviendas, locales y compra de alimentos.

5.4 Componente No.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante este periodo se realizaron y se presentaron informes semanales y cronograma de actividades los cuales fueron entregados a la interventoría. A su vez, la profesional social de interventoría brinda acompañamiento en las actividades sociales realizadas durante este periodo.

Como se señala en los términos de referencia del presente contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades y el avance del proyecto se deben entregar informes de avance de la gestión social y las novedades que se presenten. Se entregarán informes semanales, mensual y/o de finalización de la implementación del PGS en los cuales se detalle del cumplimiento de cada una de las actividades previstas y se presenten los respectivos soportes de cada una.

**INFORME DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM2023**

**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA
EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y
AMBIENTALES**

Periodo: Octubre

Vigencia 2024

Río Gaira


Profesional responsable del componente	Biólogo, Esp. Gestión Ambiental	Firma
	Andrés Felipe Pontón Albor TP: 1083003795. Res. 3 del 03/05/2022 CPB	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. LOCALIZACIÓN.....	3
3. GRUPO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE	3
4. MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	4
4.1. Caracterización general.....	4
4.3. Resultados	5
5. RUTA METODOLÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.	9
5.1. Ahuyentamiento	9
5.2. Rescate en caliente	9
5.3. Desplazamiento y contención temporal en el Centro de Recepción Provisional.....	9
5.4. Valoración	9
5.5. Liberación.	10
5.7. Centro de Recepción Provisional de Fauna Silvestre	10
5.8. MATERIALES DE MANEJO DE FAUNA <i>in situ</i>	11
6. Resultados del periodo octubre 2024.....	11
6.1. Ahuyentamiento de fauna silvestre	11
6.2. Rescate en caliente	16
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al reporte de las actividades relacionadas al periodo octubre, que va desde el día 1 al 31, del año 2024. Se relacionan las actividades de monitoreo, ahuyentamiento y rescate de fauna, así como el listado de materiales disponibles para garantizar estas acciones. Las metodologías reportadas fueron aplicadas en la parte baja del Río Gaira, cumpliendo el requisito de las actividades complementarias relacionadas al proyecto INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES, establecidas por el protocolo de manejo de fauna de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG.

2. LOCALIZACIÓN

La vigencia del año 2024 del proyecto: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES” se localiza en el río Gaira, en los últimos 6Km de su parte baja, ubicada en las coordenadas 11°11'2.50" N y -74°13'0.76"O.

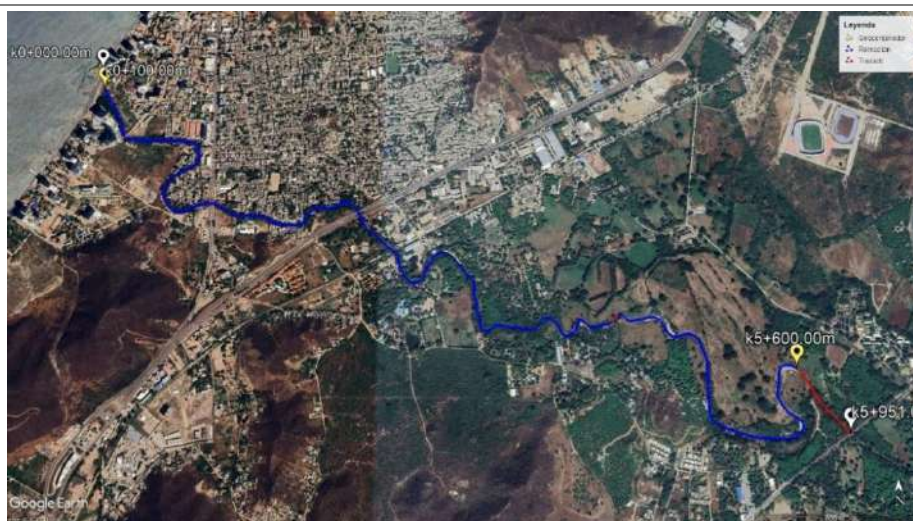


Ilustración 1. Ubicación del trazado del proyecto en la ciudad de Santa Marta. Fuente Elaboración propia.

3. GRUPO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE

El grupo de rescate de fauna silvestre del proyecto estuvo conformado durante el periodo agosto por un biólogo con experiencia en manejo de fauna silvestre, con una dedicación del 100%; un veterinario con experiencia en la atención de especies exóticas con dedicación del 100% y cuatro auxiliares de campo



Ilustración 2. Profesionales Biólogo y Veterinario junto con herramientas del Centro de Recepción Provisional de Rescate de Fauna Silvestre ubicadas en frente de obra.

4. MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

4.1. Caracterización general

Las características geomorfológicas de los bosques de galería permiten la formación de barrancos, playones y extensiones de sedimentos los cuales son continuamente aprovechados por aves, mamíferos, reptiles y anfibios para desarrollar sus procesos biológicos y comportamientos habituales como actividades de forrajeo, percha, reproducción anidación o movilidad (Corrêa et al., 2018). Es por ello, que estas zonas aun siendo fuertemente afectadas por cambios antropogénicos como la extensión de cultivos o potreros, logran mantener su heterogeneidad, favoreciendo la prevalencia de las comunidades en áreas urbanizadas. (Şekercioğlu et al., 2015; Domínguez-López & Ortega-Álvarez, 2014)

Debido a estas características, es necesario realizar un seguimiento el comportamiento de la fauna silvestre, previo a las actividades de intervención de la ronda hídrica, por lo que para el mes de octubre se estableció como como objetivo monitorear la movilidad de la fauna silvestre las áreas objeto de intervención para el establecimiento de las estructuras de protección contra la erosión.

4.2. Metodología

Se establecieron dos estaciones de fototrampeo siguiendo las recomendaciones de Díaz & Payán (2012) y Mandujano & Pérez-Solano (2019) los cuales establecen la escogencia de un microhábitat objeto en el que se ubique la cámara con dirección NS a 30 cm sobre el nivel del suelo. Las cámaras fueron ubicadas desde el día 8 de octubre hasta el 25 en las coordenadas Estación 01: 11.182397N -74.210552W y Estación 02: 11.182617N -74.206175.



Ilustración 3. Instalación de cámara trampa en sitio de muestreo por profesionales del Consorcio ICASM2023

4.3. Resultados

La actividad de las dos estaciones arrojó un esfuerzo de muestreo de 34 noches trampas de las cuales se observó movilidad de 10 especies divididas en tres clases taxonómicas como aparece en la tabla 1. De ellos, se observó una mayor movilidad *Didelphis marsupialis* en horarios nocturnos entre las 6:00 pm y las 4:00 am y de *Catharus fuscescens* 7:00 am y las 2:00 pm, este último teniendo un patrón de movilidad migratorio por lo cual se encuentra temporalmente en la zona. De igual forma, se observaron forrajeos y movilidad de *M. subrufescens* y *Catharus fuscescens* los cuales siendo ave y mamíferos forman nidos dentro de los barrancos o consumen el material que se desprende de este para sus procesos digestivos. Finalmente, se obtuvo el avistamiento del carnívoro *Procyon cancrivorus* del cual no se tenía reporte en el área desde hace dos periodos.

Table 1. Listado de fauna silvestre avistada durante la actividad de las cámaras trampas en microhábitats del Río Gaira.

Taxón	Nombre común	Estación	# de eventos
REPTILIA			
SQUAMATA			
Iguanidae			
<i>Iguana iguana</i>	Iguana	1	1
Teiidae			
<i>Ameiva bifrontata</i>	Lagarto azul	1	2
AVE			
COLUMBIFORMES			
Columbidae			
<i>Leptotila verreauxi</i>	Paloma arroyera		
CORACIIFORMES			
Momotidae			
<i>Momotus subrufescens</i>	Barranquero	2	4
GRUIFORMES			
Rallidae			
<i>Aramides cajaneus cajaneus</i>	Chilacoa colinegra	1	1

PASSERIFORMES			
Turdidae			
<i>Catharus fuscescens</i>	Zorzalito rojizo	2	6
MAMMALIA			
CARNIVORA			
Procyonidae			
<i>Procyon cancrivorus</i>	Zorra patona/mapache		
CINGULATA			
Chlamyphoridae			
<i>Cabassous centralis</i>	Armadillo cola desnuda	2	1
DIDELPHIMORPHIA			
Didelphidae			
<i>Didelphis marsupialis</i>	Zorro chucho	1,2	8
LAGOMORPHA			
Leporidae			
<i>Sylvilagus floridanus</i>	Conejo serrano	1	1

Table 2. Imágenes capturadas por cámaras trampa en estaciones de monitoreo

	
<p><i>Sylvilagus floridanus</i> Conejo serrano</p>	
	
<p><i>Didelphis marsupialis</i> Zorro chucho</p>	



Catharus fuscescens Zorzalito rojizo



Didelphis marsupialis Zorro chucho



Procyon cancrivorus Zorra patona/mapache



Momotus subrufescens

Barranquero



Cabassous centralis Armadillo cola desnuda



Leptotila verreauxi Paloma arroyera

5. RUTA METODOLÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.

Se siguieron los lineamientos establecidos por el Protocolo de Manejo de Fauna Silvestre propuesto por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, el cual está basado en la *Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010*, siendo adoptado por el CONSORCIO ICASM2023 según las condiciones del ecosistema a intervenir en la vigencia 2024 correspondiente al Río Gaira. Por tanto, se siguieron los parámetros relacionados a las actividades de ahuyentamiento, rescate en caliente, contención temporal, diligenciamiento de los formatos de datos biométricos, valoración, atención y liberación. Para este periodo se socializó y adaptó en campo dicha ruta entre el personal administrativo y operativo de la obra, estando atentos ante cualquier eventualidad.

5.1. Ahuyentamiento

Previo al inicio del traslado de la maquinaria se realizaron ahuyentamiento sonoros por medio de disturbios prolongados de 5 minutos utilizando para tal una corneta o vuvuzela de amplio alcance. En este tiempo se observó la presencia de fauna que esté dispuesta en el área del recorrido o la zona donde se ejecutará la actividad diaria, manteniendo la comunicación con el ingeniero residente de obra a cargo del frente y el maquinista.

5.2. Rescate en caliente

En caso de hallar en el sitio algún animal rezagado se procedió a hacer uso de las herramientas de contención descritas en los *materiales de campo* de acuerdo con grupo faunístico o la estrategia de contención a implementar.

5.3. Desplazamiento y contención temporal en el Centro de Recepción Provisional

Una vez realizado el rescate, en caso de existir en el periodo descrito, el animal fue resguardado en un contenedor temporal como guacal, bolsa de tela, canasta o tanque, según sea el caso. Para este periodo no se contó con el montaje del CRP debido a que sus implementos se encuentran en fase de compra, por lo que el traslado fue realizado hasta el sitio de acceso base del frente de obra.

5.4. Valoración

Una vez dispuesto en el hogar de paso o Centro de Recepción Provisional de fauna Silvestre, el biólogo inició tomando medidas morfométricas como tamaño, peso y su condición inicial las cuales serán anotadas en la bitácora de registro otorgada por CORPAMAG. Luego de ello, el veterinario a cargo procederá a evaluar condiciones físicas como postura, condición de pelaje o plumaje, estado del pico o dentadura, respiración, visión y audición. Atención y primeros auxilios

5.5. Liberación.

Los individuos rescatados, después de ser valorados en centro de recepción provisional y que se encuentran en óptimas condiciones comportamentales y físicas son liberados en espacios con características similares al lugar donde fue hallado, manteniendo la estructura de espina de pescado en áreas relacionadas a la cuenca baja del Río Gaira o que se encuentren aprobadas por CORPAMAG.



Ilustración 4. Sitios de translocación propuestos por el consorcio ICASM 2023 para la liberación de la fauna rescatada en buena condición. Fuente Google Earth 2024.

5.6. Registro

Todas estas actividades contaron con registro fotográfico con formato de coordenadas planas, las cuales dan soporte a los registros realizados en las fichas de historia clínica y los formatos de control y seguimiento. Se elaboró una base de datos en Excel en la que se lleva registro de especies ahuyentadas, rescatadas, liberadas y muertas con el fin de evidenciar gráficamente la ejecución de todas estas actividades. Se detalló por taxonomía su clase, orden, familia, género, especie y nombre común; así como el estado de conservación, las coordenadas de hallazgo y disposición final, el tipo de actividad y las observaciones finales en caso de ameritar.

5.7. Centro de Recepción Provisional de Fauna Silvestre

Los materiales relacionados al CRPFS iniciaron su proceso de compra en el periodo junio 2024. Lo anterior se dio a partir del momento en que fue adoptado el protocolo de fauna por parte del consorcio y luego de recibir el visto bueno de la interventoría. Se adquirió inicialmente los elementos de restricción y se encuentra a la espera de los materiales restantes los cuales serán subsanados en el periodo julio.

5.8. MATERIALES DE MANEJO DE FAUNA *in situ*.

Para implementar el Protocolo para Manejo de Fauna Silvestre, el proyecto ha adquirido hasta finales de junio los siguientes materiales siguiendo las metodologías de restricción físicas establecidas para cada grupo faunístico encontradas en el Río Gaira.

Tabla 1. Listado de materiales disponibles durante el periodo octubre 2024.

ACTIVIDAD	INSUMO	Cantidad disponible junio 2024
Rescate de fauna en caliente	Pértiga para el manejo de mamíferos y herpetos	1
	Pinza para el manejo de serpientes	1
	Gancho para el manejo de serpientes	1
	Guantes reforzados para manipulación de animales	2
	Nasa de captura y control para mamíferos y reptiles	1
	Caja plástica con broches alta resistencia	1
	Bolsa herpetológica de tela	2
	Polisombra	10 m
Ahuyentamiento	Rollo de saco de polipropileno	100
	Chaleco naranja reflectivo	1
	Vuvuzela de largo alcance	2
Monitoreo	Cámara trampa full-equipo	1
	Binoculares Bushnell 10x32	1
	Baterías alcalinas AA	20

6. Resultados del periodo octubre 2024

6.1. Ahuyentamiento de fauna silvestre

Para el periodo octubre se contó con un frente activo en el 90% del mes, del cual se evidenció una actividad interrumpida por parte de las maquinarias en el frente número 1 de geocontenedores. En este tiempo se hizo acompañamiento al movimiento, arrastre y traslado de material proveniente del río con el fin de evitar la colisión de las aves circundantes y la fauna íctica que pudiera quedar atrapada en dicho arrastre.

Por otra parte, hacia el día 25 de octubre se empezaron actividades de descapote, limpieza y excavación en la zona destinada para la construcción del segundo geocontenedor, pese a que se realizaron ahuyentamientos previo y posterior a la actividad no se encontró en el área algunos de los individuos avistados durante las jornadas de foto trampeo ubicadas los días previos a la intervención.



Ilustración 5. Jornada de ahuyentamiento en frente de obra de geocontenedores 1 y 2 durante el periodo octubre 2024.

Las listas de avistamiento obtenidas durante los eventos de ahuyentamiento fueron tabuladas en Excel, obteniendo un total de 36 especies distribuidos en 73 individuos (Ver tabla 2). De estas 35 se encuentran clasificadas en estado de conservación de *Preocupación menor* LC y una en *Casi amenazada* NT, correspondiendo a la especie *Ramphastos sulfuratus* la cual se ha avistado en los periodos anteriores del proyecto durante las primeras horas del día.

Tabla 2. Listado de especies ahuyentadas en obra durante el periodo octubre, 2024 del Río Gaira.

Taxón	Nombre común	IUCN	Abundancia ahuyentados
ACCIPITRIFORMES			
Accipitridae			
<i>Buteogallus anthracinus</i>	Busardo negro	LC	1
APODIFORMES			
Trochilidae			
<i>Amazilia tzacatl</i>	Amazilia colirrufo	LC	1
<i>Saucerottia saucerottei</i>	Amazilia verdiazul	LC	1
CATHARTIFORMES			
Cathartidae			
<i>Cathartes aura</i>	Laura	LC	1
<i>Coragyps atratus</i>	Golero negro	LC	5
COLUMBIFORMES			
Columbidae			
<i>Columbina passerina</i>	Tortolito pico rojo	LC	1
<i>Columbina squammata</i>	Tortolita escamosa	LC	1
<i>Leptotila verreauxi</i>	Paloma arroyera	LC	1
CORACIIFORMES			
Alcedinidae			
<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador gigante	LC	3
Momotidae			
<i>Momotus subrufescens</i>	Barranquero	LC	2
CUCULIFORMES			
Cuculidae			
<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero	LC	2
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero pijuy	LC	3
FALCONIFORMES			
Falconidae			
<i>Caracara plancus</i>	Carancho	LC	1

<i>Daptrius chimachima</i>	Pigüa	LC	7
GALBULIFORMES			
Bucconidae			
<i>Hypnellus ruficollis</i>	Bobito	LC	1
Galbulidae			
<i>Galbula ruficauda</i>	Jacamar cola canela	LC	2
PASSERIFORMES			
Furnaridae			
<i>Furnarius longirostris</i>	Hornero caribeño	LC	2
Hirundinidae			
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina barranquera	LC	1
Icteridae			
<i>Icterus nigrogularis</i>	Turpial amarillo	LC	2
<i>Quiscalus lugubris</i>	Tordo llanero	LC	2
<i>Quiscalus mexicanus</i>	Marialucia	LC	2
Thraupidae			
<i>Saltator olivascens</i>	Papayero grisáceo	LC	3
<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo	LC	2
Troglodytidae			
<i>Campylorhynchus griseus</i>	Chupahuevo	LC	1
Tyrannidae			
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bichofué común	LC	1
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Sirirí común	LC	6
PELECANIFORMES			
Ardeidae			
<i>Ardea alba</i>	Garceta grande	LC	1
<i>Egretta thula</i>	Garceta nívea	LC	1
Threskiornithidae			
<i>Phimosus infuscatus</i>	Coquito	LC	3
<i>Theristicus caudatus</i>	Coclí	LC	2
Piciformes			
Picidae			
<i>Melanerpes rubricapillus</i>	Carpintero coronirrojo	LC	3
Ramphastiformes			
Ramphastidae			
<i>Ramphastos sulfuratus</i>	Tucán piquiverde	NT	2
Psittaciformes			
Psittacidae			
<i>Brotogeris jugularis</i>	Periquito alibronceado	LC	3
Rodentia			
Sciuridae			
<i>Sciurus granatensis</i>	Ardilla colarreja	LC	1
Strigiformes			
Strigidae			
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Pavita	LC	1
Suliformes			
Phalacrocoracidae			
<i>Nannopterum brasilianum</i>	Pato yuyo	LC	1

En cuanto a la representatividad de las familias encontradas en los ahuyentamientos, las mayores poblaciones se ubican entre las familias taxonómicas Falconidae, Tyrannidae y Cathartidae, las cuales sobresalen por su oportunismo entre las 26 familias de especies halladas en la zona. Finalmente, se destacan algunas que se encuentran adaptas al ruido de

la zona y permiten su avistamiento cerca al trabajo de la maquinaria. No se hallaron nidos activos y/o vulnerables en la zona de intervención de la maquinaria para este periodo.

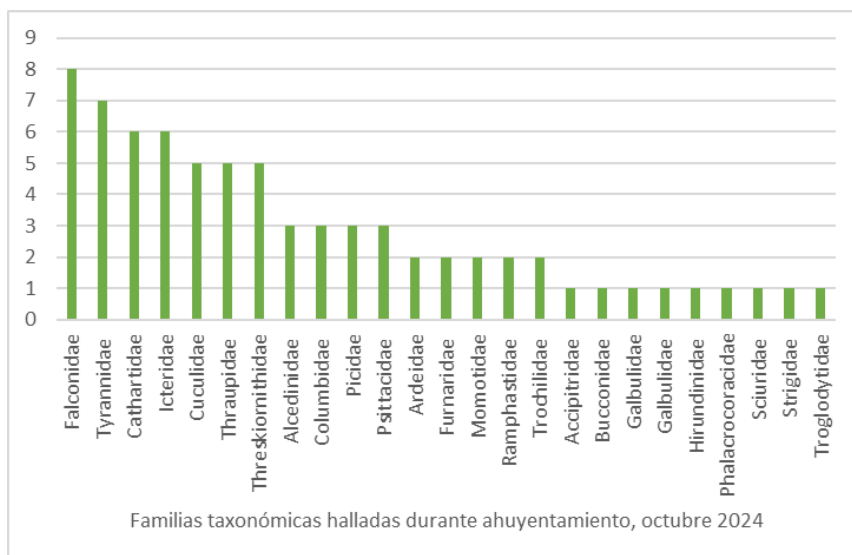


Ilustración 6. Abundancia absoluta de familias ahuyentadas durante el periodo de octubre, 2024.

Tabla 3. Algunas especies ahuyentadas en el área de intervención para el periodo octubre, 2024 del Rfo Gaira



Stelgidopteryx ruficollis - Golondrina barranquera



Coragyps atratus – Golero negro



Tyrannus melancholicus -



Crotophaga sulcirostris – Garrapatero pijuy



Icterus nigrogularis – Toche



Columbina passerina – Tortolita pico rojo



Buteogallus anthracinus -



Momotus subrufescens – Barranquero



Parabuteo unicinctus – Aguililla rojinegra
(Juv)



Sciurus granatensis – ardilla cola roja



Leptotila verreauxi – Paloma arroyera

6.2. Rescate en caliente

Para el periodo octubre no se presentaron rescates y traslados en la zona intervenida debido a que no hubo encuentros de anidadas, juveniles u otros en la zona de movilidad de la maquinaria.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ayerbe-Quiñones F. 2022. Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. Tercera edición. Wildlife Conservation Society. Editorial Punto Aparte. Bogotá D.C.

Corrêa, M. R. J., Bellagamba, Y. M., De Magalhães, A. P., Martins, J. P. V., Cruz, A. J. D. R., Kozovitz, A. R., Messias, M. C. T. B., & De Azevedo, C. S. (2018). Microhabitat structure and food availability modelling a small mammal assemblage in restored riparian forest remnants. *Mammalia*, 82(4), 315–327. <https://doi.org/10.1515/MAMMALIA-2017-0026/MACHINEREADABLECITATION/RIS>

Díaz, A., & Payán, E. (2012). Manual de fototrampeo. Manual de Fototrampeo Una Herramienta de Investigación Para La Conservación de La Biodiversidad En Colombia, 8–11. <http://hdl.handle.net/20.500.11761/31415>

Domínguez-López, M. E., & Ortega-Álvarez, R. (2014). The importance of riparian habitats for avian communities in a highly human-modified Neotropical landscape. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85(4), 1217–1227. <https://doi.org/10.7550/RMB.43849>

Ley 1333 de 2009. (2009, 21 de julio). Congreso de La República de Colombia. Procedimiento sancionatorio ambiental.

Ley 1774 de 2016. (2016, 6 de enero). Congreso de La República de Colombia. Maltrato animal


Mandujano, S., & Pérez-Solano, L. A. (2019). Fototrampeo en R: organización y análisis de datos. *Volumen I. México: Instituto de Ecología AC*.

Mendoza-Roldán, J.S. (2020) Protocolo para el manejo de fauna silvestre en el marco de los dragados hidrosedimentológicos. CORPAMAG.

Resolución 0126 de 2024. (2024, 6 de febrero). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado oficial de especies silvestres amenazadas.

Resolución 2064 de 2010. (2010, 21 de octubre). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Manejo post decomiso.

Şekercioğlu, Ç. H., Loarie, S. R., Oviedo-Brenes, F., Mendenhall, C. D., Daily, G. C., & Ehrlich, P. R. (2015). Tropical countryside riparian corridors provide critical habitat and connectivity for seed-dispersing forest birds in a fragmented landscape. *Journal of Ornithology*, 156(1), 343–353. <https://doi.org/10.1007/S10336-015-1299-X/METRICS>

	ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA " CORPAMAG"														
ACTA DE OBRA No. 05															
<div>CONTRATO No: LP 006 DE 2023</div> <div>OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"</div> <div>CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO: CM 007 DE 2023</div> <div>INTERVENTOR Interventores e Ingeniería S.A.S</div> <div>VIGENCIA: 2024</div>							<div>PERIODO: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024</div> <div>VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 330.530.495.016,00</div> <div>VALOR CONTRATO ACTUALIZADO: \$ 330.530.495.016,00</div> <div>PLAZO INICIAL Ciento cuarenta y siete (147) meses</div> <div>PLAZO ACTUALIZADO: Ciento cuarenta y siete (147) meses</div> <div>FECHA DE INICIACIÓN: 19 DE MARZO DE 2024</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO: 19 DE JUNIO DE 2036</div> <div>% DE AVANCE DEL PERIODO CON RESPECTO AL TOTAL: 0,19%</div> <div>% DE AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL TOTAL: 1,85%</div>				<div>VIGENCIA 2024</div> <div>VALOR DE LA VIGENCIA: \$ 8.873.477.366,00</div> <div>VALOR DEL ACTA: \$ 627.738.104,00</div> <div>VALOR ACUMULADO: \$ 6.113.440.458,00</div> <div>VALOR DE SALDO: \$ 2.760.036.908,00</div> <div>FECHA DE INICIACIÓN: 19 DE MARZO DE 2024</div> <div>FECHA DE FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024</div> <div>PORCENTAJE EJECUTADO: 7,07%</div> <div>PORCENTAJE ACUMULADO: 68,90%</div>				
AÑO 2023							CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ Ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDA D	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 131.639.004,00			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
1.1	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	3,0	\$ 43.879.668,00	\$ 131.639.004,00	-3,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 131.639.004,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					Aministración (23%)	\$ 30.276.971,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					Imprevistos (2%)	\$ 2.632.780,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					Utilidad (5%)	\$ 6.581.950,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	\$ 1.250.571,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 40.742.272,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	\$ 172.381.276,00				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 169.284.398,00				\$ 169.284.398,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 169.284.398,00
3.1	P - 3.5	Estudios y Diseños de Parque Lineal en áreas disponibles de Ronda Hidrica.	Gib	1,00	\$ 169.284.398,00	\$ 169.284.398,00	0,00	1,0	\$ 169.284.398,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00	1,0	\$ 169.284.398,00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	\$ 32.164.035,62				\$ 32.164.035,62		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 32.164.035,62
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2023	\$ 373.829.710,00				\$ 201.448.434,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 201.448.434,00
AÑO 2024							CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ Ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDA D	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						\$ 29.672.424,00			\$ 29.672.424,00		\$ 0,00		\$ 18.545.265,00		\$ 11.127.159,00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8,0	\$ 3.709.053,00	\$ 29.672.424,00	0,00	8,0	\$ 29.672.424,00	0,00	\$ 0,00	5,0	\$ 18.545.265,00	3,0	\$ 11.127.159,00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 5.660.158.685,10			\$ 5.791.797.687,79		\$ 414.493.512,96		\$ 4.423.450.773,03		\$ 1.368.346.914,76
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	67.732,23	\$ 15.543,18	\$ 1.052.774.242,69	18058,06	85.790,29	\$ 1.333.453.860,60	0,00	\$ 0,00	70.425,51	\$ 1.094.636.300,81	15.364,78	\$ 238.817.559,80
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	67.732,23	\$ 40.034,60	\$ 2.711.632.735,16	14868,06	82.600,29	\$ 3.306.869.419,19	3.674,62	\$ 147.111.941,86	67.163,07	\$ 2.688.846.642,22	15.437,22	\$ 618.022.776,96
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12,0	\$ 46.500.598,00	\$ 558.007.176,00	-1,00	11,0	\$ 511.506.578,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	11,00	\$ 511.506.578,00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletteria y Costuras.	m3	6.000,0	\$ 151.008,00	\$ 906.048.000,00	-2810,00	3.190,0	\$ 481.715.520,00	1.310,80	\$ 197.941.286,40	3.190,00	\$ 481.715.520,00	0,00	\$ 0,00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2.250,0	\$ 31.202,00	\$ 70.204.500,00	-1450,00	800,0	\$ 24.961.600,00	256,00	\$ 7.987.712,00	800,00	\$ 24.961.600,00	0,00	\$ 0,00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7.031,25	\$ 43.292,00	\$ 304.396.875,00	-4456,25	2.575,0	\$ 111.476.900,00	1.219,50	\$ 52.794.594,00	2.575,00	\$ 111.476.900,00	0,00	\$ 0,00
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5.156,25	\$ 11.073,00	\$ 57.095.156,25	-3186,25	1.970,0	\$ 21.813.810,00	781,90	\$ 8.657.978,70	1.970,00	\$ 21.813.810,00	0,00	\$ 0,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 5.689.831.109,10				\$ 5.821.470.111,79		\$ 414.493.513		\$ 4.441.996.038	\$ 1.379.474.073,76
					Aministración (23%)	\$ 1.308.661.155,00				\$ 1.338.938.126,00		\$ 95.333.508		\$ 1.021.659.089	\$ 317.279.037,00
					Imprevistos (2%)	\$ 113.796.622,00				\$ 116.429.402,00		\$ 8.289.871		\$ 88.839.921	\$ 27.589.481,00
					Utilidad (5%)	\$ 284.491.555,00				\$ 291.073.506,00		\$ 20.724.676		\$ 222.099.802	\$ 68.973.704,00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	\$ 54.053.395,00				\$ 55.303.966,00		\$ 3.937.688		\$ 42.198.962	\$ 13.105.004,00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 1.761.002.727,00				\$ 1.801.745.000,00		\$ 128.285.743,00		\$ 1.374.797.774,00	\$ 426.947.226,00
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	\$ 7.450.833.836,10				\$ 7.623.215.111,79		\$ 542.779.255,96		\$ 5.816.793.812,03	\$ 1.806.421.299,76
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						\$ 881.356.151,00				\$ 881.356.151,00		\$ 71.393.990		\$ 249.282.896	\$ 632.073.255,06
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1,0	\$ 246.260.339,00	\$ 246.260.339,00	0,00	1,00	\$ 246.260.339,00	0,17	\$ 41.043.390	0,88	\$ 215.547.692	0,12	\$ 30.712.646,71
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	12,0	\$ 35.256.288,00	\$ 423.075.456,00	0,00	12,00	\$ 423.075.456,00	0,86	\$ 30.350.600	0,96	\$ 33.735.204	11,04	\$ 389.340.252,35
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Manzanares.	und	1,0	\$ 212.020.356,00	\$ 212.020.356,00	0,00	1,0	\$ 212.020.356,00	0,0	\$ 0	0,00	\$ 0	1,00	\$ 212.020.356,00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	\$ 167.457.668,69				\$ 167.457.668,69		\$ 13.564.858,0		\$ 47.363.750	\$ 120.093.918,46
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2024	\$ 8.499.647.656,00				\$ 8.672.028.932,00		\$ 627.738.104,0		\$ 6.113.440.458,00	\$ 2.558.588.474,0
					VALOR TOTAL VIGENCIAS 2023-2024	\$ 8.873.477.366,00				\$ 8.873.477.366,00		\$ 627.738.104,00		\$ 6.113.440.458,00	\$ 2.760.036.908,00
VALOR PRESENTE ACTA : SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO Y CUATRO PESOS M/CTE.															
Para constancia de lo anterior firman la presente acta en las que ella intervinieron															
<div></div> <div>CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ICASM2023</div> <div></div> <div>FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORES E INGENIERIA SAS</div>															
