



EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
AO-047-2024
DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CERTIFICA:

Que **SP AMBIENTALES S.A.S.** NIT. N° 901.457.313-0 prestó a satisfacción el servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta. El cual cumplió a cabalidad con el servicio correspondiente, al periodo comprendido desde el 30 diciembre del 2024 hasta el 31 del mes de enero del 2025 y se debe pagar así:

Concepto	Unidad	CDP	Valor
Prestar servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta.	Unidad 08	16124	\$ 18.474.750.00

Asimismo, se deja constancia que el contratista suministró el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones de que trata la Ley 1295 de 1.994.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta al veintiuno (21) días del mes de febrero del 2025.


JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logística y Administrativa



SP AMBIENTALES S.A.S.

NIT 901457313-0
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 8130
Municipio: San José De Cúcuta (Norte de Santander)
Dirección: CALLE 10 # 4-38 OFI 104 BARRIO EL CENTRO
Correo: servipodasambientales@gmail.com
Teléfono: 3102967199



CUFE: e5d043112246ff6e577aa9be1255a54c1878de055450f4845e48bd448f8bb39912a1e106975e5b60879331b3af1f6906

Fecha de emisión 2025-01-30	Fecha y hora de autorización 2025-01-30 11:50:58	Prefijo FEV	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2025-01-30	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente
Nombres y apellidos: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

Número de documento NIT - 800165874-0	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Norte de Santander	Municipio San José De Cúcuta	Dirección AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2	Teléfono 5755105
Correo pagaduriacucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV013	PODA DE ARBOLES LOS CUALES POSEEN UNA ALTURA VARIADA ENTRE LOS 5 Y 8 METROS DE ALTURA, RESALTANDO ESPECIES COMO EL NEEM, OITI FICUS, ACACIA Y URAPO, INCLUYENDO IGUALMENTE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA REALIZAR UNA CORRECTA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS FINALES	45,00	UNIDAD	\$345.000,00	0%	19%		\$15.525.000,00

Total Items: 1

Observaciones

-

Número de autorización: 18764085812948
Rango Autorizado: desde FEV 207 hasta FEV 500
Expedida: 2024-12-20 Vigencia: 12 meses Vencimiento: 2025-12-20
Firma Digital:
SJQ6R0Ex4LRNEYDfajZkbyDsEE51gVIVNumdJDZSS5eYJEOPmnnxJU2TmaPF30B7qyr8NikgoHP8EtzeGDeHsg055T2fMdDATL/50jm8T5yiPdeO2re
PVNB5fn3Sg6bgct5R+mPlvd/C1dAUYNKn7pmEFbuKlrH7yjiKDLRSRXZQmvHXyw1ada0bjyMWKVucS4grW3cjpPgTLoNS3aDnMOpYx9pB0niTqOrfi
nU3kMmTXtYwmpKjOoGUQnYS1SPFoVDZ9J5H57av4ihG/oly3pX4pS1XprYfctIM2vpUV/DQhftZpvjPjK1ntRXZk022aIXi8FVXcCS1fU24UeUPw==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$15.525.000,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$15.525.000,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$2.949.750,00
Subtotal más impuestos	=	\$18.474.750,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$18.474.750,00



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	21/02/2025
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	AO-047-2024
Supervisor (es):	JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ	Fecha de suscripción:	5/11/2024
		Valor total:	\$ 18.474.750,00
Interventor :	NA	Plazo total:	: El tiempo de ejecución de la oferta presentada y aceptada es hasta 31 de Diciembre de 2024; MAS PRORROGA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025
Contratista:	SP AMBIENTALES S.A.S.	Fecha de terminacion:	31/01/2025
Nit:	901.457.313 - 0	Lugar de ejecución:	PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	Porcentaje avance:	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	EN PROCESO

Objeto de contratación:
Prestar servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	30/12/2024				
Plazo inicial:	31/12/2024				
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024	Reinicio			
Fecha terminación:	31/01/2025	Prorroga	1	31 DIAS	31/01/2025
		Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

Disminuciones al Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total disminuciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:		\$ 18.474.750,00		Valor Total:		\$ 18.474.750,00					
Con anticipo:				Valor Anticipo:		\$ -		Saldo por pagar:		\$ -	
Forma de Pago:				Descripción condiciones de pago							
Porcentaje		Valor									
100,00%		\$ 18.474.750,00		Factura electronica de venta N° FEV208							

PAGOS REALIZADOS

Unidad 02			Unidad 08			Unidad 09		
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN								
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución		Actividad Realizada				
21/02/2025	ENERO DEL 2025	100,00%		PRESTAR SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES, UBICADOS EN LAS ZONAS INTERNAS Y ADYACENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA				
DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS								
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido							
21/02/2025	PODA DE 45 ARBOLES LOS CUALES POSEEN UNA ALTURA VARIADA ENTRE LOS 5 Y 8 METROS DE ALTURA, RESALTANDO ESPECIES COMO EL NEEM, OITI FICUS, ACACIA Y URAPO, INCLUYENDO IGUALMENTE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA REALIZAR UNA CORRECTA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS FINALES							
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)							
CONCEPTO DEL SUPERVISOR								
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?			La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?			
SI ☒ NO ☐		SI ☐ ☒			SI ☒ NO ☐			
Resumen ejecución del contrato:								
Resumen pendientes del contratista:								
N/A								
Observaciones:								
N/A								
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO  JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ								



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha
evaluación: 21/02/2025

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: AO-047 del 05 de noviembre del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA : SP AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 901.457.313 - 0 C.C

FECHA DE INICIO: 30/12/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/01/2025

OBJETO: Prestar servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA


PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	DISPOSICION DE SERVICIO	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
		SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
		ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	5
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
CONFORMIDAD	5	TOTAL PROMEDIO	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5		
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA DE FACTURA	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
		EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
CONFORMIDAD		0	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0	
FUNCIONAMIENTO		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
4. CONTRATO DE CONSULTORIA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	EVALUACION TOTAL
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0	
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0	
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0	
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0	
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0	
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0	
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0	
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El servicio se prestó a satisfacción.			
 JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR  ANA SABEL VALENCA SOLANO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No: AO-047 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	AO-047 del 05 de noviembre del 2024		
CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA		
CONTRATISTA:	SP AMBIENTALES S.A.S.		
OBJETO:	Prestar servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta.		
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$18.474.750.00).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El tiempo de ejecución de la oferta presentada y aceptada es hasta 31 de diciembre de 2024; MAS PRORROGA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025		
FECHA DEL CONTRATO:	05 de noviembre del 2024		
FECHA DE INICIO:	30 diciembre del 2024		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	-----	FECHA:	-----
PRORROGA No 01:	31 días	FECHA:	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 enero del 2025		
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 enero del 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución del contrato No. AO-047-2024, correspondiente a la prestación del servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta. comprendido entre los meses de diciembre y enero del 2025, en los siguientes aspectos:

- El día treinta (30) de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del contrato AO-047-2024.
- Se realizo seguimiento para el cumplimiento de los puntos contratados según AO-047-2024
- Se organiza el pago respectivo del servicio por la prestación del servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta.
- Se hace seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan ambiental, el cual se anexa.
- El contratista llevó a cabo todos los servicios de poda contemplados dentro del contrato, con las especificaciones técnicas y en las cantidades establecidas.

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE OBRA N° AO-047-2024	
prestación del servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.474.750.00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$18.474.750.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$18.474.750.00



El valor del presupuesto contractual es de DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$18.474.750.00). incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de **DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$18.474.750.00)**. correspondiente la prestación del servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta, previa presentación de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGA	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
30 diciembre del 2024	El tiempo de ejecución de la oferta presentada y aceptada es hasta 31 de diciembre de 2024	Treinta y un (31) días	Hasta el 31 de enero del 2025	31/01/2025

4.2. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS


Mediante póliza de cumplimiento N° 460 47 994000081955, con expedición el treinta (30) de diciembre de 2024, por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia. se ampara lo establecido en el contrato principal N° AO-047-2024.

Póliza de Cumplimiento	460 47 994000081955		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición	30 diciembre 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	20/12/2024	31/05/2025	\$1.847.475.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/12/2024	31/01/2028	\$923.737,00
Calidad del servicio	20/12/2024	20/12/2025	\$1.847.475.00

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 100% al 31 de enero del 2025.

El supervisor constato, que el contratista realizo las actividades acordes a lo establecido en el contrato y que, mediante informe final se confirmó el cumplimiento la prestación del servicio de poda de árboles, ubicados en las zonas internas y adyacentes del Palacio de Justicia Francisco de paula Santander en la ciudad de Cúcuta, según AO-047-2024.



JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO: AO 057 DE 2024 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES, UBICADOS EN LAS ZONAS INTERNAS Y ADYACENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA.

**PRESENTADO A:
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE
DE SANTANDER – CUCUTA
NIT. 800.165.874-0**

**RAMA JUDICIAL CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
PERIODO: ENERO 2025.**

*Dirección: Avenida 5 # 5-52, Brr La Victoria, San
José de Cúcuta – Norte de Santander.
TEL: 3102967199-3209710254
E mail: servipodasambientales@gmail.com*

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3.	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	4
3.1	Actividades de Sensibilización y capacitación SST a los trabajadores.....	4
3.2	Cumplimiento del plan SST.....	4
3.3	Descripción de elementos SGSST, herramientas, materiales, equipos utilizados para el desarrollo de la obra.	4
4.	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, PODA DE ÁRBOLES AISLADOS	6
4.1	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	7
4.1.1	Señalización del área de trabajo.	7
4.1.2	Identificación inicial árboles a Podar	7
4.1.3	Actividad de Poda de árboles.	9
4.1.4	Ejecución poda de árboles.....	11
4.2	Manejo de Residuos Vegetales	18

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de las actividades realizadas, correspondientes a la intervención de individuos arbóreos – mediante la poda de estos, necesarios para el avance del contrato de mínima cuantía AO 057 DE 2024 que tiene por objeto la “PRESTAR EL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES, UBICADOS EN LAS ZONAS INTERNAS Y ADYACENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA”. Lo anterior constituye un documento en donde se mencionan detalladamente las acciones ejecutadas en el cumplimiento del mismo.

A continuación, se presenta el informe de las actividades correspondiente a la Poda de árboles realizados para dar continuidad al avance de la obra en general.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe técnico de actividades de Poda de árboles en las áreas objeto de intervención del contrato “PRESTAR EL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES, UBICADOS EN LAS ZONAS INTERNAS Y ADYACENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA” en el período Enero de 2025.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar las actividades que generen cumplimiento de las obligaciones durante el desarrollo de las actividades de poda de árboles.
- Realizar las actividades de poda en los individuos identificados y el manejo correspondiente a la vegetación aledaña, así como también dar un manejo adecuado para el retiro y disposición final de los productos generados en el desarrollo de estas actividades.

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

3. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1 Actividades de Sensibilización y capacitación SST a los trabajadores

Dentro del cronograma de capacitaciones SST de la empresa SP AMBIENTALES S.A.S., el primer tema socializado a los colaboradores, el día 07 de Enero de 2025, donde se presentó el procedimiento de poda de árboles y se hizo referencia a las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se deben tener en cuenta en el sitio de trabajo y la importancia del Autocuidado.

3.2 Cumplimiento del plan SST

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos SST de nuestra empresa, se ha cumplido con las actividades programadas, en lo referente a capacitaciones, charlas preoperacionales, Inspecciones diarias y periódicas y todo lo contemplado en el SGSST según las directrices establecidas por la empresa Contratante.

En materia de Seguridad Industrial, así mismo se realizaron charlas preoperacionales y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.

3.3 Descripción de elementos SGSST, herramientas, materiales, equipos utilizados para el desarrollo de la obra.

Tabla 1. Herramientas, materiales y equipos, utilizados para el desarrollo de la obra.

DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
Primeros Auxilios, Equipos SST-HSE	Botiquín de primeros auxilios
	Extintor
	Kit Antiderrames
	señalizaciones
	Camilla.
	Disponibilidad de vehículo cuando se requiera.
	Zona de hidratación
Dotación básica Operario de Guadaña y Motosierra	Casco de seguridad con barbuquejo
	Guante Antivibración de vaqueta y puntos
	Pantalón de Drill
	Camisa Industrial de drill calibre grueso
	Gafas de seguridad con protección UV

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
	Botas PVC de seguridad con puntera de acero
	Pantalla facial de plástico o de malla para casco.
	Canilleras metálicas de protección de miembros inferiores
	Delantal de carnaza
	Protector o manga de miembros superiores de carnaza
	Protectores auditivos de inserción y de copa
	Casco de seguridad
Dotación básica Operario de Herramienta manual	Guantes de vaqueta y puntos
	Pantalón de Drill reforzado
	Camisa Industrial de drill calibre grueso
	Gafas de seguridad con protección UV
	Botas PVC de seguridad con puntera de acero
	Protectores auditivos de inserción
Dotación Básica, Personal HSE y Personal de Ingeniería.	Casco de seguridad con barbuquejo
	Guantes de vaqueta y/o nitrilo
	Pantalón de Drill
	Camisa Industrial de drill
	Gafas de seguridad con protección UV
	Aislante de lluvia
	Botas PVC de seguridad con puntera de acero y/o Botas de cuero talla baja con punta reforzada en hierro
	Protectores auditivos de inserción y/o copa
Herramientas	Machete con funda
	Caja completa de llaves
	Alicates
	martillos
	Manilas o sogas de carga
	Motosierras 260, 194T, 192T (para cortar arriba y abajo)
	Machete (solo se debe usar para cortar ramas abajo del árbol ya podadas)
	Kit de derrame
Transporte	camioneta
Materiales e insumos	Lona de aislamiento
	Combustibles
Equipos	Computador
	GPS

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
	Cartografía básica y temática
	Cámaras fotográficas
	Papelería
Señalización	cinta plástica reflectora para señalizaciones

DESCRIPCION DE EQUIPOS – TRABAJO EN ALTURAS	
Equipos de Protección Contra Caídas	Líneas de vida
	Arnés integral
	Tie off – Punto de anclaje
	Eslingas de detención de Caída
	Eslingas de posicionamiento
	Freno de descenso
	Kit de rescate en alturas

4. ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, PODA DE ÁRBOLES AISLDADOS

Previo al inicio de las actividades relacionadas a la poda de árboles del contrato de “PRESTAR EL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES, UBICADOS EN LAS ZONAS INTERNAS Y ADYACENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA”, se llevó a cabo la Capacitación al personal operario del proyecto por parte de la empresa SP Ambientales S.A.S., la cual mediante un profesional experto en el tema, procedió a realizar un charlas preoperacionales orientado a la ejecución de la actividad y a minimizar los impactos ambientales que puedan generarse por el desarrollo del proyecto. La temática fue la siguiente:

- Técnicas de Poda de árboles según los requerimientos de cada especie. Objetivo: Capacitar al personal de operarios que participan en la ejecución de las actividades de poda de árboles de manera técnica que permitan minimizar el impacto ambiental que se pueda generar en el entorno paisajista del área de la obra.

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

4.1 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

4.1.1 Señalización del área de trabajo.

Se realizó la señalización de los sitios de trabajo con el objetivo de minimizar y mitigar los riesgos asociados a accidentes de trabajo y afectación de la vegetación aledaña al proyecto.

Lo anterior se evidencia a continuación. (Fotografía 1, Fotografía 2).

			
Fotografía 1. Señalización área de trabajo.		Fotografía 2. Señalización área de trabajo.	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Señalización área de trabajo.	Observación:	Señalización área de trabajo.

4.1.2 Identificación inicial árboles a Podar

Se realizó la identificación e inspección visual de los individuos forestales objeto de poda con el objetivo de realizar la planeación y ejecución de las actividades.

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022



Fotografía 3. Identificación de individuos a intervenir.

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Marcación de árboles a talar



Fotografía 4. Identificación de individuos a intervenir.

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Marcación de árboles a talar



Fotografía 5. Identificación de individuos a intervenir.

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Marcación de árboles a talar



Fotografía 6. Identificación de individuos a intervenir.

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Marcación de árboles a talar.

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

			
Fotografía 7. Identificación de individuos a intervenir.		Fotografía 8. Identificación de individuos a intervenir.	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Identificación de árboles a intervenir	Observación:	Identificación de árboles a intervenir

4.1.3 Actividad de Poda de árboles.

Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, sobre todo cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que el árbol joven para sombra debe ser podado regularmente hasta que alcance una altura de 6m; a partir de entonces el árbol sólo recibirá podas esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado definida.

Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico pesado, lo cual debilita y acorta la vida del árbol. Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma original.

Tipo de Podas

Poda de formación y/o estructural

Este tipo de corte generalmente se aplica a individuos juveniles, a los que se les quiere corregir problemas como bifurcaciones a baja altura (si se trata de especies con fustes

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

monopódicos), o para guiar el tronco principal hasta una altura deseada. Su objetivo es desarrollar árboles estructuralmente fuertes, con una forma balanceada, funcional y armónica.

Las podas estructurales son fundamentales cuando el individuo es joven. Deben ser mínimas en la fase adulta del árbol, pues tratar de formar los árboles maduros es casi imposible y puede traer como consecuencia su deterioro.

Poda de saneamiento y/o limpieza

Este tipo de poda tiene diversas connotaciones y se aplica a tejido vivo o muerto. La poda de ramas muertas es el primer paso que se da al iniciar la poda de un árbol o arbusto, sin importar su tamaño. Es recomendable podar todas las ramas muertas (secas) o moribundas con la técnica correcta de cortes y retiro del material vegetativo, para minimizar los daños a la copa.

Las podas de saneamiento o sanitarias tienen como objetivo el vigorizar la copa del árbol al eliminar la carga que tiene, por mantener ramas inutilizadas o que representan un riesgo de cerrar demasiado la copa. Adicionalmente, se deben eliminar las plantas parásitas que pueden llegar a matarlo y otros objetos que pueden afectar su salud (Gilman, 2002).

Poda de elevación de copa

Este tipo de poda también es conocida como poda basal de la copa y se aplica en árboles y arbustos desde jóvenes, sobre todo en aquellas especies que tienen la tendencia a emitir brotes en el tronco, ramas inferiores o rebrotes desde el cuello radicular. Lo más común es usar poda basal para elevar la copa del árbol joven y mantener limpio el fuste. Este tipo de poda es para árboles de sombra o de alineación en camellones, avenidas y banquetas, donde las ramas deben tener una altura de 3 a 4 m para librar el paso peatonal y del tráfico vehicular.

Poda de Reducción de copa

Consiste en disminuir el tamaño del árbol, generalmente por razones de seguridad, dado que sus ramas están cercanas o en contacto con líneas de energía o construcciones y representan un riesgo.

Infortunadamente este es el tipo de poda que más se realiza y, puesto que genera tantas deformidades y daños a los árboles, en lo posible debería evitarse, para lo cual es urgente realizar programas de reemplazos masivos por especies apropiadas a cada sitio (Morales & Varón, 2006) (Figura 11).

Aunque es considerado por algunos como un tipo de poda, en realidad es un procedimiento antitécnico y constituye, tal vez, una de las prácticas más lesivas que se

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

le pueden hacer a un árbol, la cual se debe abolir por el daño irreversible que produce (City of Alexandria, 2010). Suele tener un efecto contrario al buscado y puede generar alto riesgo, pues al quedarse sin follaje, se activan las yemas latentes del árbol y se producen muchos rebrotes que rápidamente agotan las reservas de nutrientes del individuo, lo que puede matarlo; además, los rebrotes así generados son muy débiles y propensos a reventarse con la lluvia o el viento, con riesgo para el público (ISA, 1999).

Poda estética

Esta no puede practicarse sin talento artístico, ya que la poda estética es una verdadera combinación de técnica científica y aptitudes artísticas. La poda estética o artística se practica en árboles y arbustos públicos y privados. La apariencia del árbol es la meta de esta poda, no sólo individual sino en conjunto, determinará el cuadro artístico del podador paisajista.

➤ Preparación de los árboles a Podar.

Con el fin de asegurar el éxito de la poda, prevenir accidentes de los trabajadores e impactos sobre la vegetación y estructuras, los árboles son sometidos a labores de preparación, realizando, entre otras, las siguientes actividades:

- Limpieza del fuste de lianas y enredaderas.
- Limpieza de la base del fuste de vegetación arbustiva que dificultan las labores y tránsito de los trabajadores.
- Colocar las herramientas de trabajo en sentido opuesto a la caída del árbol.
- Constatar que la dirección caída es la apropiada y que no existen riesgos de accidente
- Definir las rutas o caminos de escape.

4.1.4 Ejecución poda de árboles

Debido al alto flujo de personas y vehículos dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, se procedió a realizar la intervención según el cronograma de actividades presentado, y durante la semana se laboró en las zonas verdes donde se realizó la respectiva señalización.

En Total se podaron 48 árboles.

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022



Fotografía 9. Poda de árboles

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Poda de árboles



Fotografía 10. Poda de árboles

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Poda de árboles



Fotografía 11. Poda de árboles

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Repicado y apilado de residuos vegetales



Fotografía 12. Poda de árboles

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Repicado y apilado de residuos vegetales

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022




Fotografía 13. Poda de árboles

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas



Fotografía 14. Poda de árboles

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas

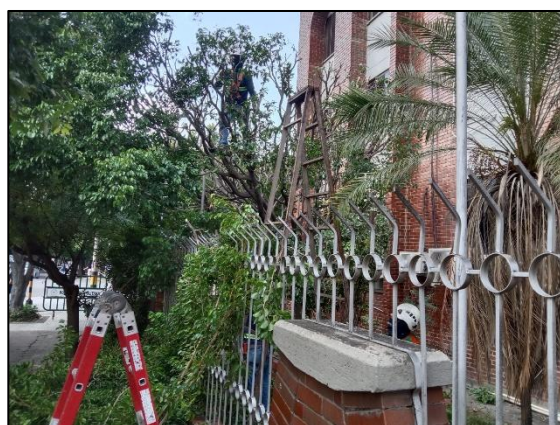

Fotografía 15. Poda de árboles

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas




Fotografía 16. Poda de árboles

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

			
Fotografía 17. Poda de árboles		Fotografía 18. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas	Observación:	Descenso controlado de ramas
			
Fotografía 19. Poda de árboles		Fotografía 20. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Descenso controlado de ramas	Observación:	Descenso controlado de ramas

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

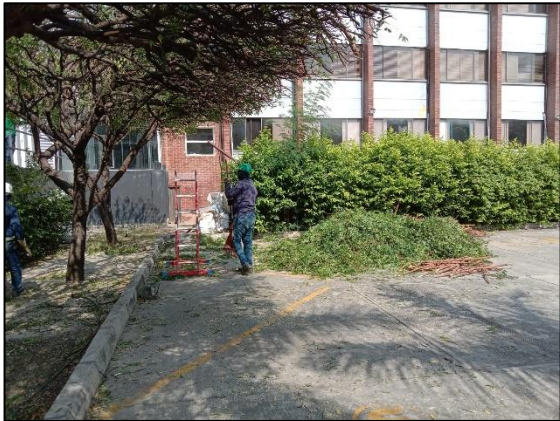			
Fotografía 21. Poda de árboles		Fotografía 22. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales
			
Fotografía 23. Poda de árboles		Fotografía 24. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

			
Fotografía 25. Poda de árboles		Fotografía 26. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales
			
Fotografía 27. Poda de árboles		Fotografía 28. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

			
Fotografía 29. Poda de árboles		Fotografía 30. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales
			
Fotografía 31. Poda de árboles		Fotografía 32. Poda de árboles	
Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales	Observación:	Repicado y apilado de residuos vegetales

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

4.2 Manejo de Residuos Vegetales

Se realizó la recolección y disposición final de residuos vegetales , en el Parque Tecnológico Guayabales VEOLIA el cual es el sitio autorizado para realizar dicha actividad. La recolección se realizó de manera manual y se incorporó en un Vehículo Tipo Camión VEOLIA para posteriormente ser trasladado al Relleno Sanitario, tal como se evidencia a continuación.



Fotografía 33. Recolección de Residuos Vegetales

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Disposición final VEOLIA



Fotografía 34. Recolección de Residuos Vegetales

Lugar: Palacio de Justicia - Cúcuta

Observación: Disposición final VEOLIA



Fotografía 35. Recolección de Residuos Vegetales



Fotografía 36. Recolección de Residuos Vegetales

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Disposición final VEOLIA	Observación:	Disposición final VEOLIA



Fotografía 37. Recolectión de Residuos Vegetales



Fotografía 38. Recolectión de Residuos Vegetales

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Disposición final VEOLIA	Observación:	Disposición final VEOLIA



Fotografía 39. Recolectión de Residuos Vegetales



Fotografía 40. Recolectión de Residuos Vegetales

Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta	Lugar:	Palacio de Justicia - Cúcuta
Observación:	Disposición final VEOLIA	Observación:	Disposición final VEOLIA

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – ENERO 2025	VERSIÓN 1
	PODA DE ÁRBOLES AISLADOS – PALACIO RAMA JUDICIAL - CUCUTA	JUNIO - 2022

Anexo Certificados de disposición final de residuos vegetales expedidos por VEOLIA.

FORMATO
VHC-GR-F-02
Versión: 05



VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P

NIT. 807.005.020-8

HACE CONSTAR

Que los residuos sólidos ordinarios producidos por **SERVIPODAS AMBIENTALES S.A.S.** identificada con el Nit. **901.457.313-0**, son entregados a la empresa **VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P**, identificada con Nit. **807.005.020-8**, para ser dispuestos técnicamente en el Relleno Sanitario Guayabal, ubicado a 10 Kilómetros de la vía que conduce de Cúcuta a Puerto Santander, el cual tiene vida útil aproximada hasta el año 2040, y cuenta con resolución CORPONOR #450 del 2006.

MES	PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Enero-2025	2,7	Ton

Se expide la presente constancia a petición del interesado, a los quince (15) días del mes de enero de 2025.

Atentamente



ANDREA LENIS
Gerente Disposición Final

Revisó: Mauritz Ayala - Jefe de Operaciones Comerciales
Realizó: M.Alexandra Cáceres - Auxiliar De Grandes Productores

Veolia Aseo Norte de Santander S.A.S E.S.P
Nit. 807.005.020-8
Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial
Cúcuta - Colombia
Tel. (607) 5784888
www.veolia.com.co/oriente

Dirección: Avenida 5 # 5-52, Brr La Victoria, San
José de Cúcuta – Norte de Santander.
TEL: 3102967199-3209710254
E mail: servipodasambientales@gmail.com

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1229307668	9481059040	E	2025/02/05	2025/01/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,675,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901457313	0	SP AMBIENTALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVENIDA 5 # 5-52 BRR LA VICTORIA	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3102967199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1229307668	9481059040	E	2025/02/05	2025/01/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,675,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$1,485,900	\$0	\$0	\$1,485,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$561,900	\$0	\$0	\$561,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$764,500	\$0	\$0	\$764,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$371,800	\$0	\$0	\$371,800	
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	11	\$371,800	\$0	\$0	\$371,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				11	\$371,800	\$0	\$0	\$371,800	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$96,900	\$0	\$0	\$96,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
TOTAL				11	\$2,675,000	\$0	\$0	\$2,675,000	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162738080	9479752143	E	2025/01/07	2024/12/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,082,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901457313	0	SP AMBIENTALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVENIDA 5 # 5-52 BRR LA VICTORIA	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3102967199	Si

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
