



INFORME SEMANAL 06

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO No: 501 DEL 2024

CONTRATISTA: STATIC INGENIERIA SAS

SUPERVISOR: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
ALCALDIA DE PAIPA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 330,329,355.00

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE – 2024

FECHA DE TERMINACION: 29 DE MARZO – 2025

DATOS DEL INFORME

OBRA PROGRAMADA: 18.07 %

VALOR PROGRAMADO: \$ 59.697.012,38

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: % 41.96

VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 138.607.017,97

OBRA EJECUTADA: % 0.0

VALOR EJECUTADO: \$ 00

OBRA EJECUTADA ACUMULADA: % 73.03

VALOR EJECUTADA ACUMULADO: \$ 241.227.716,00

PERIODO: Del 22 de febrero al 28 de febrero del 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO: 60 días

TIEMPO RESTANTE PARA TERMINACION: 30 días.

FECHA: 28 de febrero 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO




Se realiza hidratación diaria de los concretos fundidos a la fecha.



PERSONAL EN OBRA

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
SERGIO LEONARDO GALLEGU PLAZAS	1.057.586.590	RESIDENTE DE OBRA
DIANA CAROLINA DALLOS MORANTES	1.049.604.684	INSPECTOR SST
MARCO AURELIO CAMARGO HIGUERA	7.229.352	ASESOR ESTRUCTURAL
ANDRES FELIPE BERNAL	1.049.618.165	ASESOR GEOTECNICA
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA	7.173.560	DIRECTOR DE OBRA

Avance ejecutado

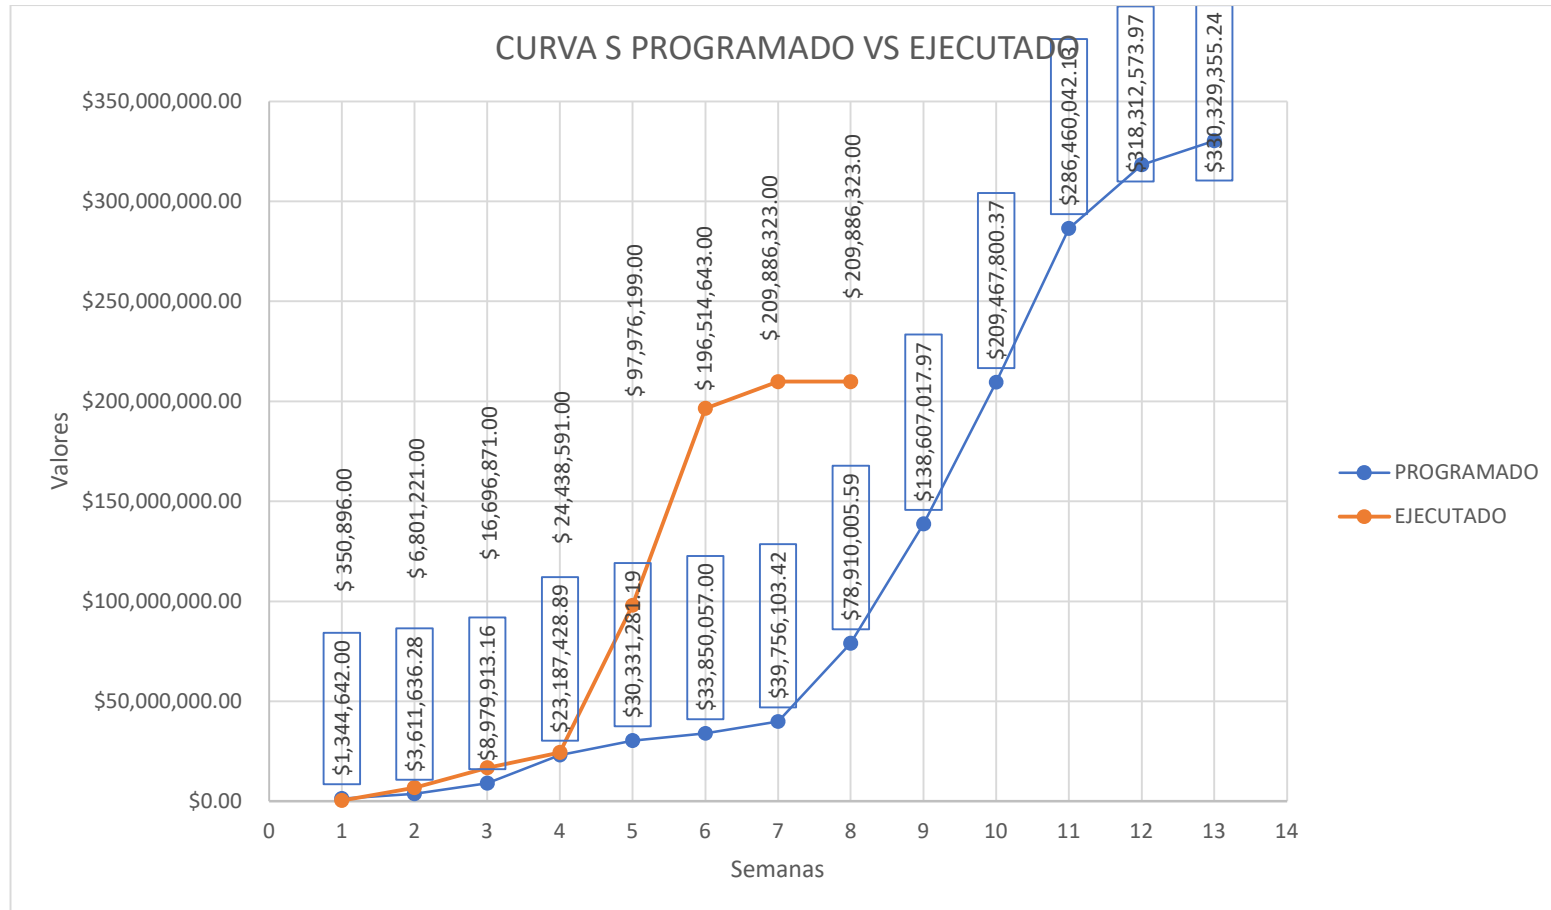



CONCLUSIONES

DURANTE LA SEMANA DEL INFORME 6, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Se realizan limpieza de las áreas de trabajo.
- Hidratación de concretos

- ✓ Se observa que la obra programada está por debajo de lo ejecutado, cumpliendo el cronograma de obra.
- ✓ Es importante resaltar, que debido a que los concretos cumplen una resistencia a los 28 días, se debe esperar este tiempo para realizar actividades de desencofre de formaleta. Luego de esto se debe realizar la prueba de estanqueidad para realizar los rellenos finales de obra.
- ✓ También se han realizado algunas actividades no previstas, las cuales no se incluyen en el presente informe. Estas actividades se incluirán, al momento de ser aprobadas por la entidad contratante.

SERGIO LEONARDO GALLEGO PLAZAS
Representante legal – Static Ingeniería S.A.S
