

BITACORA DE

OBRA

→ **OBJETO:** OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADICIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO EUAS SERRANO AMAVIA" JUZGADO PROMISCO.

→ **CONTRATANTE:** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

→ **CONTRATISTA:** JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

→ **CONTRATO No:** 082-2024

→ **RESIDENTE DE OBRA:** Arquitecto Juan Jose Monsalve Ospina.

→ **UBICACION:** CARRERA 10 No 12-15 CALI - VALLE DEL CAUCA.

→ **RESPONSABLES DE OBRA:**

DEL CONTRATISTA	DEL CONTRATANTE
-----------------	-----------------

→ **FECHA DE INICIO:**

→ **FECHA DE TERMINACION:**

→ 28 DE AGOSTO DEL 2024

MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: DESCARGUE Y ALOPIO DE MATERIAL

HORA: 7:50 AM

SE INICIA EL DIA HACIENDO ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO GUANTES, GAFAS, CASCOS, TAPAOIDOS Y DEMÁS.

SE CONTINUA A DESCARGAR MATERIAL COMO LAMINAS DE PANEL YESO, TUBERIA RECTANGULAR 146 UNAS DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, CURIELES DE ESTUCCO, PINTURA, SE REALIZA TRIPODE CON ANDAMIOS EN LA TERRAZA PARA SUBIR MATERIAL.

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 4:50 PM

→ 29 DE AGOSTO DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRASIEGO DE MATERIAL.

HORA: 8:00 AM

SE INICIA ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE MATERIAL DESDE EL PATIO CENTRAL A LA TERRAZA UBICADA EN EL 6TO PISO DE LA TORRE, DICHOS ELEMENTOS SE SUBEN DE MANERA MANUAL MEDIANTE POLAS Y SOGAS.

SE SOLICITA A ADMINISTRACION UN ESPACIO PARA UBICAR HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PERSONALES DE LOS COLABORADORES, DISPONEN ESPACIO EN EL PISO 06 DE JUZGADOS.

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN A LAS 5:00 PM

→ 30 DE AGOSTO DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LAVADA DE TERRAZA Y TRASIEGO DE MATERIAL.

HORA: 7:40 AM

LA ACTIVIDAD ESTABLECIDA ES TERMINAR DE SUMIR MATERIAL COMO ARENA, CEMENTO, ADIDOS Y DEMÁS.

SE CONTINUA CON EL LAVADO Y RETROQUE DE MATERIAL EN MAL ESTADO EN LA TERRAZA, DONDE SE HABAN ACTIVIDADES

SE RECULGE MATERIAL NE DESTRONQUE EN COSTALES Y SE
ACOPIAN EN UN SITIO PARA SU POSTERIOR DESECHO.
ESTAS ACTIVIDADES FINALIZAN A LAS 5:40 PM.

→ 31 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LAVADO Y DESTRONQUE DE MATERIAL.

HORA: 8:00 AM

SE CONTINUA CON EL LAVADO DE LA TERRAZA Y PASQUETANA
DE PAREDES EN MAL ESTADO, SE INICIA SIEMBRA DE MUROS EN PISO 5

→ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: SOLEADO

SE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA TERRAZA COMO TRAZO DEL AREA
DONDE SE INSTALARA EL ENCHUFE, SE INICIA MORTERO DE NIVELADA
SE CONTINUA CON SIEMBRA DE MUROS EN JORGANES DEL PISO
5.

→ 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: SOLEADO

SE CONTINUA CON EL SOLADO DE NIVELACION, Y SE INICIA CON
UNA PARTE DEL ENCHUFE AUTOMATIZANTE.

EN EL PISO 05 DE LOS JORGANES SE INICIAN ACTIVIDADES DE
ESTRUCTURA DE MUROS DE DRYWALL.

SE TERMINA DE ACOPIAL TODAS LAS PIEZAS DE ENCHUFE Y DE
FRAGUA, SE REUNE VENTA DE CONTRATISTA ELECTRO Y CONTRATANTE RAUL

→ 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ENCHUFE DE PISO EN TERRAZA Y JORGANES DEL PISO 05
MUROS Y POR PERIODO DE ADMINISTRACION DEL PALACIO DE JUSTICIA SE
INICIA ESTRUCTURA DE CAMARA GASEL EN EL PISO PENAL, ESTA PENDING
ELECTRICOS EN ESTE PISO.

4
→ 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FRAGA DE PIEZAS RESTANTES, CONTINUACIÓN DE MUROS EN JUZGADOS DEL PISO 05,

RASQUETEO DE ZONAS DE ALTÍSIMOS DE LOS JUZGADOS 36, 12 Y 06 PARA LUEGO APLICAR TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD.

SISO IMPARTE CHARLAS DE PAUSAS ACTIVAS.

→ 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: NUBLADO-SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FRAGA DE PISO DE TERRAZA Y CONTINUACIÓN CON JUZGADO PENAL 12 DEL PISO 5, ESTRUCTURACIÓN DE MURO, RASQUETEO DE HUMEDADES EN PARTE POSTERIOR DE LOS JUZGADOS.

SE INICIA A PINTAR CON UNILUX TIPO 1 COLOR BLANCO.

→ 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SABADO

CLIMA: SOLEADO

POR PARTE DEL PALACIO DE JUSTICIA SE REALIZA FUMIGACIÓN,

SE ESPERA DE 7:00 AM A 9:00 AM. POR MOTIVOS DE

BIOSSEGURIDAD SE DEBE FINALIZAR POSIBLES ACTIVIDADES Y TAMBIÉN ACTIVIDADES EN LA TERRAZA.

FINALIZA DÍA 9:30 AM.

→ 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DOMINGO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: CABLEADO ELÉCTRICO DE JUZGADOS Y REJANE DE PAREDES JUZGADO 36 Y 06

SE CONTINUA CON MASHIA PARA REJANAR SITIOS A INTERVENIR, SE REALIZA INSTALACIÓN DE CANALETA Y DE CABLE UTP.

→ LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: RESANES Y PINTURA JUZGADO 10 PENAL

SE CONTINUA CON LA TRABAJO DEL CABLE EN LA TERRAZA

Y RESANES DE LOS JUZGADOS 10, SE SOLICITA A ADMINISTRACION DEL PALACIO DE JUSTICIA EL MOVIMIENTO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO

10 YA QUE SE REQUIERE PINTAR Y RETANAR ESA ZONA.

A LA PAR SE REALIZA INSTALACION DE CANALITA Y CABLE ELECTRICO.

→ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MARTES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INSTALACION CANALITA - PINTURA MUROS - TERRAZA.

SE CONTINUA CON RESANES Y PINTURA DE JUZGADOS A INTERVENIR

10 - 12, SE HAN CANALITA INSTALADA EN SITIO PARA SU LUGO

CABLEADO Y INSTALACION DE ACCESORIOS COMO TOMA...

PASQUEJANA DE MEDICAMENTA EN MAL ESTADO.

SE TRABAJAN 131,5m² HASTA EL MOMENTO FALTA UN RESTANTE POR OTRA ACTIVIDAD.

→ 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MIERCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TERRAZA,

INSTALACION DE MUROS Y REDES ELECTRICAS.

A LA PAR DE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZA EL RELLENO DE

CAJAS ELECTRICAS EN LOS JUZGADOS 36 PENAL Y LOS MENOS YA INTERVENIDOS

PARA EL RELLENO DE LAS CAJAS ELECTRICAS SE ESTA UTILIZANDO, CEMENTO BLANCO, ADITIVOS Y MARMOLINA.

→ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PINTURA Y RESANES JUZGADO 10 Y 36, INSTALACIONES ELECTRICAS

SE CONTINUA CON LOS MUROS DE LOS JUZGADOS 36 Y 10

DEL PISO 5. SE SIGUE A LA ESPERA QUE MOVIAN EL ARCHIVO

DEL 36 PARA DARLE ESA ZONA

→ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: MUROS DEYWALL, INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO PARA LA FUNDACION DE PAREDES DE 20x20 PARA LOS PAREDES DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

SE INSTALAN 11 ESTRUCTURAS PARA DADO DE CONCRETO, A LA PAR SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA Y REJANES EN LOS PISO 05 DE JUZGADOS PENALES.

→ 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SABADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: REJANES CAMARA GEL DEL PISO 5, DESMONTES DE VIDRIO TEMPLADO DEL JUZGADO, DESMONTES DE RH DE VENTANA, SE CONTINUA CON LA ESTRUCTURACION DE LA VENTANA Y SE LE INSTALA LA PROTECCION TERMOACUSTICA CONO ESTIPULA.

SE REALIZA ARBO Y TRASIEGO DE ESTE HASTA EL SITIO DE DEPOSITO EN LA MODEGA 01 SOTANO, SE INSTALAN PAREDES DE ESTRUCTURA CUBIERTA.

→ 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LUNES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ESTRUCTURACION DE MUROS DE JUZGADOS Y RECTIFICACION DE PAREDES PARA INSTALAR POSTERIORMENTE CERRAJES Y CORRENTES DE CUBIERTA, SE CONTINUA CON EL JUZGADO 36 PENAL, SE TIENE COMUNICACION CON PABLO "CONTADISTA COMUNICACIONES" EL CUAL SUJERE AL SWICHE: COMUTADOR AEROMA INSTANT 6H 1930 24G A SEP/SEPT PARA INSTALAR EN EL DACT DE COMUNICACIONES DEL PISO 06 DE LOS JUZGADOS PENALES.

[Handwritten signature]

→ 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ESTRUCTURA DE CUBIERTA - ESTRUCTURACION DE MUROS
Drywall

SE CONTINUA ACTIVANDO DE FUNCIÓN DE PANDOS Y ANCLAJE DE PLATINAS. SE REMUEVEN 02 PANDOS Y SE VUELVE A EMPEZAR YA QUE NO OPERAN EN OPTIMAS CONDICIONES, SE CONTINUA CON EL RELEVO DE CAJAS ELECTRICAS DE PISO.

→ 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO - NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FUNCIÓN DE PANDOS EN TERRAZA


SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE ES DESMONTAR DE FORMALETAS DE PANDOS PARA FUNCIÓN DE LOS PROXIMOS PANDOS CON ANCLAJES. SE REALIZA PRIMERA CAPA DE PINTURA EN LA CAMARA GESSEL DEL PISO 05, SE REALIZA TRAFERO DE ESCOMBROS HASTA EL LUGAR FINAL DE DEPÓSITO.

→ 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 JUEVES

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FUNCIÓN DE PANDOS - INSTALACIÓN DE PUERTAS.

SE LE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES, INSTALANDO Y ARMANDO MARCOS DE PUERTAS EN EL PISO 05 DE LA CAMARA GESSEL EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA PAUL, GERMA Y JONATAN (PERSONAL DE MANTENIMIENTO). SE REALIZA RECARGA AL CARGO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, TOMANDO MUESTRAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EN EL PISO 06 JUZGANDO PENALES SE PREPARA MEZCLA PARA RELENAR HUELOS DE CAJAS ELECTRICAS QUE NO SE ENCUENTRAN HABILITADAS.



→ 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: DESMONTE FORMALETAS, INSTALACION DE PARRALES DE COMERTA.

SE RECTIFICAN MEDIDAS, Y CALAMIN DE FORMACION DE VANDOS, SE DA DIRECTRIZ DE CORREGIR 02 PARRS QUE ESTABAN CON HORMIGUERO, EN LA ZONA DEL PISO 06 DE JUZGADOS PENALES SE REALIZA PASQUEO EN ZONA POSTERIOR DE ARCHIVOS DE JUZGADOS 06-36

→ 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SAMADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INSTALACION DE PARRALES DE COMERTA, INSTALACION DE CANALITA Y ALAMBROS ELECTRICOS EN EL PISO 06 DE JUZGADOS PENALES DEL PALACIO DE JUSTICIA.


→ 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LUNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INSTALACION DE PARRALES, PINTADA DE CARPINTERIA METALICA EN LA ZONA DE TORERA, EL OTRO FONTE DE TRAMATE REALIZA ACTIVIDADES DE PASQUEO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE DRYWALL EN LOS JUZGADOS 12-10, SE PAGA ESTA ACTIVIDAD PARA SUPLEN LA NECESIDAD DEL JUZGADO 07 PENAL DEL PISO 06 YA QUE POR PETICION DE JUEZA Y TEMAS DE SEGURIDAD SE RECONSTRUYE VIVIENDO Y SE REALIZA ESTRUCTURA PARA COMPLETAR EL VANDOS.

TAMBIEN SE INSTALA SWITCH ELECTICO "AROMAS"



→ 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Pintura y Resame nel piso 06 - Instalación de carpintería metálica en cocina.

Se continúa con el resame de los juzgados en el piso 06, se pide a la administración del Palacio hacer sillas y demás enseres para ponerle un celebrador al juzgado 03 Penal ya que este lo están solicitando de urgencia, se continúa con la instalación de puertas para continuar con la instalación del guarda electricos en PVC y canaletas electricas.

→ 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Resames y Pintura Juzgado 03 Penal, Instalaciones electricas


Se continúa con las actividades ya preestablecidas como Pintura, Resame y también instalación de puertas en juzgados ya terminados. Dicho remiende de instalación de puertas se va retrasando ya que no se podía realizar debido en la sala debido a que se encontraban en audiencia, a la par se realiza actividades administrativas, como maclare de obra nel Palacio de Justicia.

→ 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de seguridad en celdas de cometa y a la par se realiza la instalación de estructura de drywall en el hall de acceso nel juzgado Penal 03 (Hall de acceso que se genera debido al retroceso de la pared) para generarle un acceso mas privado a la sala en intervención, se instalan carpenteria de panel y se hace lo requiere.

Se realiza jornada de obra en toda la planta de trabajo



→ 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VIERNES.

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SOLDADURA EN COMIERTA, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS TAMBIÉN SE REALIZA MARCADO DE PUNTOS REGULARES.

EN CADA UNO DE LOS JUZGADOS A INTERVENIR.

SE PINTA LOS JUZGADOS PERIMETROS POR 3 MANO DE PINTURA QUE SON LOS: 36-12-07-11-10,

→ 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SÁBADO

CLIMA: LUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PESAJES, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EN LA ASO 66, EN EL JUZGADO 03 Y 36

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES YA ESTABLECIDAS, A LA PAR SE

REALIZA INSTALACIÓN DE MARCO DE PUERTAS PERIMETROS.

EN LA ZONA DE TERRAZA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLDADURA

PERO SE REALIZA ORDENAMIENTO DE MATERIALES EN DICHA ZONA

→ 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SOLDADURA DE CORREAS, INSTALACIÓN DE PUERTAS.

DICHAS ACTIVIDADES SE CONTINUAN DE MANERA ÓPTIMA POR PARTE DE LOS

COLABORADORES, SE REALIZA INSTALACIÓN DE PUNTO DE PESO Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS EN LOS JUZGADOS 36-03. DEL CUERPO PENAL.

→ 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VIERNES

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SOLDADURA EN COMEDA, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS TAMBIÉN SE REALIZA MARCADO DE PUNTOS REGULARES

EN CADA UNO DE LOS JUEGOS A INTERVENIR.

SE PINTA LOS JUEGOS PERMANENTE POR 3 MANO DE PINTURA QUE

SON LOS: 36-12-07-11-10,

→ 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SABADO

CLIMA: LUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PESAJE, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EN EL PISO 06, EN EL JUEGO 03 Y 36

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES YA ESTABLECIDAS, A LA PAR SE

REALIZA INSTALACION DE MARCO DE PUERTAS PERMANENTES

EN LA ZONA DE TENDERA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SOLDADURA

PERO SE REALIZO ORDENAMIENTO DE MATERIALES EN DICHA ZONA

→ 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SOLDADURA DE CORREAS, INSTALACION DE PUERTAS

DICHAS ACTIVIDADES SE CONTINUAN DE MANERA OPTIMA POR PARTE DE LOS

COLABORADORES, SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO DE RED Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS EN LOS JUEGOS 36-03. DEL CUERPO RENAL.

→ 01 DE OCTUBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: SOLEADO



ACTIVIDAD PRINCIPAL: SOLDADURA DE CORREAS, LIMPIEZA DE PISO 06

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES CONTINGENTES, SE REALIZA ASEO GENERAL

DEL PISO 06 DE LOS JUEGOS PERMANENTES, SE RECIEN LOS PATCH CORD

PARA EL DACK DE SISTEMAS, SE REALIZAN MEMORIAS DE MARCAJE

DE OBRA PARA INFORME REQUERIDO

→ 02 DE OCTUBRE DEL 2024 JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de Marcos de Puertas,

Instalación de Guardaxenias PVC

Instalación de Correas de Cometa, La Actividad

de Instalación de Marcos de Puertas se Paró a 1:45 min

Debido a Aumento en el Juzgado

→ 03 DE OCTUBRE DEL 2024 VIERNES

CLIMA: SOLEADO - NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Traslado de Material en sótano 01

Revisión de Piso de Salón de Reposo, a la Par se

Instalación de Tiroceros Eléctricos, se Revisa el Punto

de Red a la Par se Realiza la Instalación del Marco de

Puerta del Juzgado 03 Penal del Circuito, se Realiza

Visita de Juzgados Laborales para Realizar Tratamiento

de Humedades 05 y 02, se Realiza Volumetría en 3D

del Cuarto de Combustible para Toma de Medidas.

→ 04 DE OCTUBRE DEL 2024 SÁBADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Pintura y Ujado Cámara Gesec Piso 05

se Realiza Visita al Cuarto de Combustible a Rectificar

Medidas, Limpieza de Calles de Terraza, la Actividad de

Pintura en Cámara Gesec se ve Detenida ya que Ingresan

Grupo de Recusos e Instalación Enseres en la Pared a

Tratar


→ 05 DE OCTUBRE DEL 2024 SÁBADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Tratamiento de Humedad en Archivos

Posteriores de Juzgado 03 Penal, a la Par se Realiza

Desmonte de Muros en el Hall de Acceso de Juzgado 02

S 

→ 07 DE OCTUBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: SOLEADO - NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PINTURA DE ESMALTE DE VENTANA,
SE REALIZA INSTALACION DE GUARON ESCOMA EN CERAMICA, EN
LA ENTUBADA DE LA CAMARA GRESSEL, SE CONTINUA CON LA
INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SE RECTIFICAN
MEDIDAS DE ALEROS DE CUBIERTA.

→ 08 DE OCTUBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: RECORRIDO CON EL INQ EDWIN CANTE
LA WAL TJE PARA ADICIONAR AL BALANCE NUEVAS CANTIDADES
DE PINTURA-PASQUETES Y ESTUCO ADICIONAL POR LOS ESPACIOS A
TRATAR EN LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PISO 01
A LA PAR SE INICIA CON EL PASQUETES DEL CIELO PASO
Y PAREDES EN MAL ESTADO DEL ARCHIVO DE TERRAZA
SE ENVIAN MEDIANTS DE M² DE ZONAS CON HONDERANES
32m² EN TOTAL DE ZONA ADMINISTRATIVA, SE CONTINUA
CON PASQUETADA DE ARCHIVO DE TERRAZA.

→ 09 DE OCTUBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PASQUETES DE ARCHIVOS DE TERRAZA, CIELO
Y PAREDES, SE REALIZA LIMPIEZA DE ZONA A TRATAR,
DICHA ACTIVIDAD DE PASQUETES TIENE UN RENDIMIENTO MENOR
DEBIDO A LA CANTIDAD DE ESTAMPAS Y DOCUMENTACION EN EL SITIO
O INTERVENIR.

→ 10 DE OCTUBRE DEL 2024 JUEVES

CLIMA: SOLEADO - LLUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PASQUETE DE ZONA DE ARCHIVO,
SE REALIZA RECORRIDO CON EL INQ EDWIN CANTE
PARA OBSERVAR ACTIVIDAD ADICIONAL EN EL MANDO ADMINISTRATIVO
Y AREA FINANCIERA DEL PISO 01 DEL PALACIO DE JUSTICIA.

→ 11 DE OCTUBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: NUBLANO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2DA MANO DE PINTADA DE ESMALTE EN CAMARA DESSEL PISO 03, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL PISO 04 QUE ESTA EN ESPERA PARA INTERVENCIÓN, A LA PAR SE REPARAN LOS CABLES DEL SWITCH QUE ESTAN EN EL DUK DE COMUNICACIONES, SE REALIZA EL RESANE Y LIMA DE TALL DE MISO DE JUZGADO 03 PENAL, SE REUNEN TEJAS DE CUBIERTA Y SE DISPONEN A SER OMKADAS EN EL ATRIO DEL PALACIO.

→ 12 DE OCTUBRE DEL 2024

SABADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRASIEGO DE MATERIAL DE CUBIERTA DESNE EL ATRIO EN EL PISO 01 A LA TERRAZA MEDIANTE SISTEMA DE POLEAS

→ 13 DE OCTUBRE DEL 2024

DOMINGO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRASIEGO DE MATERIA DE CUBIERTA TEJAS MEDIANTE SISTEMA DE POLEAS.

→ 14 DE OCTUBRE DEL 2024

LUNES (FESTIVO)

CLIMA: NUBLANO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRASIEGO DE MATERIAL DE CUBIERTA


→ 15 DE OCTUBRE DEL 2024

MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ASEO GENERAL DE CUBIERTA,

SE REFIENAN LOS HUECOS DE CABLES ELECTRICAS EN JUZGADO 03 SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO DE RED ADICIONAL EL JUZGADO 01 DE PEQUEÑAS CAUSAS (AMORACE)



→ 16 DE OCTUBRE DEL 2024

MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE RECIBE MATERIAL COMO TOMOS CUADRADOS PARA CUBIERTA, SE REALIZA CHARLA POR PARTE DEL PERSONAL SISO, SE COMIENZA CON LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN. SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA HABILITACIÓN DEL PISO 04 PARA ACTIVIDADES PERTINENTES EN LOS JUEGOS, A LA PAR SE REALIZAN CANOCHAS Y SOSCOS O BAJANTES PARA CUBIERTA.

→ 17 DE OCTUBRE DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: REALIZACIÓN DE CANALES PARA CUBIERTA, REALIZACIÓN DE SOSCOS DE 3" EN CANALES Y SE REALIZA PRE ENSAMBLE DE TEJAS DE CUBIERTA, SE REALIZA EVACUACIÓN INMEDIATA POR AMENAZA DE ARTIFICIO EXPLOSO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI. (Hora de evacuación 12:44 PM) EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONTINUA EN LAMOREL Y SE APROVECHA PARA DEFINIR SALAS PARA INTERVENIR EL PISO 04.

→ 18 DE OCTUBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DE CANOCHAS PARA CUBIERTA, EN LA ZONA DE LA TERRAZA, PRE ENSAMBLE DE TEJAS DE CUBIERTA.

→ 19 DE OCTUBRE DEL 2024

SÁBADO

CLIMA: SOLEADO (TEMPERATURA ALTA)

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRASLADO DE PUNTO DE PARA RAYOS, SE TRASLADA APROXIMADAMENTE 45cm PARA QUE LA TEJA Y LA CANAL DE ALUMINIO SE PUEDAN INSTALAR DE FORMA CORRECTA Y ESTÉTICA.

A LA PAR SE INSTALA LÍNEA DE VIBRA POR DONDE REALIZARÁN TRABAJOS.

→ 21 DE OCTUBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de cubierta en la zona de terraza, a la par se realiza resanes en la parte de archivo de terraza.

Se realiza usha del Ing Edwin Cante, se toman sugerencias de cámaras, tubería de desagüe y pasarela metálica para no pisar tubería.

→ 22 DE OCTUBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: LUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de cámara en zona de cubierta, instalación de cubierta, toma de cantonamientos para tubería de 4" sanitaria para paramentos, se sigue a la espera de intervenir el piso 04, se solicita tubería y accesorios, se continúa con resanes y rasquero en archivo de terraza.

→ 23 DE OCTUBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: TORMENTA ELÉCTRICA - LUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Resanes de archivo de terraza, aseo general, las actividades se ven afectadas por fuerte lluvia que imposibilita la instalación de la cubierta y sus accesorios, se continúa con la espera de intervención de piso 04, se realiza intervención de estructura metálica de cubierta para dejar las 2 cubiertas con la misma pendiente.

OBSERVACION/NOTA:


SE HACE ENTREGA DE 21 PATCH CORD DE 2m LSZH A PAZO CONTRAISTA DATOS EN PALACIO DE INSTALACIÓN Y DE 17 PATCH CORD DE 1.5 que tienen instalados en RACK DE COMUNICACIONES DE PISO 06.

→ 24 DE OCTUBRE DEL 2024 JUEVES
 CLIMA: NUBLADO
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: RASQUETEO DE ARCHIVO DE TERRAZA, SE REALIZAN RESANES Y SE APLICA IMPERMEABILIZANTE EN ZONAS AFECTADAS.
 75% APOX DEL ARCHIVO
 SE REALIZA INSTALACION DE TEJAS DE CEMENTO A LA PARRA
 SE REALIZA MURCELOS DE TUBERIA DE DESAGÜE DE CEMENTO.

→ 25 DE OCTUBRE DEL 2024 VIERNES
 CLIMA: NUBLADO - SOLEADO
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CONTINUA CON RASQUETEO DE PAREDES Y CASERONES DE CIELO "ACTIVIDADES QUE DEMANDA MAYOR TIEMPO"
 A LA PARRA SE REALIZA RESANES, SE CONTINUA CON DESAGÜE HIDRAULICOS

→ 26 DE OCTUBRE DEL 2024 SABADO
 CLIMA: NUBLADO - LUVIOSO
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CONTINUA CON RASQUETEO Y RESANES DE ZONA DE ARCHIVO, PARA OPTIMIZAR TIEMPO SE PAUSA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CEMENTO POR LLUVIAS
 SE CONTINUA CON EL ENSAMBLAJE DE LA TUBERIA DE DESAGÜES.

→ 28 DE OCTUBRE DEL 2024 LUNES
 CLIMA: NUBLADO - LUVIOSO "FUERTE TORMENTA"
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE REALIZA RASQUETEO Y RESANE DE ZONA DE ARCHIVO DE TERRAZA, A LA PARRA SE REALIZA RECORRIDO CON Ing Edmundo Caste y LA SRA MARIA DEL SOCORRO SE RECURRE SUGERENCIAS Y DIRECTRICES, SE TOMAN Y SE CORRIJEN DE FORMA INMEDIATA.

← 

→ 29 DE OCTUBRE DEL 2024

MARTES

CLIMA: NUBLADO - LUVIOSO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE REALIZA REPARACION AMIGUAL POR PARTE ELECTILICO YA QUE EL CABLE # 8 ME PISO 06 ME JUZGANDO ESPECIALES "Juzgado Penal 03", SE PONE LINEA ELECTRICA PROVISIONAL PRINCIPALMENTE PARA PONER TRANXPAR ME MANERA CORRECTA, A LA PAR SE REALIZA COMPRA DE PINTURA EN HOME CENTER DEL NORTE.

→ 30 DE OCTUBRE DEL 2024

MIÉRCOLES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CONTINUA CON RESANES Y APLICACION ME IMPERMEABILIZANTE EN ZONAS AFECTADAS, ME ARCHIVO ME TERRAZA SE INTERVIENE ME MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA ELECTICO NEL PISO 06 - JUZGADO 03 ME PENAS, A LA PAR SE REALIZA ESTRUCTURA ME ESCALERA - PASILLO ME TORERA ME AIRE ACONDICIONADO

→ 31 DE OCTUBRE DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONTINUIDAD ME RESANES Y PINTURA ME ARCHIVO ME TERRAZA. SE REALIZA RECORRIDO CON EL INGENIERO EDWARD CUNTE REVISANDO PUNTOS A INTERVENIR EL LOS JUZGADOS ME ELEVACION ME PENAS PISO 01 (Puntos Electricos y me Red) Y SE REALIZA TOMA ME MEDIDAS EN ZONA ME PORTERIA A INTERVENIR, SE REALIZA TRASHADO ME PARAPAYOS EN ZONA ME TERRAZA PARA DARLE CONTINUIDAD A LA INSTALACION ME ESTRUCTURA

→ 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: RESANES Y LIJADA ME ARCHIVO ME TERRAZA. SE TOMAN PUNTOS ME REFERENCIA PARA INTERVENIR HUMEDADES ENTRE JUNTAS ME ESTRUCTURA ME UNIDAD ME A/C Y ENCHAPE APLICACION ME IMPERMEABILIZANTE Y MANTO ANTIHUMEDAD.

7

A III ... II

SABADO

→ 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PASQUETEO DE ARCHIVO - Instalacion de CANALES Y SOLAPAS DE ALUMINIO EN LA ZONA DE COMERCIO.

SE PAUSAN ACTIVIDADES POR FUEJE A GUARICO.

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL ARQUITECTO RICARDO ROJAS Y SE ACATAN SUGERENCIAS.

→ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LUNES

DIA FESTIVO

05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PASQUETEO DE CASEONES EN ZONA DE ARCHIVO DE TERRAZA, SE CONTINUA INSTALANDO PARTE DE CAMERAS Y ACCESORIOS DE TOMERIA DE DESAGÜE DE COMERCIO, A LA PAR SE IMPERMEABILIZAN JUNTAS DE DADOS DE ESTRUCTURA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS.

→ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MIÉRCOLES


CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalacion de Puntos de RED Y ELECTRICOS EN NUEVOS JORGADOS A INTERVENIR, SE INICIA CON JORGADO 07 DE BOWEN SE INSTALAN PARTE DE PUNTOS YA QUE POR ESPACIO, DIRECTOS NO REPARON CONTINUAR, SE REPA EN CAMBIO UTP EN CABLE LISTO PARA SER PUNCHADO SE INSTALA PASARELA METALICA DE COMERCIO, A LA PAR SE REALIZA IMPERMEABILIZACION DE DADOS DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, SE REALIZAN CORRECCIONES POR PARTE DEL JUG CAUTE POR TEMA DE CAÑERA EN TERRAZA, SE CONTINUA CON PINTURA EN ARCHIVO DE TERRAZA Y CON LA INSTALACION DE SOLAPAS DE COMERCIO.

Monche.

- 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 JUEVES
- CLIMA: SOLEADO
- ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de Puntos de Red y Eléctricos en Juzgado 02 de Ejecuciones, se realiza recorrido con German "Contratista" y Jaime "Master de obra" tomando nota y medidas de pendientes con actividades de Panel Vaso.
- OBSERVACIÓN: Las actividades se pararon 1.20 horas debido a simulacro en el Palacio de Justicia de Cali.
- 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 VIERNES
- CLIMA: NUBLADO - LUVIOSO
- ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se continúa con Lijado y Pintura de Casilleros de Archivo de Terraza a la par se interviene el Juzgado 06 de Ejecuciones en el Piso 2, se realiza recorrido con Arq Lorena - Ing Edwin Cante y Arq Juan Monsalve rebuscando pendientes de obra.
- 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SÁBADO
- CLIMA: SOLEADO - NUBLADO
- ACTIVIDAD PRINCIPAL: Estudio y Resame en zona administrativa en el Piso 02 a la par se realizan trabajos de instalación de Puntos de Red y Eléctricos en zona administrativa Piso 01 dicha intervención solo se puede realizar bajo la supervisión de personal del juzgado y los sábados debido a la cantidad de personas laborando, a la par se realizan actividades de Lija y Pintura de zona de Archivo de Terraza.
- 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DOMINGO
- CLIMA: SOLEADO
- ACTIVIDAD PRINCIPAL: Lijado y Pintura de zona administrativa en el Piso 02 se realiza aspo parcial en zona a intervenir.

S



MARTES

12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: LIADA Y PINTURA DE CASETONES DE ARCHIVO DE TERRAZA, SE CORRIGE Y SE REALIZA DE MANERA ADECUADA LA CUNETA DE DRENAJE DEL ENCLAVE DE TERRAZA Y SE REALIZA RECORRIDO CON LA ARA LOCHAY JEFA DE PISO DONDE ESTA LA UNIDAD DE RESIDUOS SOTANO 1, SE DEJA ESTABLECIDO QUE EL SITIO SE REQUERIE LIBRE DE RESIDUOS, SE TOMA NOTA TAMBIEN DE DILATAIONES A INTERVENIR.

13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO


ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CONTINUA CON LA CAÑERA DE TERRAZA, SE DA A LA PURQUEDA DE ENCLAVE SIMILAR, A LA PAD SE CONTINUA CON INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS DE PURGADO DE CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL PISO 02 SE INICIAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MURO EN OFICINA DE ASOAL PISO 16

14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

JUEVES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CONTINUA CON ESTRUCTURACION Y MASILLA DE MURO DIVISORIO DE OFICINA DE ASOAL, SE PASQUETEA HUMEDADES Y SE TRATAN CON CEMENTOSO EN LA OFICINA DE LA DRA SOCORRO SE COMPON MATERIALES Y SE FUNEN OAROS RESTANTES EN ZONA DE TERRAZA, SE REALIZA RELLENO DE TROMERA EN PATIO DE MUJERES EN OFICINA JUMIAL PISO 01, SE HCEIA APLICANDO CEMENTOSO EN OFICINA DE DRA SOCORRO.

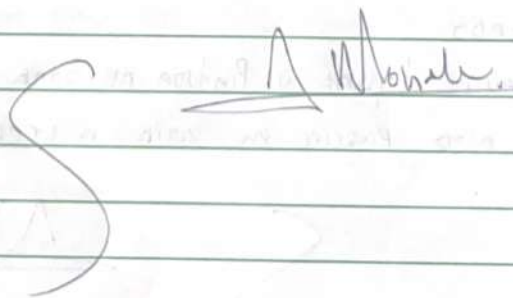

→ 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: RESANES Y PINTURERIA DE OFICINA DE ASONAL
SE CONTINUA CON INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNOS
ELECTRICOS EN JUEGARDOS 08 DEL PISO 06,

→ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SABADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: REGATAS DE ZONAS COMUNES DE AREA
HACIA ABAYO. PISO 06 AL 01, SE TRAZA LAS CAÑUELAS REALIZANDAS
SE CONTINUA CON RESANES DE OFICINA DE VRA SOCORRO
SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE HALL DE ACCESO PRINCIPAL, SE
REALIZA ASEO GENERAL EN ZONA DE TERRAZA, SE MASILLA
PADEP DE ZONA COMUN DE ADMINISTRACION.

→ 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LUNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SE CE DA CONTINUAN A ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN JUEGARDOS 08 DEL PISO 6
SE CONTINUA CON LIJADO Y PINTADO DE OFICINA DE ASONAL,
SE REALIZA LIMPIEZA PARA DAR INICIO A ACTIVIDADES DE FUTURA.

→ 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MARTES

CLIMA: Nublado - Lluvioso

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PINTURA DE OFICINA DE ASONAL, SE CONTINUA
CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN
JUEGARDOS 01 DE EJEMPLOS DE PISO 02, SE INSTALA SOCOM DE
GUARDA ESCOMBROS EN CERAMICA EN HALL DE ACCESO PISO 5, SE REJANA
ZONA DE VRA SOCORRO, SE IMPERMEABILIZAN DADOS ESTRUCTURA DE UNIDAD
DE AIRE ACONDICIONADO.

W. W. W.

→ 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Impermeabilización de pisos en zona de terraza a la par se realiza pintura de base blanca para posteriormente darle el acabado en el color y pintura que es, se realizan trabajos de instalación de puntos eléctricos en juzgado 05 de Ejecutivos en piso 02, se realiza pintura base en pared de hall de sala de espera de administración, se inician labores de destrucción de piso en zona de unidad de residuos en sótano 01.

→ 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 JUEVES

CLIMA: SOLEADO - NUBADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se continúa con el destrucción de la película de piso de la unidad de residuos en sótano 01 se realiza pintura en zona de oficina de la sala de socorro no se realiza la pared lateral izquierda por directriz de Arq Lorena, se realiza traseado de puerta de juzgado de Ejecutivos 09 a oficina de asonac por parte de personal del Palacio de Justicia.


→ 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza pintura de base en muro de primer piso se realizan perforaciones de prueba en zona de sub-estación eléctrica para revisar estado de losa, ased de zona administrativa. Por directriz de Arq Lorena la pintura de muro de 1m de altura tiene ser color blanca.



→ 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SAMARQ
 CLIMA: NUBADO-SOLEADO
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Pintura de zona administrativa.
 Oficina DDA, SOCORRO y MURO de zona de FINANCIERO
 A LA PMA SE REALIZA MERMONTA DE MURO EN MAC
 ESTADO DE UNIDAD DE RESIDUOS SOLAR 01, ASEO DE
 SITIO INTERVENIENDO.

→ 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LUNES
 CLIMA: SOLEADO
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Aplicativo de Impermeabilizante
 Adicional en MEDITERRANEA, SE REALIZA RECORRIDO CON RAFAEL
 Y ERIKA SST EN ESPACIO DE SUBESTACION PARA INSPECCIONAR
 Y PRE VISUALIZAR LOGISTICA PARA INTERVENIR ZONA.
 SE REQUIERE INSPECCIONAR LA ZONA DE ESCOLTA DE
 SUBESTACION PERO POR PARTE DE ADMINISTRACION DEL PALACIO
 PARA INSPECCION Y PINTAR QUE EL PERSONAL TENGA CURSOS
 EN ESPACIO CONFINADO Y DE ACCESOS.
 SE REALIZA DOCUMENTO DE SUGERENCIAS Y PASO A PASO DE
 LEVANTAMIENTO DE TANQUE EN SUBESTACION CON PERSONAL
 SST "ERIKA CHAO"

 ERIKA CHAO

→ 26 de Noviembre del 2024 Martes
 Clima: soleado
 Actividad Principal: Se inicia empalme con el residente
 Eddie Calderon, Posteriormente a eso, se inicia recorrido desde la
 terraza hasta la sub estacion, Pasando por las diferentes zonas
 que faltan por intervenir y los que ya se encuentran intervenidas.
 Tambien se realizó la rasquetada del Juzgado
 y se le aplica el Cementoso en los muros que se estan interviniendo

→ 27 de Noviembre del 2024 Miércoles

Clima: Soleado

Actividad Principal: Armado de muro para la zona de residuos sólidos. Se realiza recorrido por los diferentes juzgados para el cálculo de cantidades (lanaleta) y reconocer los puntos que hacen falta por intervención. Construcción de media cña con impermeabilizante en la zona de residuos sólidos.

28 de Noviembre del 2024 Jueves

Clima: Soleado

Actividad Principal: Montaje de laminas de eterboard de 8mm para muro de la zona de residuos sólidos. Recorrido por los juzgados para reconocimiento y conteo de los diferentes puntos de red y cálculo de dichas cantidades.

29 de Noviembre del 2024

VIERNES

Clima: Soleado


Actividad Principal: Terminación de muro en lamina de eterboard 8mm. Se le aplica masilla a dicho muro, se totalizaron los m² aproximados de pintura vinilo 104.52m² Esmalte 104.502m², pintura epoxica 84.7m²

→ 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SABADO

Clima: Soleado

Actividad Principal: Estructuración de porteria piso 01. C/A 10 a la par se realiza trabajos electricos para la porteria: 2 Triplets y puntos de vol, se deja estructurado y parte de la instalación de lamina de eterboard, se realiza instalación de 02 switches alarma en rack de piso 06 de juzgados penales (falta organizador).

 Monche

→ 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 DOMINGO

CLIMA: SOLEADO


ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de Laminas en Porteria de Piso 01 CRA 10, se aplica masilla, se realiza aseo pertinente en zona intervenida, se deja porteria totalmente funcional (puntos electricos electrificados y puntos de Jack panchados).

→ 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 LUNES

CLIMA: SOLEADO-HUMEDO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: REMARQUEO DE DILATACIONES, SE INICIA CON LA INSTALACION DE DILATACIONES EN ZONA DE VENTANILLA DE ADMINISTRACION PISO 01.

SE ACATAN SUGERENCIAS POR PARTE DE ARQ CESAR Y ARQ LORENA
• ALCARAR COMIERTA DE PORTERIA HASTA MACETA. DE ACCESO

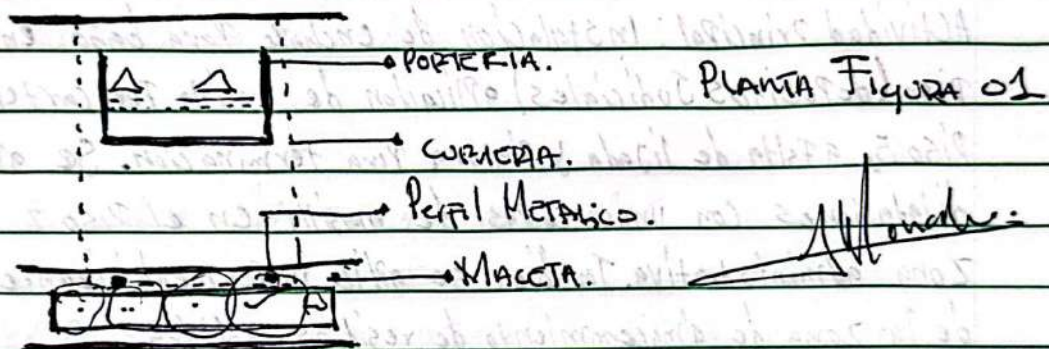

→ 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 MARTES

CLIMA: Soleado

Actividad Principal: Pintura de muros, primeramente se lijaron los muros a intervenir y posterior a eso, se procede a pintar los muros que se tenían pendientes en el Juzgado Segundo municipal del quinto piso. Se continúa con las reparaciones de muros en la zona de almacenamiento de residuos sólidos (Laminas de eternboard).

[Signature]

→ 04 de Diciembre del 2024 Miércoles

Clima: Soleado-nublado

Actividad Principal: Postura de cinta malla para muro de la zona de almacenamiento de residuos sólidos. Reconocimiento y recorrido con el ingeniero Cante por todos los puntos de trabajo.

→ 05 de Diciembre del 2024 Jueves

Clima: Soleado

Actividad Principal: Toma de cantidades con el personal eléctrico para voz y datos. Reparación de Cartera en el quinto piso. Compra de material para enchape de baño en el primer piso.

→ 06 de Diciembre del 2024 Viernes


Clima: Lluvioso-soleado

Actividad Principal: Instalación de enchape para baño en el primer piso (depositos judiciales) aplicación de masilla para Cartera en el piso 5, a falta de lijada y pintura para terminación. Se afinan las dilataciones con unas capas de masilla en el piso 2 en la zona administrativa. También se aplica impermeabilizante en el piso de la zona de almacenamiento de residuos sólidos.

→ 07 de Diciembre del 2024 Sabado

Clima: Soleado

Actividad Principal: Se afinan las paredes en la oficina administrativa donde se realizaron las dilataciones, también se terminaron las reparaciones en el deposito de residuos sólidos, con láminas de eterboard de 6mm, y se le da una mano de masilla para sellar. Se mezcla pintura para dar el tono requerido para los muros que estan pendientes a intervenir.



→ 09 de Diciembre del 2024 Lunes

Clima: Soleado

Actividad Principal: Se recibe material para el trabajo que esta pendiente por realizar en la subestacion. Se da inicio al recorrido con el personal electrico para el calculo de cantidades ejecutadas y las faltantes. Terminacion de muros con pintura en la Camara Gessel del Quinto Piso.

→ 10 de Diciembre del 2024 Martes

Clima: Soleado

Actividad Principal: Se empieza a intervenir los muros del deposito de residuos solidos, dicha actividad se realiza con estuco plastico. Se realiza recorrido para sacar cantidades de obra ya completadas, para desarrollar las memorias de calculo y asi poder ser tenidas en cuenta en el balance.

→ 11 de Diciembre del 2024 Miercoles


Clima: Soleado

Actividad Principal: Se hizo ajustes de las canaletas y troqueles en el centro de servicios del PISO 2. Se le da la segunda mano de estuco plastico a muros de estorbado en el deposito de residuos solidos

→ 12 de Diciembre del 2024 Jueves

Clima: Soleado

Actividad Principal: Se hace limpieza en la zona designada para trabajar todo lo correspondiente a la subestacion, posterior a esto se traslada una parte del material a dicha zona, a espera de que nos otorguen el permiso para iniciar labores.



→ 13 de Diciembre del 2024 Viernes

Clima: Soleado

Actividad Principal: Instalación de puntos de red en el Juzgado 9 del segundo piso, con canalera, tubería cables necesarios, y falta de Panchar e instalar Patchcord. También se abelajo con el armado de la estructura metálica para la losa que se va a suministrar para la subestación.

→ 14 de Diciembre del 2024 Sabado

Clima: Nublado

Actividad Principal: Se realiza perforaciones sobre la losa existente en la subestación, para empezar los anclajes en dicha zona, ya que los anclajes son la base sobre la que se sostendrá toda la estructura.

→ 16 de Diciembre del 2024 Lunes

Clima: Soleado

Actividad Principal: Nivelación de los anclajes y formaleta, posterior a esto se hace la fundición de los pedestales los cuales serán la base de toda la estructura donde irá la losa.

→ 17 de Diciembre del 2024 Martes

Clima: Nublado - Soleado

Actividad Principal: Se realiza la manjura de las dilataciones en el piso del depósito de residuos sólidos y se procede a vaciar el mortero sobre el piso. También se trabaja soldadura sobre las columnas metálicas que son las que sostendrán la estructura sobre la que irá la losa para el tanque de la subestación.



→ 18 de Diciembre del 2024 Miércoles

Clima: Soleado

Actividad Principal: Se realiza soldadura para las columnas que van a sostener la estructura de la losa, posterior a esto se termina todo el armado de la estructura, y se procede a hacer los montajes de las columnas y se deja apornillado a la espera de el montaje del resto de la estructura. Por otro lado se realiza recorrido por los Juzgados faltantes por intervenir lo de voz y datos y se confirma en el Juzgado 5 del segundo piso, entrar a intervenir el día Jueves.

→ 19 de Diciembre del 2024 Jueves

Clima: Nublado

Actividad Principal: Se realiza el desplazamiento de la estructura faltante a la subestación, luego se procede a instalarla, para poder subir el tanque donde va el combustible y así poder montar las vigas donde dicho tanque se va a sostener, luego con la diferencia se empieza a levantar el tanque, seguido de esto se realiza el montaje completo de la estructura con la Puerta de las vigas faltantes donde se va a apoyar el tanque. Se programa a los electricos para realizar lo de voz y datos faltantes, en vista de que el día anterior se hizo visita al Juzgado 5 del Piso 2 y confirmaron que se podía entrar a trabajar el día de hoy. Pero hoy que se iba a realizar el trabajo, nos manifestaron que no se podía y que el día anterior luego de la visita, le manifestaron al ingeniero Cante que no se iba a poder trabajar en dicho Juzgado, pero el ingeniero no nos notificó sobre esto y por ende no se pudo realizar dicha actividad.



→ 20 de Diciembre del 2024 Viernes

Clima: Nublado

Actividad Principal: Se asegura el tanque de ALPM de la subestacion con tornillos sobre la estructura y se pinta toda la estructura con pintura negra. Tambien se termina de hacer la media caña en el deposito de residuos solidos.

— 16 de Enero del 2025 Jueves

Clima: Soleado.

Actividad Principal: Reunion de actividades efectuadas en zonas como terraza, porteria calle 10, estructura de subestacion actividades electricas en los juzgados del piso 02, montas de dilatacion

→ 17 de Enero del 2025 Viernes

Clima: Soleado

Actividad Principal: Rectificacion de medidor de cuenta de porteria de carrera 10, estructuracion de cuenta y traslacio a sitio, se recibe material enviado

→ 18 de Enero del 2025 Sabado


Clima: Soleado

Actividad Principal: Instalacion de cuenta en porteria de calle 10, fijacion de esta y masillado

→ 19 de Enero de 2025 Domingo

Clima: Nublado - soleado

Actividad Principal: Realizacion de Carteras, cuenta y masillado de porteria de calle 10.



→ 20 de Diciembre del 2024 Viernes

Clima: Nublado

Actividad Principal: Se asegura el tanque de ALPM de la subestacion con tornillos sobre la estructura y se pinta toda la estructura con pintura negra. Tambien se termina de hacer la media cana en el deposito de residuos solidos.

— 16 DE ENERO DEL 2025 JUEVES

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Reunion de actividades efectuadas en zonas como terraza, porteria calle 10, estructura de subestacion actividades electricas en los juzgados del piso 02, montas de dilata

→ 17 DE ENERO DEL 2025 VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Rectificacion de medidor de cubierta de porteria de carrera 10, estructuracion de cubierta y traslacio a sitio, se reúne material enviado

→ 18 DE ENERO DEL 2025 SABADO

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalacion de cubierta en porteria de calle 10, fijacion de esta y masillado

→ 19 DE ENERO DE 2025 DOMINGO

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Realizacion de Carteras, cubierta y masillado de porteria de calle 10.

→ 20 DE ENERO DEL 2025 LUNES

CLIMA: SOLEADO


ACTIVIDAD PRINCIPAL: Realización de limpieza de APICA de UNIDAD DE RESIDUOS, SE INICIA A PINTAR con VINILO LAS PAREDES,

[Signature]

→ 21 DE ENERO DEL 2025 MARTES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Aplicación de Pintura en UNIDAD DE RESIDUOS DEL SOTANO 01, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA DE APOYAMA HASTA LA MITAD DE ALTURA DE MURO.



Medios Lineales 20.15 por columna

$20.15 \times 2.60 \text{ altura} = 52.39 \text{ m}^2$ por columna

[Signature]

→ 22 DE ENERO DEL 2025 MIÉRCOLES

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS DE UNIDAD DE RESIDUOS color GRIS, A LA VEZ TAMBIEN SE APLICA PINTURA EN EL PISO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATANTE, A LA PAR SE PASAN MUELES PARA CONTINUAR CON EL OTRO ESPACIO

[Signature]

→ 23 DE ENERO DEL 2025 JUEVES

CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Resanes de ARCHIVO DEL SOTANO DEL PISO 06, SE TRABAJO con los estantes en el sitio YA QUE NO SE OBTUVO RESPUESTA DE MANTENIMIENTO PARA RETIARLOS MOMENTANEAMENTE, SE RECIBE PACK DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR.

[Signature]

→ 24 DE ENERO DEL 2025

VIERNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Preparación de pintura para su posterior aplicación en unidad de residuos, dicha actividad se realiza de manera paulatina ya que libera muchos vapores y el espacio es encerrado y con poca ventilación se da la aplicación desde muros hasta el suelo.

→ 25 DE ENERO DEL 2025

SABADO

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Masillado de porteria en calle 10, instalación de cubierta, masillado y pintura

→ 27 DE ENERO DEL 2025

LUNES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realizan dilataciones en piso 05, se realiza limpieza en sitio intervenciendo

→ 28 DE ENERO DEL 2025

MARTES

CLIMA: SOLEADO - NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza aseo general en sitios intervencidos, zona de dilataciones, se aplico resanes y masilla, se realiza retiro de cierta cantidad de material absorbente (Laminas de Superbonaflex)

Se realiza visita por parte del Arquitecto Ricardo Rojas y a la par se recibe swiche aroma.

Se realizan actividades de instalación de tableros eléctricos en el juzgado de Asistente de Servicios Sociales en piso 02, instalación de cable UTP.

→ 29 DE ENERO DEL 2025 MIERCOLES

CLIMA: Nublado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de troqueles y cable UTP en la oficina de servicios

A la par se realiza lijado y pintura de dilataciones nel piso 05 y zona de espera de administración piso 02



→ 30 DE ENERO DEL 2025 JUEVES

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza instalación de troqueles y cable UTP en el centro de servicios administrativos nel piso 02

Se reúne material como malla electrosoldable, bloques de concreto para la realización de losa en subestación.

A la par se realiza visita por parte del arquitecto contratista Ricardo Rojas

→ 31 DE ENERO DEL 2025 VIERNES

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se continúa con actividades eléctricas nel centro de servicios administrativos, se le suma la actividad de ponchado e instalación de Jack 45° para cable UTP

Se reúne material como arena para darle finalidad a la fundición de la losa de subestación, se realiza toronado de tubería de 3/4 para instalarla con un tanque de combustible y se instala quedando totalmente funcional.

→ 01 DE FEBRERO DEL 2025 SABADO

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza toronado de tubo de 1" de alimentación de tanque de combustible. A la par se realiza lijado y pintura de dilataciones nel zona administrativa.

→ 29 DE ENERO DEL 2025 MIERCOLES

CLIMA: Nublado



ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalación de troqueles y cable UTP en la oficina de servicios.
A la par se realiza liado y pintura de dilataciones nel piso 05 y zona de espera de administración piso 02.

→ 30 DE ENERO DEL 2025 JUEVES

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza instalación de troqueles y cable UTP en el centro de servicios administrativos nel piso 02. Se reúne material como malla electrosoldable, bloques de concreto para la realización de losa en subestación.

A la par se realiza visita por parte del arquitecto contratista Ricardo Rojas.

→ 31 DE ENERO DEL 2025 VIERNES

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se continúa con actividades eléctricas nel centro de servicios administrativos, se le suma la actividad de ponchado e instalación de Jack 45° para cable UTP. Se reúne material como arena para darle finalidad a la fundición de la losa de subestación, se realiza toronado de tubería de 3/4 para instalarla con un tanque de combustible y se instala quedando totalmente funcional.

→ 01 DE FEBRERO DEL 2025 SABADO

CLIMA: Soleado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza toronado de tubo de 1" de alimentación de tanque de combustible. A la par se realiza liado y pintura de dilataciones en zona administrativa.


→ 03 DE ENERO DEL 2025

LUNES

CLIMA: NUBLADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Realización de muros de confinamiento en subestación eléctrica, a la par se realiza actividad eléctrica en zona de rack nel piso 02 del Palacio de Justicia de Cali, se contabilizan cantidades y accesorios de juzgado 05 de Ejecutorias.

Se finalizan actividades en la subestación eléctrica, tubería no llenando, tubería de suministro y muro estructurales quedan totalmente okey, también se deja la zona intervenida en subestación totalmente limpia y respetada para maniobra de llenado de combustible.




→ 04 DE ENERO DEL 2025

MARTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se realiza instalación de troqueles en juzgado 05 de Ejecutorias nel piso 02, se realiza rectificación de puntos de datos y cable UTP, a la par se realiza charlas y actividades de pausas activas por parte del personal de seguridad en el trabajo.

Ericka







→ 05 DE ENERO DEL 2025

MIÉRCOLES

CLIMA: Lluvioso - Nublado

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se continúa con la instalación de troqueles eléctricos en el juzgado 05 de Ejecutorias dejando así solo lo pendiente que sería parchar los cables UTP.

Se realiza recordando de obra, se hace la notificación de que la pintura de piso en la unidad de residuos aún sigue fresca debido a su composición química y a que en


- 06 DE FEBRERO DEL 2025 JUEVES
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalacion de cable UTP y Tuberia SCH 40 1" en el centro administrativo y se neja ponchano

- 07 DE FEBRERO DEL 2025 VIERNES
CLIMA: Lluvioso - Nublado
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Instalacion de canaleta y cable trenzado en centro de servicios especializados, a la par se nejan troqueles normales prescrtiados en canaletas.

- 08 DE FEBRERO DEL 2025 SABADO
CLIMA: Nublado
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se tenia presente atender el centro de servicios especializado pero no dieron permiso administrativamente

- 10 DE FEBRERO DEL 2025 LUNES
CLIMA: Nublado
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se tenia presente continuar con el juzgado o centro de servicios especializado, el personal electrico hizo presencia pero no se pudo labrar en dicho espacio debido a la alta afluencia de funcionarios, esta semana se espera confirmacion de mas para continuar.
Se notifica que se necesita espacio en el PACS del ADO 02 para poder instalar swiche, organizadores y nemas.
Se hace recordando electrico con el arquitecto contratista Ricardo Rojas.
A la par se realiza recello de sumergidos y Acopio de material


→ 11 DE FEBRERO DEL 2025 MARTES

CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recorrido general de obra, con el arquitecto contratista Julio Ricardo Rojas, se notifica de la actividad que se realizó en los juzgados de Ejecuciones, la cual fue de rellenar cajas eléctricas de piso, aproximadamente 8 días de actividad y 6 cajas eléctricas por juzgado.

Se realiza verificación de medidas para acopiar de manera correcta la modulación de la fachada a intervenir.



→ 12 DE FEBRERO DEL 2025 MIÉRCOLES

CLIMA: Lluvioso


ACTIVIDAD PRINCIPAL: Verificación de medidas de módulos de fachada de Carrera 10, se da seguimiento a nuevo material que llega finalizando la tarde, se continúa a la espera que el centro especializando nos den vía libre para continuar con las actividades eléctricas y de datos.



→ 13 DE FEBRERO DEL 2025 JUEVES

CLIMA: Lluvioso


ACTIVIDAD PRINCIPAL: Acopio de material, limpieza de sitio, instalación de malla, se pausa actividad a fuerte aguacero. 1 oficial y 2 ayudantes - 4 horas




→ 14 DE FEBRERO DEL 2025 VIERNES


CLIMA: Lluvioso - Normal

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Desmonte e instalación de módulos de fachada. Se instalan 17.81 m² de malla microperforada para fachada, se pausan actividades 2 horas debido a fuerte lluvia.




→ 15 DE FEBRERO DEL 2025 SABADO
 CLIMA: Lluvioso - Nublado
 Actividad Principal: Instalación de troques eléctricos en juzgado de centro de servicios especializados. Dicha actividad se demora 1 hora en inicial debido a confusión de llaves con Romero nel Palacio de Justicia.
 A la par se realiza mesquite e instalación de módulos de fachada de CRA 10.
 Se hace reporte de que un módulo de la fachada llegó con medidas incorrectas desde la suministradora.



→ 17 DE FEBRERO DEL 2025 LUNES
 CLIMA: Nublado
 Actividad Principal: Instalaciones Eléctricas/Instalación de Fachada.
 Se entregan 48 und de patch cords de 3m a personal de VOZ y Datos nel Palacio de Justicia. 
 Se reporta que un módulo de fachada está con medidas trocadas de altura y de ancho, se realiza aseo general de puntos de trabajo (fachada - Cuarto Eléctrico Piso 02).

→ 18 DE FEBRERO DEL 2025 MARTES
 CLIMA: Nublado - Soleado
 Actividad Principal: Pintura de Angulo de Fachada, Instalación de tubulados de fachada. Se pausa actividad 1 hora debido a la cantidad de gente en la zona.
 Se realiza Reunión de Punto de Juzgado 02 de Ejecutivos nel Piso 02 ya que no había Link, se corrige de manera correcta, se solicita a Administración el plano eléctrico para guiarse y poder realizar las marquillas de forma correcta.




→ 19 DE FEBRERO DEL 2025

MIÉRCOLES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL: RECTIFICACION Y MARQUADO DE PUNTO DE RED EN JULYADO 04 DEL MISO 02 DEL PALACIO DE JUSTICIA, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE ENTREGUEN EL MODULO DE FACHADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.


SE REALIZA ENTREGA DE 22 PATCHCORD A Ing. Cante




- 20 DE FEBRERO DEL 2025

CLIMA: NUBADO

SE LE ENTREGAN AL ING. Cante 6 PATCHCORD de 3MT., SE SIGUE A LA ESPERA DEL MODULO FALTANTE PARA INSTALAR EN FACHADA.






- 21 DE FEBRERO DEL 2025

CLIMA: NUBADO

SE PROCEDE A REALIZAR LA INSTALACION DEL PAPEL FALTANTE EN LA FACHADA QUEDANDO ASI CUMPLIDO AL 100% TODAS LAS ACTIVIDADES DE ES FRENTE DE TRABAJO PALACIO DE JUSTICIA DE CACI PEDRO ELIAS GERRERO ABADIA.



Dir. obra.
