

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	989-2021	Contratista:	CONSORCIO VIAL MHC 063
Contrato de Interventoría No.	971-2021	Interventoría:	CONSORCIO ICEACSA TPF

Objeto Contrato de Obra:
 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INFORME MENSUAL No.	45	MES O PERIODO:	feb-25
----------------------------	----	-----------------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		10
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		22
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		25
3.1	Información general del contrato		25
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		28
3.3	Seguimiento ítems no previstos		36
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		43
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		47
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	47
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	47
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	47
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	47
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	47
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	48
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	48
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	48
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		48
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	48
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	48
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	48
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	48
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	48
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	48
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		52
5.3	Informes especialistas y profesionales		80
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		84
5.5	Informe matriz de riesgos.		84
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		85
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		85
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		86
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	86
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	86
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	86
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	86
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	86
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		87
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	87
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	87
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	87
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	87
7	Conclusiones y recomendaciones		88
8	Anexos		92
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		92
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		127
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		131
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		133

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: Gustavo Cepeda
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 1051 de fecha 24/03/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 5/03/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PERIODO MES: feb-25

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 465.288.090.475,00

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA, GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 58.580.051.078,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 523.868.141.553,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030

ANTICIPO CONCEDIDO: \$

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 2021

PLAZO ACUMULADO: 114

ANTICIPO AMORTIZADO: \$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALEONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PRIORIZADA**
Pavimentación	Construcción	km	27
	Mejoramiento y rehabilitación	km	36,8
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento*	Parqueo	km	344
	Bacheo	km	
Estudios y diseños	km	33,58	33,58

* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades en el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A partir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre Chiquinquirá y Curti, debido a que dichos contratos finalizan.

**El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6,58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	km	0,06
	Mejoramiento y rehabilitación	km	-
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parqueo	km	2,16
	Bacheo	km	-
Estudios y diseños	km		6,58

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 414.144.754.010,00	\$ 1.210.576.973,00	\$ 415.355.330.983,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 27.957.104.337,00	\$ 81.720.767,00	\$ 28.038.825.104,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 75.778.877.774,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.000,00		\$ 350.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 523.868.141.553,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.831.461.946,00	\$ 5.353.504,00	\$ 1.836.815.450,00	\$ 160.169.908.723,00
AJUSTES	\$ 242.555.962,00	\$ 709.010,00	\$ 243.264.972,00	\$ 35.783.299.926,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -	\$ -	\$ 3.030.108.611,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			\$ -	\$ 171.645.389,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 89.726.665,00	\$ 415.806,00	\$ 90.142.471,00	\$ 1.760.959.069,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 306.979.902,00	\$ 3.523.871,00	\$ 310.503.773,00	\$ 4.782.380.319,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)		\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ -	\$ 2.880.773,00
VALOR EJECUTADO		\$ 10.002.191,00	\$ 2.480.726.666,00	\$ 205.701.182.810,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 157.600.807.636
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 159.703.084.323
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	101,33%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	145
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	110
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	176

REGISTRO FOTOGRÁFICO



viernes, 28 de febrero de 2025 10:57 a. m.
CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERIA



Parcheo sector: Susa Pr: 28+757@805instalacion liga MDC 19 CD
10/02/2025 05:20:01 p. m.

K 44+200 - K 44+300 Extensión y compactación de mezcla asfáltica MSC-25 (capa intermedia) Tramo 2 Casablanca - Ubaté ruta 45A04

PR 28+757 Mantenimiento vial mediante parcheo. Sector de Susa. Ruta 45A05

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 1 de 133

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 045



INTERVENTOR:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Contrato de INTERVENTORIA No 971 de 2021

CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAL MHC 063
Contrato de Obra No. 989 de 2021

PERIODO:
01-02-2025 A 28-02-2025
VERSION 0

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C Telefax: 6014489346
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com


 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 2 de 133



CONTRATO INVIAS No. 971 DE 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 045

ELABORÓ: Ing. Martha L. Cortes FECHA: 13 de marzo de 2025	REVISÓ: Ing. María Soledad Sánchez FECHA: 14 de marzo de 2025	APROBÓ Ing. Luis Antonio Rueda FECHA: 14 de marzo de 2025
		
CARGO: Ingeniero Residente de Interventoría	CARGO: Líder de Integración	CARGO: Director Interventoría

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 3 de 133

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	10
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	11
2.1 Localización del Proyecto	11
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	13
2.3 Inventario y estado inicial de la vía	15
2.4 Características técnicas del proyecto	22
2.4.1 <i>Parámetros geométricos y de diseño</i>	22
2.4.2 <i>Sección típica de la vía</i>	22
2.4.3 <i>Estructura del pavimento</i>	23
2.4.4 <i>Tipificación de los diferentes sectores</i>	24
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	25
3.1 Información general del contrato	25
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	28
3.3 Seguimiento ítems no previstos	36
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría	43
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL	47
4.1 Informe semanal	47
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra	47
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra	47
4.4 Información financiero y presupuestal contrato de obra	47
4.5 Estado general del tiempo	47
4.6 Resumen ensayos de laboratorio	48
4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra	48
4.8 Seguimiento PC contrato de obra	48
4.9 Otros documentos seguimiento mensual	48

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 4 de 133

5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	50
5.1	Información general del contrato	50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría	52
5.2.1	Actividades área social	52
5.2.2	Actividades área ambiental	64
5.2.3	Actividades área predial	66
5.2.4	Actividades área SST	79
5.3	Informes de especialistas	80
5.4	Informe del programa anual de caja - PAC	84
5.5	Informe matriz de riesgos	84
5.6	Información otros programas y aplicativos	85
6.	REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	86
6.1	Equipo y vehículos contrato de Interventoría	86
6.2	Personal, control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría	86
6.3	Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría	86
6.4	Seguimiento garantías contrato de Interventoría	86
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	86
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	87
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	88
8.	ANEXOS	92
8.1	Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor	91
8.2	Registro fotográfico de actividades	127
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad	131
8.4	Bitácora	133

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 5 de 133

LISTADO DE TABLAS

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia	13
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes	16
Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño	22
Tabla No 4. Información general contrato de obra	25
Tabla No 5. Actividades ejecutadas	34
Tabla No 6. Seguimiento ítems no previstos	36
Tabla No 7. Seguimiento recursos contrato 989-2021	44
Tabla No 8. Financiero de Interventoría	46
Tabla No 9. Informes semanales de Interventoría	47
Tabla No 10. Actas de comité del área técnica	49
Tabla No 11. Actas de comité	49
Tabla No 12. Información general contrato Interventoría	50
Tabla No 13. Resumen insumos prediales	69
Tabla No 14. Niveles de cumplimiento de la gestión predial	70
Tabla No 15. Estado gestión predial tramo 1. Variante Zipaquirá	70

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 6 de 133

Tabla No 16. Estado gestión predial tramo 2 Peaje Casablanca Ubaté	73
Tabla No 17. Cuadro bolsa predial	78
Tabla No 18. Reporte de ATEL	80
Tabla No 19. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría	80
Tabla No 20. Correspondencia enviada Interventoría	92
Tabla No 21. Correspondencia recibida Interventoría	107
Tabla No 22. Registro fotográfico actividades	1127
Tabla No 23. Registro fotográfico actividades socioambientales	131

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 7 de 133

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No 1. Informes semanales

Anexo No 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra

Anexo No 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra

Anexo No 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero

Anexo No 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo

Anexo No 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen ensayos de laboratorio

Anexo No. 7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimientos garantías obra

Anexo No 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-17 Seguimientos PC obra

Anexo No.9. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimientos programa de Inversión

Anexo No 10. Actas de comité de obra y actas de reunión

Anexo No 11. Informes de especialistas

Anexo No. 12. Matriz de riesgos

Anexo No. 13. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos de Interventoría

Anexo No. 14. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal y parafiscales

Anexo No. 15. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal de Interventoría

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 8 de 133

Anexo No. 16. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías de Interventoría

Anexo No. 17. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento PC Interventoría

Anexo No. 18. Plan de Cargas

Anexo No. 19. Bitácora

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 9 de 133

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor	11
Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción	12
Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista Consorcio Vial MHC 063	13
Ilustración No 4. Sección típica de la vía	23
Ilustración No 5. Estructura del pavimento	23
Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores	24
Ilustración No 7. Programa de obra	45
Ilustración No 8. Plataforma CIFRA	85

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 10 de 133

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 45 de Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 28 de febrero de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene por objeto realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063.

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se encuentran los informes ejecutivos de los especialistas.

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente quien designo al Ing. Jaime Nilton Ramirez Gutierrez como Apoyo a la supervisión a través del comunicado 2025S-VBOG-005828.

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Martin Rodriguez como profesional de apoyo a la supervisión social y Francis Ramirez Monje como profesional de apoyo a la supervisión predial.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 11 de 133


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquirá) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá (PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional (PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional (PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081).

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor

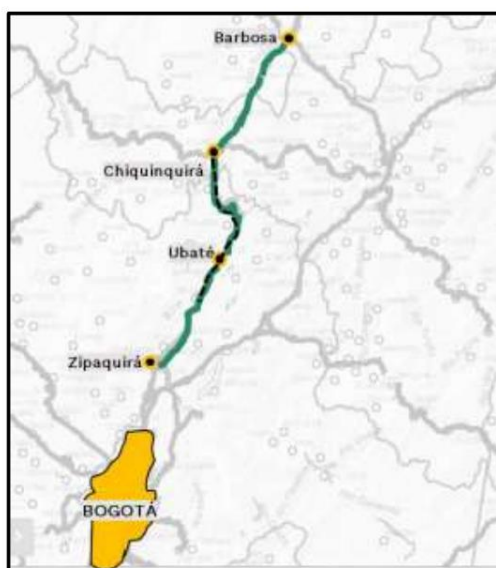


 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 12 de 133

Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción



 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 13 de 133

Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063

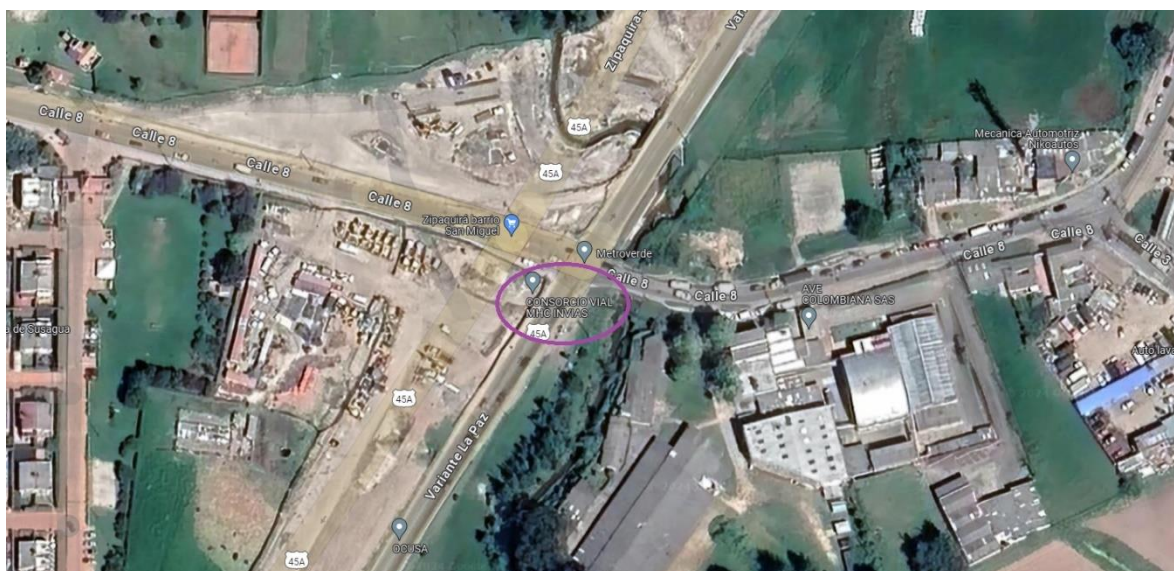

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia

Departamentos	Municipios	Vereda
Cundinamarca	Zipaquirá	Pasoancho
		Portachuelo
		Barandillas
		La Granja
	Cogua	Rincón Santo
		Mortiño
		Casablanca
	Nemocón	Oratorio

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C Telefax: 6014489346
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 14 de 133

Departamentos	Municipios	Vereda
	Tausa	Patio Bonito
		Pajarito
		Rasgata Alto
	Sutatausa	Pueblo Viejo
		Concubita
		Naval
		Novoa
		Ojo de agua
	Ubaté	Chipaquín
		Tausavita
		Centro del Llano
		Palogordo
		Soagá
	Fúquene	Guatancuy
		Nemoga
		Taravita
	Susa	Chinzque
		Punta de Cruz
		Llano Grande
		Cascadas
Boyacá	Simijaca	Timinguita
		La Glorieta
		Táquira
		Centro
		San Rafael
		Santuario
		El Fical
	Chiquinquirá	Sucre Occidental
		Sucre Oriental
		Tierra de Páez

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios para los Municipios los cuales se enlistan a continuación:

- Satisfacer las necesidades viales de la comunidad.
- Disminuir de accidentes de tránsito.
- Reactivación económica en las zonas de influencia.
- Inclusión de género en la contratación de personal.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 15 de 133

- Vinculación madres cabeza de familia.
- Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años.
- Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS.
- Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y por ende su infraestructura.
- Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de sensibilización.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación de retornos y de intersecciones.

De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0000 y el PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) y mezcla asfáltica MSC-25. Paralelamente se construyen las obras de drenaje correspondientes a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 16 de 133

Las actividades que se adelantan se evidencian en el siguiente registro fotográfico.

Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes

ruta 45 a CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ	
	
K6+340 – K6+470 fundida de cuneta por calzada existente (12/02/25)	K6+295 – K6+340 fundida de cuneta por calzada existente (12/02/25)
	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 17 de 133

Obra No 19, fundida de solado para muro de cierre pórtico de salida de arco metálico (21/02/25)



Obra No 19, fundida de placa inferior de módulo 2 de canal de acceso (24/02/25)



Obra No 19, fundida de 4ta sección de muros de módulo 2 de canal de acceso (24/02/25)



Puente peatonal, izaje de pasarela entre pilas 3 y 4 (05/02/25)



Puente peatonal, instalación de placas alveolares en rampa 2 (28/02/25)

Puente peatonal, fundida de placa curva de rampa 1 (25/02/25)

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 18 de 133

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA	
 viernes, febrero 28, 2025 08:34a. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA #tramo #2	 jueves, febrero 27, 2025 09:17a. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA #tramo #2
K44+170 – K44+188, instalación 4ta capa de terraplén (28/02/25)	K44+180, Obra No 31, armado de acero 2da sección de muros de caja de inspección (27/02/25)
 viernes, febrero 28, 2025 10:48a. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA #tramo #2	 viernes, febrero 28, 2025 01:22p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA #tramo #2

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 19 de 133

K44+242 – K44+298, instalación de MSC-25 carril izquierdo (28/02/25)	K44+365 – K44+390, excavación para tramo de vía (28/02/25)
DEMARCACIÓN HORIZONTAL	
	
Ruta 45 A 04, PR28+0270 – PR29+0120 línea blanca de borde ambos costados (10/02/25)	Ruta 45 A 05, PR69+0452 demarcación de resalto (19/02/25)
	

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 20 de 133

Ruta 45 A 06, Suaita - Oiba, PR56+0000 – PR60+0000 doble línea amarilla de eje (28/02/25)	Ruta 45 A 07, Curití, PR5+0800 – PR11+0320 doble línea amarilla de eje (26/02/25)
A	
JORNADAS TAPAHUECOS	
RUTA 45 A 04 ZIPAQUIRÁ – UBATÉ	
 miércoles, 19 de febrero de 2025 CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA	 miércoles, 19 de febrero de 2025 1:46 p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
Ruta 45 A 04, PR53+0350, Tausa, tapa huecos con MDC-19 (19/02/25)	Ruta 45 A 04, PR53+0530, Tausa, tapa huecos con MDC-19 (19/02/25)
RUTA 45 A 05, UBATÉ - CHIQUINQUIRÁ	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 21 de 133



Ruta 45 A 05, PR3+0450, Ubaté, tapa huecos con MDC-19 (12/02/25)



Ruta 45 A 05, PR3+0450, Ubaté, tapa huecos con MDC-19 (12/02/25)

JORNADAS DE PARCHEO

ruta 45 a 05, Ubaté - Chiquinquirá



PR29+0757 – PR29+0826, Susa, fresado e instalación de MDC-19 (24/02/25)



PR28+0521 – PR28+0545, Susa, fresado e instalación de MDC-19 (25/02/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 22 de 133

2.4 Características técnicas del proyecto

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño

PARÁMETROS DE DISEÑO			
REQUISITO TÉCNICO	Sector 2 K00+700–K02+300	Sector 3 K02+300–K3+300	Sector 4 K03+300–K6+700
Funcionalidad	Primaria	Primaria	Primaria
Intervención	Construcción	Construcción	Construcción
Longitud Aproximada	1.60 Km	1.00 Km	3.40 Km
Número de Calzada (Un)	1	1	1
Velocidad Específica	90–100 Km/h	90–100 Km/h	90–100 Km/h
Velocidad de Diseño	80 Km/h	80 Km/h	80 Km/h
Peralte Máximo	8%	8%	8%
Radio Mínimo	304m–394m	304m–394m	304m–394m
Pendiente Mínima	0.3%	0.3%	0.3%
Pendiente Máxima	5%,6%	5%,6%	5%,6%
Ancho de Carril Mínimo	3.65m	3.65m	3.65m
Ancho de Calzada Mínimo	7.30m	7.30m	7.30m
Ancho de Berma Mínimo	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m
Tipo de Berma	Externa/Interna	Externa/Interna	Externa/Interna
Ancho Separador Central aprox.	7.80m	9.10m	7.80m
Sentido de Carriles (Unidireccional o Bidireccional)	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional
Tipo de Terrono	Plano	Plano	Plano

2.4.2 Sección típica de la vía

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 23 de 133


Ilustración No 4. Sección típica de la vía



2.4.3 Estructura del pavimento

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm

Ilustración No 5. Estructura del pavimento

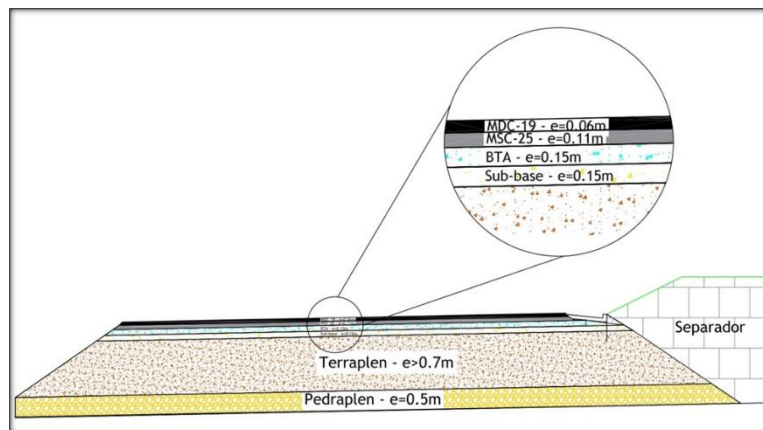


	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 24 de 133

2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores

En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollan las actividades en 6 frentes de trabajo

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal informativa elevada),
- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera Tablegres)
- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 Grados), como se muestra en el siguiente esquema.

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores

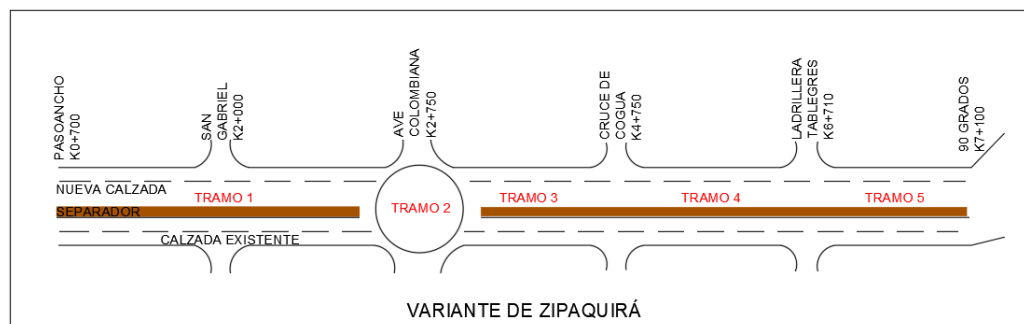

En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo:

- Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 25 de 133

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

Tabla No 4. Información general contrato de obra

CONTRATO No.	0989 de 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT	901.475.859-6
ID SECOP	CO1.PCCNTR.2410803
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MARIO ALBERTO HUERTAS COTE 50% - MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO HUERTAS COTE
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA
ADICION No 1	\$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICION No 2	\$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a la vigencia 2022

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 26 de 133

MODIFICACIÓN No 2	Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.200.000.000), IVA INCLUIDO
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, la cual para todos los efectos legales quedara así: "(...) CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$325.296.612.887,00) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$133.464.020.484,00) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (\$1.344.500.313,00) MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$501.600.000,00) MONEDA CORRIENTE, g)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 27 de 133

	Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.698.521.780,00) MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$892.719.138,00) MONEDA CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (\$53.827.286.178,00) MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$2.880.773.00) MONEDA
MODIFICACION No 4	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE. de la vigencia 2024 a la vigencia del 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 28 de 133

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de febrero de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se relacionan así:

- Actividades Técnicas

Mantenimiento de pavimentos

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de recursos.

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado con el acompañamiento de funcionario de las alcaldías, veedores de la zona, contratista, Interventoría, secretario de planeación, en el cual se definen los sectores que presenten un alto deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la información en campo, para determinar una proyección de las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento en los tramos a intervenir, para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.

Para el mes de febrero de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica mediante bacheo, para el corredor de la ruta Los Comuneros, se cuenta con 2 frentes de obra, uno localizado en la Ruta 45 A 05, con el mantenimiento de la carpeta asfáltica entre el PR27+0900 y el PR29+0969; el segundo frente desarrolla actividades de tapahuecos en la Ruta 45 A 04, abarcando entre el PR53+0350 y el PR55+0450 y en la Ruta 45 A 05, abarcando entre el PR3+0450 y el PR3+0700. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar la movilidad de los usuarios del corredor

Los sectores intervenidos en el mes de febrero de 2025 se relacionan a continuación:

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 29 de 133

Mantenimiento mediante tapa huecos

Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- PR53+0350 – PR55+0450: Tausa, se realiza tapa huecos con MDC-19.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- PR3+0450 – PR3+0700: Ubaté, se realiza tapa huecos con MDC-19.

Mantenimiento mediante Parcheo

Ruta 45 A 05, Ubaté - Chiquinquirá

- PR27+0900 – PR28+0253: Susa, se realiza fresado e instalación de MDC-19.
- PR28+0308 – PR29+0184: Susa, se realiza fresado e instalación de MDC-19.
- PR29+0202 – PR29+0969: Susa, se realiza fresado e instalación de MDC-19.

Mantenimiento, Demarcación horizontal

Ruta 45 A 04, Zipaquirá - Ubaté

- PR28+0270 – PR32+0930: Zipaquirá, carrera 36, demarcación de línea blanca de borde ambos costados.
- PR44+0095 – PR44+0450: La Ruidosa, demarcación de línea amarilla de eje.
- PR62+0000 – PR66+0000: Ubaté, demarcación línea amarilla de eje y línea blanca de borde ambos costados.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- PR0+0990 – PR3+0316: Ubaté, demarcación de línea amarilla de eje.
- PR58+0640 – PR58+0850: Saboyá, demarcación de 2 pictogramas de zona escolar, 2 textos de zona escolar y 1 cruce peatonal.
- PR62+0190 y PR62+0409: Saboyá, demarcación de resaltos.
- PR67+0000 – PR69+0000: Saboyá, demarcación de líneas blancas de borde ambos costados.
- PR69+0452 y PR69+0750: Garavito, demarcación de resaltos.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 30 de 133

- PR69+0610 – PR69+0765: Garavito, demarcación de 2 textos de zona escolar, 1 resalto y 1 cruce peatonal.
- PR71+0000 – PR73+0500: Puente Nacional, demarcación de línea amarilla de eje.
- PR78+0000 – PR81+0864: Puente Nacional, demarcación de línea blanca de borde ambos costados.
- PR84+0000 – PR88+0000: Puente Nacional, demarcación de línea blanca de borde ambos costados.

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- PR76+0185 – PR80+0000: Oiba, demarcación de línea blanca de borde ambos costados.
- PR80+0000 – PR83+0500: Oiba, demarcación de doble línea amarilla de eje y de línea blanca de borde derecho.

Ruta 45 A 07, San Gil – Piedecuesta

- PR2+0500 – PR5+0800: San Gil, demarcación de doble línea amarilla de eje y línea blanca de borde ambos costados.
- PR5+0800 – PR11+0320: Curití, demarcación de doble línea amarilla de eje.
- PR7+0500 – PR11+0320: Curití, demarcación de línea blanca de borde ambos costados.

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda calzada de la variante realizando las siguientes actividades:

- K6+628 – K6+295: fundida de cuneta por calzada existente.
- Desvío provisional Glorieta Ave Colombiana, los desvíos Bogotá – Ubaté, Bogotá – Nemocón, Bogotá – Zipaquirá, Nemocón – Zipaquirá, Nemocón – Ubaté y Zipaquirá – Ubaté están en buenas condiciones y se encuentra circulando el tráfico vehicular sin contratiempos. Se encuentran operativos los semáforos y demarcación

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 31 de 133

horizontal de acuerdo al PMT provisional implementado para la puesta en funcionamiento de la nueva calzada; instalación de bordillo para ciclorruta.

- Glorieta Ave Colombiana: Se realiza instalación de mezcla entre subbase granular y fresado en sector de espacio público.
- Glorieta Ave Colombiana: traslado de semáforo de sector occidental de calle 8 para liberar espacio de construcción de isleta; corte de asfalto para bordillo de isleta.
- K 2+750 Puente Peatonal: En rampa 1 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales A, B, C, D, E, F, G y H, fundidos los muros de acceso y rampa, montada la estructura metálica de rampa.

En pila 1 y pila 2 se encuentran fundidos el pilote, dado y pedestal I y J, respectivamente.

En pila 3 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales K, L, M y N, y se encuentra montada la estructura de soporte de la pasarela.

En pila 4 se encuentra fundido el pilote, dado y pedestal O y se encuentra montada la estructura de soporte de la pasarela.

Se encuentra montada la estructura metálica de pasarela entre pilas 1 y 2.

En rampa 2 Se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales P, Q, R, S, T, U, V y W, se encuentra montada parte de la estructura metálica de la rampa.

En el presente periodo se realiza montaje de pasarela entre pilas 3 y 4; continúa instalación de placas alveolares en rampa 1, pasarela y rampa 2; se realiza armado de acero, encofrado y fundida de 1 placa curva de rampa 1; termina montaje de estructura de rampa 2.

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la glorieta de Ave Colombiana así:

- K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): Al costado occidental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 36 al No. 74 con sus pruebas de integridad; se encuentra fundida la viga cabezal norte y sur; armados los anillos 1 a 35 de arco metálico; se encuentran contruidos cuatro niveles de gaviones al costado norte y sur de encole de arco metálico; se encuentra fundida la

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 32 de 133

viga de empuje costado norte y sur de arco metálico; se encuentra fundido el box de transición.

Al costado oriental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 1 al No. 35; fundida la viga cabezal oriental y occidental; armados los anillos No. 36 a 59 de arco metálico; fundida la viga de empuje oriental y occidental; fundidos los muros de transición oriental y occidental; fundida de placa superior de pórtico; fundida la ménsula y placa superior de box existente; fundida la placa inferior y muro sur de box de transición; fundida la placa triangular de cierre entre box de transición y pórtico; fundida la caja No. 8; fundido el pozo PZ24; fundida la columna occidental de pórtico de salida de arco metálico.

En el presente periodo se realiza excavación, instalación de rajón y fundida de concreto ciclópeo para muro lateral de salida de arco metálico, armado de acero y fundida de columna oriental de pórtico de salida de arco metálico; excavación, fundida de solado, armado de acero, encofrado y fundida de zarpa y vástago de muro de contención; excavación, fundida de solado, armado de acero, encofrado y fundida de placa inferior y 4 secciones de muros de módulo 1 de canal de acceso; excavación, instalación de rajón, fundida de solado, armado de acero, encofrado y fundida de placa inferior y 2 secciones de muros de módulo 2 de canal de acceso; excavación, instalación de rajón, fundida de solado y armado de acero de módulo 3 de canal de acceso; excavación, instalación de rajón y fundida de solado para módulo 4 de canal de acceso; excavación para construcción de caja de válvula tubería de agua potable Barandillas, en conjunto con EPZ.

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté

Durante el presente mes continúan las actividades para la construcción de la segunda calzada desarrollándose las siguientes:

- K44+200: continúa adecuación de campamento de obra.
- K44+130 – K44+160: se realiza excavación e instalación de rajón, geotextil y 1 capa de terraplén.
- K44+160 – K44+170: se realiza excavación e instalación de rajón, geotextil y 2 capas de terraplén.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 33 de 133

- K44+170 – K44+188: se realiza excavación instalación de rajón, sello, geotextil y 4 capas de terraplén.
- K44+200 – K44+220: se realiza instalación de subbase granular y BTA.
- K44+220 – K44+300: se realiza instalación de subbase granular, BTA y MSC-25 por carril derecho.
- K44+242 – K44+298: se realiza instalación de subbase granular, BTA y MSC-25 por carril izquierdo.
- K44+365 – K44+390: se realiza trasvase del jagüey y excavación para tramo de vía.

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación de obras hidráulicas así:

- K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): se realiza excavación e instalación de rajón, solado y tubería de 900mm. Se avanza en la construcción de la caja de inspección en el separador realizando armado de acero y fundida de placa inferior y 1er sección de muros, h=2m.

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca y el Canigo (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del proyecto.

Estudios y diseños

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 190 de estudios y diseños radicado el 26 de febrero de 2025 se establece:

El Contratista radica el oficio D-000005318, dando respuesta al oficio C971-3836-2024, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por la interventoría del informe y anexos del componente de geotecnia – estabilidad de taludes del tramo Casablanca – Ubaté.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 34 de 133

El Contratista radica el oficio D-000005323, dando respuesta al oficio C971-3990-2025, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría de los estudios geotécnicos del muro de contención proyectado entre el K41+716 y el K41+747.

El Contratista radica el oficio D-000005327, dando respuesta al oficio C971-4006-2025, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría del estudio geotécnico de la versión C del Pontón proyectado entre el K41+848 y el K41+873.

El Contratista radica el oficio D-000005336, por el cual se hace entrega de los planos y memoria de cálculo de iluminación del sector de Ave Colombiana en versión E, para su revisión y aprobación

Tabla No 5. Actividades ejecutadas

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Acta modificación No 18 02/12/2024)	VALOR EJECUTADO MES			ACUMULADO	SALDO
			BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRAS	\$ 356,775,279,905	\$ 326,247,479,910	1,831,461,196.00	\$ 5,353,502.00	\$ 1,836,814,698.00	\$ 160,169,907,972.00	\$ 166,077,571,938.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 28,038,825,104	\$ 133,854,146,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,783,299,926.00	\$ 98,070,846,156.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E	\$ 1,203,507,692	\$ 1,203,507,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,203,507,692.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA	\$ 3,141,600,000	\$ 3,141,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,030,108,611.00	\$ 111,491,389.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 35 de 133

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	\$ -	\$ 5,591,240,918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,591,240,918.00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA licencia ambiental e IVA 19%)	\$ 75,778,877,774	\$ 53,827,286,178	\$ 396,706,567.00	\$ 3,939,677.00	\$ 400,646,244.00	\$ 6,714,984,777.00	\$ 47,112,301,401.00
GESTIÓN AMBIENTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,645,389.00	
GESTIÓN SOCIAL			\$ 89,726,665.00	\$ 415,806.00	\$ 90,142,471.00	\$ 1,760,959,069.00	
GESTIÓN PREDIAL			\$ 306,979,902.00	\$ 3,523,871.00	\$ 310,503,773.00	\$ 4,782,380,319.00	
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 350,000,000	\$ 2,880,773	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,773.00	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ 465,288,090,475	\$ 523,868,141,553	\$ 2,228,167,763.00	\$ 9,293,179.00	\$ 2,237,460,942.00	\$ 205,701,182,059.00	\$ 318,166,959,494.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 36 de 133

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Tabla No 6. Seguimiento Ítems no previsto

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
220.1P	1	Material terraplén para	M3	686,054	\$ 42,374.00	\$ 29,070,852,196.00	No 1 de 17/11/2021	306,947.00
221.1	1	Pedraplén compacto	M3	183,042	\$ 19,910.00	\$ 3,644,366,220.00	No 1 de 17/11/2021	94,286.00
221.1P	1	Material terraplén para	M3	237,728	\$ 81,868.00	\$ 19,462,315,904.00	No 1 de 17/11/2021	122,345.30
600.1.2.2.4	5	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	9,960	\$ 45,232.00	\$ 450,510,720.00	No 1 de 17/11/2021	7,054.30
661.1P	5	Box Culvert prefabricado 1m * 1M (Suministro e instalación)	ML	1,263	\$ 1,610,012.00	\$ 2,033,445,156.00	No 1 de 17/11/2021	1,055.75
7P	5	Bandas alertadoras ancho 0,25 m, espesor 0,02 m, (incluye suministro e instalación).	ML	2,513	\$ 138,738.00	\$ 348,648,594.00	No 1 de 17/11/2021	1,704.05
8P	5	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	UND	3,121	\$ 77,167.00	\$ 240,838,207.00	No 1 de 17/11/2021	2,382.00
9P	5	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	UND	794	\$ 77,971.00	\$ 61,908,974.00	No 1 de 17/11/2021	389.00
710.1P	4	Señal vertical SI-27. Tablero variable según leyenda proyectada. (Incluye Suministro e instalación)	UND	150	\$ 1,324,653.00	\$ 198,697,950.00	No 1 de 17/11/2021	12.00
231.1	7	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	M2	612,538	\$ 10,590.00	\$ 6,486,777,420.00	No 2 de 06/12/2021	274,530.00
642.5P	5	Cinta PVC para junta de construcción en estructuras de concreto	ML	2,366	\$ 56,631.00	\$ 133,988,946.00	No 15 de 05/07/2024	2,320.00
450.13P		BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 BTA - BG38	M3	55,087	\$ 674,379.00	\$ 37,149,515,973.00	No 15 de 05/07/2024	24,829.30
642.4P		JUNTA DE DILATACION, CON SELLO PVC O-22 O EQUIVALENTE, DE	ML	791	\$ 135,126.00	\$ 106,884,666.00	No 15 de 05/07/2024	675.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 37 de 133

		ANCHO 2CM, CON SELLANTE DE MASILLA POLIURETANO Y PLACA DE POLIESTER EXPANDIDO DE e=20mm ESPESOR.						
630.7		CONCRETO CLASE 14 MPA - CICLOPEO	M3	1,482	\$ 376,988.00	\$ 558,696,216.00	No 15 de 05/07/2024	694.40
450.4P		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC 25	M3	31,920	\$ 730,766.00	\$ 23,326,050,720.00	No 3 de 28/02/2022	13,358.20
220.2P		GEOBLOQUE DENSIDAD 30Kg/m3	M3	4,152	\$ 1,032,638.00	\$ 4,287,512,976.00	No 3 de 28/02/2022	3,362.00
11P		DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SEÑALES EXISTENTES SP, SR Y SI	UNIDA D	154	\$ 58,894.00	\$ 9,069,676.00	No 3 de 28/02/2022	14.00
12P	5	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIQUAIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	GL	1	\$ 252,989,756.00	\$ 252,989,756.00	No 4 de 08/07/2022	0.93

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 38 de 133

13P	5	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGA PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	GL	1	\$ 8,511,981.00	\$ 8,511,981.00	No 4 de 08/07/2022	1.00
14P	5	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTINO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	GL	1	\$ 978,684,911.00	\$ 978,684,911.00	No 4 de 08/07/2022	0.80
320.1.1P	2 - 11602	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIQUAIRÁ)	M3	12,906	\$ 108,109.00	\$ 1,395,254,754.00	No. 5 29/08/2022	11,769.00
671.1P	5-11604	CUNETAS DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3,080.9	\$ 650,786.00	\$ 2,005,006,587.40	No 6 7/12/2022	1,784.60
15P	5-11304	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN	186	\$ 22,264,277.00	\$ 4,141,155,522.00	No 15 de 05/07/2024	186.00
17P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0	\$ 4,158,327.00	\$ -	No 6 7/12/2022	0.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 39 de 133

18P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 3,326,662.00	\$ 286,092,932.00	No 15 de 05/07/2024	86.00
19P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 2,970,234.00	\$ 255,440,124.00	No 15 de 05/07/2024	84.00
812.1P	4-11606	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	8,408	\$ 269,425.00	\$ 2,265,325,400.00	No 6 7/12/2022	8,407.00
623.1P	4-11606	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	5,619	\$ 270,418.00	\$ 1,519,478,742.00	No 6 7/12/2022	5,619.00
811.1P	7-11606	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2	6,203	\$ 50,253.00	\$ 311,719,359.00	No 6 7/12/2022	2,507.00
200.2P	1-11601	DESABOMBE DE TALUDES	M2	8,131	\$ 21,359.00	\$ 173,670,029.00	No 6 7/12/2022	7,772.00
662.2P	4-11604	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	149,306	\$ 3,240.00	\$ 483,751,440.00	No 6 7/12/2022	127,764.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 40 de 133

662.1P	4-11604	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIÁMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	149,306	\$ 19,896.00	\$ 2,970,592,176.00	No 6 7/12/2022	127,764.00
673.3P	7-11604	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M	3,300	\$ 51,662.00	\$ 170,484,600.00	No 15 de 05/07/2024	2,201.00
621.1.3P	5-11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	54	\$ 3,197,047.00	\$ 172,640,538.00	No 13 17/08/2023	54.00
91D.1	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100m) Y MIL METROS (1000m) DE DISTANCIA	M3-E	177,966	\$ 1,100.00	\$ 195,762,600.00	No 13 17/08/2023	8,976.00
663.4P	5-11604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	766	\$ 275,983.00	\$ 211,402,978.00	No 13 17/08/2023	279.50
211.1	1-11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	34,489	\$ 16,718.00	\$ 576,587,102.00	No 13 17/08/2023	882.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 41 de 133

900.3.3	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	M3/KM	338,880	\$ 1,175.00	\$ 398,184,000.00	No 13 17/08/2023	2,068.00
22P	4-11304	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	7	\$ 4,158,327.00	\$ 29,108,289.00	No 15 de 05/07/2024	0.00
23P	5-12202	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	19	\$ 3,318,594.00	\$ 63,717,004.80	No 16 de 23/08/2024	19.20
24P	5-12202	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	23	\$ 1,805,618.00	\$ 41,529,214.00	No 16 de 23/08/2024	23.00
450.14P	7-11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	7,564	\$ 743,399.00	\$ 5,623,070,036.00	No 16 de 23/08/2024	6,143.10
450.15P	7-11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	8,327	\$ 733,409.00	\$ 6,107,096,743.00	No 16 de 23/08/2024	1,966.80
450.16P	7-11603	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	2,679	\$ 665,781.00	\$ 1,783,627,299.00	No 16 de 23/08/2024	1,895.60
900.1.1P	3-11603	Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM	1,290,996	\$ 1,511.00	\$ 1,950,694,956.00	No 16 de 23/08/2024	1,094,426.80

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 42 de 133

630.3.4P	5-14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	1000	\$ 341,770.00	\$ 341,770,000.00	No 17 de 11/10/2024	706.00
730.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	2000	\$ 275,536.00	\$ 551,072,000.00	No 17 de 11/10/2024	1084.00
710.1.2P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	U	150	\$ 297,577.00	\$ 44,636,550.00	No 18 de 02/12/2024	8.00
710.1.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	U	200	\$ 255,001.00	\$ 51,000,200.00	No 18 de 02/12/2024	59.00
710.1.4P	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO XI	U	30	\$ 1,007,546.00	\$ 30,226,380.00	No 18 de 02/12/2024	9.00
730.4P	4-11607	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	U	100	\$ 1,405,751.00	\$ 140,575,100.00	No 18 de 02/12/2024	86.00
29P	5-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PARA BANCA	U	24	\$ 303,701.00	\$ 7,288,824.00	No 18 de 02/12/2024	0.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 43 de 133

		EN CONCRETO TIPO M40						
30P	4-11605	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	U	86	\$ 241,470.00	\$ 20,766,420.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
31P	4-11605	SUMINISTRO E DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	U	14	\$ 1,873,885.00	\$ 26,234,390.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
32P	4-11605	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN PARADERO TIPO M10	U	8	\$ 9,225,675.00	\$ 73,805,400.00	No 18 de 02/12/2024	0.00

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría

- Gestión Técnica

En el presente periodo se presentaron 5.48% de horas de lluvia con respecto al total de horas del mes, aumentando con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, no se ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, los periodos de lluvia fueron intensos generando demoras de las jornadas de trabajo, la instalación de materiales granulares de las capas de terraplén y de subbase, base tratada con asfalto y mezcla densa en caliente tuvo un rendimiento inferior esperado; así mismo, la demarcación horizontal se vio afectada por las precipitaciones.

Se registra para la construcción de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, avances acumulados al mes de febrero de 2025, en la ejecución de las diferentes actividades así: Excavación de explanación 6.58Km, pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, de los cuales 6.58Km se encuentran en corona, 6.58Km en Subbase granular SBG-38, 6.58Km en BTA, 6.58Km en MSC-25 y 6.50Km en capa de rodadura en MDC-19. Y en el Tramo 2, Ruta 45 A 04, Excavación de explanación 0.17Km, Terraplén 0.15Km, de los cuales 0.09Km se encuentran en corona, 0.09Km en Subbase granular SBG-38, 0.09Km en BTA y 0.05Km en MSC-25

Con base en la reprogramación No.20 del programa de inversión inicial para el mes de febrero de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado de \$ 157.600.807.641,00 equivalente al 48.45% del valor básico de obra inicial y se tiene un

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 44 de 133

valor básico de obra ejecutado acumulado de \$159.703.083.574 equivalente al 49.09% del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta retraso en el avance financiero.

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de febrero de 2025, se tiene un valor ejecutado acumulado de \$ 205.701.182.059,00 incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, y con un saldo de la reserva 2024 por valor \$ 4.119.340.447,00 y un saldo de la vigencia 2025 por valor de \$ 28.085.714.286 tal y como se evidencia en la siguiente tabla

Tabla No 7. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 11,235,709,523	\$ 11,235,709,523	\$ -
2022	\$ 101,984,812,983	\$ 101,984,812,983	\$ -
2023	\$ 40,928,571,429	\$ 40,928,571,429	\$ -
2024	\$ 55,671,428,571	\$ 51,552,088,124	\$ 4,119,340,447
2025	\$ 28,085,714,286	\$ -	\$ 28,085,714,286
SUBTOTAL ACUMULADO A 2025	\$ 237,906,236,792	\$ 205,701,182,059	\$ 32,205,054,733
		VALOR CONTRATO	\$ 523,868,141,553
		% EJECUTADO	39.27%


- Seguimiento al programa de obra

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra a continuación, se establece tener finalizada la construcción de la variante de Zipaquirá Ruta 45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la glorieta de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 45 de 133

Glorieta en Ave Colombiana, costado oriental que permita la conectividad de la Variante con la Calle 8 para el mes de abril de 2025. Así mismo, se establece desarrollar la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 y el PR44+0650, y entre el PR46+0600 y el PR47+0150.

Ilustración No 7. Programa de obra

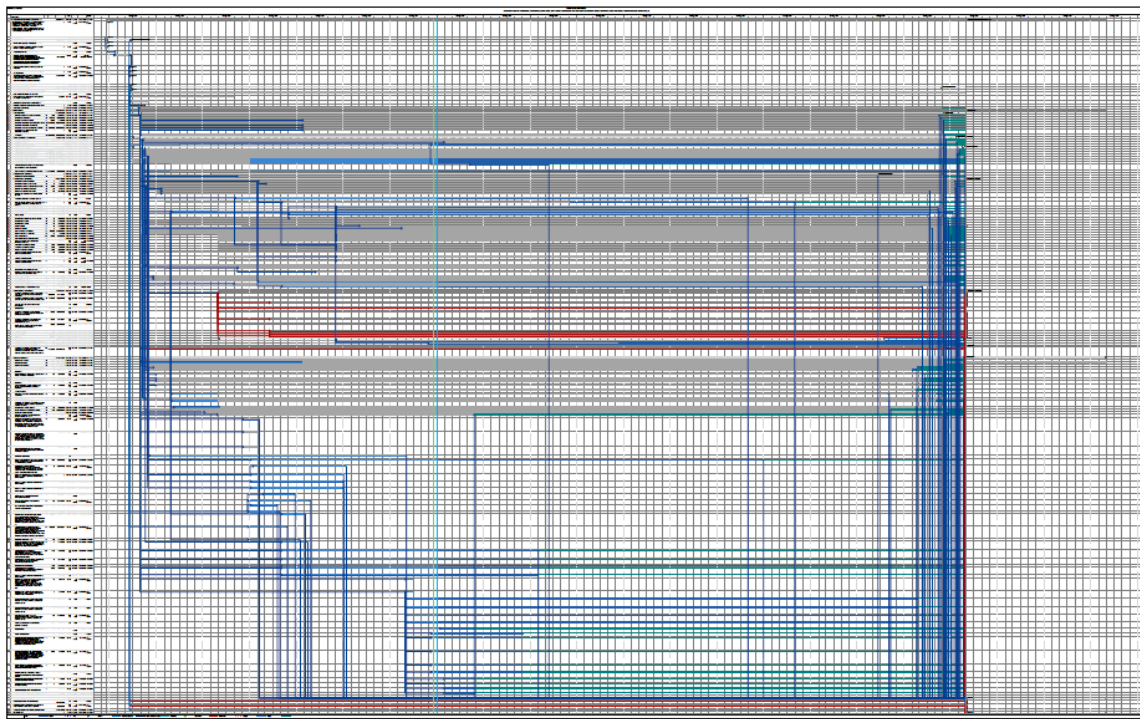

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 46 de 133

- Financiero Interventoría

Para el mes de febrero de 2025 el valor ejecutado acumulado es de \$ 14.038.730.094 incluido IVA, equivalente al 41.91% de valor total del contrato.

Tabla No 8. Financiero de Interventoría

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 2,552,238,390	\$ 2,552,238,390	\$ -
2022	\$ 2,595,238,095	\$ 2,595,238,095	\$ -
2023	\$ 4,071,428,571	\$ 4,071,428,571	\$ -
2024	\$ 4,328,571,429	\$ 4,328,571,429	\$ -
2025	\$ 1,914,285,714	\$ 491.253.609	\$ 1,423.032.105
SUBTOTAL ACUMULADO A 2025	\$ 15,461,762,199	\$ 14.038.730.094	\$ 1,423.032.105
		VALOR CONTRATO	\$ 33,499,857,438
		% EJECUTADO	41.91%

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 47 de 133

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL

4.1 Informe Semanal

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación:

Tabla No 9. Informes Semanales de Interventoría

INFORME SEMANAL No	PERIODO
190	31 de enero a 06 de febrero de 2025
191	07 a 13 de febrero de 2025
192	14 a 20 de febrero de 2025
193	21 a 27 de febrero de 2025

(Anexo No 1)

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2).

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3).

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4).

4.5 Estado General del tiempo

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del tiempo. (Anexo No 5).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 48 de 133

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo No 7).

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra

Durante este periodo la interventoría inicio con la revisión del plan de calidad del contratista, el seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8).

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo.

- Seguimiento programa de inversiones

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 49 de 133

- Actas de comité de obra

Tabla No 10. Actas de comité del área técnica

REUNION	FECHA
OBRA – INVIAS	07/02/2025
OBRA – INVIAS	14/02/2025
OBRA – INVIAS	24/02/2025

- Acta de reunión

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación:

Tabla No 11. Actas de comité

REUNION No	FECHA
PREDIAL	12/02/2025
PREDIAL	19/02/2025

(Anexo No 10).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 50 de 133

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del contrato

Tabla No 12. Información general contrato de Interventoría

CONTRATO No.	0971 de 2021
OBJETO	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
ID SECOP	1761149
CONTRATISTA	CONSORCIO ICEACSA - TPF
INTEGRANTES CONSORCIO	• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% • ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
ACLARACION No 1	1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 51 de 133

ACLARACION No 1	ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(...) CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) (...)”
ACLARACION No 3	1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022. 2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE \$1.000.000.000 DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE PROPIOS, RECURSO 20.
MODIFICACIÓN No 2	CLAUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 2021, en el sentido de indicar que la el valor de la VIGENCIA 2024 es de \$3.828.571.429,00 CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 52 de 133

	(\$1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023.
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 33.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría

5.2.1 Actividades área social

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria	
Se ha realizado el seguimiento a la atención de los puntos SAU en los municipios de Zipaquirá y Sutatausa, con el fin de verificar el trámite oportuno de las (224) solicitudes recibidas a la fecha, en este periodo el contratista le ha dado respuesta al 97% de las PQRS ingresadas, de las cuales (7) PQRS se encuentra en trámite y proceso de respuesta. Para el caso de los Puntos Satélites, se han recibido (9) PQRS durante	- Número de quejas y reclamos recibidos en el mes: (8) - Número de quejas y reclamos recibidos a la fecha: (224) - Número de quejas y reclamos en trámite: (7) - Número de quejas y reclamos atendidos en el contrato: (217)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 53 de 133

toda la ejecución del contrato, las cuales se encuentran cerradas.

Las PQRS en trámite corresponden a: **SAU-Z-091, SAU-Z-112, SAU-Z-123, SAU-Z-137** corresponden a: presuntas afectaciones en predios sector ave colombiana, las cuales se darán cierre una vez se finalicen las actividades en el sector de la glorieta de Ave Colombiana.

En el periodo se hizo apertura de (8) PQRS, de las cuales (3) se encuentran en trámite y corresponde a: **PQRS SAU-Z-186** por presuntos taponamientos en la tapa de inspección ubicada en el ingreso a la vereda la Granja sector Codito - Zipaquirá y afectación en el desagüe de la carretera, a partir de los trabajos en obra realizados en el sector.

PQRS SAU-S-028 y SAU-S-029 remitidas por parte de la alcaldía de Tausa y personería de Sutatausa, solicitando reuniones informativas del trazado y alcance del contrato en esos municipios.

Las anteriores PQRS se encuentran programadas para atender los días 05 y 12 de marzo de 2025.

Verificación buzones y puntos satélites de información:

Los días 13 y 18 de febrero de 2025, el contratista realizó la actualización de los (10) puntos satélites del corredor vial “Los Comuneros” en los municipios de: Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca y Chiquinquirá, allí se dispuso el afiche No. 65 “Avance de obra mes de enero de 2025” y se mantuvo el

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 54 de 133

plegable No. 10 con recomendaciones de seguridad vial.

En la verificación de los buzones satélites no se encontraron PQRS, por lo que se mantienen las 9 solicitudes atendidas a la fecha.

Traslado oficinas SAU Sutatausa – Zipaquirá

En el periodo el contratista reportó el traslado y cambio de horario presencial de la oficina SAU de Sutatausa que se encontraba en la carrera 3 No. 4-33 a la calle 2 No. 4 - 33. A través del comunicado C971-4058-2025 (24-02-2025) se emitió concepto de aprobación al cambio de oficina y ajuste en el horario presencial, dejando la salvedad que este podrá ser requerido se ajuste nuevamente por solicitud del INVIAS o la interventoría de acuerdo a las dinámicas que se evidencien en la atención.

Se estable el siguiente horario de atención:
Presencial: martes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Virtual y telefónica: lunes, martes, jueves y viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

La anterior información, es debidamente reportada al INVIAS.

Asimismo, el 28 de febrero el contratista notifica a través del comunicado D-000005366 el traslado de la oficina SAU que se encuentra en el barrio Barandillas de Zipaquirá, a la entrada del campamento de obra en la vereda Susaguá sector ave

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 55 de 133

colombiana del mismo municipio. La primera semana de marzo se remitirá el concepto por parte de interventoría.	
PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitario	
Acciones de divulgación: En el mes de febrero de 2025 se realizó la aprobación de (4) volantes: No. 99 “Finalización izaje del puente peatonal glorieta de la calle 8 (variante Zipaquirá)”, No. 100 “Mantenimiento vial variante Zipaquirá”, No. 101 “Mantenimiento vial entre Zipaquirá y Chiquinquirá y No. 102 “Información traslado oficina SAU Sutatausa”. Estos fueron divulgados con la comunidad del AID y en los puntos satélites de información. El volante No. 103 corresponde al cambio de la oficina del SAU de Zipaquirá el cual se enviará concepto de la revisión en el mes de marzo de 2025. Y un (1) afiche No. 65 “avances mes de enero 2025”. Con una entrega total de (602) piezas comunicativas en el periodo, a la comunidad, entes municipales e instalados en las carteleras informativas y puntos SAU. Reuniones Informativas: Reunión extraordinaria No. 81: Con el fin de dar atención a la PQRS No. 180 el 12 de febrero se hizo acompañamiento a la reunión No. 81 convocada por la personería de Tausa la cual tuvo como objetivo escuchar las solicitudes de la comunidad y los casos de accidentalidad presentados en la vía nacional Zipaquirá –	Divulgación de piezas Reuniones: No aplica para el periodo comunicativas: 1- Entrega volante No. 99: (81) piezas. 2- Entrega volante No. 100: (151) piezas. 3- Entrega volante No. 101: (225) piezas. 4- Entrega volante No. 102: (110) 5- Distribución afiche No. 65: (11) 6- Comunicados personalizados: (35) Total, de piezas entregadas en el periodo: (602). Total, de piezas entregadas a la fecha: (31.415)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 56 de 133

Chiquinquirá por parte de cada uno de los representantes de los municipios ubicados en el área de influencia de la vía nacional. Los compromisos generados fueron los siguientes:

- 1- Envío del estado financiero del contrato, plazos para la ejecución de actividades y porcentajes de cumplimiento del mismo.
- 2- Envío de los documentos contractuales del contratista e interventoría.
- 3- Solicitud de una segunda mesa de trabajo con la asistencia y participación del INVIAS, y otras instituciones como ministerio de transporte y gobernación de Cundinamarca. Se programará para finales del mes de marzo de 2025.

Por parte de interventoría se remitió correo electrónico el 21 de febrero a los asistentes de la reunión en Tausa, dando respuesta a cada uno de los compromisos generados y se indica que se debe solicitar al correo de INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co la programación de la reunión esto debido a procesos internos de logística de la Dirección Territorial de la entidad.

Se contó con la asistencia de aproximadamente (34) personas de la comunidad, contratista, interventoría e INVIAS.

Comité de participación No. 17:

Se llevó a cabo la reunión el 19 de febrero de 2025, en la cual se hizo seguimiento a los compromisos generados y se socializaron los avances en las actividades de la variante Zipaquirá. Se contó con la asistencia de (5) personas de la comunidad. El próximo

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 57 de 133

comité se llevará a cabo el 23 de abril de 2025. Capacitaciones sociales: El día 27 de febrero del 2025, se hizo acompañamiento a capacitación social dirigida a los trabajadores del contrato de obra, en el tema “diversidad e inclusión”, logrando capacitar a (34) personas.	
FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – Afectación de Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios	
Actas de vecindad de cierre variante Zipaquirá: En el mes de febrero no se adelantaron actividades relacionadas con actas de vecindad de cierre en el sector de la variante Zipaquirá. A la fecha se cuenta con un avance del 80%, con el levantamiento de (109) actas de vecindad de cierre de (137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. La PQRS 174 por presunta alteración en uno de los tanques de la estación de gasolina fue cerrada a conformidad en el mes de febrero, debido a que la empresa desistió de la queja conforme al informe y concepto presentado por el contratista en donde informaba la baja probabilidad de afectación originada por las actividades de obra. A la fecha se encuentran aprobadas por interventoría a través de comunicado (107) actas de vecindad de cierre. Pendiente por entregar por parte del contratista (2) y por levantar (28) una vez se finalicen las	Cantidad actas de vecindad de inicio a la fecha: Actas de Vecindad Variante: (137) Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: (163) Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y placa huella: (21) Actas de Seguimiento Variante: (5). Actas de vecindad en el Tramo 2: (2) Cantidad actas de vecindad de cierre a la fecha: Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) Actas de cierre Variante Zipaquirá: (109) Actas de compromiso cerradas: (92)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 58 de 133

actividades de obra en el sector de ave colombiana.		
Actas de vecindad de inicio tramo 2: No aplicar para el presente periodo.		
Actas de compromiso: Durante el desarrollo contractual se han desarrollado (119) actas de compromiso de las cuales se ha dado cierre a (93) actas a satisfacción de las partes. Se encuentra pendiente de cierre (26) actas. En el periodo se dio cierre al acta de compromiso 119.		
FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía		
Actividades desarrolladas para la recuperación del derecho de vía: En el mes de febrero de 2025 el contratista no adelantó actividades para el presente programa.	No. Actividades económicas en derecho de vía de información y sensibilización: (46) No. Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía: (4) Sensibilizaciones y notificaciones: (41).	
FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de Accidentes sobre la Población		
Talleres pedagógicos de sostenibilidad: En el mes de febrero no se adelantaron actividades por parte del contratista. Se encuentra programado por el contratista retomar la actividad para el mes de marzo de 2025.	Talleres pedagógicos de sostenibilidad en cultura vial: (50) Campañas de seguridad vial: (15) Total, realizados a la fecha: (65)	
Campaña de seguridad vial: Esta actividad se encuentra programada para el mes de marzo de 2025.		
FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra (ENERO 2025)		
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	OBRA ACTIVOS	INTERVENTORÍA
MANO DE OBRA CALIFICADA	145	14
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	31	3

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 59 de 133

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS.	66	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS.	110	9
TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS	176	17

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación Comunitaria

OPC Polideportivo vereda Susagüá, municipio de Cogua:

Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024

No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024

06-02-2025: Se recibe el comunicado D-000005243, con el asunto: Reconocimiento económico obligación compensación ambiental y obras de participación comunitaria a través ítems no previstos, por medio del cual el contratista solicita el reconocimiento económico a través de ítems no previsto para la implementación de Obras con Participación Comunitaria.

21-02-2025: Se lleva a cabo mesa de trabajo entre el contratista y la interventoría, para hacer revisión de la solicitud enviada por el Consorcio Vial MHC 063 para cambiar la modalidad de pago por ítem no previsto para las actividades de Obras con Participación Comunitaria, en esta reunión se hizo claridad sobre los documentos que el contratista debe presentar para dar trámite a la solicitud.

25-02-2025: Por parte de interventoría se remite el comunicado C971-4061-2025, enviando concepto de la solicitud realizada para el cambio en la modalidad de pago, desde el área social de la interventoría se enfatizó en remitir la siguiente información:

- Presentación de análisis de precios unitarios para las actividades de Obras con Participación Comunitaria y actividades de compensación forestal.
- Alcance a la propuesta definitiva para la ejecución de la OPC en el municipio de Cogua, ya que no se realizará a través de un tercero (empresa ICONO), que para este caso se encontraba aprobado y avalado por la interventoría y la Subdirección de Sostenibilidad de Invias.
- Debe darse prioridad a los proveedores y mano de obra del área de influencia del proyecto.
- Actualización del plan de inversión social, especificando que actividades para el desarrollo de la Obra con Participación Comunitaria no se incluirían como ítem no previsto.
- Informar a la comunidad, junta de acción comunal y alcaldía de Cogua sobre el aplazamiento en el inicio de la ejecución de la OPC mientras se surte el respectivo proceso para el ajuste en la modalidad de pago.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 60 de 133

- Tener en cuenta lo especificado en el apéndice E – pliego de condiciones, ítem 14 Desarrollo de Actividades con Participación Comunitaria.

Cartografía social Zipaquirá:

En el presente periodo, el contratista no dio cumplimiento al compromiso de entrega de la propuesta el 15 de febrero de 2025.

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

Monitoreo:

Tramo 1, Frente 2, UMA 231 y UMA 233, excavación para la adecuación de la plataforma de mantenimiento de las estructuras del puente, a una profundidad de 6 m.

Tramo II -abscisas K44+180 y K44+380, se supervisaron los trabajos de descapote.

Actividades Laboratorio:

Se realizaron 400 fotos de las 600 faltantes.

Otras actividades:

Durante el periodo, fue informado al contratista la no aprobación de los informes de arqueología No. 42 y 43 ya que estos no presentan los avances detallados desde el área SIG y no son claros los ajustes realizados en el modelo de datos.

Por otro lado, se envió el comunicado C971-4063-2025 informando que debido a que las actividades de laboratorio se finalizan en el mes de febrero del año en curso, no se requiere continuar con el arriendo para estas actividades, por lo que se solicita hacer entrega del inmueble para no generar cobros adicionales.

Arqueología pública:

Capacitaciones al personal:

Fecha	Temática	Asistencia
27/02/2025	Arte rupestre cundiboyacense	20
28/02/2024	Arte rupestre cundiboyacense	16
TOTAL		36

FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial

17-02-2025: Por parte de interventoría se remitió el comunicado C971-4042-2025, con el que se dio respuesta al oficio D-000005214 (05-02-2025) enviando

Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 1: Siete (7), correspondiente a tres unidades sociales identificadas.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 61 de 133

comentarios y observaciones a las siguientes fichas: Sin aplicación de factores sociales: 021-D-T2-MCRC, 022-D-T2-MCRC, 023-D-T2-MCRC, 029-D-T2-MCRC 030A-D-T2-MCRC y 030B-D-T2-MCRC. Con aplicación de factores sociales: 030-D-T2-MCRC (2) unidades sociales y 031-D-T2-MCRC (2) unidades sociales. Se encuentra pendiente la respuesta por parte del contratista. 21-02-2025: Por parte de interventoría se hace acompañamiento y verificación de las (2) unidades sociales existentes en el predio 031-D-T2-MCRC ubicados en el municipio de Tausa, en donde se indicó al profesional sociopredial del contratista la importancia de contar con el contrato de arrendamiento del año actual de la unidad social del señor Joaquín Fandiño, ya que el que fue remitido a interventoría esta hasta el 31 de diciembre de 2024. Respecto a la segunda unidad social, no se logró constatar que el señor Fernando Bello habita de manera permanente en el predio, ya que no se encontró durante la visita, presuntamente debido a que labora como conductor y tiene este espacio para sus días de descanso, cuenta con un contrato de arrendamiento indefinido.	Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a la fecha: dieciséis (16), correspondiente a ocho unidades sociales identificadas.
Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia de Regiones	
En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem.	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 62 de 133

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales:

Revisiones y comentarios informe mensual
Informe mensual No. 42: 03-02-2025: Una vez verificados los ajustes realizados al informe No. 42, se remitió el comunicado C971-3996-2025, con el concepto de no aprobación al informe, ya que no fue ajustado de manera completa la observación realizada el informe de arqueología por lo que se informa que se ha evidenciado que desde el informe del mes de noviembre de 2024 no han sido reportados los avances en el modelo de datos, actividad que se debe reportar de manera mensual, por lo que, no se encuentra la justificación por la cual, se ha dejado de presentar la información, si conforme a las preactas presentadas por el contratista, el profesional SIG continúa desarrollando sus actividades de manera normal. Asimismo, no fue aclarada la información respecto al cambio menor que se va gestionar ante el ICANH. Por tal motivo, se requiere se incluyan los avances generados en los meses de noviembre y diciembre del 2024. 12-02-2025: Se recibe el comunicado D-000005267 con el que el contratista envió respuesta a las observaciones realizadas por interventoría. 19-02-2025: Una vez verificada la información se remite el comunicado C971-4849-2025, en donde se informa que, de acuerdo a la documentación remitida, no es claro los tiempos empleados por el profesional SIG que representen el 50% de su dedicación en el contrato, de igual forma, se tiene dudas respecto a los datos de vectores y fragmentos reportados.
Informe mensual No. 43: 07-02-2025: Se recibe el comunicado D-000005242, con el cual el contratista remitió el informe social No. 43. 13-02-2025: Una vez verificada la información entregada por el consultor se remitió el comunicado C971-4027-2025 con observaciones. 21-02-2025: El contratista da respuesta a las observaciones a través del comunicado D-000005326. 28-02-2025: Se remite el comunicado C971-4070-2025, enviando observaciones a comentarios que no fueron ajustados por el contratista.
Revisiones y comentarios informe trimestral
Trimestral No. 14 (octubre, noviembre y diciembre 2024) 06-02-2025: Se remitió al INVIAS el informe trimestral social No. 14 por medio del comunicado C971-4013-2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 63 de 133

Revisiones y comentarios informe ICA

28-02-2025: Se remitió al INVIAS el informe ICA No. 7 correspondiente al 01 de julio al 30 de diciembre de 2024. Expediente LAM 4576", a través del comunicado C971-4073-2025.

Revisiones y comentarios pre acta mensual

Pre acta social No. 45 (periodo febrero 2025), con cobro del componente arqueológico se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista conforme a las observaciones enviadas por la interventoría relacionadas con la presentación del cobro del mes de enero de 2025 y soportes para el cobro del profesional SIG.

Programa civico guardavías

Durante el comité de participación comunitaria No. 17 realizado en el presente mes y en cumplimiento de la metodología propuesta por la interventoría, se brinda información sobre prevención de accidentes y comportamientos seguros en la vía durante el desarrollo del contrato 989 de 2021, en donde se explicó a los asistentes sobre el objetivo de los Planes de Manejo de Tránsito, la normatividad que los regula y las autoridades encargadas de aprobar y viabilizar su aplicación en las obras. Se informa también que los ciudadanos pueden hacer seguimiento y control a la instalación de estas medidas para garantizar la seguridad de los peatones y usuarios de la vía. Al finalizar la presentación se recuerdan los datos de atención al ciudadano establecidos por parte del INVIAS.

Comité social No. 43

Se encuentra programado para la primera semana de marzo de 2025.

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social

No aplica para el presente periodo.

Reuniones actividades de mantenimiento y señalización rutas 45ª05, 45A06 y 45A07 de Chiquinquirá a San Gil

En atención a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la Nación la cual fue remitida al contratista Mario Huertas, en la que notifican una citación de seguimiento al cumplimiento de acuerdos mesa de diálogo vía Nacional Ruta los Comuneros en el sector entre Oiba, Suaita, Vado Real, Tolota y Olival, para el día 26 de febrero de 2025 a las 8:00 am, la interventoría participa en la mesa de trabajo, en la que se dejó como compromiso para el Consorcio UT Vial del Norte 3226-2024 encargado de estas rutas, la programación de una reunión con la comunidad en donde se socialicen las actividades ejecutadas.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 64 de 133

5.2.2 Actividades área ambiental

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de febrero del año 2025, se efectuó la inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 de 2021.

➤ Cesión parcial de Licencia Ambiental

Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución N°00310 del 03 de febrero de 2022.

Cómo se informó en anteriores informes mensuales se ha llevado a cabo todos los trámites necesarios y esta interventoría mediante comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 radicó al INVIAS el comunicado borrador ajustado para el trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental de la Resolución 2029 de 2009. Esta Interventoría en el mes de febrero de 2025 no recibió respuesta al comunicado, razón por la cual la interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del 25 de febrero de 2025 con radicado INVIAS 2025EVUVRAZ-020180, solicita al INVIAS se de atención al comunicado del 12 de agosto del 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325. Esto con el fin de zanjar finalmente con este requerimiento contractual.

➤ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental

Para este periodo se reporta que la interventoría inició con la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, al cual se le efectuaron observaciones de forma y fon con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los términos de referencia de la ANLA. Una vez finalizada la revisión por parte de la interventoría se realiza el envío del estudio al contratista para la atención de estas observaciones en el mes de marzo del 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 65 de 133

➤ **Actas de reunión**

A la fecha en el contrato se han efectuado 48 Comités Ambientales, para el mes de febrero de 2025 no se realizaron comités ambientales, sin embargo, si se desarrolló reuniones de comité técnico donde se trataron temas ambientales cada semana, y al no contar con la profesional especialista ambiental de interventoría, ni con la profesional gestora ambiental del INVIAS no se programaron comités. Por tal razón se programó el próximo comité ambiental para el día 13 de marzo del año 2025.

➤ **Actividades de tipo Ambiental**

Durante el mes de febrero del año 2025, el área ambiental de esta Interventoría continuó realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029:2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576.

Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. Además, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes cada mes. Esta información se presenta al INVIAS mensualmente para efectos de entregas por donación.

Para este mes se realizó por parte del contratista la entrega el Informe de Cumplimiento Ambiental N°7 mediante comunicado D0005193 del 05 de febrero de 2025, al cual se realizaron observaciones por parte de la interventoría y enviaron para atención por correo electrónico para dar celeridad a su atención. Una vez atendidas las observaciones y verificadas por la interventoría se realiza el envío a al Instituto mediante comunicado C971-4074 del 25 de febrero de 2025, con su respectivo concepto y link de descarga suministrado por INVIAS para su radicación a la Autoridad ambiental

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 66 de 133

➤ Actividades de compensación

Durante el periodo reportado el contratista presento una solicitud para que el desarrollo de la actividad no sea reconocido bajo la modalidad de reembolso de gastos, sino como Ítems no previstos, a lo cual esta interventoría eleva la consulta al área jurídica y se requiere al contratista información adicional para poder emitir un concepto más acertado a la solicitud. De momento la interventoría se encuentra a la espera del pronunciamiento del contratista al comunicado en mención.

5.2.3 Actividades área Predial

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, ; para adelantar la gestión predial 1º) PR 40 al 47; 2º) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la revisión y verificación de los predios 008-D-T2-MCRC, 009-D-T2-MCRC y 010-D-T2-MCRC. Durante este proceso, se realizaron observaciones y se solicitaron ajustes al contratista. También se verificaron y aprobaron las fichas prediales 001-D-T2-MCRC, 001B-I-T2-MCRC y 026-D-T2-MCRC, las cuales fueron enviadas a la SS INVIAS para su visto bueno de no objeción. Se llevó a cabo la revisión del predio 018-D-T2-MCRC, generando observaciones que requirieron ajustes por parte del contratista. Asimismo, se verificaron y aprobaron las fichas prediales 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC, que fueron enviadas a la SS INVIAS para su visto de no objeción. Adicionalmente, mediante el oficio C971-4014-2025, se complementó el oficio C971-4002-2025, enviando la ficha predial 001B-I-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté para su revisión y visto de no objeción por parte de la SS INVIAS. Se llevó a cabo una visita de campo para verificar áreas, linderos, construcciones y la ubicación del diseño en los predios 016-D-T2-MCRC y 017-D-T2-MCRC, durante la cual se realizaron observaciones relevantes al contratista. Se llevó a cabo la revisión y verificación del predio 028-D-T2-MCRC, generando observaciones y ajustes que fueron

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 67 de 133

comunicados al contratista. Mediante el oficio C971-4040-2025, se amplió el alcance del oficio C971-4010-2025, el cual incluye la remisión de la Ficha Predial 026-D-T2-MCRC para su revisión y obtención del visto bueno por parte de la SS INVIAS. Se llevó a cabo la revisión y verificación del predio 039-I-T2-MCRC, generando observaciones y ajustes que fueron comunicados al contratista a través de un correo electrónico. Asimismo, mediante el oficio C971-4057-2025, se realizó la revisión de la ficha predial correspondiente al predio 028-D-T2-MCRC, incluyendo igualmente observaciones dirigidas al contratista. Se emitió el oficio C971-4066-2025 para remitir la ficha predial del predio 018-D-T2-MCRC, solicitando su revisión y el visto bueno por parte de la SS INVIAS. De manera similar, se elaboró un oficio para la remisión de la ficha predial del predio 015-D-T2-MCRC, con el objetivo de obtener la revisión y aprobación por parte de la misma.

- Se realizaron dos mesas de trabajo con el contratista: la primera el 12 de febrero de 2025, para ajustar el informe mensual No. 31 de enero de 2025, y la segunda el 19 de febrero de 2025, para revisar las fichas prediales 015-D-T2-MCRC, 016-D-T2-MCRC y 017-D-T2-MCRC. Las observaciones de ambas reuniones fueron documentadas en las actas de reunión predial No. 137 y No. 138, respectivamente.
- Se revisaron los estudios de títulos de los predios 075-D-T2-MCRC, 076-D-T2-MCRC, 032-D-T2-MCRC y 035-I-T2-MCRC, generando observaciones que fueron comunicadas al contratista. Además, se evaluó la oferta de compra del predio 031-D-T2-MCRC, la cual también requirió ajustes.
- Mediante el comunicado C971-3992-2025, se ha enviado la Constancia de Ejecutoria correspondiente al predio 025-D-T2-MCRC, ubicado en el Tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, en el primer sector que abarca 3.9 kilómetros. Este documento ha sido remitido para su revisión con el objetivo de obtener el Visto de No Objeción por parte de SS INVIAS.
- Se envió el estudio de títulos del predio 024 A-D-T2-MCRC para su revisión y visto de no objeción a la SS INVIAS, mediante el oficio C971-4019-2025. Además, se tramitó la

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 68 de 133

radicación de la minuta de escritura del predio 030A-D-T2-MCRC, también para su revisión, a través del oficio C971-4018-2025.

- A través del oficio C971-4852-2025, se realizó la revisión y verificación de los Estudios de Títulos de los predios 075-D-T2-MCRC y 076-D-T2-MCRC, se generaron observaciones y ajustes que fueron dirigidos al contratista. Adicionalmente, se remitió, mediante el oficio C971-4039-2025, la Minuta de Escritura del predio 030B-D-T2-MCRC para su revisión y obtención del visto de no objeción por parte de la SS INVIAS.
- A través del oficio C971-4057-2025, se realizó la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 075-D-T2-MCRC y 076-D-T2-MCRC, generando observaciones y ajustes que fueron comunicados al contratista.
- Se revisaron y verificaron los avalúos de los predios 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC en el tramo Casa Blanca-Ubaté, generando observaciones y ajustes que se comunicaron al contratista, mediante oficio C971-4025-2025.
- Se remite el informe predial mensual No. 31 de enero de 2025 del Consorcio Vial MHC 063, mediante el oficio C971-4851-2025, con el fin de que la SS INVIAS lo revise y emita su visto bueno.
- Se enviaron los oficios emitidos por INVIAS, numerados 2024S-VBOG-05281 y 2024S-VBOG-05275. En relación al oficio 2024S-VBOG-005281, que trata sobre la revisión y aprobación del insumo jurídico del predio 021-D-T2-MCRC, se emitió el oficio 2024S-VBOG-004724 para la inscripción de la oferta. Respecto al oficio 2024S-VBOG-005275, que aborda la revisión de los insumos jurídicos de los predios 022-D-T2-MCRC y 023-D-T2-MCRC, se generaron los oficios 2024S-VBOG-004753 y 2024S-VBOG-004756, relacionados con la oferta. Finalmente, los oficios 2024S-VBOG-004936 y 2024S-VBOG-004937 se vinculan a las inscripciones de dicha oferta.
- A través del oficio C971-4017-2025, se envió al contratista el documento de INVIAS, número 2024S-VBOG-006378, que aborda la revisión del informe mensual No. 28 de octubre de 2024, confirmando la no objeción.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 69 de 133

- A través del oficio C971-4044-2025, se envió al contratista el documento emitido por INVIAS, numerado 2024S-VBOG-008526, relacionado con la revisión y el visto de no objeción de la Pre-Acta No. 44 correspondiente al mes de enero de 2025. Asimismo, mediante el oficio C971-4038-2025, se remitió al contratista el oficio número 2025S-VBOG-007610 de INVIAS, que aborda la revisión y aprobación del insumo técnico de la Ficha Predial del predio 001B-I-T2-MCRC.
- Se envió al contratista el oficio emitido por INVIAS, numerado 2025S-VBOG-009993, a través del oficio C971-4056-2025, el cual aborda la revisión y aprobación del insumo técnico relacionado con la ficha predial del predio 026-D-T2-MCRC.
- Mediante el oficio C971-4059-2025, se revisó y aprobó la Pre Acta No. 45 de febrero de 2025, la cual fue enviada a la SS INVIAS para su revisión y obtención del visto de no objeción.

Tabla No. 13 Resumen insumos prediales

TRAMO SECTOR	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	ESTUDIO DE TITULOS	AVALÚOS APROBADOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD LIBERADA (Km)	ESCRITURA A FAVOR DE INVIAS	PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
1	15	15	15	15	13	6,70	13	2
2	158	39	32	22	10	2,51	5	3
TOTAL	173	54	47	37	23	9.21	18	5

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 70 de 133

Tabla No. 14 Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	173	31.2 %	54
ESTUDIO DE TITULOS	173	27.2 %	47
AVALÚOS APROBADOS	173	21.4 %	37
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	166	13.9 %	23
OFERTAS DE COMPRA	173	18.0%	31
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	166	10.8%	18
PAGOS TOTALES	173	10.4%	18
DESEN GLOBE CATAS TRO	166	3.6%	6
LONGITUD LIBERADA Km	18.963	48.6 %	9.21
EXPROPIACIONES	10	30.0 %	3
EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL	173	4.6%	8
AVANCE PROMEDIO	173	20.0%	

Tabla No. 15. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 Notaria 1 Zipaquirá, FMI 176-236470. En Catastro en proceso de mutación de 2° orden. . Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 71 de 133

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
2	002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
3	003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1606 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
4	004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaria 2 Zipaquirá y FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
5	005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
6	006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
7	009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
8	010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
9	011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 72 de 133

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
10	012-D-T1-MCRC	SAMUEL SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente en ajustes para cierre predial.
11	013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIQAQUIRA	Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
12	014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado.
13	014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente en ajustes para cierre predial.
14	014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. Notaría 1 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado.
15	022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente en ajustes para cierre predial.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 73 de 133

Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T2-MCRC	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO ITAGRO	Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. En revisión y ajustes insumos técnicos, por ajuste en el diseño, No priorizado 2024 según disponibilidad de recursos.
2	001A-D-T2-MCRC	INDETERMINADO	En elaboración ficha predial
3	001A1-D-T2-MCRC	ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE CASTILLO	Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático
4	001B-I-T2-MCRC	CARLOS ARTURO TORRES	Ficha predial Aprobada. ET en elaboración.
5	002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDIÑO	Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET Aprobados, y elaboración del avalúo.
6	003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 INVIAS.
7	004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS	Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, para ajustar Ficha predial elaborada.
8	005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP y ET Aprobados, y en ajustes del avalúo. por cambio de diseño geométrico. Con PIV.
9	005A-D-T2-MCRC	INVERSIONES XLV SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET Aprobados, y en ajustes del avalúo, por cambio de diseño geométrico. Con PIV.
10	005B-D-T2-MCRC	GARNICA FUENTES EDWIN OLMEDO Y OTRO	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET Aprobados, y en ajustes del avalúo, por cambio de diseño geométrico. Con PIV.
11	005B-1-D-T2-MCRC	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en modificación.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 74 de 133

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
12	005B-2-D-T2-MCRC	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en modificación.
13	005B-3-D-T2-MCRC	LEIDY JOHANNA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en modificación.
14	005B-4-D-T2-MCRC	EMILCE AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en modificación.
15	005B-5-D-T2-MCRC	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en modificación.
16	008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS MANUEL AREVALO VILLAMIL	Ficha predial y E.T, Para alcance de FP y ET en revisión y ajustes Con PIV, categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
17	009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	Ficha predial y E.T, Para alcance de FP y ET en revisión y ajustes Con PIV, categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
18	010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S	Ficha predial y E.T en revisión y ajustes. con PIV. Categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
19	011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Demanda en revisión de INVIAS. Minuta de escritura en revisión y ajustes.
20	012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Demanda en revisión de INVIAS. Minuta de escritura en revisión y ajustes.
21	013-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP en revisión y ajustes por modificación del diseño de acceso. Pendiente diseños de detalle en fase III. Prioridad 3.
22	014-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP en revisión en ajustes por modificación del diseño de acceso. Pendiente diseños de detalle en fase III. Prioridad 3. Prioridad 3

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 75 de 133

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
23	015-D-T2-MCRC	JAIME RODRIGUEZ	FP en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
24	016-D-T2-MCRC	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PINZÓN Y OTROS	FP en revisión en ajustes. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 2
25	017-D-T2-MCRC	CARLOS JULIO DELGADO NOVOA	FP en revisión en ajustes. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
26	018-D-T2-MCRC	ANA DOLORES PINZON CASTILLO	FP en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
27	019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON Y OTROS	FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra. Escritura radicada en ORIP para registro. Primer pago No 1. realizado con EP 2175 26-11-2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808.
28	020-D-T2-MCRC	CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS	Ficha predial, y ET, Aprobado, en elaboración Avalúo. Con alcance FP E.T. por cambio de propietarios Aprobado, en elaboración de avalúo.
29	021-D-T2-MCRC	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada, oficio de inscripción en revisión de INVIAS.
30	022-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo Aprobados, con Oferta de compra y notificación.
31	023-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo Aprobados, con Oferta de compra y notificación.
32	024-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL	FP Aprobada, ET en revisión y ajustes. No priorizado.
33	024A-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL	FP Aprobada, ET en revisión y ajustes. No priorizado.
34	025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	Con FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución aprobada del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación en revisión SS INVIAS.
35	025-1-D-T2-MCRC	YANETH FORERO C Y OTRO	Con FP y DJ aprobados, avalúo en revisión y ajustes.
36	026-D-T2-MCRC	EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS	FP Aprobada, ET en elaboración. Sin priorización y atención socio predial.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 76 de 133

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
37	027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	Ficha predial, E.T, avalúo y Oferta de compra. Primer pago. Minuta. de escritura en registro. Segundo y ultimo pago realizado con EP 1779 02-10-2024 Notaria 1 De Zipaquirá.
38	027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	Ficha predial, E.T, avalúo y Oferta de compra. Primer pago. Minuta. de escritura en registro. Segundo y ultimo pago realizado con EP 2305 06-08-2024 Notaria 2 De Zipaquirá.
39	027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	FP, E.T, Avalúo, Oferta de compra. Primer, segundo y último pago realizado con EP 086 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS.
40	027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	FP, E.T, Avalúo, Oferta de compra. Primer , segundo y último pago, con EP 087 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173218 INVIAS.
41	028-D-T2-MCRC	ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ	Ficha Predial en revisión y ajustes. Pendiente diseños de detalle en fase III. Sin priorización y atención socio predial.
45	029-D-T2-MCRC	MARIA ANA ISABEL DE PONZON Y OTROS	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación. Minuta de escritura en revisión y ajustes.
42	030-D-T2-MCRC	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación. Con PIV.
43	030A-D-T2-MCRC	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRA	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación.
44	030B-D-T2-MCRC	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación. Con PIV.
45	031-D-T2-MCRC	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra en revisión y ajustes.
46	032-D-T2-MCRC	ANA HILDA FIGUEROA DE CAICEDO	Ficha predial Aprobada y E.T en revisión y ajustes. Categorizados como prioridad 1.
47	035-I-T2-MCRC	EDITH YANETH FANDIÑO RODRIGUEZ Y OTRA	Ficha Predial aprobada, E.T en revisión y ajustes.
48	036-D-T2-MCRC	EDELMIRA FANDIÑO CONTRERAS	Ficha Predial en revisión y ajustes.
49	039-I-T2-MCRC	IVAN DARIO FANDIÑO CARDENAS	Ficha Predial en revisión y ajustes.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 77 de 133

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
50	073-D-T2-MCRC	FRANCISCO ALFREDO MONROY VILLAMIL Y OTRA	Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración.
51	074-D-T2-MCRC	DANIEL LOPEZ SAAVEDRA	Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración.
52	075-D-T2-MCRC	MARIA CELMIRA VANEGAS PINZON	Ficha Predial Aprobada, ET en revisión y ajustes.
53	076-D-T2-MCRC	ALCIRA MONTAÑO PINZON Y OTRA	Ficha Predial Aprobada, ET en revisión y ajustes.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 78 de 133

Tabla No 17. Cuadro Control Bolsa Predial.

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PRE ACTAS
1	jun-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	jul-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	ago-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	sep-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	oct-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	nov-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	dic-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	ene-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	feb-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	mar-2022	\$ 8.477.000,00	\$ 1.610.630,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.087.630,00
11	abr-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	may-2022	\$ 17.755.000,00	\$ 3.373.450,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.128.450,00
13	jun-2022	\$ 7.368.000,00	\$ 1.399.920,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.767.920,00
14	jul-2022	\$ 1.508.000,00	\$ 286.520,00	\$ 840.575.738,53	\$ 21.014.393,46	\$ 3.992.734,76	\$ 867.377.386,75
15	ago-2022	\$ 45.072.875,00	\$ 8.563.846,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.636.721,25
16	sep-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	oct-2022	\$ 14.485.500,00	\$ 2.752.245,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	\$ 305.765.367,25
18	nov-2022	\$ 2.897.000,00	\$ 550.430,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.447.430,00
19	dic-2022	\$ 171.119.500,00	\$ 32.512.705,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.632.205,00
20	ene-2023	\$ 9.187.500,00	\$ 1.745.625,00	\$ 49.861.214,40	\$ 1.246.530,36	\$ 236.840,77	\$ 62.277.710,53
21	feb-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	mar-2023	\$ 10.448.000,00	\$ 1.985.120,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	\$ 300.960.742,25
23	abr-2023	\$ 5.290.500,00	\$ 1.005.195,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.295.695,00
24	may-2023	\$ 18.047.000,00	\$ 3.428.930,00	\$ 21.366.557,00	\$ -	\$ -	\$ 42.842.487,00
25	jun-2023	\$ 2.541.000,00	\$ 482.790,00	\$ 413.125.201,55	\$ 10.328.130,04	\$ 1.962.344,71	\$ 428.439.466,30
26	jul-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	ago-2023	\$ 12.905.000,00	\$ 2.451.950,00	\$ 24.635.602,80	\$ 615.890,07	\$ 117.019,11	\$ 40.725.461,98
28	sep-2023	\$ 1.270.500,00	\$ 241.395,00	\$ 100.637.047,96	\$ 2.435.143,70	\$ 462.677,30	\$ 105.046.763,96
29	oct-2023	\$ 8.317.000,00	\$ 1.580.230,00	\$ 25.669.975,76	\$ 641.749,39	\$ 121.932,38	\$ 36.330.887,54
30	nov-2023	\$ 1.501.500,00	\$ 285.285,00	\$ 66.996.451,28	\$ 1.674.911,28	\$ 318.233,14	\$ 70.776.380,71
31	dic-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	ene-2024	\$ 7.638.000,00	\$ 1.451.220,00	\$ 147.828.639,72	\$ -	\$ -	\$ 156.917.859,72
33	feb-2024	\$ 11.860.000,00	\$ 2.253.400,00	\$ 511.352.171,80	\$ -	\$ -	\$ 525.465.571,80
34	mar-2024	\$ 8.532.500,00	\$ 1.621.175,00	\$ 18.845.847,72	\$ -	\$ -	\$ 28.999.522,72
35	abr-2024	\$ 18.819.500,00	\$ 3.575.705,00	\$ 145.144.214,73	\$ -	\$ -	\$ 167.539.419,73
36	may-2024	\$ 4.569.000,00	\$ 868.110,00	\$ 676.115.608,40	\$ 16.902.890,21	\$ 3.211.549,14	\$ 701.667.157,75
37	jun-2024	\$ 1.917.500,00	\$ 364.325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.281.825,00
38	jul-2024	\$ 2.259.500,00	\$ 429.305,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.805,00
39	ago-2024	\$ 12.340.000,00	\$ 2.344.600,00	\$ -	\$ 20.103.812,00	\$ 3.819.724,28	\$ 38.608.136,28
40	sep-2024	\$ 3.131.500,00	\$ 594.985,00	\$ 70.523.472,00	\$ 1.769.087,00	\$ 334.986,00	\$ 76.354.030,00
41	oct-2024	\$ 1.885.000,00	\$ 358.150,00	\$ 91.687.093,46	\$ 2.292.177,00	\$ 435.514,00	\$ 96.657.934,00
42	nov-2024	\$ 1.971.500,00	\$ 374.585,00	\$ 38.797.976,00	\$ 440.772,00	\$ 83.746,68	\$ 41.668.580,00
43	dic-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44	ene-2025	\$ 21.208.000,00	\$ 4.029.520,00	\$ 39.311.520,00	\$ 982.788,00	\$ 186.729,72	\$ 65.718.558,00
SUBTOTAL ACUMULADO		ACUMULADO GESTIÓN	IVA ACUMULADO GESTIÓN	ACUMULADO ADQUISICIÓN	ACUMULADO ADMINISTRACIÓN	IVA ADMIN ACUMULADO	TOTAL IVA
		\$ 434.322.875,00	\$ 82.521.346,25	\$ 3.842.858.158,79	\$ 94.457.870,16	\$ 17.945.855,17	\$ 100.467.201,42
TOTAL ACUMULADO ADQUISICIÓN PREACTA 44, CON MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO		\$	4.472.106.105,37				\$ 3.842.858.158,79
				SALDO POR EJECUTAR (MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 989-		\$ 49.355.180.072,63	DESEMBOLSOS PREDIALES
TOTAL ACUMULADO ADQUISICIÓN PREACTA 44, SEGÚN CIRCULAR 2024I-VBOG-075539		\$	4.472.106.105,37				\$ 3.842.858.158,79
				SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CIRCULAR 2024I-VBOG-075539		\$ 22.728.952.258,63	DESEMBOLSOS PREDIALES

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 79 de 133

5.2.4 Actividades área SST

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de noviembre de 2024.

- **Capacitaciones**

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores tratando los siguientes temas:

- ✓ Socialización actualización Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 20/02/2025
- ✓ Cuidado auditivo: 28/02/2025

- **Accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales por parte de la interventoría, sin embargo, se reportan 2 accidentes de trabajo por parte del contratista durante el periodo ejecutado redundando en incapacidades o periodos de trabajo sin labor.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 80 de 133

Tabla 18. Reporte de ATEL

ÍTEM	Cantidad (unid.) INTERVENTORÍA	Cantidad (unid.) CONTRATISTA
Accidentes de trabajo	0	2
Enfermedades laborales	0	0
TOTAL	0	2

- **No Conformidades**

En el periodo del presente informe se presenta no conformidad notificado mediante registro en libro de obra los días 5, 14 y 17 de febrero del presente año, respecto a la falta de implementación de sistemas seguros de entibados, teniendo en cuenta que se está generando condiciones inseguras tanto para los trabajadores y usuarios de la vía.

5.3 Informes Especialistas

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de Interventoría durante el mes de febrero de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes realizados por cada una de las áreas.

Tabla No 19. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría

AREA	PROFESIONAL	ACTIVIDAD
Ambiental	Gynna Zayde Granados	- Reunión interna de socialización del proyecto celebrada el día 5 de febrero de 2025. - Visita de reconocimiento al proyecto celebrada el día 13 de febrero de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 81 de 133

		- Emisión de concepto referente a la modalidad de pago y condiciones de los rubros a cargo del Plan de Inversión Ambiental, - Avance en la revisión del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental del tramo Casablanca – Ubaté localizado en el K40+070 al K47+452. - Se remitió el concepto asociado al reconocimiento de los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones de compensación ambiental contenidas en el artículo tercero de la Resolución 2029 de 2009 modificada mediante el artículo séptimo de la Resolución 1552 de 2011. Se conceptúa indicando al constructor que los costos asociados a actividades ejecutadas a través de terceros serán reconocidos como Reembolsos de gastos y que, los APU, para actividades directamente ejecutadas por el contratista, adicionalmente, se especificar las exenciones tributarias para productos agroecológicos. Se deben desglosar los costos por anualidad y actividad y plantear a la Manual de Compensación biótica planteando medidas compensatorias diferentes a las siembras y establecimiento de plantaciones, no solo por la complejidad que reviste hallar áreas suficientes para el establecimiento, sino que la obtención del cumplimiento de las obligaciones puede extenderse en el tiempo y está sujeta a diferentes riesgos ambientales y antropogénicos que, sin objeción, debe asumir el constructor. - Por otro lado, dio inicio a la lectura y revisión del Estudio de impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental del tramo Casablanca – Ubaté, cuyo concepto final será emitido en el mes de marzo de 2025. - Se adelantó visita de seguimiento al proyecto con el fin de identificar el área sujeta a la modificación de la licencia ambiental, permitiendo de esta manera reconocer el territorio, y emitir concepto frente a los estudios para modificación del permiso ambiental. - Adicionalmente, se realizó visita al corredor en construcción, realizando sugerencias de mejora al
--	--	---

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 82 de 133

		constructor en las obras de traslado del campamento, puente peatonal y otros.
Geotecnia	Paula Margarita Herrera	- C971-3990-2025 Respuesta comunicado D-000004976 - Estudios geotécnicos del muro de contención proyectado entre el K41+716 y el K41+747 Versión C. - C971-4006-2025 Respuesta comunicado D-000004977 – Estudio geotécnico del pontón proyectado entre el K41+848 y el K41+873 Versión C. - C971-4036-2025 D-000004978 Atención a comentarios C971-2786-2024 (R-000002041) y comentarios generales del C971-3010-2024 (R-000002265), muro K41+773 al K41+785. - C971-4053-2025 Respuesta al comunicado D-000005122 Respuesta a oficio C971-3875-2024 (R-000003035) con asunto: “Respuesta comunicado D-000004953 Estudio Geotécnico obras especiales – Muro K41+684 - K41+702 (Versión F). - C971-4055-2025 Respuesta al oficio D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R-000003079) con asunto: “Respuesta D-000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana – Geotecnia. - C971-4071-2025 Respuesta al comunicado D-000005149 Estudio geotécnico Versión D de los muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 de la vía Casablanca – Ubaté. - C971-4850-2025 Respuesta a oficio D-000004979 Atención a comentarios C971-2786-2024 (R-000002041) y comentarios generales del C971-3010-2024 (R-000002265), muro K41+830 al K41+848.
Pavimentos	Luz Eneida Botina	- C971-4051-2025 Respuesta al comunicado D000005046 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SERVICIO PRESENTE (PSI) EN LA ZONA DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS CON INCUMPLIMIENTO EN EL PARÁMETRO ESTABILIDAD - C971-4064-2025 Respuesta al oficio D-000005300 (13/02/2025) con asunto: Concepto técnico diseño de la estructura del pavimento sin el uso de geotextil en la capa de SBG.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 83 de 133

Estructuras	Samuel Montero	- C971-4005-2025 D-000005180 Entrega de las pruebas de carga de los puentes del tramo Casablanca – Ubaté. - C971-4033-2025 Respuesta comunicado D-000005210 Implementación sección cuneta sector K6+610 – K7+000 vía existente. - C971-4034-2025 Respuesta comunicado D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R-000003079) con asunto: "Respuesta D-000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana. - C971-4052-2025 Respuesta al oficio D-000005266 Entrega del Diseño estructural de la placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave Colombiana.
Transito	Jorge Enrique Diaz Laverde	- C971-3993-2025 Respuesta comunicado D-000005189 PMT No 40 - para actividades de izaje de puente peatonal en el sector AVE Colombiana variante doble calzada fase 2 sentido Nemocón y/o Barandillas – Zipaquirá - C971-3995-2025 Respuesta comunicado D-000005163 plan de manejo de tránsito N°39 para actividades de mantenimiento, mejoramiento, demarcación e ingreso y salida de vehículos de obra sobre el corredor vial de la carretera Zipaquirá – Ubaté - Chiquinquirá (ruta 45A04 y ruta 45A05).
Sostenibilidad	Julián Andrés Ossa Montes	- Se elaboraron los informes trimestrales 3 y 4. - Se encuentran en revisión los informes de sostenibilidad del año 2024 (12 informes).
Abogado	Gerardo Alfonso Salcedo Molina	- C971-3992-2025 PREDIAL, Remisión de Constancia de Ejecutoria del predio 025-D-T2-MCRC del Tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, primer sector 3.9 kilómetros, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS. - C971-4007-2025 PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005146 de fecha 16 enero de 2025, cuyo asunto es: "Radicaion Estudios de títulos predios Tramo 2 -Casablanca- Ubaté correspondiente a los predios identificados con consecutivo INVIAS No. 032-D-T2-MCRC y 035-I-T2-MCRC". - C971-4011-2025 PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005160 del 21 de enero del 2025, cuyo asunto es: "Respuesta a la comunicación R-

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 84 de 133

		000003103 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005151 de fecha 17 de enero del 2025 cuyo asunto es: "Alcance a la comunicación D-000005134 cuyo asunto es: Revisión y verificación de Oficio Oferta de compra e Inscripción de Oferta predios 029-D-T2-MCRC, 030-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-MCRC, 030B-D-T2-MCRC y 031-D-T2-MCRC tramo 2 –Casablanca-Ubaté con observaciones".
Arqueóloga	Xiomara López Santamaria	- C971-3996-2025 Concepto de no aprobación informe mensual social No. 42. Respuesta a comunicado D-000005169 con asunto: Respuesta al oficio C971-3958-2025. - C971-4063-2025 Finalización actividades de laboratorio – componente arqueológico.
Valuatorio	Omar Salcedo	C971-4025-2025 Respuesta al oficio D-000005139. PREDIAL. Revisión y verificación Avalúos del tramo Casablanca-Ubaté de los predios 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC con observaciones.

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, sin embargo, a la fecha del presente informe no se ha tenido ningún pago por parte de la Entidad a las facturas radicadas desde agosto de 2024.

5.5 Informe Matriz de riesgos

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 85 de 133

5.6 Información otros programas y aplicativos

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de obra.

Ilustración 8. Plataforma CIFRA

Objeto Contrato Obra		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.								
Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
197	197	2025-03-21	2025-03-27	2025-03-27				PROCESO		
196	196	2025-03-14	2025-03-20	2025-03-20				PROCESO		
195	195	2025-03-07	2025-03-13	2025-03-13				PROCESO		
194	194	2025-02-28	2025-03-06	2025-03-06	2025-03-13 08:58	2025-03-13 10:26		TERMINADO		
193	193	2025-02-21	2025-02-27	2025-02-27	2025-03-13 08:57	2025-03-13 10:25		TERMINADO		
192	192	2025-02-14	2025-02-20	2025-02-20	2025-03-10 15:02	2025-03-13 10:24		TERMINADO		
191	191	2025-02-07	2025-02-13	2025-02-13	2025-03-10 12:26	2025-03-13 10:21		TERMINADO		
190	190	2025-01-31	2025-02-06	2025-02-06	2025-02-14 09:12	2025-03-13 10:20		TERMINADO		
189	189	2025-01-24	2025-01-30	2025-01-30	2025-02-11 15:02	2025-03-13 10:19		TERMINADO		
188	188	2025-01-17	2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24 07:32	2025-03-13 10:17		TERMINADO		

Así mismo a través de la plataforma Youtube (<https://youtu.be/mWZVxGyDHcs>) mensualmente se sube un video donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 86 de 133

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13).

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14).

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15).

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

Teniendo en cuenta la modificación No 2 realizada al contrato de Interventoría las garantías del contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16).

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Ver anexo No 17

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 87 de 133

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II.

- Plan de Cargas:

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 aprobado por la Entidad se encuentra en el anexo No 18.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 88 de 133

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Área Técnica

Mantener las cuadrillas de personal para agilizar la terminación de las obras transversales en referencia a la nivelación e instalación de tapas de las cajas de transición, así mismo, continuar con las cuadrillas de personal que vienen realizando las obras faltantes para la terminación de la Glorieta de Ave Colombiana.

Se informó y solicitó al Contratista que la actividad de mantenimiento periódico y preventivo, debe hacerse permanentemente en todo el corredor para mantener la seguridad vial y con esto contribuir a mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía, dado que, se han incrementado las precipitaciones en la zona de desarrollo del proyecto, lo que conlleva que se incrementen baches, hundimientos y daños en la carpeta asfáltica, generando la probabilidad de riesgo de accidente a los actores viales.

De la misma manera, se ha solicitado al Consorcio Vial MHC 063, de acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato, realizar periódicamente la demarcación vial, con énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la demarcación existente, tanto de líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y mantener la seguridad vial en el corredor a cargo.

Se solicita al Contratista que se disponga del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de las actividades de obra en óptimas condiciones de servicio, con el fin de garantizar un rendimiento adecuado en las actividades ejecutadas y evitar la prolongación de las jornadas de trabajo a horario nocturno.

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para este año.

Las acciones a seguir por parte de la Interventoría, se enfocan en el control y supervisión del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 89 de 133

contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de interventoría vigente.

- Área Social

Se ha atendido al 97% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad al contrato 989 del 2021.

Se cuenta con un avance del 80% en el levantamiento de actas de vecindad de cierre en el tramo 1. Se proyecta por parte del contratista continuar con la actividad una vez se finalicen las labores de obra en el sector de ave colombiana.

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia directa.

Se realizó la entrega de (602) piezas comunicativas con información de actividades de obra y avance contractual a la comunidad del área de influencia directa del contrato 989 del 2021.

En el presente periodo, se llevó a cabo mesa de trabajo entre el contratista y la interventoría para evaluar la solicitud de cambio en la forma de pago de las Obras con Participación Comunitaria a través de ítem no previsto, por lo cual, se emitió concepto por parte de interventoría y se solicitó enviar la documentación requerida en el manual de interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en un plazo no mayor a (5) días hábiles.

.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 90 de 133

- Área Ambiental

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de la licencia ambiental, Para lo cual se realizará una reunión entre las partes para el mes de marzo.

El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que cuenta el proyecto.

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden comprometer el componente ambiental del proyecto.

- Área Predial

Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados.

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malos entendidos con la comunidad.

Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 91 de 133

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el del tramo 1.

Es importante ya tener el plan de inversión general, con los recursos asignados de la bolsa predial y cronograma de la gestión predial del tramo 2, para el buen control y seguimiento de parte de la interventoría, con la actualización del diagnóstico predial, para determinar con más precisión los costos reales a ejecutar.

- Área SST

Se mantiene en cero el indicador de accidentalidad en el grupo de colaboradores de la interventoría.

Se solicita al contratista implementar mejores sistemas de contención de talud en las actividades que implican excavaciones cuyo ángulo de seguridad no es el indicado generando condiciones inseguras para trabajadores y usuarios de la vía.

Las actividades de armado de puente peatonal en el sector de la glorieta calle 8 se ha adelantado implementando las respectivas medidas de seguridad mitigando así ocurrencia de incidentes.

Las actividades de mantenimiento y demarcación de la carpeta asfáltica en las rutas 45 A 04, 05 y 06, se ejecutan implementando los respectivos planes de manejo de tráfico no objetados para estas actividades.

.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 92 de 133

8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

Tabla No 20. Correspondencia Enviada Interventoría

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
3-feb-25	C971-3993-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005189 PMT No 40 - PARA ACTIVIDADES DE IZAJE DE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR AVE COLOMBIANA VARIANTE DOBLE CALZADA FASE 2 SENTIDO NEMOCÓN Y/O BARANDILLAS – ZIQAQUIRÁ
3-feb-25	C971-3994-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Javier Cañon Bonilla	Respuesta Radicado 2025E-VUVR006723 – Mantenimiento vial
3-feb-25	C971-3995-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005163 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO N°39 PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, DEMARCACIÓN E INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA CARRETERA ZIQAQUIRÁ – UBATÉ - CHIQUINQUIRÁ (RUTA 45A04 Y RUTA 45A05)
3-feb-25	C971-3996-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto de no aprobación informe mensual social No. 42. Respuesta a comunicado D-000005169 con asunto: Respuesta al oficio C971-3958-2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 93 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
4-feb-25	C971-3997-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005043. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial 009-D-T2-MCRC con observaciones.
4-feb-25	C971-3998-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005108. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial 008-D-T2-MCRC con observaciones.
4-feb-25	C971-3999-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a radicado 2025E-VUVR006383 – Solicitud Inspección Vía Zipaquirá-Bucaramanga
4-feb-25	C971-4000-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión de los oficios 2024S-VBOG-005281, que aborda la revisión y aprobación del insumo jurídico del predio 021-D-T2-MCRC, y el oficio 2024S-VBOG-004724, el cual corresponde a la inscripción de la oferta.
4-feb-25	C971-4001-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000004850. PREDIAL. Revisión y verificación de las fichas prediales de los predios 016-D-T2-MCRC y 017-D-T2-MCRC con observaciones.
4-feb-25	C971-4002-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Remisión de las Ficha predial 001B-I-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
4-feb-25	C971-4003-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000004989. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 039-I-T2-MCRC con observaciones.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 94 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
4-feb-25	C971-4004-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión de los oficios 2024S-VBOG-005275, 2024S-VBOG-004753, 2024SVBOG-004756, 2024S-VBOG-004936 y 2024S-VBOG-004937.
4-feb-25	C971-4005-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	D-000005180 Entrega de las pruebas de carga de los puentes del tramo Casablanca – Ubaté.
5-feb-25	C971-4006-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000004977 – Estudio geotécnico del pontón proyectado entre el K41+848 y el K41+873 Versión C
5-feb-25	C971-4007-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005146 de fecha 16 enero de 2025, cuyo asunto es: "Radicacion Estudios de títulos predios Tramo 2 -Casablanca- Ubaté correspondiente a los predios identificados con consecutivo INVIAS No. 032-D- T2-MCRC y 035-I-T2-MCRC"
5-feb-25	C971-4009-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Aldo Bastidas Godoy	Reiteración solicitud pago acreencias e intereses moratorios por el no pago de las facturas correspondientes a las Actas de Costos de Interventoría y Reiteración solicitud de suspensión contrato de Interventoría.
6-feb-25	C971-4010-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Remisión de la ficha predial 026-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 95 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
6-feb-25	C971-4011-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005160 del 21 de enero del 2025, cuyo asunto es: "Respuesta a la comunicación R-000003103 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005151 de fecha 17 de enero del 2025 cuyo asunto es: "Alcance a la comunicación D-000005134 cuyo asunto es: Revisión y verificación de Oficio Oferta de compra e Inscripción de Oferta predios 029-D-T2-MCRC, 030-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-MCRC, 030B-D-T2-MCRC y 031-D-T2-MCRC tramo 2 –Casablanca-Ubaté con observaciones"
6-feb-25	C971-4013-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Entrega informe trimestral No. 14 estado social del Contrato 989 – 2021 correspondiente al periodo entre los meses de octubre a diciembre de 2024
6-feb-25	C971-4014-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Alcance al oficio C971-4002-2025, Remisión de la ficha predial 001B-I-T2- MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
6-feb-25	C971-4015-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 190
6-feb-25	C971-4016-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Atención a correo electrónico con asunto: Gestiones adelantadas para el traslado de la oficina SAU de sutatausa / Consortio Vial MHC 063.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 96 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
6-feb-25	C971-4017-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2024S-VBOG-006378, que aborda la revisión y visto de no objeción del informe mensual No 28 del mes de octubre del 2024.
10-feb-25	C971-4018-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Radicacion Minuta de Escritura – Tramo 2 -Casablanca – Ubate correspondiente al predio identificados con consecutivo INVIAS No 030A-D-T2-MCRC.
10-feb-25	C971-4019-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Remisión del Estudio de Titulos del predio 024 A- D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no objeción.
10-feb-25	C971-4020-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Atención al comunicado D-0000004929. Solicitud de Certificación de Presencia de comunidades Étnicas- Consulta Previa.
10-feb-25	C971-4021-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000004928 asunto "INCUMPLIMIENTO PARÁMETROS MEZCLA ASFALTICA MDC-19 Y MDC-25 JORNADA DEL 08/08/2024.
10-feb-25	C971-4022-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005141 del 10 de enero de 2025, con Asunto: "Entrega Informe Ambiental No 42 – diciembre 2024".
13-feb-25	C971-4023-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – solicitud de retiro equipo fresadora CAT PR 450 C

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 97 de 133

FECHA DE ENVÍO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
13-feb-25	C971-4024-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Reiteración solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales – Maquinaria y Equipo.
13-feb-25	C971-4025-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005139. PREDIAL. Revisión y verificación Avalúos del tramo Casablanca-Ubaté de los predios 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC con observaciones.
13-feb-25	C971-4026-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Nelson Eduardo Páez Obando	Respuesta a radicado 2025VUVR-012432 Información ejecución proyecto Vial Pacto Bicentenario – Vía Zipaquirá – Ubaté - Chiquinquirá
13-feb-25	C971-4027-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005242. Observaciones informe mensual social No. 43 y anexos.
13-feb-25	C971-4029-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Remisión de las Fichas prediales 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
13-feb-25	C971-4030-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión oficio 2025S-VBOG-006777, que aborda la revisión y No Objeción de los Estudios de Título de los predios 073-D-T2-MCRC y 074-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté,

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 98 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
13-feb-25	C971-4031-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Traslado de oficio 2025S-VBOG-006845, que aborda la remisión de constancia de ejecutoria del predio 025-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté,
13-feb-25	C971-4032-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Miyey Nayary Suarez Páez	Respuesta a derecho de petición Interventorías Obras Construcción. Corredores viales Pacto Bicentenario.
13-feb-25	C971-4033-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005210 Implementación sección cuneta sector K6+610 – K7+000 vía existente
13-feb-25	C971-4034-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R-000003079) con asunto: "Respuesta D-000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana
13-feb-25	C971-4035-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 191
17-feb-25	C971-4036-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	D-000004978 Atención a comentarios C971-2786-2024 (R-000002041) y comentarios generales del C971-3010-2024 (R-000002265), muro K41+773 al K41+785

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 99 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
17-feb-25	C971-4037-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado de radicado Invias 2025S-VBOG-007386 del 10 de febrero de 2025, con asunto: "Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-129112 y 2025EVUVRAZ-008373. Cambio menor Puente Vehicular entre las abscisas K44+497 a K44+604. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021
17-feb-25	C971-4038-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-007610, que aborda la revisión y aprobación de la parte técnica el insumo de Ficha Predial del predio 001B-I-T2-MCRC
17-feb-25	C971-4039-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Remisión de Minuta de Escritura – Tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, del predio 030B-D-T2-MCRC, para revisión y Visto de no objeción
18-feb-25	C971-4040-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Alcance al oficio C971-4010-2025, Remisión de las Ficha Predial 026-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
18-feb-25	C971-4041-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Respuesta al Radicado 2025VUVR-015646 - Información estado actual convenio - vía Doble calzada Ubaté

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 100 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
18-feb-25	C971-4042-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado, D-000005214, con el asunto: Radicación Ficha Social Casablanca-Ubaté, predios; 021-D-T2-MCRC-022-D-T2 MCRC-023-D-T2-MCRC-029-D-T2-MCRC-030-D-T2-MCRC-030A-D-T2-MCRC-030B-D-T2-MCRC 031-D-T2-MCRC
18-feb-25	C971-4043-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Marlon Gamboa Duarte - Dirección Territorial Santander	Actualización de información sobre el material de fresado disponible en jurisdicción del departamento de Santander, a diciembre de 2024.
18-feb-25	C971-4044-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2024S-VBOG-008526, que aborda la revisión y aprobación de la pre-acta No 44 del mes de enero 2025.
18-feb-25	C971-4045-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Radicado 2025E-VUVR011938
18-feb-25	C971-4046-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Radicado 2025E-VUVR011864 – Ocupación Indevida de Predio Vía 45 A CNB PR 3 Variante Zipaquirá

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 101 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
18-feb-25	C971-4047-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Traslado derecho de petición 2025E-VUVR-006272 - Memorando 2025IVBOG-007429 – Solicitud acceso predio - Aprecruz
18-feb-25	C971-4048-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Javier Cañon Bonilla	Respuesta Derecho de petición - Radicado Invias 2025EVUVR-010736- información doble calzada Zipaquirá – Ubaté.
19-feb-25	C971-4849-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a oficio D 000005267 con asunto: Alcance a su oficio C971-3996-2025 (R-000003131) / Concepto no aprobación Informe Mensual Social No. 42.
19-feb-25	C971-4850-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a oficio D-000004979 Atención a comentarios C971-2786-2024 (R-000002041) y comentarios generales del C971-3010-2024 (R-000002265),muro K41+830 al K41+848
19-feb-25	C971-4851-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Remisión del informe predial mensual No. 31 correspondiente al mes de enero de 2025 del Consortio Vial MHC 063.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 102 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
19-feb-25	C971-4852-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005131 de fecha 09 enero de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al oficio R-000003072 (C971-3927-2024) cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005036. PREDIAL. Revisión y verificación de los Estudios de Títulos predios Tramo 2 – Casablanca – Ubaté, con observaciones
19-feb-25	C971-4853-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005106. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 010-D-T2-MCRC con observaciones.
20-feb-25	C971-4049-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 192
21-feb-25	C971-4050-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Remisión de Demanda de expropiación predio 025-D-T2-MCRC, Tramo 2 – Casa Blanca – Ubaté, para revisión y Visto de no objeción.
21-feb-25	C971-4051-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D000005046 - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SERVICIO PRESENTE (PSI) EN LA ZONA DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS CON INCUMPLIMIENTO EN EL PARÁMETRO ESTABILIDAD

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 103 de 133

FECHA DE ENVÍO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
21-feb-25	C971-4052-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005266 Entrega del Diseño estructural de la placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave Colombiana
21-feb-25	C971-4053-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005122 Respuesta a oficio C971-3875-2024 (R-000003035) con asunto: "Respuesta comunicado D-000004953 Estudio Geotécnico obras especiales – Muro K41+684 - K41+702 (Versión F).
21-feb-25	C971-4054-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005155. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 028-D-T2-MCRC con observaciones.
21-feb-25	C971-4055-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R-000003079) con asunto: "Respuesta D- 000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana – Geotecnia
24-feb-25	C971-4056-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-009993, que aborda la revisión y aprobación de la parte técnica el insumo de Ficha Predial del predio 026-D-T2-MCRC,

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 104 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
24-feb-25	C971-4057-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005152 de fecha 17 enero de 2025 y D-000005335 de fecha 21 febrero de 2025, de asunto: "Alcance a la comunicación D- 000005131 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005036. PREDIAL. Revisión y verificación de los Estudios de Títulos predios Tramo 2 – Casablanca – Ubaté, con observaciones". y Respuesta a la comunicación R-000003178 de asunto: "Revisión y verificación de los estudios de títulos identificados con consecutivo INVIAS No. 075D-T2-MCRC y 076D-T2-MCRC".
24-feb-25	C971-4058-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a oficio D 000005329 con asunto: Respuesta a oficio C971-4016-2025 (R-000003147) / Atención a correo electrónico con asunto: Gestiones adelantadas para el traslado de la oficina SAU de Sutatausa / Consortio Vial MHC 063.
24-feb-25	C971-4059-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Remisión Pre acta predial No. 45 del mes de FEBRERO de 2025, para revisión y visto de no objeción.
25-feb-25	C971-4060-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: "Trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 105 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
25-feb-25	C971-4061-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: "Trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009".
25-feb-25	C971-4062-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Solicitud Reactivación Parcheo Ruta 45A05 – tramo Garavito - Puente Nacional.
25-feb-25	C971-4063-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Finalización actividades de laboratorio – componente arqueológico.
25-feb-25	C971-4064-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005300 (13/02/2025) con asunto: Concepto técnico diseño de la estructura del pavimento sin el uso de geotextil en la capa de SBG.
25-feb-25	C971-4065-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Javier Cañon Bonilla	Respuesta a derecho de petición Personería Municipal de Oiba.
25-feb-25	C971-4066-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 018-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
25-feb-25	C971-4067-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005336 Entrega iluminación de Ave Colombiana Versión E.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 106 de 133

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
27-feb-25	C971-4069-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 193
28-feb-25	C971-4070-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado, D-000005326. Observaciones informe mensual social No. 43 versión 1.
28-feb-25	C971-4071-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005149 Estudio geotécnico Versión D de los muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 de la vía Casablanca – Ubaté.
28-feb-25	C971-4072-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Atención al comunicado D-000005193 del 05 de febrero de 2025, con asunto: “ Entrega del Informe ICA No. 7, correspondiente al 01 de julio al 30 de diciembre de 2024. Expediente LAM 4576”.
28-feb-25	C971-4073-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Concepto al comunicado D-000005193 del 05 de febrero de 2025, con Asunto: “Entrega del Informe ICA No. 7, correspondiente al 01 de julio al 30 de diciembre de 2024. Expediente LAM 4576”.
25-feb-25	C971-4074-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Remisión de las Ficha predial 015-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción
28-feb-25	C971-4075-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Información de traslado oficina de Servicio de Atención al Usuario – SAU y cambio en el horario presencial, contrato de obra 989 de 2021

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 107 de 133

Tabla No 21. Correspondencia Recibida Interventoría

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005227	6-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Reunión No. 17 del Comité de Participación Comunitaria – Variante Zipaquirá
D-000005190	3-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R-000003079) con asunto: "Respuesta D-000004757 Entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana y el Diseño del muro de contención del descole del Arco metálico"
2025S-VCUN-005593	3-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-003313
2025S-VBOG-005601	3-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-005028
D-000005195	5-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión de los informes de sostenibilidad del 31 al 42 para el periodo de 2024 corregidos.
D-000005233	6-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Minuta de Escritura- Tramo 2 -Casablanca-Ubaté correspondientes al predio identificados con consecutivo INVIAS No. 030A-D-T2-MCRC.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 108 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005191	4-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega del estudio geotécnico del arco metálico del sector K40+800 tramo Casablanca – Ubaté.
D-000005192	4-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No.187 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005221	6-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-3948-2024 "R-000003091 "Contrato 989 de 2021 – Reiteración demarcación Vial."
D-000005222	6-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-3931-2025 R-000003078 "Traslado de radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-114010 - ALERTA NARANJA POR DERRUMBE ACTIVO EN EL PR 24+0300 VIA UBATE PUENTE NACIONAL 45A05".
D-000005238	7-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003133 (C971-3997-2025) cuyo asunto es "Respuesta al oficio D-000005043. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial 009-D-T2-MCRC con observaciones."
DERECHO DE PETICION	5-feb-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE OIBA	MARIA LUCILA SARMIENTO AGUILAR	INTERVENCION PUENTE UBICADO EN VIA NACIONAL MUNICIPIO OIBA

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 109 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005196	5-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-3718-2024 (R-2907) Contrato 989 de 2021 – Respuesta oficio D-000004864 – Solicitud de aprobación ítems no previstos
D-000005197	5-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	ENTREGA DE INFORMES MEPI – ENSAYOS DE LABORATORIO CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS ENERO 2025.
2025S-VBOG-006382	5-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-005556
2025S-VBOG-006378	5-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003969
D-000005210	5-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Implementación sección cuneta sector K6+610 – K7+000 vía existente.
D-000005214	5-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Ficha Social Casablanca-Ubaté, predios; 021-D-T2-MCRC-022-D-T2-MCRC-023-D-T2-MCRC-029-D-T2-MCRC-030-D-T2-MCRC-030A-D-T2-MCRC-030B-D-T2-MCRC-031-D-T2-MCRC.
D-000005234	6-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000002838 (C971-3651-2024) cuyo asunto es "Respuesta al oficio D-000003499. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial de mejora, predio 001A-1-D-T2-MCRC."

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 110 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005237	7-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-3763-2024 (R-000002947) con asunto: "Traslado de comunicado INVIAS 2024S-VBOG-080773 del 01 de noviembre de 2024, con Asunto: "Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-090508. Solicitud de reconocimiento económico para la elaboración de la Tomografía Geoelectrica, manantial K44+670. Modificación Licencia Ambiental. CO 9892021, CI 971-2021
D-000005239	7-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación R-000003142 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005151 de fecha 17 de enero del 2025 cuyo asunto es: "Radicación Estudios de títulos predios Tramo 2 - Casablanca- Ubaté correspondiente a los predios identificados con consecutivo INVIAS No. 032-DT2-MCRC y 035-I-T2-MCRC".
D-000005243	10-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Reconocimiento económico obligación compensación ambiental y obras de participación comunitaria a través ítems no previstos.
D-000005244	10-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Minuta de Escritura- Tramo 2 -Casablanca-Ubaté correspondientes al predio identificados con consecutivo INVIAS No. 030B-D-T2-MCRC.
D-000005261	11-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003134 (C971-3998-2025) cuyo asunto es "Respuesta al oficio D-000005108. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial 008-D-T2-MCRC con observaciones."
D-000005262	11-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003082 (C971-3937-2025) cuyo asunto es "Respuesta a oficio D-000004986. PREDIAL. Revisión y verificación ficha predial del predio, 036-D-T2-MCRC con observaciones."

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 111 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
DERECHO DE PETICION	7-feb-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE OIBA	MARIA LUCILA SARMIENTO AGUILAR	INTERVENCION PUENTE UBICADO EN VIA NACIONAL MUNICIPIO OIBA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS_ Actas
2025S-VBOG-006777	7-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta alcance 2024E-VUVRAZ-134118 - oficio No. C971-3925-2024.
2025S-VBOG-006845	7-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-010826
D-000005242	7-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Mensual Social No. 43.
2025E-VUVR-013483	7-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Derecho de petición Zipaquirá
2025I-VBOG-006372	7-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Socialización Resolución 00221 de 2025

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 112 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025E-VUVRAZ-005445	7-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	INFORME ESPECIAL DE POLICÍA EN SEGURIDAD VIAL No. 006
2025E-VUVR-012432	10-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIME RAMIREZ	Derecho de Petición instaurado por el señor Nelson Eduardo Páez Obando
D-000005245	10-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4021-2025; R000003153 al "Respuesta al comunicado D-000004928 asunto "INCUMPLIMIENTO PARÁMETROS MEZCLA ASFALTICA MDC-19 Y MDC-25 JORNADA DEL 08/08/2024"
2025S-VBOG-007386	10-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-129112y 2025E-VUVRAZ-008373. Cambio menor. Puente Vehicular entre las abscisas K44+497 a K44+604. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021
2025S-VBOG-007382	10-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-126710. Acta de Oralidad No. 774 de 2024 ANLA. Expediente LAM 4576. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté, en 41 kilómetros. Exp: LAM4576. CI 971-2021, CO 989-2021
2025S-VBOG-007377	10-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO - SS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-121417. Cambio menor: Área hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cauces. Expediente LAM 4576. CI 971-2021, CO 989-2021

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 113 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
DERECHO DE PETICION	11-feb-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE OIBA	MARIA LUCILA SARMIENTO AGUILAR	Solicitud de Informe de los compromisos pendientes en acta de fecha 29 de Octubre de 2024.
2025S-VCUN-007499	11-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-114010
2025S-VBOG-007610	11-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	VISTO DE NO OBJECION PREDIAL
2025E-VUVR-006272-2025I-VBOG-007429	11-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	Traslado derecho de petición 2025E-VUVR-006272. Memorando 2025I-VBOG-007429
D-000005263	11-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No.188 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005264	11-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de Minuta de Demanda de expropiación - correspondiente al predio identificado con consecutivo INVIAS No. 025-D-T2-MCRC.
D-000005267	12-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a su oficio C971-3996-2025 (R-000003131) / Concepto no aprobación Informe Mensual Social No. 42. Respuesta a comunicado D-000005169 con asunto: Respuesta al oficio C971-3958-2025

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 114 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005269	12-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Ambiental No 43 - enero 2025.
2025S-VBOG-007605	12-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	VISTO DE NO OBJECION PREDIAL
2025E-VUVR-011938	12-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	DERECHO DE PETICION Marco Antonio Perico Martínez
2025E-VUVR-011864	12-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	DERECHO DE PETICION Ocupación de predio
D-000005266	12-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega del Diseño estructural de la placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave Colombiana.
D-000005270	12-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	respuesta al comunicado C971-3369-2024 R-000002611 Solicitud información horario personal Consorcio Vial MHC 063
2025S-VBOG-008101	12-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-012835

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 115 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005316	17-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio R-000003054, C971-3896-2024 con asunto: Concepto al comunicado D-000005078 del 16 de diciembre de 2024, con asunto: "Atención oficio R-000002964, C971-3782-2024 con asunto: Incumplimiento del contratista en el programa de manejo del recurso hídrico establecido en el PMA de la licencia ambiental, otorgada por la Resolución 2029 de 2009.
2025E-VUVRAZ-015584	13-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	INFORME ESPECIAL DE POLICÍA EN SEGURIDAD VIAL No. 036 Bogotá Ubaté
2025E-VUVR-015646	13-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Requerimiento Jaime Torres Suarez
D-000005313	13-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3922-2024 (R-000003067) con asunto: Respuesta comunicado D-000005027 Respuesta al oficio C971-3669-2024 R000002855) con asunto: "Respuesta comunicado D-000004712 Entrega de los diseños estructurales de los Pontones K41+846 y K43+198
D-000005300	20-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Concepto técnico diseño de la estructura del pavimento sin el uso de geotextil en la capa de SBG.
2025S-VBOG-008526	14-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIR FERNANDO ARGUELLO UREGO	Alcance al Radicado 2025E-010196 de la pre-acta No 44 por falla del sistema

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 116 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005301	14-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión del Presupuesto para el retiro y reubicación de la Infraestructura de Media y Baja tensión ubicada en los 4.5km, desde el peaje Casablanca hacia Ubaté. Orden de servicio ENEL SALESFORCE 667022905.
D-000005312	14-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud aprobación Plan de Compensación, obligación Licencia Ambiental Resolución 2029 de 2009.
D-000005314	14-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3185-2024 (R-000002431) con asunto: "Respuesta comunicado D- D-000004085 Respuesta al oficio C971-3035-2024 (R-000002282) con asunto: Revisión Alternativas cruce línea Férrea (Alternativa 1 K4+020 - K4+100 - Alternativa 2 K3+890 - K4+100)"
D-000005314	14-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3185-2024 (R-000002431) con asunto: "Respuesta comunicado D- D-000004085 Respuesta al oficio C971-3035-2024 (R-000002282) con asunto: Revisión Alternativas cruce línea Férrea (Alternativa 1 K4+020 - K4+100- Alternativa 2 K3+890 - K4+100)"
D-000005315	14-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Documentación Dossier de calidad Puente peatonal Zipaquirá
D-000005318	17-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3836-2024 (R-000003001) con asunto: "Respuesta comunicado D-000004694 informe final componente de geotecnia – estabilidad de taludes versión B

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 117 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-008905	17-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRÓ FERNANDO ARGUELLO UREGO	Alcance al Radicado 2025S-VBOG-008526 del pre-acta No 44 por falla del sistema
D-000005319	19-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No.189 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005322	19-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación R-000003144 cuyo asunto es: "Revisión y verificación de Oficio Oferta de compra e Inscripción de Oferta del predio 031-D-T2-MCRC".
D-000005323	19-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3990-2025 (R-000003123) con asunto: "Respuesta comunicado D-000004976 - Estudios geotécnicos del muro de contención proyectado entre el K41+716 y el K41+747 Versión C"
2025E-VUVR-011864	19-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Ocupación indebida de predio Hugo Triana
D-000005327	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4006-2025 (R-000003141) con asunto: Respuesta comunicado D-000004977 - Estudio geotécnico del pontón proyectado entre el K41+848 y el K41+873 Versión C.
D-000005336	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega iluminación de Ave Colombiana Versión E.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 118 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-009993	20-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-017387
D-000005324	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Documentación Dossier de calidad Puente peatonal Zipaquirá
D-000005325	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-3964-2025 (R-000003102) / Solicitud de programación de reunión de inicio y ejecución programa de Obra con Participación Comunitaria vereda Susaguá, municipio de Cogua.
D-000005326	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a su oficio C971-4027-2025 (R-000003161) / Respuesta al comunicado D-000005242. Observaciones informe mensual social No. 43 y anexos.
D-000005329	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-4016-2025 (R-000003147) / Atención a correo electrónico con asunto: Gestiones adelantadas para el traslado de la oficina SAU de Sutatausa / Consorcio Vial MHC 063.
D-000005335	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación R-000003178 cuyo asunto es: "Revisión y verificación de los estudios de títulos identificados con consecutivo INVIAS No. 075D-T2-MCRC y 076D-T2-MCRC".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 119 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005340	24-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Estudio de títulos - Tramo 2 - Casablanca-Ubaté correspondiente al predio identificado con consecutivo INVIAS No. 001B-I-T2-MCRC.
D-000005342	24-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4001-2025 referente a revisión y verificación de las fichas prediales de los predios 016-D-T2-MCRC y 017-D-T2-MCRC
D-000005337	21-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de la Preacta No. 045 del componente predial para revisión y remisión a INVIAS por parte de Interventoría.
D-000005341	24-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Minutas de Escritura pública tramo Casablanca -Ubaté
D-000005344	25-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Diseño de la estructura de cuneta – Glorieta de Ave Colombiana

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 120 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-010493	24-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA	RESPUESTA A RADICADO 2025E-VUVRAZ-001513 - SOLICITUD DE APROBACIÓN CAMBIO ESPECIALISTA AMBIENTAL
D-000005352	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003187 (C971-4054-2025) cuyo asunto es "Respuesta al oficio D-000005155. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 028-D-T2-MCRC con observaciones."
D-000005356	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos
D-000005343	25-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	CONCEPTO TECNICO DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SIN EL USO DE GEOTEXTIL EN LA CAPA DE SBG

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 121 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005345	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación R-000003191 (C971-4057-2025) cuyo asunto es: "Revisión y verificación de los estudios de títulos identificados con consecutivo INVIAS No.075D-T2-MCRC y 076D-T2-MCRC".
D-000005346	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No.190 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005350	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de expediente predial para revisión de Insumos Técnicos
D-000005351	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3501-2024 (R-000002707) con asunto: "Respuesta comunicado D-000004527 Entrega de los ZODMES 1 y 2 del tramo Peaje Casablanca – Ubaté
D-000005357	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Personal profesional mínimo requerido – PMR, Residente de obra y Especialista en Sostenibilidad

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 122 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005361	27-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión acta de modificación de cantidades No. 19 y reprogramación plan de inversión No. 21
D-000005362	27-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Compromiso Proceso Compensación predio Don Benito (13,7 Ha) y sector ronda de río Susaguá (Predio Nro. Matrícula 176-78654).
2025E-VUVR-018900	26-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Radicación de Derecho de Petición sobre el Restablecimiento del Doble Sentido en la Carrera 36 de Zipaquirá
2025E-VUVR-020357	26-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	REITERACION DE SOLICITUD DE ARREGLO Y SENALIZACION DE LA CARRERA 36 TRAMO SECTOR LA PAZ

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 123 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005354	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-4067-2025 (R-000003199) con asunto: "Respuesta comunicado D-000005336 Entrega iluminación de Ave Colombiana Versión E."
2025S-VCUN-011455	26-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO-DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-011938
D-000005355	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4052-2025 (R-000003184) con asunto: "Respuesta al oficio D-000005266 Entrega del Diseño estructural de la placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave Colombiana."
2025S-VBOG-011478	26-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO UREGO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-018142

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 124 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005358	26-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4034-2025 (R-000003165) con asunto: "Respuesta comunicado D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R000003079) con asunto: "Respuesta D- 000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana"
D-000005359	27-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4055-2025 (R-000003188) con asunto: "Respuesta al oficio D-000005190 Respuesta al oficio C971-3933-2025 (R000003079) con asunto: "Respuesta D- 000004757 entrega de la estructura de cierre del Arco Metálico de Ave Colombiana – Geotecnia."
2025S-VCUN-011666	27-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO-DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Traslado por competencia. Radicado INVIAS 2025E-VUVR-013483 Calle 19, barrio San Juanito, municipio de Zipaquirá.
D-000005360	27-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4064-2025 – R000003197 "Respuesta al oficio D-000005300 (13/02/2025) con asunto: Concepto técnico diseño de la estructura del pavimento sin el uso de geotextil en la capa de SBG."
D-000005365	28-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-3653-2024 Contrato 989 de 2021 – Requerimiento Programa de Obra y Reprogramación Programa de Inversión Recursos vigencia 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 125 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VCUN-011710	27-feb-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO-DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-015646
D-000005364	27-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al D-000005210 con asunto: "Implementación sección cuneta sector K6+610 – K7+000 vía existente."
D-000005367	28-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-3637-2024 (R-2824) Respuesta comunicado D-000004738 Remisión acta de modificación de cantidades No. 17 y reprogramación de plan de inversión No. 19
D-000005366	28-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Traslado de la oficina SAU de Zipaquirá / Consorcio Vial MHC 063
D-000005368	28-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4036-2025 (R-000003168) con asunto: "D-000004978 Atención a comentarios C971-2786-2024 (R-000002041) y comentarios generales del C971-3010-2024 (R-000002265), muro K41+773 al K41+785"

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 126 de 133

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005369	28-feb-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión de Informe mensual No. 32 correspondiente al mes de febrero de 2025.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 127 de 133

8.2 Registro fotográfico

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de febrero de 2025.

Tabla No 22. Registro Fotográfico actividades

 miércoles, 5 de febrero de 2025 21:26 Izaje de pasarela entre pila 3 - 4 Puente peatonal Sector ave colombiana Consortio Iceacsa - Tpf	 TRAMO 2, SEGUNDA CALZADA, K44+200 - K44+250 COMPACTACIÓN DE CAPA CORONA DE TERRAPLÉN.
 miércoles, 5 de febrero de 2025 Amarre de acero en muro de contención Obra susagua Sector ave colombiana Consortio Iceacsa - Tpf VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE ZARPA Y ARMADO DE ACERO DE MURO DE CONTENCIÓN EN BOX DE TRANSICION.	 miércoles, 5 de febrero de 2025 Trabajos de soldadura Rampa 2, puente peatonal Sector ave colombiana Consortio Iceacsa - Tpf VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, TRABAJOS DE SOLDADURA EN RAMPA 2.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 128 de 133



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE MÓDULO 1 DE CANAL DE ACCESO



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR EN PASARELA DE PILA 2 Y 3




TRAMO 2, K44+160 - K44+180, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y 1er CAPA DE TERRAPLEN



TRAMO 2, OBRA No 31, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 900mm

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 129 de 133

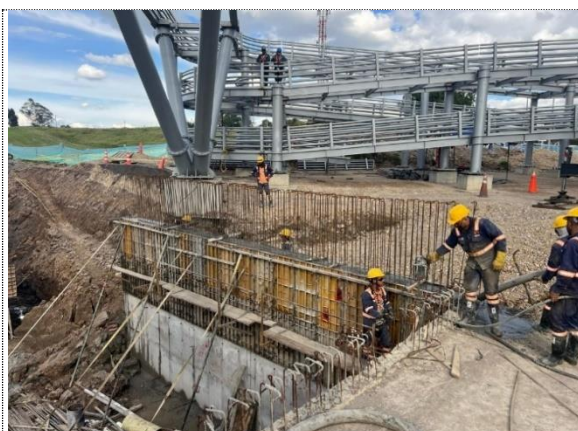

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MURO DE CONTENCIÓN



PARCHEO RUTA 45 A 05, SUSÁ, PR28+0953 - PR28+0962, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19



VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE COLUMNA ORIENTAL DE PÓRICO DE SALIDA DE ARCO METÁLICO



TRAMO 2, K44+180 OBRA No 31, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 900mm

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 130 de 133



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE MÓDULO 3 DE CANAL DE ACCESO



DEMARCACIÓN RUTA 45 A 07, SAN GIL - CURITÍ, PR5+0800 - PR11+0320, DOBLE LÍNEA AMARILLA DE EJE



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE BORDILLO SOBRE PÓRTICO DE TRANSICIÓN Y PLACA TRIANGULAR, COTA BAJA



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, INSTALACIÓN DE PLACAS ALVEOLARES EN RAMPA 2

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 131 de 133

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de febrero de 2025.

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades socioambientales

	
INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE CAMPAMENTO EN TRAMO 2	REUNIÓN PERSONERIA DE TAUSA
	
SEGUIMIENTO PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ 13-02-2025	VERIFICACION CAMBIO DE OFICINA MUNICIPIO DE SUTATAUSA

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 132 de 133



ACOMPAÑAMIENTO ÁREA SOCIOPREDIAL PREDIO 031-D-T2-MCRC 21-02-2025



DIVULGACION VOLANTE No 102 TRASLADO OFICIAN SAU SUTATAUSA



REUNION PROCURADURIA NACIONAL.



INSPECCION MATERIAL DE FRESADO CAMPAMENTO

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 45 INVIAS-IM – 0971-2021 FEBRERO DE 2025	Hoja 133 de 133

8.4 Bitácora

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en los diferentes frentes de obra.
