

[illegible]



ENDA
CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.970.280-2

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

VERSION

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO

FECHA:

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:

Jorge Osorio

FECHA: DI 27 M 12 A 21

ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS
M A Q U I N A R I E Q U I P O S	SEIRI Clasificar	13. El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpios, libres de materiales innecesarios.	X			
H E R R A M I E N	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: Di 27 W 12 A 24		
ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		NO CUENTA CON ESTE SERVICIO FIJO
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
M A N E J O U O S	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y E A L T I Z M A T O R I O S	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio			FECHA: DI 10 MI 12 A 24	
ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Á R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
* fuente PR-55455 R-5003 Afid						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: D/10 M/12 A/24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
M A P T R E I R M I A S	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
P E R S O N A S	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

VERSION

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO

FECHA

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:

Jorge Osorio

FECHA: DI 10 MI 12 A 24

ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS
M A Q U I N A R I O	SEIRI Clasificar	13. El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
H E R R A M I E N	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge-Oscario		FECHA: 10/12/24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SERI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestíes son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		No cuentan con estos servicios fijos.
	SETON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
M A N E J O U N D E	SERI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SETON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y S T E M A D E E X T I N G U I C I O N E S	SERI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SETON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso		X		
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	VERSION		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA	001		
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge. osorio		FECHA: DI 18 MI 12 AJ 24		
ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Á R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			En tiempos de lluvia es riesgoso descender
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
* frente PR 81900 R-2508 Anserma disicados						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge. Osorio		FECHA: D/ 18 M/ 12 A/ 24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
M A P T R E I R M I A S S	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
P E R S O N A S	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

VERSION

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO

FECHA

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:

Jorge Osorio

FECHA: DI 18 MI 12 A 24

ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
M A Q U I N A R I O S	SEIRI Clasificar	13. El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquina y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
H E R R A M I E N	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: D/18 W/12 A/24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestíbulos son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		No cuentan con estos servicios fijos
	SEITON Ordenar	21 El casero permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22 Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
M A N E J O U N D E	SEIRI Clasificar	23 Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25 La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y S T E M A D E E X T I N G U I C I O N E S	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	VERSION		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA	001		
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: DI 13 MI 12 AJ 24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de tránsito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
* frente Aca R-5003						

CÓDIGO

VERSION

FECHA:

Q21

**RESPONSABLE
INSPECCIÓN:**

Torge. nsoxi'd

FECHA: DI 13 ME 12 A 24

ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS
M A T E R I A S	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
P E R S O N A S	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :	
---	--

[illegible]

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO				FECHA:	001
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge. Osorio			FECHA: DI 13 / 12 / 24	
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20. Los servicios sanitarios y vestíeros son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21. El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
M A N E J O U O S	SEIRI Clasificar	23. Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24. Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y E Ñ E A L T I Z A T O R E S	SEIRI Clasificar	26. El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27. La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28. La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio			FECHA: DI 9 MI 12 A 24	
ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Á R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de tránsito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
* frente puente Viterbo R-5003						

RESPONSABLE
INSPECCIÓN:

Jorge Osorio

FECHA: DI 9 MI 12 A 24

ITEM		5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
M A P T R E I R M I A S A S	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X				
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X				
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X				
P E R S O N A S	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X			falta personal
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X				
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X				
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X				

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :	
---	--

VERSION

509

FECHA: DI 9 MI 12 N 24

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	VERSION		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA	001		
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: DI 9 / 12 / 24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestíbulos son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
M A N E J O U O S	SEIRI Clasificar	23 Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y S T E M A T I C O N O M I C O	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	VERSION		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA	001		
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: DI 6 MI 12 AL 24		
ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Á R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
+ frente MUJO 63+250 R-5003 APIA						

Editorial

195-00112-0000

Results

304

RESPONSABLE
INSPECCIÓN:

Jorge-Osorio

FECHA: DI 6 ME 12 A 24

ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS
MATERIAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido.	X			
	SEKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :	
---	--

Had

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: 06 de 12 de 2024		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestidores son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		No cuentan con este servicio
M A N E J O U O S	SEIRI Clasificar	23. Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24. Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y E N A L I Z A T O R I O N S	SEIRI Clasificar	26. El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27. La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28. La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO		VERSION	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA		001	
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge - Osorio		FECHA: DI 2 MI 12 AJ 24		
ÍTEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Á R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						
* frente las melenas						

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINADOR	VERIFICADOR
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	OTRO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge - OSORIO		FECHA: DI 2 MI 12/12/24		
ITEM	ES	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
M A P T R E I R M I A S A S	SEIRI Clasificar	6 La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea	X			
	SEITON Ordenar	7 Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8 Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
P E R S O N A S	SEIRI Clasificar	9 El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		faltan Ingresos
	SEITON Ordenar	10 Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11 Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEKETSU Bienestar personal	12 Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

quantities (r

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO	VERSION		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA	001		
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio			FECHA: DI 2 NI 12 N 24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
S A N I T A R I A S	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestíbulos son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21. El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
M A N E J O U O S D E	SEIRI Clasificar	23 Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
S Y E Ñ A L I Z A T C O R D E N S	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-#	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001


FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>13</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Las Melenas</u>		Empresa: <u>At Ingenieros</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Mauricio Orjuela</u>		FIRMA <u>Mauricio Orjuela</u>		CARGO <u>conductor</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>Volqueta JUK-161</u>		Localizado en un lugar visible: SI ☐ No ☒			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ☒ No ☐		El botiquín se encuentra señalizado: SI ☐ No ☒			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	☒				
Alcohol al 70% (Frasco)	☒				
Jabón Antibacterial (Frasco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gasas (Rollo 6"x5)		☒			
Gasas (Rollo 3"x5)	☒				
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Bolsa)	☒				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Odusor Ojo (Unidad)		☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	☒				
Gautes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)	☒				

COPIA CONTROLADA


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ___ M ___ A ___	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					


RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA



FIRMA



CARGO



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>10</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Las Melenas</u>		Empresa: <u>AET Ingenieros</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Carlos Alberto Torres</u>		FIRMA <u>Carlos Torres</u>		CARGO <u>conductor</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>Volqueta MLR-317</u>		Localizado en un lugar visible: SI <u>X</u> No <u>X</u>			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI <u>X</u> No <u> </u>		El botiquín se encuentra señalizado: SI <u> </u> No <u>X</u>			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS				30-12-24	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	X				
Oclisor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)		X			

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COD. G-SS7-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D 30 M 12 A 24	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado		NA.			
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Carlos Arroyave FIRMA [Firma] CARGO conductor



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA,
RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
Q-SST-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 06 M 12 A 24Frente de obra: PuenteEmpresa: AB IngenierosRESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Yan Carlos Ajáji FIRMA [Firma] CARGO OperadorRESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO Inspector SSTUbicación específica: Recto Excavadora
John DeereLocalizado en un lugar visible: SI X - No El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI No XEl botiquín se encuentra señalizado: SI X No

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X	X			
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)	X	X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
G-SST-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M ____ A ____	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X	X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado		NA-			
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA

Yon Carlos Zúñiga

FIRMA

CARGO

operador

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COB 3-887-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>11</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Lus melenas</u>		Empresa: <u>BL Servicios Integrales</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Sebastian Gomez</u>		FIRMA 		CARGO <u>Operador</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>Inspector SSI</u>	
Ubicación específica: <u>pajarita New Holland 1395B</u>		Localizado en un lugar visible: Si ☐ No ☒			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si ☐ No ☒		El botiquín se encuentra señalizado: Si ☐ No ☒			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS				20-09-25	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gesas (Rollo 6"x5)		X			
Gesas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	X				
Odusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tepalcates (Unidad)	X				
Gautes (Par)	X				
Gafas Protectores (Unidad)		X			

COPIA CONTROLADA


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D 20 M09 A 25	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA-				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA



FIRMA



CARGO

D.P



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
G-SST-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 16 M 12 A 24 Frente de obra: puente vi Empresa: ENDD construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I.SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación específica: puente viterbo caldas

Localizado en un lugar visible: Si X No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No

El botiquín se encuentra señalizado: Si X No

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	<u>X</u>				
Alcohol al 70% (Frasco)	<u>X</u>				
Jabón Antibacterial (Frasco)	<u>X</u>				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	<u>X</u>				
Gasas (Rollo 6"x5)		<u>X</u>			
Gasas (Rollo 3"x5)	<u>X</u>				
Vendas (Rollo)	<u>X</u>				
Aplicadores (Paquete)	<u>X</u>				
Bajalenguas (Paquete)	<u>X</u>				
Algodón (Bolsa)	<u>X</u>				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	<u>X</u>				
Ocluser Ojo (Unidad)		<u>X</u>			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	<u>X</u>				
Guantes (Par)	<u>X</u>				
Gafas Protectoras (Unidad)	<u>X</u>				

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M04 A 25	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>19</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>MUJO 63+250</u>		Empresa: <u>ENDP CONSTRUCCIONES</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>I - SST</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>MUJO 63+250</u> <u>APIA</u>		Localizado en un lugar visible: SI ☒ No ☐			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ☒ No ☐		El botiquín se encuentra señalizado: SI ☒ No ☐			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	☒				
Alcohol al 70% (Frasco)	☒				
Jabón Antibacterial (Frasco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gasas (Rollo 6"x5)		☒			
Gasas (Rollo 3"x5)	☒				
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Bolsa)	☒				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Oclusor Ojo (Unidad)		☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	☒				
Guantes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)	☒				

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COO. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M ____ A ____	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I.SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>6</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Diseador 2508</u>		Empresa: <u>END CONSTRUCCIONES</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Jorge Osoño</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>I-SST</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osoño</u>		FIRMA <u>Jorge O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>Ruta 2508 PA 81900</u>		Localizado en un lugar visible: SI ☒ No ☐			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ☒ No ☐		El botiquín se encuentra señalizado: SI ☒ No ☐			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	☒				
Alcohol al 70% (Frasco)	☒				
Jabón Antibacterial (Frasco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gasas (Rollo 6"x5)		☒			
Gasas (Rollo 3"x5)	☒				
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Bolsa)	☒				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Oclusor Ojo (Unidad)		☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	☒				
Gautes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)		☒			

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M <u>GV</u> A <u>25</u>	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	☒				
Tijeras (Unidad)		☒			
Linterna (Unidad)	☒				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	☒				
Termómetro (Unidad)	☒				
Toallas Higiénicas (Unidad)	☒				
Inmovilizadores (Unidad)	☒				
Solución salina (suero fisiológico)	☒				
Salas de Rehidratación	☒				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	☒				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	☒				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	☒				
Se realiza limpieza periódica	☒				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COG: 0-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>17</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Las melenas</u>		Empresa: <u>ENDD construcciones</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge-O</u>		CARGO <u>I-SST</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge-O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>Campamento las melenas</u>		Localizado en un lugar visible: SI ☐ No ☒			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ☐ No ☒		El botiquín se encuentra señalizado: SI ☐ No ☒			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	☒				
Alcohol al 70% (Frasco)	☒				
Jabón Antibacterial (Frasco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gasas (Rollo 6"x5)		☒			
Gasas (Rollo 3"x5)	☒				
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Bolsa)	☒				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Odusor Ojo (Unidad)		☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	☒				
Gautes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)	☒				

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-EST-#	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	901

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M 11 A 25	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas - Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas - 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO J. SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>17</u> M <u>12</u> A <u>24</u>		Frente de obra: <u>Oficina Viterbo</u>		Empresa: <u>ENDD CONSTRUCCIONES</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge-O</u>		CARGO <u>I-SST</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge-O</u>		CARGO <u>Inspector SST</u>	
Ubicación específica: <u>Oficina Viterbo C.</u>		Localizado en un lugar visible: Si ☒ No ☐			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si ☒ No ☐		El botiquín se encuentra señalizado: Si ☒ No ☐			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	☒				
Alcohol al 70% (Frasco)	☒				
Jabón Antibacterial (Frasco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gasas (Rollo 6"x5)		☒			
Gasas (Rollo 3"x5)	☒				
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Bolsa)	☒				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Oclusor Ojo (Unidad)	☒	☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	☒				
Guantes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)	☒				

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M ____ A ____	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Salas de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
G-SS1-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA: *Las melanas*EMPRESA: *AE Ingenieros*RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: *Jorge Osorio*FECHA: *13-12-24*

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL										OBSERVACIONES										
		PQS		SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS	CILINDRO			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD		CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN					
		BC	ABC																							CO2				
	<i>Votave 19 50X-161</i>		<i>ABC</i>				<i>10L</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	
B	BUENO						NT	NO TIENE										FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: <i>Xavier Osorio</i>												
R	REGULAR						NA	NO APLICA																						
M	MALO						NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA: <i>Las Mercedes</i>		EMPRESA: <i>AE Ingenieros</i>																						
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <i>Jorge Asorio</i>		FECHA: <i>10-12-24</i>																						
No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL										OBSERVACIONES				
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN		SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC																					
	<i>Volquete 44-312</i>		<i>ABC</i>					<i>10L</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>MA</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>NT</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>Agosto-2025</i>	<i>10-12-24</i>	
B	BUENO								NT	NO TIENE										FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: <i>[Signature]</i>				
R	REGULAR								NA	NO APLICA														
M	MALO								NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE														



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003;
REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
Q-SST-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA:

puente viterbo

EMPRESA:

AE Ingenieros

FECHA: 06-12-24


RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

Jorge-050810

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														OBSERVACIONES	
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA INSPECCIÓN
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Retenexavado 14 Jon DEERB		ABC					20L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NC	B	Abv 11-2025	06-12-24	
B	BUENO								NT	NO TIENE														FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: *	
R	REGULAR								NA	NO APLICA															
M	MALO								NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE															

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COO. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA: <i>Las melenas</i>										EMPRESA: <i>BL servicios Integrales</i>																		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <i>Jorge Asotico</i>										FECHA: <i>11-12-24</i>																		
No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													OBSERVACIONES					
		PQS		CO2	SOLKAFAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO																
	<i>Pajarita New Holland B45B</i>		<i>ABC</i>					<i>5L</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>		
B	BUENO								NT	NO TIENE													FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: 					
R	REGULAR								NA	NO APLICA																		
M	MALO								NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COO. G-357-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: <u>Puente Viterbo</u>		EMPRESA: <u>ENDD construcciones</u>																									
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <u>Jorge Osorio</u>		FECHA: <u>16-12-24</u>																									
No	UBICACIÓN	TIPO						REVISIÓN ESTADO GENERAL											OBSERVACIONES								
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA		RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
	<u>Puente Viterbo</u>		<u>ABC</u>					<u>20L</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	
B	BUENO							NT	NO TIENE											FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: <u>Jorge Osorio</u>							
R	REGULAR							NA	NO APLICA																		
M	MALO							NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COO. G-EST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA: Muto 631250 APIA										EMPRESA: ENPD CONSTRUCCIONES																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio										FECHA: 19-12-24																	
No	UBICACIÓN	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												OBSERVACIONES						
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA		SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
	Muto 631250 R 5003	ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	April-2025	19-12-24	
B	BUENO							NT	NO TIENE												FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio						
R	REGULAR							NA	NO APLICA																		
M	MALO							NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																		

 CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA: <i>Disipador R 2508 PR 81900</i>										EMPRESA: <i>ENPD CONSTRUCCIONES</i>																
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <i>JOI9E-050110</i>										FECHA: <i>6-12-24</i>																
No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												OBSERVACIONES				
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN		SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO														
	<i>Disipador R 2508 PR 81900</i>		<i>ABC</i>					<i>10L</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>6-12-24</i>	
B	BUENO							NT	NO TIENE												FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: <i>JOI9E-050110</i>					
R	REGULAR							NA	NO APLICA																	
M	MALO							NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																	



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

COD.
G-EST-F

VERSIÓN

FECHA
ENERO 2024

001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRETE DE OBRA:

Las melenas

EMPRESA:

END CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

Jorge Osorio

FECHA: 17-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												OBSERVACIONES				
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN		SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO														
	Campanario Las melenas		ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16-12-2015	17-12-24	
B	BUENO								NT	NO TIENE												FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio				
R	REGULAR								NA	NO APLICA																
M	MALO								NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.911.230-0</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: <i>Oficina Viterbo</i>		EMPRESA: <i>ENDD CONSTRUCCIONES</i>																											
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <i>Jorge Osorio</i>		FECHA: <i>17-12-24</i>																											
No	UBICACIÓN	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													OBSERVACIONES							
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN		SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN				
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO																	
	<i>Oficina Viterbo</i>		<i>ABC</i>					<i>30L</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>Feb 1-2025</i>	<i>17-12-24</i>	
B	BUENO								NT	NO TIENE													FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: <i>Jorge Osorio</i>						
R	REGULAR								NA	NO APLICA																			
M	MALO								NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																			



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.69 ANEXO 10. Preoperacionales maquinaria y volquetas obra.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: Diciembre

Equipo No: _____

Marca/ Referencia:

John DeereEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☒

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Accesos delanteros y traseros		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Espejo		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Detonadores de seguridad		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Selector		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Adornos en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Indicadores de hidroneumático, reguladores, barómetro,		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Tubo de escape		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Varilla de retroceso		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Wilo		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Escaleras de acceso		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Baterías y cables		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Estado de pesadores		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Drugs y/o Bantas tensionadas		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Adecuamiento de Giro		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Corona de tornamaza		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Andenes de avance y estacionamiento		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Cilindros en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Sistema de frenos en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Ando de levanta brazo		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Estado general del valde		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:





Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL VOLQUETA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: DiciembreEquipo No: SUX-161

Marca/ Referencia: _____

Equipo Nuevo: ☐Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de luces y bocina		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de espejos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Niveles de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Fugas de fluidos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Presión y fuga de aire		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de los frenos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado del parabrisas		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Elementos de retención (cinturón)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Documentos al día		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Luces de tablero, testigos y manómetro		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de la suspensión y dirección		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

VOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Alonso Orozco



Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL VOLQUETA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: DiciembreEquipo No: MLY-317

Marca/ Referencia: _____

Equipo Nuevo: ☐Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de linternas y guardapolvos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Estado de luces y bocina		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Estado de espejos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Óvalos de líquidos (aceite, hidráulico, refrigerante)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Luces de ruidos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Presión y fuga de aire		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Estado de los frenos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Estado del parabrisas		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Elementos de retención (cinturón)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Documentos al día		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Equipos de prevención (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Luces de tablero, testigos y manómetro		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-
Estado de la suspensión y dirección		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	-	-		-	-

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

VOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

*Calles Antioqueñas

cc 15.506892



Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: DiciembreEquipo No: B45BMarca/ Referencia: New HollandEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☒Otro: ☐

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Juntas delanteras y traseras		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Espesores		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Almohadillas de seguridad		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Extintor		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Admisores en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicadores de hidráulica refrigerante, combustible,		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo de escape		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Maneja de retroceso		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Refr		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Escaleras de acceso		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Baterías y cables		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado de pasadores		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupos y/o Runtas tensionadas		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Accionamiento de Giro		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	I	NA	NA	I	I		I	I	I	I	NA	NA		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Corona de formadora		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	I	NA	NA	I	I		I	I	I	I	NA	NA		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Andenes de avance y estacionamiento		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilindros en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de frenos en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Ande de levanta brazo		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado general del equipo		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:



Tipo de documento: Formato

AREA SST

PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: DiciembreEquipo No: CB-24Marca/ Referencia: CaterpillarEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor		C	C	I	R	R	R																								
Estado nivel de combustible		C	C	I	R	R	R																								
Estado del nivel de la caja de velocidades		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las correas		C	C	I	R	R	R																								
Estado de los mandos de dirección		C	C	I	R	R	R																								
Revisión de pasadores en general		C	C	I	R	R	R																								
Estado de los rodillos		C	C	I	R	R	R																								
Estado de la Manivela		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las guayas		C	C	I	R	R	R																								
Estado de la caja de cambios		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las guardas de seguridad		C	C	I	R	R	R																								
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

* Revisado

PREOPERACIONAL DE MIXER

CODIGO G-55T

2024C

Res/Año: Diciembre Equipo No: _____ Marca/ Referencia: International Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUESTES"

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras				C								C								C						C	C				
Direccionales Del. Y Traseras				C								C								C						C	C				
Stop Traseros				C								C								C						C	C				
Espejo Retrovisor				C								C								C						C	C				
Espejos laterales				C								C								C						C	C				
Alarma (o pit) de Retroceso				C								C								C						C	C				
No Normal				C								C								C						C	C				
Switch Encendido				C								C								C						C	C				
Frenos de Servicio				C								C								C						C	C				
Freno de emergencia				C								C								C						C	C				
Dirección/suspensión(Terminales)				C								C								C						C	C				
Cinturones de Seguridad				C								C								C						C	C				
Estado de la puertas				C								C								C						C	C				
Admisión frontal en buen estado.				C								C								C						C	C				
Extintor (10 lbs) P Q S				C								C								C						C	C				
Botiquin Primeros Auxilios				C								C								C						C	C				
Estado de los asientos				C								C								C						C	C				
Indicadores (Hidraulico- voltmetro)				C								C								C						C	C				
Motor- Refrigerante-otometro, aire)				C								C								C						C	C				
Velocimetro				C								C								C						C	C				
Altera y cables				C								C								C						C	C				
Juntas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				C								C								C						C	C				
Estado físico de llantas (No lisas)				C								C								C						C	C				
Control de fugas hidráulicas				C								C								C						C	C				
Estado de correas				C								C								C						C	C				
Caja de cambios en buen estado.				C								C								C						C	C				
Radiador				C								C								C						C	C				
Tanque de combustible(Abrastadores- oportu)				C								C								C						C	C				
Manifesterios en general				C								C								C						C	C				
Cadena cardan				C								C								C						C	C				

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

VOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

Juan DAVID Canirca
10.0519415


ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S <small>NIT. 901.961.235-0</small>	Tipo de documento: Formato		AREA SST			
	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR		CODIGO G-SST			
			2024			
Mes/Año: <u>Diciembre</u>		Equipo No: <u>440</u>	Marca/ Referencia: <u>case</u>	Equipo Nuevo: ☐	Alquilado: ☒	Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces delanteras y traseras																					C	C	C	C	C	I	C	C	C	I	I	T
Espejo																					NA	NA	NA	NA	NA	I	NA	NA	NA	NA	NA	
Cinturón de seguridad																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Extintor																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Vidrios en buen estado																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Indicadores (hidráulico, refrigerante, horómetro, etc.)																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Tubo de escape																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Alarma de retroceso																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Pito																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Escaleras de acceso																					NA	NA	NA	NA	NA	I	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Baterías y cables																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Estado de pesadores																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Oruga y/o llantas tensionadas																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mecanismo de Giro																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Corona de tornamiza																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mandos de avance y estacionamiento																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Cilindros en buen estado																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Sistema de frenos en buen estado																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mando de levanta brazo																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Estado general del vehículo																					C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:





Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL DE PILOTEADORA

Mes/Año: DiciembreEquipo No: C66Marca/Referencia: HitachiEquipo Nuevo: ☐Alquilado: ☒

Otro: _____

Proyecto: _____

TESCAN

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Asiento en buena condicion																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Cinturon de seguridad																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Pedales y mandos en buen estado																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Extintor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Indicadores de presion hidraulica de motor, convertidor, transmision, refrigerante, horometro, tacometro, voltmetro, encendido y combustible																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Aceite de motor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Agua de radiadores																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Broca																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Espejo retrovisor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Luces																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Pito																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Alarma de reversa																					NA		NA	I	I	I	I	NA		I	I
Tension de bandas de ventilador																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Estribos y pasamanos																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Manometro																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tension de cadena cabezal																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tiempo de levante de equipo																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Control de fugas hidraulicas																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tubo de escape																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Orugas tensionadas																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Sistema de encendido																					C		C	I	I	I	I	C		I	I

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.70 ANEXO 11. Matriz de ausentismo Indicadores obra.

	<div><div>ENDD</div><div>CONSTRUCCIONES S.A.S</div><div>HTC-001361.2019-9</div></div> <div>CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES</div>	
	PERIODO DICIEMBRE 2024	
	ITEM	TOTAL MENSUAL
	ENDD CONSTRUCCIONES DICIEMBRE- 2024	
	N° TOTAL DE TRABAJADORES	42
	N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	25
	N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	5.460
	INDICADORES	
	INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
	INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
	AUSENTISMO	2,86




**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.71 ANEXO 12. Incapacidades obra.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



INCAPACIDAD

Fecha y Hora: 13 Dic 2024

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre: Salud Total EPS - Virrey Solis

Código: EPS002

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Documento: Cedula de Ciudadania
Nombre: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE
Dirección: CL 85 N 25 110
Departamento: (17) CALDAS
Teléfono Celular: 3218304380

Documento: 30235814
Fecha de Nacimiento: 15 Jul 1982
Teléfono: 0
Municipio: (001) Manizales
Email: ANGELAMARIA.CASTILLO@HOTMAIL.COM

DATOS DE LA TRANSACCION

Tipo: AMBULATORIA
Motivo:
Diagnóstico: S91.3
Ubicación del Paciente: Consulta Externa
Origen del servicio: Enfermedad general

Régimen:
Fecha Vencimiento:
DP Anterior: 31255-2462591447
No. Solicitud:

DETALLE

PRESENTE ESTE FORMATO EN LA BARRA DE ATENCIÓN PARA QUE LE SEA EFECTUADA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE

Dias de incapacidad: 7
Fecha inicio incapacidad: 13 Dic 2024
Fecha final incapacidad: 19 Dic 2024

PR - 5565093

INFORMACIÓN DEL PRESCRIPTOR

Nombre: Paul Antonio Franco Burbano
Cargo o Actividad: MEDICINA GENERAL
Ips que Prescribe: VS PALMAS
Dirección: (Manizales) CR 23 57 114

Teléfono: NIT: 800003765-1
Teléfono Celular:
Teléfono: 6068782300 6068782700

OBSERVACIONES





ENE_F7914681

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

NIT : 890.806.490-5 Teléfono : 8783430

Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

Licencias-Incapacidades

Nombre Paciente: ANGELA MARIA
CASTILLO AGUIRRE
Historia Clínica: CC 30235814
Afluación: 30235814 01

Convenio: SALUD TOTAL EPS-C -
COTSAT
Edad: 42 Años

Fecha: Viernes, 20 de
diciembre de 2024
Hora: 15:43:2

Datos incapacidad
Tipo incapacidad: Enfermedad General
Descripción: CODIGO CIE 10: M201

Fecha inicial: viernes, 20 de diciembre de
2024

Fecha final: sábado, 18 de enero de 2025
Número días: 30

Señor empleador, ante cualquier duda o alteración en este documento verifique la autenticidad de esta incapacidad. El número del código de barra es único y consecutivo para cada orden, NO se repite.

Médico

Nombre: IVAN DARIO GARCIA MONROY

Identificación: 79424063

Registro médico: 79424063

Especialidad: Ortopedista

Firma médico


IVAN D. GARCIA M.
Ortopedista y Traumatólogo
Cruzado de Paz y Toboqui
Univ. Militar - R.S.F.S.
R.M.N. 79.424.063



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.72 ANEXO 14. Asistencia personal de obra.

ASISTENCIA PERSONAL MES DE DICIEMBRE

AREA 007

D

P

FIRMA

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
JOEL ARTURO RANGEL	77027611		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	NO	NO	<i>Joel Rangel</i>
ANDY DEHER LONDOÑO	1961571682		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		NO	NO	NO	NO	X	X	X	X	NO	NO	<i>Andy Deher</i>
JOSÉ LEONARDO BERRA	1.008.378.541		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Jose Leonardo Berra</i>	
VICTOR HUGO TRIUNILLO	1.126.988.190		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	NO	NO		R								X	NO	X	X	X	NO	NO	<i>Victor Hugo Triunillo</i>	
DIEGO FERNANDO AGUDELO	19811913		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Diego Fernando Agudelo</i>	
CARLOS ARTURO TORRES	15.506.893		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Carlos Arturo Torres</i>	
VERFISON ALEXANDER GALLEGO	1004018740		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		R							X	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<i>Verfison A. Gallego M.</i>	
JORDAN MAURICIO JIMÉNEZ	1110492308		NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X	X	NO	NO	NO		X	X	X	X	X		R									<i>Jordan Mauricio Jimenez</i>	
YAN CARLOS AJALA	1.827.877.168		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		NO	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Yan Carlos Ajala</i>	
EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	8100275		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	NO	NO		NO	R														<i>Edgar Alexander Parra Rojas</i>	
VONNY ALEJANDRO RAMÍREZ GUTIERREZ	1889721256		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Vonny Ramirez</i>	
DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Diego Alberto Cardona Villada</i>	
EMILIANO SEGUNDO HERNÁNDEZ HURTADO	88444888		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Emiliano Segundo Hernandez Hurtado</i>	
WILLIAM BEDOYA NOTATO	18806388		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>William Bedoya</i>	
JOSÉ GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554		X	X	X	X	NO	NO		NO	NO	NO	X	NO	NO		R															<i>Jose Gilberto Montoya Zapata</i>	
HECTOR BARRIO BEDOYA	1088719548		X	X	X	X	X	X		NO	X	NO	X	NO	NO		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Hector Barrio Bedoya</i>	
SEBASTIÁN DAVID SILVA	1004780802		NO	X	X	X	NO	NO		NO	NO	NO	X	NO	NO		R															<i>Sebastian David Silva</i>	
JARLEIN DAVIDSON LOPEZ ARBOLEDA	1.083.223.795		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	R														<i>Jarlein Davidson Lopez Arboleda</i>	
EMILIANO ANTONIO ARGUMENTO RAMOS	1832281828		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X		X	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Emiliano Antonio Argumento Ramos</i>	
NEILA ROSARIO BENAVIDES	38.505.378		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	NO	R													<i>Neila Benavides</i>	
VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO		NO	NO		X	X	X	X	NO	NO	<i>Valentina Vallejo</i>	
GILBERTO RAFAEL MEJÍAS MENAÑO	5048488		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	NO	NO	<i>Gilberto Mejias</i>	
JUAN GUILLERMO CASTAÑO BERRA	1182924781		X	X	X	X	X	X		NO	NO	X	X	X	X		NO	X	NO	X	X		X	X		X	X	X	X	NO	NO	<i>Juan Guillermo Castano Berra</i>	
ROBERT AUGUSTO CASTILLO	88188024		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	NO	NO	NO	NO		R									<i>Robert Augusto Castillo</i>	
WILFREDO CHAVEZ	1087748803		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	NO	NO	<i>Wilfredo Chavez</i>	
HERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	7252891		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	NO	NO	NO		R															<i>Hernando Gonzalez Jimenez</i>	
WILLER MANUEL CARDENAS VAGUARO	1106779851		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		NO	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	NO	NO	<i>Willer Manuel Cardenas Vaguaro</i>	

Jhonier Andres Pardo 1004628333

* Jhonier Andres *

NOMBRE	CODIGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA	
JOSE RIBALDO SANCHEZ LONDOÑO	4387873		X	R																														<i>[Signature]</i>
SEBASTIAN BOMEZ BARRERA	1061372762		X	X	X	X	X	X		X	NO	X	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	X	X		NO	NO	R								<i>[Signature]</i>
AJAN MANUEL ROSE ARIZA	1.004.888.484		X	X	X	X	NO	NO		R																								<i>[Signature]</i>
BENGO RAMIREZ RODRIGUEZ	1670764836		X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	1064706350		X	X	X	X	X		NO	NO	NO	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
HECTOR TAMARAÑO MORALES	1067486453		X	X	NO	NO	NO	NO		X	X	NO	X	X	X		R																	<i>[Signature]</i>
RAULICO DRAGELA BORDO	15.305.005		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<i>[Signature]</i>
OSCAR CHIVARRO CARRILAL	80070612		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X		X	NO		X									<i>[Signature]</i>
OSMAR EISENBERG CHIVARRO	1065530117		X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		R																		<i>[Signature]</i>
SABIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010053788		X	NO	R																													<i>[Signature]</i>
HERNAN ALBERTO SANCHEZ CARDONA	1.006.538.045		X	NO	R																													<i>[Signature]</i>
JAMES SALSANO BRALDO	8764381		X	NO	R																													<i>[Signature]</i>
PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	36752157		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
KRYN BOMEZ VELAZ	1068245255		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
ANDRES RICARDO BARRATO F	76796327		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
OSCAR WILLIAN ENDA	1065522416		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
SABIEL MARCELA RUÍZ TABORDA	1061366623		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
ANABEL CASTILLO AGUIRRE	30235814		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
CARLOS DANIEL CORTES VALENZUELA	1062644561		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
JOSUE BANGUE CORDO RIVERA	1.002.944.363		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
BENJAMIN RAULICO BORDO	7.101.848		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
ADRIANA CARDONA SANTAMARIA	1.067.680.618		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
JACQUES ANDRES BARRA	1.004.826.333		X	X	X	X	X		X	NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X		NO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
RICARDO ALBERTO BRAGA BRALDO	9673365		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
DANIEL RAMIREZ PULSARIN	1.004.876.017		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
YERMIN YOFRAH OCHOA	4.402.061		X	X	X	X	X		X	X	NO	NO	NO	NO		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	1.176.818.843		X	X	X	X	X		X	NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>
JAHON WILSON LOPEZ LOPEZ	7607881		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Signature]</i>



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.73 ANEXO 15. Actas de comités obra.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

REUNIÓN COMITÉ PARITARIO Y/O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA No: 12 FECHA: 26-12-24 HORA: 8:00 AM

ASISTENTES NOMBRE:

FIRMA:

- 1 Miguelito Montoya Cárdenas
- 2 ISABEL MARCELA M.
- 3 Carlos Daniel Cortez
- 4 Martha Gomez Vera
- 5 Jorge Enrique Osorio
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____

ISABEL MARCELA M.

Carlos Daniel Cortez

Martha Gomez Vera




Jorge - Osorio

ORDEN DEL DÍA

1. Verificar Asistencia personal de oficina
2. Temas: Implementación SG-SST para la obra del
3. Puente Viterbo
4. Identificación de Riesgos y Planes de Acción
5. Alerta temprana - Nivel y Cauce del Río

COMENTARIOS Y DESARROLLO

Se inicia el comité con una pausa activa, luego se entra a tratar específicamente las actividades realizadas en el frente de obra del puente, ya que contamos con personal y maquinaria dentro del río, se identifican riesgos, en esta época un poco lluviosa se sabe conocer el contacto con la hidroeléctrica la cual es la encargada de informar cuando el río suba de nivel y así poder intervenir con la evacuación del personal si es necesario

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		

FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN _____

ISABEL Muñoz
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITÉ

Jorge - Osorio
FIRMA SECRETARIO

COPIA CONTROLADA



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.74 ANEXO 16. Cronograma de actividades obra.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.75 ANEXO 17. Plan de trabajo anual obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												CÓDIGO: G-SST		VERSIÓN 1																																							
		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUEBLOS"												FECHA: ene-24																																									
		PLAN DE TRABAJO ANUAL																																																					
OBJETIVO:		ESTABLECER EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL SG-SST Y HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL A SU EJECUCIÓN																																																					
MES / AÑO: JULIO 2024																																																							
OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/VE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA							
1. Cumplir la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y otros requisitos sucosos.	Procedimiento de requisitos legales - Matriz Requisitos Legales	Realizar la evaluación de estándares mínimos	Coord. SST	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
PROGRAMADAS				1				0				2				0				0				1				0				0				0				0				1				0							
				REALIZADAS				1				0				0				0				1				0				0				0				0				1				0							
				OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/VE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
								SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
2. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles pertinentes.	Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y Determinación de Controles Matriz de IPVRDC	Elaborar el procedimiento de IPVRDC	Coord. SST	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
PROGRAMADAS		Elaborar la matriz de IPVRDC	Coord. SST																																																				
REALIZADAS		Divulgación de controles y resultados de la valoración	Prof. SST																																																				
PROGRAMADAS		Capacitación Reporte de actos y condiciones inseguras	Aux. SST																																																				
REALIZADAS		Actualización de la matriz	Prof. SST																																																				
OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/VE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA							
3. Promover la adopción de hábitos y estilos de vida y trabajo saludable	Programa de vigilancia y promoción y prevención de la salud. Programa de vigilancia de factores de riesgo psicosociales	Campaña de prevención de consumo de tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
PROGRAMADAS		Campaña de prevención de consumo de alcohol	Prof. SST																																																				
REALIZADO		Actividades de compañerismo, trabajo en equipo y entornos laborales saludables	Asesora Social																																																				
PROGRAMADAS		Análisis y acciones Riesgo Psicosocial	Asesora Social																																																				

ELABORÓ:

REVISÓ Y APROBÓ:

NO REALIZADO

PLANEADO

REALIZADO



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.76 ANEXO 18. Presupuesto SST obra.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”														
	ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST														

PRESUPUESTO SG-SST OCTUBRE		\$ -
----------------------------	--	------

		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	\$ 1.562.336	\$ 781.168	\$ 585.876	\$ 585.876	\$ 195.292	\$ 195.292	\$ 272.000	\$ 1.608.576	\$ 14.468.448	\$ 5.010.474	\$ -	\$ -		\$ 25.265.338
	E		\$ 976.839					\$ 272.000	\$ 1.608.576	\$ 14.468.448	\$ 5.010.474	\$ -	\$ -		
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	\$ 424.288	\$ 169.715	\$ 127.286	\$ 84.858	\$ 42.429	\$ -		\$ -	\$ 527.675	\$ 358.000	\$ -	\$ -		\$ 1.734.250
	E		\$ 1.056.647							\$ 527.675	\$ 358.000	\$ -	\$ -		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	\$ 3.401.478	\$ 850.370	\$ 850.370	\$ 566.913	\$ -	\$ -		\$ 10.645.400	\$ 2.467.000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 18.781.530
	E		\$ 8.729.124		\$ 5.000.000				\$ 10.645.400	\$ 2.467.000	\$ -	\$ -	\$ -		
ADICIONALES	P	\$ 4.020.829	\$ 4.020.829	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 3.015.622	\$ 748.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ 20.852.147
	E		\$ 994.184					\$ 748.000			\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL PROYECTADO	P	\$ 9.408.931	\$ 5.822.082	\$ 4.579.154	\$ 4.253.269	\$ 3.253.343	\$ 3.210.914	\$ 1.020.000	\$ 12.253.976	\$ 17.463.123	\$ 5.368.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.633.265
TOTAL EJECUTADO	E	\$ -	\$ 11.756.794	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.020.000	\$ 12.253.976	\$ 17.463.123	\$ 5.368.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.862.367

PORCENTAJE EJECUCIÓN		0,00%	17,64%	0,00%	7,50%	0,00%	0,00%	1,53%	18,39%	26,21%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	79,33%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO		0,00%	17,64%	17,64%	25,15%	25,15%	25,15%	26,68%	45,07%	71,28%	79,33%	79,33%	79,33%	79,33%	



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.77 ANEXO 19. Planillas de seguridad social obra.



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222538	\$11.380.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	19.100	0		0		0	1	100	0	19.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	374.400	0		0		0	1	300	0	374.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.000	0		0		0	1	100	0	140.100	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	130.000	0		0		0	1	100	0	130.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	504.400	0		0		0	1	400	0	504.800	10
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	38.200	0		0		0	1	100	0	38.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.008.100	0	0	0	0	1	700	0	1.008.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.845.500	0	0	0	0	1	1.900	0	2.847.400	10
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	76.300	0	0	0	0	1	100	0	76.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	195.800	0	0	0	0	1	200	0	196.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.817.200	0	0	0	0	1	1.300	0	1.818.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.456.800				2.456.800	1	1.700	2.458.500			24.568	2.458.500	22

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF44	Comfamiliar Risaralda					891480000-1	1.486.100
							1
							1.000
							1.487.100
							22



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222538	\$11.380.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.486.100	1.487.500
Pensión	5	5.942.900	5.947.100
Riesgos Laborales	1	2.456.800	2.458.500
CCF	1	1.486.100	1.487.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.371.900	11.380.200



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					22 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2024-12		2024-11		\$11.380.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Builejo	Exonerado	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	SLN	IOE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1002944561	CORTES VALENCIA CARLOS DANIEL	1	0				S															25-14	1.838.000	294.100	0	0	0	0	0	EPS037	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
2	CC	1004679017	PULGARIN RAMIREZ DANIEL ANDRES	1	0				S															230301	1.838.000	294.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	1004681750	BEDOYA JARAMILLO JUAN FELIPE	1	0				S	X														25-14	919.000	147.100	0	0	0	0	0	EPS037	919.000	36.800	14-23	919.000	5	64.000	CCF44	919.000	36.800	0	0	0	0	0
4	CC	1054478856	CANO LONDOÑO JUAN MANUEL	1	0				S	X														230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.040.000	41.600	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF44	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
5	CC	1054923467	ROMERO GOMEZ WILMER YESID	1	0				S	X														231001	963.334	154.200	0	0	0	0	0	EPS037	963.334	38.600	14-23	963.334	5	67.100	CCF44	963.334	38.600	0	0	0	0	0
6	CC	1061368682	MUÑOZ TABORDA ISABEL MARCELA	1	0				S	X														230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF44	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1087490610	CARDONA BETANCUR ADRIANA	1	0				S						X									230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF44	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	1088003239	GARCIA MARIN DIEGO MAURICIO	1	0				S	X														230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS018	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	5	121.800	CCF44	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
9	CC	1088245235	GOMEZ VELEZ KEVIN	1	0				S															EPS002	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1088539117	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	1	0				S	X														230201	216.667	34.700	0	0	0	0	0	ESSC62	216.667	8.700	14-23	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
11	CC	1093212416	ISAZA VALLEJO OSCAR WILLIAM	1	0				S	X														25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS018	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF44	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
12	CC	1093738982	DURAN ESTUPIÑAN LUIS CARLOS	1	0				S	X														230201	346.667	55.500	0	0	0	0	0	EPS037	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF44	346.667	13.900	0	0	0	0	0
13	CC	18600369	BEDOYA MOTATO WILLIAM ALBERTO	1	0				S	X														230301	736.667	117.900	0	0	0	0	0	ESSC62	736.667	29.500	14-23	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
14	CC	18611913	AGUDELO AGUDELO DIEGO FERNANDO	1	0				S	X														231001	260.000	41.600	0	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF44	260.000	10.400	0	0	0	0	0
15	CC	30235814	CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA	1	0				S															25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	0	EPS002	5.100.000	204.000	14-23	5.100.000	5	355.000	CCF44	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
16	CC	39752157	RUIZ RODRIGUEZ ANA PATRICIA	1	0				S															25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF44	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	CC	4549054	LOPEZ CANO JOSE ELIECER	1	0				S	X														230201	736.667	117.900	0	0	0	0	0	EPS037	736.667	29.500	14-23	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
18	CC	5165382	OROZCO VARGAS FERNANDO ENRIQUE	1	0				S	X														230901	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EPS001	476.667	19.100	14-23	476.667	5	33.200	CCF44	476.667	19.100	0	0	0	0	0
19	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	1	0				S															230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF44	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
20	CC	75079821	LOPEZ LOPEZ JOHN WILSON	1	0				S															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF44	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
21	CC	79796327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	1	0				S															230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	5	348.000	CCF44	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
22	CC	9870365	GIRALDO GIRALDO RICARDO ALBERTO	1	0				S	X														230301	1.119.000	179.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.119.000	44.800	14-23	1.119.000	5	77.900	CCF44	1.119.000	44.800	0	0	0	0	0



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-05, 11:15:10 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1068607890

Periodo Cotización: noviembre de 2024

Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 05/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO		
Documento	CC1093212416	Dirección	CL 14 #14 - 72
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3658435
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SANTA ROSA DE CABAL	Departamento	RISARALDA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093212416	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO	03	00	X															0	15	15	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 650.000	\$ 104.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 650.000	\$ 81.300	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 650.000	\$ 650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 81.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.300	\$ 0	\$ 185.300



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 07:08:12 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 74738837

Periodo Cotización: noviembre de 2024

Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 02/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO		
Documento	CC9870365	Dirección	CR 46 #78 - 70 CONJ ENTREVERDE M 7 C 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3458493
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ASP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9870365	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO	03	00																0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 0	\$ 370.500





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061368682	NÚMERO PLANILLA:			4578716789	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISABEL MARCELA MUNOZ TABORDA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA	DÍAS DE MORA:			0						
DIRECCIÓN:	CAMBULOS LA POPA MZ F CS 8	TELÉFONO:	3333333	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9990700493
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE										
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO										

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 309.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.000	\$ 0	\$ 309.000
SUBTOTALES:										\$ 309.000	\$ 0	\$ 309.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.400	\$ 0	\$ 0	\$ 241.400
SUBTOTALES:			\$ 241.400													

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 47.100	\$ 47.100	\$ 0	\$ 0	\$ 47.100
SUBTOTALES:									\$ 47.100	\$ 0	\$ 0	\$ 47.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061368682	MUNOZ TABORDA ISABEL MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.930.800				NO																		230301-PORVENIR	30		\$ 1.930.800	\$ 309.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 309.000	EPS037-NUEVA EPS	30		\$ 1.930.800	\$ 241.400	\$ 0	\$ 241.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30		\$ 1.930.800	\$ 106136868	\$ 47.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 597.500
--------------	-------------------



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31859659
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUAVANZAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900664402	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 2 ESTE 28 A 45	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUAVANZAR@GMAIL.COM	TELÉFONO	4133788
FAX	4154336	SUCURSAL	0023	NOMBRE SUCURSAL	personal
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19358499	PRIMER APELLIDO	BELTRAN	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	HECTOR	SEGUNDO NOMBRE	DARIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
48		\$29.213.368		31859659

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18611913	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	AGUDELO AGUDELO DIEGO FERNANDO	\$1.300.000
CC-1004565833	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ARANGO VALENCIA JUAN PABLO	\$1.600.000
CC-1032251328	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ARGUMEDO RAMOS EMILIANO ANTONIO	\$1.300.000
CC-79784504	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	AVELLANEDA AVELLANEDA JUAN CARLOS	\$1.300.000
CC-1089719548	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	BEDOYA BATERO HECTOR MARIO	\$1.300.000
CC-18600369	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	BEDOYA MOTATO WILLIAM ALBERTO	\$1.300.000
CC-1106775931	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDENAS VAQUIRO MILER MANUEL	\$1.300.000
CC-1088257238	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDONA VILLADA DIEGO ALBERTO	\$1.300.000
CC-1192924761	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTAÑO SERNA JUAN GUILLERMO	\$1.300.000
CC-16185524	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTILLO MUÑOZ ROBERT AUGUSTO	\$1.600.000
PT-5118413	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CEDEÑO LUIS MANUEL	\$1.600.000
CC-6010512	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO CARVAJAL OSCAR	\$1.300.000
CC-1088539117	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	\$1.300.000
CC-1087749903	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVEZ ORTEGA WILFREDO	\$1.600.000
CC-1100337473	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CIPRIAN JULIO JUAN DAVID	\$1.600.000
CC-1016028684	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CRUZ ALONSO LUIS EDUARDO	\$1.300.000
CC-1088249882	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	FERNANDEZ ESCOBAR SEBASTIAN	\$1.300.000
CC-1088537143	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	FRANCO MORALES JOHN FREDY	\$1.300.000
CC-9764361	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GALEANO GIRALDO JAMES WNIER	\$1.300.000
CC-7252891	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GONZALEZ JIMENEZ HERNANDO	\$1.300.000
CC-85444858	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	HERNANDEZ HURTADO EMILIANO SEGUNDO	\$1.300.000
CC-1110492366	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	JIMENEZ VILLALBA YORDAN MAURICIO	\$1.300.000
CC-1061371592	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	LONDOÑO YEPEZ JHON DEINER	\$1.300.000
CC-18562609	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MARCELO DREGAMA JAIRO	\$1.300.000
CC-18601393	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	MAYA PELAEZ ALBEIRO DE JESUS	\$1.300.000
CC-5049466	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	MENESES MERIÑO GILBERTO RAFAEL	\$1.300.000
CC-91436696	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MERCHAN CARREÑO ANGEL MIGUEL	\$1.300.000
CC-4430554	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MONTOYA ZAPATA JOSE GILBERTO	\$1.300.000
PT-5106075	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	PARRA ROJAS EDGAR ALEXANDER	\$1.300.000
CC-9993087	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	PEREZ DUQUE LUIS ALFONSO	\$1.300.000
CC-1007167160	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ CASTAÑEDA SANTIAGO	\$1.300.000
CC-1089721259	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ GUTIERREZ YHONNY ALEJANDRO	\$1.300.000
CC-1070704836	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO	\$1.300.000
CC-77027611	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RANGEL HERNANDEZ JOEL ARTURO	\$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004688464	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RIOS ARIAS JUAN MANUEL	\$1.300.000
CC-1064708350	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RODRIGUEZ RANGEL SANTIAGO	\$1.300.000
CC-1097399246	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ROJAS ZAMUDIO GUSTAVO ADOLFO	\$1.300.000
CC-1054923467	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ROMERO GOMEZ WILMER YESID	\$1.300.000
CC-1002594493	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ BOLIVAR FABIAN	\$1.300.000
CC-1010052785	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	\$1.300.000
CC-1088538045	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA JEISON ALBERTO	\$1.300.000
CC-1088278541	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SERNA GONZALEZ JOSE LEONARDO	\$1.300.000
CC-1004766802	01	No	No	No	66	1	1141001	Fijo	SILVA MAYA ESTEBAN DAVID	\$1.300.000
CC-9991043	01	5	No	No	66	1	4411101	Fijo	TABORDA CASTAÑO JOSE MANUEL	\$1.300.000
CC-1087486453	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TAMANIZA MORALES HECTOR	\$1.300.000
CC-1126586196	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TRUJILLO ZAPATA VICTOR HUGO	\$1.300.000
CC-1079932836	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	VASQUEZ TERNERA DEIVIS DAVID	\$1.300.000
PT-6497642	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	YAGUA SOTO ANGEL RAFAEL	\$1.300.000

[illegible]

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18611913	COLFONDOS	24	\$1.040.000	0.1600000	\$166.400	\$0	\$0	\$166.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1004565833	PORVENIR	1	\$53.334	0.1600000	\$8.600	\$0	\$0	\$8.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1032251328	PROTECCION	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79784504	PORVENIR	1	\$43.334	0.1600000	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1089719548	PORVENIR	10	\$433.334	0.1600000	\$69.400	\$0	\$0	\$69.400	\$0	\$0	\$0
CC - 18600369	PORVENIR	11	\$476.667	0.1600000	\$76.300	\$0	\$0	\$76.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1106775931	PORVENIR	25	\$1.083.334	0.1600000	\$173.400	\$0	\$0	\$173.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1088257238	PORVENIR	16	\$693.334	0.1600000	\$111.000	\$0	\$0	\$111.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1192924761	COLPENSIONES	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 16185524	COLPENSIONES	30	\$1.600.000	0.1600000	\$256.000	\$0	\$0	\$256.000	\$0	\$0	\$0
PT - 5118413	PORVENIR	1	\$53.334	0.1600000	\$8.600	\$0	\$0	\$8.600	\$0	\$0	\$0
CC - 6010512	PROTECCION	25	\$1.083.334	0.1600000	\$173.400	\$0	\$0	\$173.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1088539117	PROTECCION	17	\$736.667	0.1600000	\$117.900	\$0	\$0	\$117.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1087749903	PORVENIR	30	\$1.600.000	0.1600000	\$256.000	\$0	\$0	\$256.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1100337473	PORVENIR	15	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1016028684	PORVENIR	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1088249882	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1088537143	COLFONDOS	5	\$216.667	0.1600000	\$34.700	\$0	\$0	\$34.700	\$0	\$0	\$0
CC - 9764361	PORVENIR	8	\$346.667	0.1600000	\$55.500	\$0	\$0	\$55.500	\$0	\$0	\$0
CC - 7252891	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 85444858	COLFONDOS	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1110492366	COLFONDOS	28	\$1.213.334	0.1600000	\$194.200	\$0	\$0	\$194.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1061371592	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 18562609	PORVENIR	18	\$780.000	0.1600000	\$124.800	\$0	\$0	\$124.800	\$0	\$0	\$0
CC - 18601393	SINAFFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 5049466	SINAFFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 91436696	PORVENIR	1	\$43.334	0.1600000	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000	\$0	\$0	\$0
CC - 4430554	PORVENIR	16	\$693.334	0.1600000	\$111.000	\$0	\$0	\$111.000	\$0	\$0	\$0
PT - 5106075	COLFONDOS	15	\$650.000	0.1600000	\$104.000	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0
CC - 9993087	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1007167160	PORVENIR	15	\$650.000	0.1600000	\$104.000	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1089721259	PORVENIR	10	\$433.334	0.1600000	\$69.400	\$0	\$0	\$69.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1070704836	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlir no ret
CC - 77027611	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1004688464	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1064708350	PORVENIR	25	\$1.083.334	0.1600000	\$173.400	\$0	\$0	\$173.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1097399246	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923467	COLFONDOS	9	\$390.000	0.1600000	\$62.400	\$0	\$0	\$62.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1002594493	PORVENIR	15	\$650.000	0.1600000	\$104.000	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1010052785	PORVENIR	16	\$693.334	0.1600000	\$111.000	\$0	\$0	\$111.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1088538045	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1088278541	PORVENIR	17	\$736.667	0.1600000	\$117.900	\$0	\$0	\$117.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1004766802	COLFONDOS	22	\$953.334	0.1600000	\$152.600	\$0	\$0	\$152.600	\$0	\$0	\$0
CC - 9991043	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1087486453	PROTECCION	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1126586196	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1079932836	PROTECCION	23	\$996.667	0.1600000	\$159.500	\$0	\$0	\$159.500	\$0	\$0	\$0
PT - 6497642	COLPENSIONES	1	\$43.334	0.1600000	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18611913	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$1.040.000	0.0400000	\$41.600	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$1.040.000	3	0.0696000	\$72.400
CC - 1004565833	SALUD TOTAL	1	\$53.334	0.0400000	\$2.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$53.334	3	0.0696000	\$3.800
CC - 1032251328	SALUD TOTAL	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	3	0.0696000	\$12.100
CC - 79784504	FAMISANAR	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$43.334	3	0.0696000	\$3.100
CC - 1089719548	SALUD TOTAL	10	\$433.334	0.0400000	\$17.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$433.334	3	0.0696000	\$30.200
CC - 18600369	ESSC ASMET SALUD	11	\$476.667	0.0400000	\$19.100	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$476.667	3	0.0696000	\$33.200
CC - 1106775931	EPS-S COOSALUD	25	\$1.083.334	0.0400000	\$43.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.083.334	3	0.0696000	\$75.500
CC - 1088257238	ESSC ASMET SALUD	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$693.334	3	0.0696000	\$48.300
CC - 1192924761	ESSC ASMET SALUD	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	3	0.0696000	\$12.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16185524	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.600.00 0	0.0400000	\$64.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.600.00 0	3	0.0696000	\$111.400
PT - 5118413	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$53.334	0.0400000	\$2.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$53.334	3	0.0696000	\$3.800
CC - 6010512	SALUD TOTAL	25	\$1.083.33 4	0.0400000	\$43.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.083.33 4	3	0.0696000	\$75.500
CC - 1088539117	ESSC ASMET SALUD	17	\$736.667	0.0400000	\$29.500	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$736.667	3	0.0696000	\$51.300
CC - 1087749903	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.600.00 0	0.0400000	\$64.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.600.00 0	3	0.0696000	\$111.400
CC - 1100337473	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$800.000	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$800.000	3	0.0696000	\$55.700
CC - 1016028684	EPS-S CAPITAL	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	3	0.0696000	\$6.100
CC - 1088249882	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1088537143	SALUD TOTAL	5	\$216.667	0.0400000	\$8.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$216.667	3	0.0696000	\$15.100
CC - 9764361	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$346.667	0.0400000	\$13.900	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$346.667	3	0.0696000	\$24.200
CC - 7252891	SALUD TOTAL	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 85444858	EPS-S COOSALUD	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1110492366	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$1.213.33 4	0.0400000	\$48.600	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1.213.33 4	3	0.0696000	\$84.500
CC - 1061371592	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 18562609	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$780.000	0.0400000	\$31.200	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$780.000	3	0.0696000	\$54.300
CC - 18601393	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$866.667	0.0400000	\$34.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$866.667	3	0.0696000	\$60.400
CC - 5049466	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 91436696	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$43.334	3	0.0696000	\$3.100
CC - 4430554	EPS-S PIJAOSALUD	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$693.334	3	0.0696000	\$48.300
PT - 5106075	ALIANSALUD EPS	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$650.000	3	0.0696000	\$45.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9993087	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	3	0.0696000	\$9.100
CC - 1007167160	SALUD TOTAL	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$650.000	3	0.0696000	\$45.300
CC - 1089721259	ESSC ASMET SALUD	10	\$433.334	0.0400000	\$17.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$433.334	3	0.0696000	\$30.200
CC - 1070704836	FAMISANAR	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 77027611	EPS SURA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1004688464	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1064708350	SANITAS	25	\$1.083.33 4	0.0400000	\$43.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.083.33 4	3	0.0696000	\$75.500
CC - 1097399246	SANITAS	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1054923467	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$390.000	0.0400000	\$15.600	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$390.000	3	0.0696000	\$27.200
CC - 1002594493	SALUD TOTAL	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$650.000	3	0.0696000	\$45.300
CC - 1010052785	SALUD TOTAL	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$693.334	3	0.0696000	\$48.300
CC - 1088538045	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1088278541	SALUD TOTAL	17	\$736.667	0.0400000	\$29.500	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$736.667	3	0.0696000	\$51.300
CC - 1004766802	ESSC ASMET SALUD	22	\$953.334	0.0400000	\$38.200	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$953.334	3	0.0696000	\$66.400
CC - 9991043	MIN002 - ADRES	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$43.334	3	0.0696000	\$3.100
CC - 1087486453	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	3	0.0696000	\$12.100
CC - 1126586196	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500
CC - 1079932836	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$996.667	0.0400000	\$39.900	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$996.667	3	0.0696000	\$69.400
PT - 6497642	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$43.334	3	0.0696000	\$3.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18611913	COMFAMILIAR RISARALDA	24	\$1.040.00 0	0.0400000	\$41.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004565833	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$53.334	0.0400000	\$2.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1032251328	COMFAMILIAR RISARALDA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79784504	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1089719548	COMFAMILIAR RISARALDA	10	\$433.334	0.0400000	\$17.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-18600369	COMFAMILIAR RISARALDA	11	\$476.667	0.0400000	\$19.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1106775931	COMFAMILIAR RISARALDA	25	\$1.083.33 4	0.0400000	\$43.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088257238	COMFAMILIAR RISARALDA	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1192924761	COMFAMILIAR RISARALDA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16185524	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.600.00 0	0.0400000	\$64.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-5118413	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$53.334	0.0400000	\$2.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6010512	COMFAMILIAR RISARALDA	25	\$1.083.33 4	0.0400000	\$43.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088539117	COMFAMILIAR RISARALDA	17	\$736.667	0.0400000	\$29.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087749903	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.600.00 0	0.0400000	\$64.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1100337473	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1016028684	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088249882	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088537143	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$216.667	0.0400000	\$8.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9764361	COMFAMILIAR RISARALDA	8	\$346.667	0.0400000	\$13.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7252891	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-85444858	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1110492366	COMFAMILIAR RISARALDA	28	\$1.213.33 4	0.0400000	\$48.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1061371592	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-18562609	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$780.000	0.0400000	\$31.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-18601393	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$866.667	0.0400000	\$34.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5049466	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91436696	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4430554	COMFAMILIAR RISARALDA	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-5106075	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9993087	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007167160	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1089721259	COMFAMILIAR RISARALDA	10	\$433.334	0.0400000	\$17.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1070704836	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-77027611	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004688464	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1064708350	COMFAMILIAR RISARALDA	25	\$1.083.33 4	0.0400000	\$43.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1097399246	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054923467	COMFAMILIAR RISARALDA	9	\$390.000	0.0400000	\$15.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002594493	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010052785	COMFAMILIAR RISARALDA	16	\$693.334	0.0400000	\$27.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088538045	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088278541	COMFAMILIAR RISARALDA	17	\$736.667	0.0400000	\$29.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004766802	COMFAMILIAR RISARALDA	22	\$953.334	0.0400000	\$38.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9991043	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087486453	COMFAMILIAR RISARALDA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1126586196	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079932836	COMFAMILIAR RISARALDA	23	\$996.667	0.0400000	\$39.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-6497642	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$43.334	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$0	\$0	\$0	\$0	
PORVENIR	25	\$2.870.200	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$11.500	\$0	\$0	\$2.881.700	
COLFONDOS	9	\$1.151.100	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$4.700	\$0	\$0	\$1.155.800	
PROTECCION	6	\$714.400	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$2.900	\$0	\$0	\$717.300	
COLPENSIONES	5	\$706.800	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$2.900	\$0	\$0	\$709.700	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$52.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$52.00 0	6	\$300	\$0	\$52.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$52.30 0	\$0	\$0	\$52.30 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALIANSA LUD EPS	1	\$26.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.00 0	6	\$200	\$0	\$26.20 0	\$0	0	\$0	\$0	\$26.20 0	\$0	\$0	\$26.20 0
NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$486.3 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$486.3 00	6	\$2.000	\$0	\$488.3 00	\$0	0	\$0	\$0	\$488.3 00	\$0	\$0	\$488.3 00
MIN002 - ADRES	1	\$1.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.800	6	\$100	\$0	\$1.900	\$0	0	\$0	\$0	\$1.900	\$0	\$0	\$1.900
ESSC ASMET SALUD	8	\$243.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$243.0 00	6	\$1.000	\$0	\$244.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$244.0 00	\$0	\$0	\$244.0 00
EPS-S COOSALUD	2	\$95.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$95.40 0	6	\$400	\$0	\$95.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$95.80 0	\$0	\$0	\$95.80 0
SANITAS	2	\$95.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$95.40 0	6	\$400	\$0	\$95.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$95.80 0	\$0	\$0	\$95.80 0
EPS-S EMSSANAR	1	\$64.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$64.00 0	6	\$300	\$0	\$64.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$64.30 0	\$0	\$0	\$64.30 0
EPS-S CAPITAL	1	\$3.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$3.500	6	\$100	\$0	\$3.600	\$0	0	\$0	\$0	\$3.600	\$0	\$0	\$3.600
FAMISANAR	2	\$53.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$53.80 0	6	\$300	\$0	\$54.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$54.10 0	\$0	\$0	\$54.10 0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$61.20 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$61.20 0	6	\$300	\$0	\$61.50 0	\$0	0	\$0	\$0	\$61.50 0	\$0	\$0	\$61.50 0
EPS-S PIJAOSALUD	1	\$27.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$27.80 0	6	\$200	\$0	\$28.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$28.00 0	\$0	\$0	\$28.00 0
SALUD TOTAL	10	\$240.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$240.0 00	6	\$1.000	\$0	\$241.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$241.0 00	\$0	\$0	\$241.0 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	48	\$2.522.900	0	\$0	\$0	\$2.522.900	6	\$10.100	\$2.533.000	0	\$0	\$0	\$2.533.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$1.450.200	6	\$5.800	\$1.456.000
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	6	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	13	\$1.456.800
PENSIONES	4	\$5.464.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$2.533.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.456.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$10.910.300



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APIÁ	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				22 0
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222593	TOTAL A PAGAR \$5.459.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.000	0		0		0	6	700	0	156.700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.500	0		0		0	6	100	0	3.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	343.300	0		0		0	6	1.400	0	344.700	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	6	300	0	52.300	1
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	29.500	0		0		0	6	200	0	29.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	118.500	0		0		0	6	500	0	119.000	4

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	554.300	0	0	0	0	6	2.300	0	556.600	4	
230301	Porvenir	800224808-8	2.241.000	0	0	0	0	6	9.000	0	2.250.000	17	
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.900	0	0	0	0	6	100	0	14.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.222.700				1.222.700	6	4.900	1.227.600			12.227	1.227.600	22

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF44	Comfamiliar Risaralda					891480000-1	702.800
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				6	2.900	705.700	22



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APIÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222593	\$5.459.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	702.800	706.000
Pensión	3	2.809.200	2.820.600
Riesgos Laborales	1	1.222.700	1.227.600
CCF	1	702.800	705.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.437.500	5.459.900



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APÍA		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					22 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2024-12		2024-11		\$5.459.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE											INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Boligero	Exonerado	Columna especial	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VBP	SLN	IOE	UMA	UVA	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1002594493	SANCHEZ BOLIVAR FABIAN	1	0		S		X														230301	216.667	34.700	0	0	0	0	0	EPS002	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
2	CC	1002944048	VALLEJO VALENCIA VALENTINA	1	0		S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1002944383	OSORIO RIVERA JORGE ENRIQUE	1	0		S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1004626333	DAVILA COLORADO JHONIER ANDRES	1	0		S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1004688472	URIBE MARIN MARIO ALEJANDRO	1	0		S		X														230301	693.334	111.000	0	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
6	CC	1004766802	SILVA MAYA ESTEBAN DAVID	1	0		S		X														230301	736.667	117.900	0	0	0	0	0	ESSC62	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
7	CC	1010052785	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	1	0		S		X														230301	906.667	145.100	0	0	0	0	0	EPS002	906.667	36.300	14-11	906.667	5	63.200	CCF44	906.667	36.300	0	0	0	0	0
8	CC	1061368680	MAFLA GRAJALES SAMUEL DAVID	1	0		S		X														230301	390.000	62.400	0	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF44	390.000	15.600	0	0	0	0	0
9	CC	1078918233	MARTINEZ MENA LUIS EVIN	1	0		S		X														230301	693.334	111.000	0	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
10	CC	1086280029	GALLEGO PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO	1	0		S		X														230301	216.667	34.700	0	0	0	0	0	EPS037	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
11	CC	1088241602	ESPINOSA ZAPATA CRISTIAN DAVID	1	0		S		X														230201	563.334	90.200	0	0	0	0	0	ESSC62	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF44	563.334	22.600	0	0	0	0	0
12	CC	1088257238	CARDONA VILLADA DIEGO ALBERTO	1	0		S		X														230301	963.334	154.200	0	0	0	0	0	ESSC62	963.334	38.600	14-11	963.334	5	67.100	CCF44	963.334	38.600	0	0	0	0	0
13	CC	1088278541	SERNA GONZALEZ JOSE LEONARDO	1	0		S		X														230301	390.000	62.400	0	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF44	390.000	15.600	0	0	0	0	0
14	CC	1088538045	SANCHEZ CARDONA JEISON ALBERTO	1	0		S		X														230201	693.334	111.000	0	0	0	0	0	ESSC62	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
15	CC	1093223795	LOPEZ ARBOLEDA JARLEN DAVINSON	1	0		S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1112103319	POSSO MACIAS VANESSA	1	0		S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1193510310	LAMUNDIA SUCRE ILDER	1	0		S		X														230201	906.667	145.100	0	0	0	0	0	EPS037	906.667	36.300	14-11	906.667	5	63.200	CCF44	906.667	36.300	0	0	0	0	0
18	CC	18600464	LOPEZ NARANJO JUAN DIEGO	1	0		S		X														230301	693.334	111.000	0	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
19	CC	18601393	MAYA PELAEZ ALBEIRO DE JESUS	1	0		S		X														230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPS037	866.667	34.700	14-11	866.667	5	60.400	CCF44	866.667	34.700	0	0	0	0	0
20	CC	36505376	BENAVIDES MANCERA NELA ROSARIO	1	0		S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	4430554	MONTOYA ZAPATA JOSE GILBERTO	1	0		S		X														230301	736.667	117.900	0	0	0	0	0	EPSIC6	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
22	CC	77027611	RANGEL HERNANDEZ JOEL ARTURO	1	0		S		X														25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF44	86.667	3.500	0	0	0	0	0

PAGADA 2024-12-10 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COIMAQ						
Documento	NI 900742437			Dirección	VTE 99 #99 - 99 VEREDA ANCON1 COPACABANA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4441270		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	16
Ciudad	COPACABANA			Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ ACEVEDO PEDRO ENRIQUE			Identificación	CC 8029417		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037977168		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					IJAJI AGUIRRE YAN CARLOS	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF					
							X							0	30	30	30	30																														
																																							</									

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 316.000	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000	\$ 137.500	\$ 79.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

PAGADA 2024-12-10 12:48:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO				
Documento	CC 15511323		Dirección	CR 80 #39 - 65	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	4530612	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados5
Ciudad	COPACABANA		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15506892		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					TORRES RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	30	25-14	16 %	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	EPS010		4 %	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 1.300.000	\$ 90.500	CCF04	4 %	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA identificado(a) con CC 9845977 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION MUTUAL DE COLOMBIA NI 900008843																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-12	2024-12	1118009863	9478782070	Y	2024-12-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$1,300,000						\$90,500										
EPS		SALUD TOTAL		30	12.5%	\$1,300,000						\$162,500										

Este certificado se expide el día 2024-12-11 a las 10:35.

PAGADA 2024-12-10 12:48:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO						
Documento	CC 15511323			Dirección	CR 80 #39 - 65		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	4530612		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	5
Ciudad	COPACABANA			Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15505605		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					ORJUELA MORENO MAURICIO	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF							
														0	30	30	30	30																																

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CRA 37B 29 18		3114464		SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31919440	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.804.300	106.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31919440	2024-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.			
1	CC 3513263	PEREZ FRANCISCO JAVIER	1.300.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	3	194.500	S	1711001		
2	CC 6119228	OSPINA MARIN JOSE ADRIAN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
3	CC 6284489	ARREDONDO MARIN NAUDO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
4	CC 9869223	RAMIREZ LOPEZ JOSE OMAR	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSC5	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
5	CC 10011710	GARZON ARISMENDIS JOHN CARLOS	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
6	CC 10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS	2.014.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.014.000	322.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.014.000	80.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.014.000	80.600	2.014.000	140.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	623.700	S	1711001	
7	CC 16203714	NIETO CARDONA ORLANDO	1.300.000	F															0			0	30	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	3	194.500	S	1711001
8	CC 16231729	VILLA BEDOYA EDUAR ALEXANDER	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
9	CC 16233922	VILLA BEDOYA JUAN CARLOS	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
10	CC 18510624	RAMIREZ LOPEZ ALEX	5.434.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.434.000	869.500	27.200	27.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.434.000	217.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	5.434.000	217.400	5.434.000	378.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.737.000	S	1711001	
11	CC 1005098943	LOPEZ GALLEGO BRALLAN ESTIBEN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
12	CC 1078178390	RENTERIA MOSQUERA MANUEL DE JESUS	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
13	CC 1088033762	CRUZ RUBIO JUAN ESTEBAN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001	
14	CC 1126318294	BETANCUR LOPEZ JUAN ARTURO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	1711001	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CRA 37B 29 18		3114464		SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31919440	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.804.300	106.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31919440	2024-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.448.000	23.048.000	23.048.000	23.048.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	3.326.200	0	52.700	0	3.378.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.454.200	0	23.100	0	1.477.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	3.300	0	211.300
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.664.000	0	26.300	0	1.690.300
EPS(Administradoras: 6)				14	922.000	0	15.000	0	937.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	900	0	52.900
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	52.000	0	900	0	52.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	425.400	0	6.800	0	432.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	900	0	52.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	236.600	0	3.800	0	240.400
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	104.000	0	1.700	0	105.700
ARP(Administradoras: 1)				14	1.527.600	0	24.200	0	1.551.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.527.600	0	24.200	0	1.551.800
CCF(Administradoras: 1)				14	922.000	0	14.600	0	936.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	14	922.000	0	14.600	0	936.600
Gran Total					6.697.800	0	106.500	0	6.804.300



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 09:41:35 AM Tipo Planilla E Número Planilla 1068683149
Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202412
Cliente:

PAGADA 2024-12-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BL SERVICIOS INTEGRALES SAS				
Documento	NI 901320751			Dirección	CR 8 #18 - 18 21 ED ANTONIO CORREA 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	1
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	PEREIRA			Total Afiliados	1
Representante Legal	RESTREPO RAMIREZ BEATRIZ LILIANA			Departamento	RISARALDA
				Identificación	CC 24549595

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1061372792		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ BARRERA SEBASTIAN		000000005	ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															0				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1046653637	9477245485	E	2024/12/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	\$2,132,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,120,000	\$244,800			\$7,000,000	\$487,300		\$0	\$0		\$2,132,100	
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,120,000	\$244,800			\$7,000,000	\$487,300		\$0	\$0		\$2,132,100	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,120,000	\$244,800			\$7,000,000	\$487,300		\$0	\$0		\$2,132,100	
1	CC	1056709462	AGUIRRE JONATHAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$390,500
2	CC	1090991513	GALVIS CARLOS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
3	CC	1083553993	GUTIERREZ DAINER																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
4	CC	7713215	LOSADA RODRIGO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$390,500
5	CC	1120577121	TRIANA JUAN	X																230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300
Total Afiliados(5)																						\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,120,000	\$244,800			\$7,000,000	\$487,300		\$0	\$0		\$2,132,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1046653637	9477245485	E	2024/12/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	\$2,132,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$912,000	\$0	\$0	\$912,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$487,300	\$0	\$0	\$487,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$487,300	\$0	\$0	\$487,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$244,800	\$0	\$0	\$244,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$244,800	\$0	\$0	\$244,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
TOTAL				5	\$2,132,100	\$0	\$0	\$2,132,100	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012		JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31867373	E	2024-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.254.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31867373	2024-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 10267588	CASAS BELTRAN LUIS ALFONSO	4.347.827		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.347.827	695.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.347.827	174.000	CCF DE CALDAS-CCF11	4.347.827	174.000	4.347.827	302.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.346.400	S	5431202
2	CC 10271296	MORALES MORALES CARLOS EMILIO	1.563.043		F	X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	781.522	125.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	781.522	31.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.023.577	41.000	781.522	54.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	251.800	S	5431202
3	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088		F															0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	2.449.277	391.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.449.277	98.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.449.277	98.000	2.449.277	170.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	758.400	S	5431202
4	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088		F									X						0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	251.183	40.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	251.183	10.100	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	251.183	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	50.300	S	5431202
5	CC 16078232	MARTINEZ OSPINA JAIDER FERNANDO	6.351.520		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.351.520	1.016.300	31.800	31.800	EPS SURA-EPS010	6.351.520	254.100	CCF DE CALDAS-CCF11	6.351.520	254.100	6.351.520	442.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	2.030.200	S	5431202
6	CC 24343391	BEDOYA VALENCIA DIANA CAROLINA	4.347.827		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.347.827	695.700	0	0	EPS SURA-EPS010	4.347.827	174.000	CCF DE CALDAS-CCF11	4.347.827	174.000	4.347.827	22.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	1.066.400	S	5431202
7	CC 75062648	OSPINA RIOS JUAN CARLOS	1.563.043		F	X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	781.522	125.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	781.522	31.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.009.466	40.400	781.522	54.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	251.200	S	5431202
8	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653		F															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	717.682	114.900	0	0	EPS SURA-EPS010	717.682	28.800	CCF DE CALDAS-CCF11	717.682	28.800	717.682	50.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	222.500	S	5431202
9	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653		F												X			0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	627.972	100.500	0	0	EPS SURA-EPS010	627.972	25.200	CCF DE CALDAS-CCF11	627.972	25.200	627.972	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	150.900	S	5431202
10	CC 75078346	LONDOÑO MARTINEZ JUAN JOSE GREGORIO	3.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5431202
11	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000		F															0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	857.267	137.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	857.267	34.300	CCF DE CALDAS-CCF11	857.267	34.300	857.267	59.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	265.500	S	5431202
12	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000		F												X			0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	1.091.067	174.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.091.067	43.700	CCF DE CALDAS-CCF11	1.091.067	43.700	1.091.067	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	262.000	S	5431202
13	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000		F									X						0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	259.752	41.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	259.752	10.400	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	259.752	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	52.000	S	5431202
14	CC 1035581081	LOPEZ TUBERQUIA FERNANDO	1.300.000		F	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	216.667	8.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	441.459	17.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	76.200	S	5431202
15	CC 1053803773	MORENO HENAO CARMENZA	2.438.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.438.000	390.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.438.000	97.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.438.000	97.600	2.438.000	169.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	755.000	S	5431202
16	CC 1053831761	YARA ALVAREZ JUAN DAVID	1.563.043		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.563.043	250.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.563.043	62.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.563.043	62.600	1.563.043	108.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	484.100	S	5431202
17	CC 1053846908	GARCIA PEREZ JULIANA	3.339.600		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.339.600	534.400	0	0	EPS SURA-EPS010	3.339.600	133.600	CCF DE CALDAS-CCF11	3.339.600	133.600	3.339.600	17.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	819.100	S	5431202
18	CC 1054856187	GIRALDO CASAS OSCAR MANUEL	1.563.043		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.563.043	250.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.563.043	62.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.563.043	62.600	1.563.043	108.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	484.100	S	5431202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012		JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31867373	E	2024-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.254.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31867373	2024-12-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
34.984.771	34.984.771	34.984.771	35.168.627	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				14	5.661.800	0	0	0	5.661.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.970.200	0	0	0	1.970.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	912.100	0	0	0	912.100
PROTECCION	230201	800229739	0	7	2.779.500	0	0	0	2.779.500
EPS(Administradoras: 3)				14	1.400.300	0	0	0	1.400.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	6	833.300	0	0	0	833.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	495.700	0	0	0	495.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	71.300	0	0	0	71.300
ARP(Administradoras: 1)				14	1.785.200	0	0	0	1.785.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.785.200	0	0	0	1.785.200
CCF(Administradoras: 2)				14	1.407.600	0	0	0	1.407.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	1	17.700	0	0	0	17.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	13	1.389.900	0	0	0	1.389.900
Gran Total					10.254.900	0	0	0	10.254.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478421337	9478421337	E	2024/12/10	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	1	\$5,127,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF					
1	CC	1087557079	ARENAS PESCADOR BRESMAN ORLANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
2	CC	4414692	ARROYAVE MAZO JHON FREDY																		230301	30	EPS002	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
3	CC	18607924	AVILA GARCES DUBER ORLAD																		230201	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
4	CC	94406227	CARVAJAL BARCO JOSE GUILLERMO		X																231001	13	EPS005	13	CCF44	13	14-11	13	13	Si					
5	CC	16233805	CASTAÑEDA GIRALDO WILMORE	X																	25-14	3	EPS042	3	CCF44	3	14-11	3	3	Si					
6	CC	16217281	HERNANDEZ MELO EDISON																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
7	CC	71938535	HERRERA MORALES JOSE AGERSAIN	X																	230301	25	EPS037	25	CCF44	25	14-11	25	25	Si					
8	CC	2473378	HOYOS ALVAREZ JAIR DE JESUS																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
9	CC	18608459	LUGOS OSPINA HERZON																		230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
10	CC	11636118	MURILLO CRISTOBAL	X																	230201	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
11	CC	1087547729	OCAÑO CASTAÑO LUIS FERNANDO																		230201	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
12	CC	94394705	RAMIREZ RUDAS LIBANIEL																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si					
13	CC	14567024	VALENCIA CORREA JUAN CARLOS																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	No					
Total Afiliados(13)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-11	2024-12	9478421337	9478421337	E	2024/12/10	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	1	\$5,127,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					13	\$2,556,400	\$2,000	\$0	\$2,558,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$90,200	\$100	\$0	\$90,300		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$20,800	\$100	\$0	\$20,900		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,821,400	\$1,300	\$0	\$1,822,700		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000	\$500	\$0	\$624,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,112,400	\$800	\$0	\$1,113,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$1,112,400	\$800	\$0	\$1,113,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$639,200	\$500	\$0	\$639,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	\$639,200	\$500	\$0	\$639,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					13	\$749,700	\$800	\$0	\$750,500	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$5,200	\$100	\$0	\$5,300		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$299,400	\$200	\$0	\$299,600		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$370,500	\$300	\$0	\$370,800		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$22,600	\$100	\$0	\$22,700		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$39,000	\$100	\$0	\$39,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$100	\$0	\$39,100		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100		
TOTAL					13	\$5,122,700	\$4,300	\$0	\$5,127,000	



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.78 ANEXO 20. Gestión orden y aseo Obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

14. GESTION ORDEN Y ASEO

#	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (INSPECCION/JORNADA /CHARLAS/OTRAS	FECHA	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIA DE GESTION
1	Organización del punto Ecológico	3/12/2024	Apia		
2	Jornada de Orden y Aseo	3/12/2024	Apia		
3	Jornada de Orden y Aseo	06/12/2024	Apia		

4	Jornada de orden y Aseo	07/12/2024	Apia		
5	Recolección de Señalización	09/12 /2024	Las melenas		
6	Jornada de orden y Aseo	13/12/2024	Apia		
7	Jornada de orden y Aseo	18/12/2024	Apia		
8	Lavada de Mixer	27-12-2024	Apia Muro		



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.79 Prórroga No. 05 Contrato de Interventoría No. 4107 de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 4107 DE 2023
PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 10 DE ENERO DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA- SIGA identificado con NIT 901.053.528-2 (Integrado por SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775-1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 51%; ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. CON NIT. 860.008.018-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 49%).

Entre los suscritos, **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.378.804, en calidad de **SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 0150 GRADO 20 de la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** de la Planta Global de INVIAS, nombrado mediante Resolución No. 1591 de del 17 de mayo de 2023 y posesionado mediante Acta No. 00043 del 18 de mayo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 2922 del 16 de julio de 2024, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **ERIKA LILIANA ACOLSTA ALZATE** identificada con cédula de ciudadanía número 43.839.377 expedida en Itagüí, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO ETSA- SIGA** identificado con NIT 901.053.528-2 en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato de interventoría No. 4107 del 02 de noviembre de 2023, hemos convenido suscribir la presente prórroga, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

- 1) Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y **CONSORCIO ETSA- SIGA**, suscribieron el Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023, el 02 de noviembre de 2023, cuyo objeto es: “**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**”
- 2) Que el valor inicial del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023, se estableció en MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.299.999.953), INCLUIDO IVA y el plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Que mediante oficio No. 2023S-VBOG-027818 dirigido al **INTERVENTOR**, el Subdirector de Gestión Integral de Carreteras del **INSTITUTO** imparte Orden de Inicio del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023 a partir del 12 de diciembre de 2023.
- 4) Que el Contrato Interventoría N° 4107 de 2023 ha sido objeto de las siguientes modificaciones, adiciones y prórrogas:

Modificación contractual	Fecha de suscripción	Asunto
Prórroga No. 1	29 de diciembre de 2023	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 30 de junio de 2024.
Modificación No. 1	03 de abril de 2024	Se suprimió la cláusula décima primera relacionada

		con el anticipo y el literal b) de la cláusula décima octava del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Prórroga No. 2	27 de junio de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 31 de octubre de 2024.
Prórroga No. 3	31 de octubre de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 15 de noviembre de 2024.
Prórroga No. 4 y Adición No. 1	15 de noviembre de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 31 de diciembre de 2024, y se adiciono la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 199.999.992.00), para un valor total acumulado de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.499.999.945).

5) Que mediante oficio No. **5143058INV-OV-388-2024** del 03 de diciembre de 2024, **EL INTERVENTOR**, solicita la prórroga hasta el 10 de enero de 2025 del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023. En la justificación establece:

“(…) 6. El Contrato de Obra contempla la estabilización de los sitios en los que se presente pérdida de banca o la posibilidad de ocurrencia, situación que se presenta en el PR 63+250 RUTA 5003 Apia – Viterbo – Asia y las Obras de reforzamiento estructural en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003
7. Para construir y concluir las obras diseñadas en el PR 63+250 y Puente Vehicular en el PR77+100 de la ruta 5003, que aseguren la estabilidad de la vía, se requiere el plazo aquí descrito.
8. Para el mes de noviembre, se presentaron lluvias en un total de 19 días, lo cual representa el 64% de los días del mes y un incremento de precipitación del 20% respecto al mes de octubre, días en los cuales se realizó suspensión de las actividades de obra situación que ha generado impactos negativos en la ejecución de los frentes de obra y atrasos en la programación de obra, lo cual genero reprocesos en las actividades.
9. Se han materializado los riesgos naturales y ambientales, los cuales han generado la necesidad de adelantar el balance de cantidades y la solicitud de prorroga No. 5 para el contrato de obra No. 4161 de 2023
10. Que el contratista de obra mediante oficio mediante comunicación E-514T del 7 de noviembre de 2024, solicitó la prórroga No 05, hasta el 10 de enero de 2024.
11. Que esta Interventoría, conceptuó favorablemente la solicitud, mediante comunicación 5143058INV-OV-387-2024_ PRÓRROGA No. 5 Contrato de obra 4161 de 2023, en donde se concluyó que el Contratista de Obra requiere un plazo adicional hasta el 10 de enero de 2025 para la ejecución de la obra.
12. Por lo antes expuesto, y partiendo que el plazo del Contrato de Interventoría finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024, se hace necesario proceder a la prórroga del plazo del Contrato de Interventoría hasta el 10 de enero de 2025.
13. Con lo anterior, el nuevo plazo de finalización sería el 10 de enero del 2025 (…)”

6) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Prórroga del 03 de diciembre de 2024, suscrito por el Interventor, el Apoyo a la Supervisión, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial y la Abogada de la Unidad Ejecutora. En la solicitud se establece la siguiente justificación:

“Dado que el plazo del contrato de interventoría No. 4107 de 2023 vence el próximo 31 de diciembre de 2024 y en procura de garantizar la actividad de INTERVENTORÍA a la ejecución de la obra de “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA

LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.”, cuyas obras consisten a la fecha en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003 contemplando el reforzamiento estructural mediante los debidos manejos de aguas, el recalces en concreto y pilotaje en el estribo izquierdo, derecho y pila/dado central, también la limpieza de toda la superestructura para sellado de fisuras y grietas que puedan tener presente y el mantenimiento de la carpeta asfáltica del tablero, el reemplazo de las 3 juntas de dilatación del tablero y la instalación de una defensa metálica, y frente al Muro de contención en el PR 63+250 de la vía 5003 de 53.5 metros de longitud, distribuidos en 3 módulos continuos de 22.63m, 24m y 6.78m respectivamente, y con un total de 34 caissons a profundidades variables; dicho esto para su proceso constructivo fue necesaria realizar una excavación parcial del talud, e iniciar la excavación de caissons con niveles de desplante superiores, lo cual garantizará una transitabilidad vehicular sobre la ruta y estabilidad del talud en el tiempo de construcción. Se proyecta la construcción total de los módulos 1 y 3, para posteriormente realizar la construcción del módulo 2, lo cual genera tiempos adicionales, obras que se desarrollan bajo el contrato de obra número No. 4161 de 2023, el que hoy cuenta con su AVAL para su PRORROGA para el que se hace necesario por tanto PRORROGAR hasta el día 10 de enero de 2025 el contrato de INTERVENTORIA aquí citado y para garantizar así el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, en el desarrollo de las obras.

No se requiere adición a la fecha debido a la extensión de la plantilla mínima para poder garantizar el seguimiento, control y calidad de las obras que se ejecutarán en este plazo para el contrato de obra No. 4161 de 2023, que son continuar con las obras en la recuperación de la banca en el PR 63+250, consistentes en la construcción de un (1) muro de contención de $l = 53,5m$, y en el Reforzamiento estructural del Puente vehicular Viterbo PR 77+100 para así garantizar la transitabilidad del corredor vial, ruta 5003 vía Apia – Viterbo – Asia.

El balance financiero del contrato es el siguiente:

- a) Valor inicial del contrato: \$1,299,999,953, Adición No. 01: \$199,999,992; Valor Total del Contrato: \$ 1,499,999,945
- b) Valor facturado y obligado a la fecha (Valores ya cancelados al contratista). Actas de costos pagadas hasta el mes de noviembre de 2024 para un valor total de \$ 1,373,394,782.62
- c) Saldos fenecidos: \$ 0.7
- d) Saldos en reserva (si existen): N/A
- e) Balance general: El contrato de interventoría No. 4107-2023 está al día en acta de costos hasta el mes de NOVIEMBRE de 2024, quedando un saldo de Vigencia 2024 por \$ 126,605,161.68.
- f) Los recursos existentes serán ejecutados en la presente vigencia y los mismos son suficientes junto con el plazo del contrato y/o convenio para el cumplimiento del 100% del objeto contractual en la vigencia que corresponda: Al respecto, se informa que los recursos se ejecutarán HASTA EL MES DE ENERO DE 2025.

La solicitud de prórroga hasta el 10 DE ENERO DE 2025 resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes. teniendo en cuenta que la presente solicitud de prórroga no es imputable a la interventoría, se reserva el derecho de reclamación.”

- 7) Que con Memorandos Nos. 2024I-VBOG-093881 del 05 de diciembre de 2024 y alcance 2024I-VBOG-098366 del 18 de diciembre de 2024, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la prórroga del contrato. El resumen justificación Unidad Ejecutora establece lo siguiente:

“La Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales considera VIABLE la solicitud de PRÓRROGA al contrato de interventoría No. 4107 de 2023 -, CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528 – 2, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental al contratista de obra dentro del plazo solicitado por el Contratista del contrato de Obra No. 4107 de 2023 y que se encuentra en trámite actualmente, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento de las actividades de construcción muro de contención del 63+250, y reforzamiento del puente Viterbo, PR77+100 de la ruta 5003 y así, cumplir con los procesos misionales del Instituto Nacional de Vías.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

Por lo tanto, la Unidad Ejecutora luego del análisis expuesto, considera viable la solicitud de PRÓRROGA hasta el día 10 de enero de 2025 (...)

(...) Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que las causas que dan lugar a prorrogar el plazo de ejecución del contrato son irresistibles, imprevisibles y no imputables a las partes; resulta procedente constituir en reserva presupuestal el saldo por ejecutar del contrato, para continuar su ejecución en el año 2025.”

- 8) Que de conformidad con la información reportada por la unidad ejecutora en el memorando No. 2024I-VBOG-093881 del 05 de diciembre de 2024, el contrato cuenta con el siguiente estado:

Avance Financiero programado: 92,08 %	Avance financiero ejecutado: 91,56 %
---------------------------------------	--------------------------------------

- 9) Que el contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 no tiene procesos administrativos sancionatorios en curso.
- 10) Que las garantías que amparan la ejecución del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 se encuentran actualizadas y aprobadas por el INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023 y las siguientes,

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, hasta el 10 de enero de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del **INTERVENTOR** y no implica adición en valor ni sobrecostos para **EL INSTITUTO**, por lo que **EL INTERVENTOR** efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL INTERVENTOR**. Así las cosas, dicha prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA- ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL INTERVENTOR** se obliga a presentar para aprobación del **INSTITUTO**, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA- GARANTÍA ÚNICA. - **EL INTERVENTOR** se obliga a modificar la garantía, a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguiente a la suscripción de esta prórroga, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Laura Sofia Melendez- Abogada SGCP.
Revisó: Liz Kendry Sánchez Pinto – Abogada SGCP.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.80 Pólizas Actualizadas Prorroga No.05 Contrato de Interventoría No. 4107 de 2024



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 45491859

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	30/12/2024	52848	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
Tomador: CONSORCIO ETSA SIGA					NIT/CC 901053528
Suma de: QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.*****					
Pagador: MONROY GARCIA CA LTDA					NIT/CC 9000426661
Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #21808008					
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
11-BOGOTA-40-RCE CONTRATOS-101065609-2-1	\$106.841,69	\$3.000,00	\$20.869,92	\$0,00	\$130.711,61
11-BOGOTA-45-CU. PARTICULAR.-101146885-2-1	\$275.552,77	\$8.000,00	\$53.875,03	\$0,00	\$337.427,80
11-BOGOTA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101210610-10-1	\$27.123,29	\$8.000,00	\$6.673,43	\$0,00	\$41.796,72
Otros conceptos de pago					Valor
APROVECHAMIENTOS					\$-0,80
APROVECHAMIENTOS					\$-0,72
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$509.936,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,61
Forma de pago					
AHORRO				Ahorro:	\$509.934,00
				Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 16859671				Total:	\$509.934,00
				Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101210610	ANEXO 10
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 12 2024	02 11 2023		00:00	10 02 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO ETSA SIGA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.053.528-2
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 25 C - 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3100811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 4107 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO EXTENDERÁ SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/11/2023	10/01/2028	\$299,999,989.00	\$299,999,989.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2023	10/07/2025	\$149,999,994.50	\$149,999,994.50
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	15/01/2029	\$449,999,983.50	\$449,999,983.50

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO CINCO (05) DE 2024, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****27,123.00	\$ *****8,000.00	\$ *****6,673.00	\$ *****41,796.00	\$ *****899,999,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

23783

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
BOGOTA, D.C.						BOGOTA						11		11-44-101210610		10	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
26	12	2024	02	11	2023	00:00	10	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO ETSA SIGA		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.053.528-2	
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 25 C - 11		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3100811	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
ESTUDIOS TECNICOS SAS
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
860008018-9	49.00
900269775-1	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

23783

DLF052848E

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101210610, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.81 Acta de Aprobación de Pólizas Interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS						
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS			VERSIÓN			
	INTERVENTORÍA						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			PAGINA	1	DE	1
CONTRATO No. 4107 DE 2023							
CONTRATISTA:		CONSORCIO ETSA-SIGA NIT 901.053.528-2					
OBJETO DEL CONTRATO:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		2/11/2023					
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		12/12/2023					
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:		10/01/2025					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1,499,999,945.00					
VALOR ADICIONA: N/A				No.REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A			
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:		- PRORROGA 5					
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS							
PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	11-44-101210610		ANEXO: 10		Del 26/12/2024		ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	Desde:	2/11/2023	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		Valor:	\$ 149.999.994.50
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	Desde:	2/11/2023	Hasta:	10/01/2028		Valor:	\$ 299,999,989,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.					Valor:	\$ 449,999,983.50
OBSERVACIONES:							
<div>Proyectó: Stella Ballen Herrera</div> <div>Revisó: Andres Leal Roas</div> <div>Aprobó: Carolina Pabón Silva- SGCP</div>							

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-44-101210610

Fecha de expedición:

jueves, 26 de diciembre de 2024

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Inicio de vigencia:

jueves, 2 de noviembre de 2023

Valor total asegurado:

\$ 899.999.967

Número de anexo:

10

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:

CONSORCIO ETSA SIGA

Fin vigencia:

sábado, 10 de febrero de 2029

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

10/01/2028 11:59:00 PM

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)

Tareas del flujo (3/3)

Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1 Abogado Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Pólizas SGCPA :: Abogados Equipo Pólizas SGCPA	Gilma Stella Ballen Herrera	8 días de tiempo transcurrido (12/02/2025 2:52:22 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
2 Coordinadores	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	1 día de tiempo transcurrido (19/02/2025 11:29:34 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del	Aprobado	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos	Carolina Pabón	1 día de tiempo transcurrido

ago de la factura

A definir




**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.82 Registro fotográfico del avance de las obras.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apía - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA									
					FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920					Vaciado de pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100				
									
Excavación manual para instalación de tubería para manejo de aguas, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Apía, PR59+455 margen derecha a mayores					Figurado de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920				

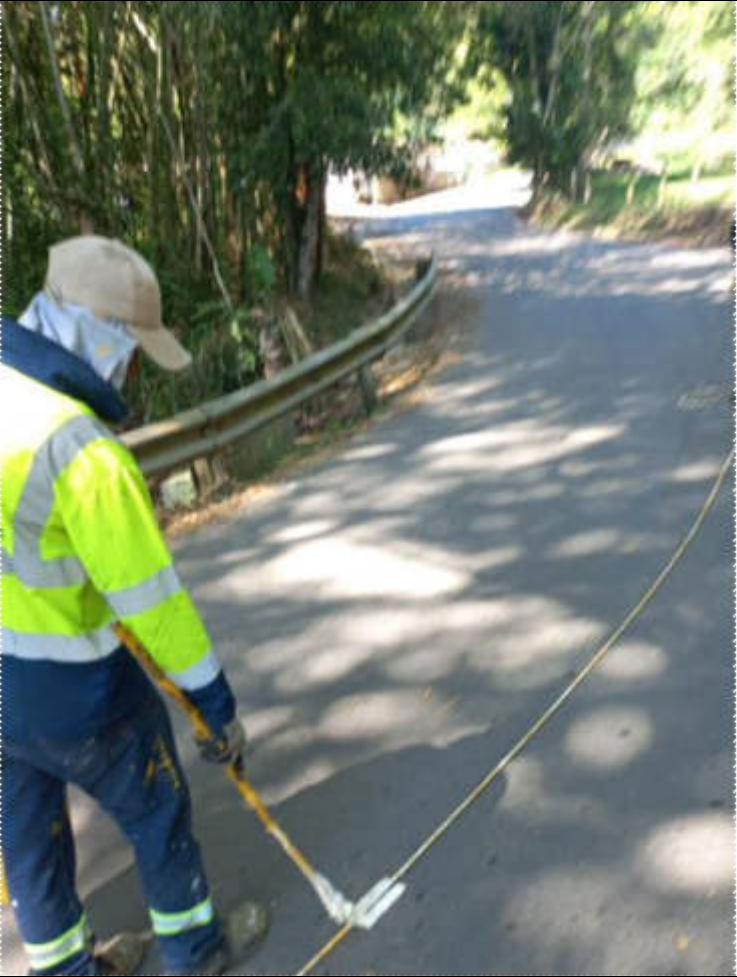	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920					Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920				
									
Figurado de acero para su instalación, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920					Punteo previo para pintura de línea de centro , Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 74+230				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA																			
					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024										
							(Día)	(Mes)	(Año)										
1. DATOS GENERALES																			
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:														
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023																
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES																		
																			
Instalación de acero para recámara, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455										Vaciado de losas del disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920									
																			
Instalación de acero para recámara, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455										Vaciado de losa del disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920									

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.											
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA												
				FECHA ELABORACIÓN		<table><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>(Día)</td><td>(Mes)</td><td>(Año)</td></tr></table>	31	12	2024	(Día)	(Mes)	(Año)
31	12	2024										
(Día)	(Mes)	(Año)										
1. DATOS GENERALES												
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:								
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023									
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES											
<div><div></div><div></div></div>												
Pintura de línea de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 73+250				Pintura central doble línea, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 74+980								
<div><div></div><div></div></div>												
Instalación de señales verticales, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR40+223				Instalación resaltos, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR38+300								

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.							
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA								
				FECHA ELABORACIÓN		<div>31 (Día)</div>	<div>12 (Mes)</div>	<div>2024 (Año)</div>
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023					
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES							
								
Pintura de resalto, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR38+300				Pintura pasos peatonales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000				
								
Vaciado de losa de dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920				Vaciado de losa de dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.											
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA												
				FECHA ELABORACIÓN		<table><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>(Día)</td><td>(Mes)</td><td>(Año)</td></tr></table>	31	12	2024	(Día)	(Mes)	(Año)
31	12	2024										
(Día)	(Mes)	(Año)										
1. DATOS GENERALES												
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:								
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023									
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES											
<div><div><p>18 dic 2024 10:15:20 a.m. 3°22'51,738"N 75°42'35,766"W 13.00m Manizales-La Felisa Realce de muros PR29+858 - PR30+000 ruta 2508</p></div><div><p>Colombia Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia Frente Apia</p></div></div>												
Perforación e instalación de epóxico para realce de muro, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR29+858				Instalación de acero y formaleta para vaciado de recámara , Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455								
<div><div><p>Colombia Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia Calle 11 entre Cra 5 y 8 Apia Risaralda</p></div><div><p>Colombia Ruta 2508 Cauyá-La Felisa Frente dissipador PR8+920</p></div></div>												
Pintura doble linea central y de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente pavimento rígido Apía, PR58+590 al PR58+800				Instalación de formaleta para paredes de canal dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920								

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA							
				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES							
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023				
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES						
							
Pintura pasos peatonales, línea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000				Pintura resaltos, doble línea central y de borde, Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, PR73+500			
							
Pintura pasos peatonales, línea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000				Pintura doble línea central y de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente pavimento rígido Apía, PR58+590 al PR58+800			

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA									
					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Instalación de formaleta para paredes de canal dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920					Instalación de formaleta para paredes de canal dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920				
									
Instalación de señalización vertical, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Vereda Las Pilas, PR40+050					Instalación de acero para pilotes, Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA									
					FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES								
									
Pintura pasos peatonales, línea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Parque principal Apia, PR59+000					Vástago y zarpa de los Módulos 2 y 3, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Muro de contención, PR63+250				
									
Instalación de formaleta para paredes de canal dissipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920					Perforación de pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.							
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA				FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023					
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES							
								
Canal dissipador posterior a vaciado, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920				Figurado de acero para pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100				
								
Canal dissipador posterior a vaciado, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente dissipador, PR8+920				Instalación de formaceta para vaciado del módulo 1-A, Ruta 5003 Apia-viterbo-Asia, Frente muro de contención, PR63+250				



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.83 Registro fílmico del avance de las obras.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA


8.84 Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

Domingo
353

01 Diciembre 2024

Domingo, Actividades

El día de hoy el contratista de obra no ejecuta actividades en ninguno de los fretes, no hay maquinaria ni personal activo.

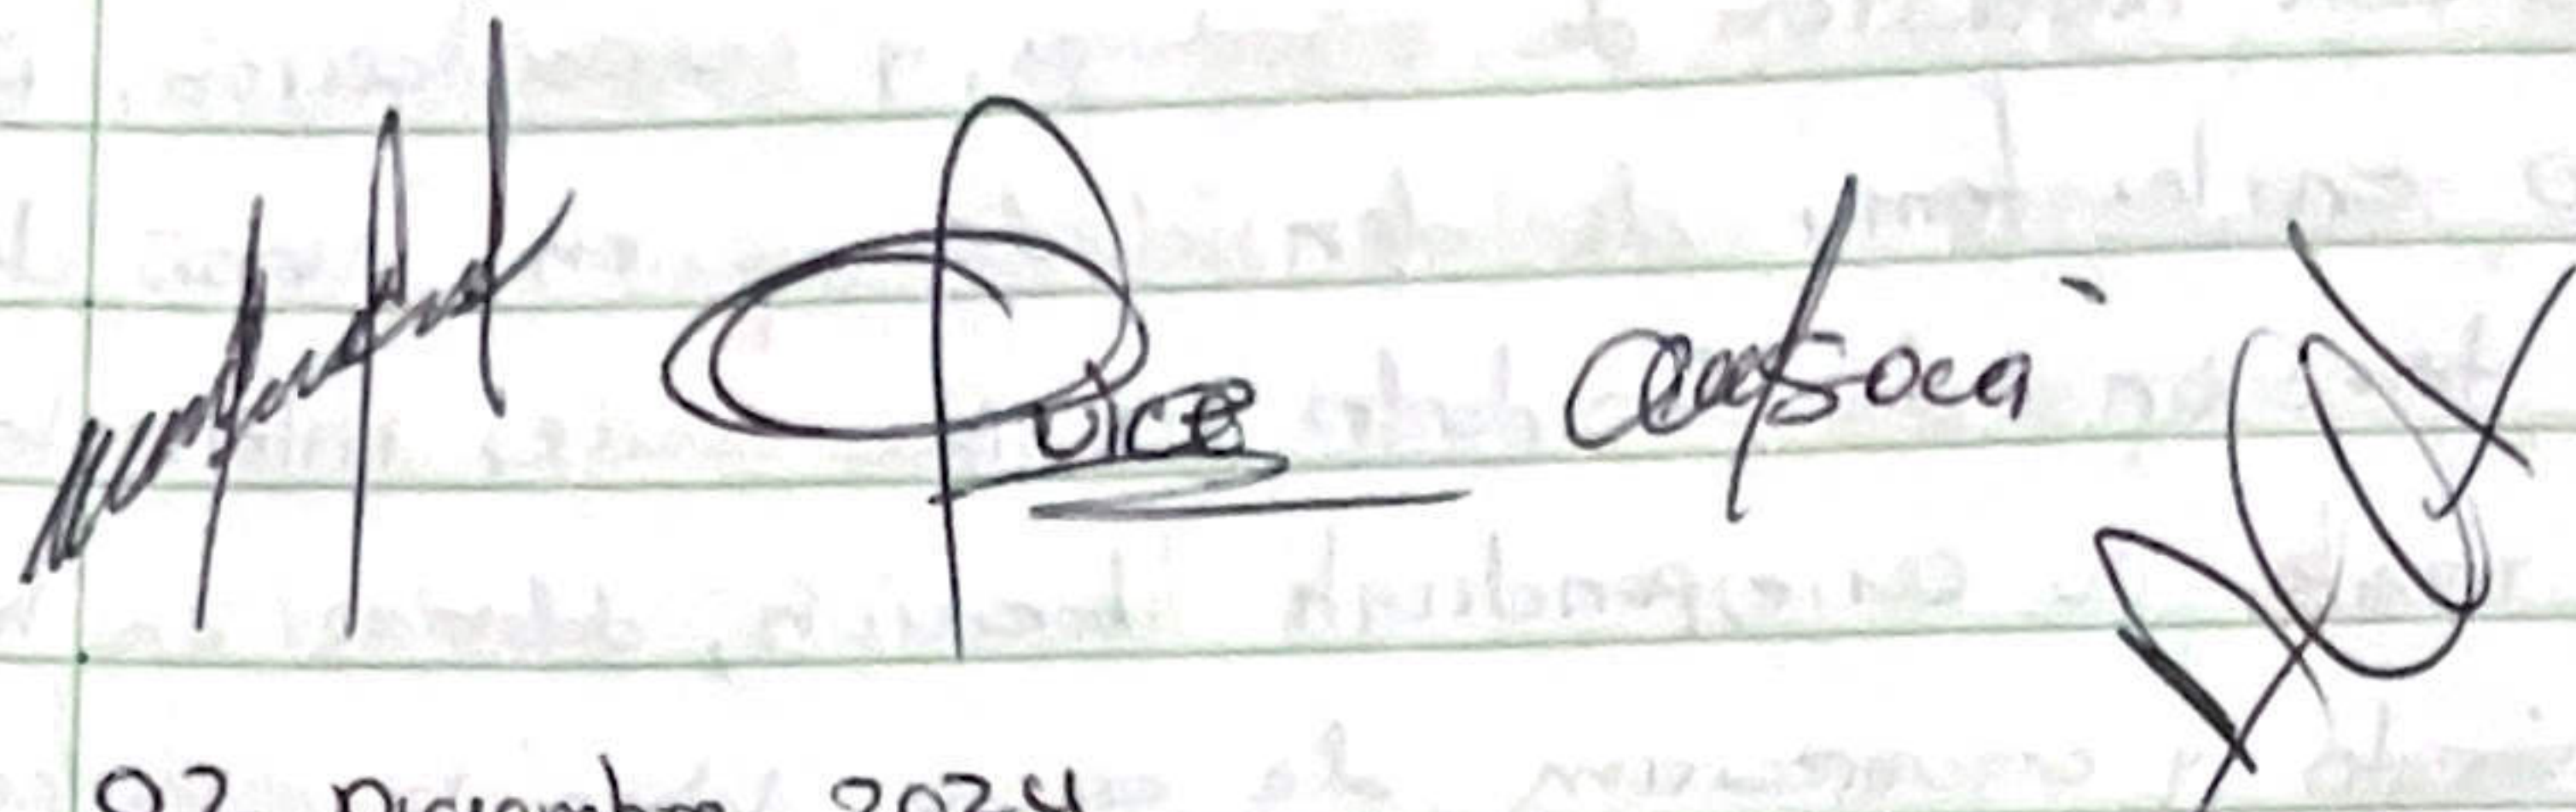

Lunes
354

02 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

El contratista no programo actividades, tiene pendiente contruir el cabezal de la transversal de PE 47+900 y el manejo de aguas sobre los tramos intervenidos en el mejoramiento de pavimento flexible.

Ruta 2508 Cauya - La faja

El contratista a la fecha no ha iniciado actividades sobre los frentes autorizados para manejo de aguas lluvias en PE 34+600 y PE 8+920 denominados dissipadores, continúan con la señalización horizontal, inicio señalización vertical, realce de muros.

PR 9+550 contratista continua con las actividades de construcción de canetas margen derecha y figurado de acero, alistamiento para vaciado de solado sobre dissipar 9+820.

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Asia

PR 74+100 puente Uteibo: Contratista en horas de la mañana, realiza actividades de llenado de geobolsas con un ayudante y en la tarde se suspende actividades.

PR 74+700 a PR 74+700 contratista en horas de la mañana se realizan actividades de alistamiento y formaleto de canetas bordillos, instalación bordillos, en horas de la tarde se hace vaciado.

PR 74+100 sector Trapiche un ingreso, Bordillo insitu sobre los pilotes PR 74+200, y la el ingreso de la transversal PR 74+760, contratista no hace prueba de slum por falta de equipo, no hace forma de cilindros PR 63+250 muro de contención frente inactivo no hay ninguna actividad, se reitera al contratista dar inicio de

de actividades ya que a la fecha presenta un ahaso
 PE 59+450 dissipador se encuentra inactivo
 PE 58+590 a PE 58+800 Pavimento rígido
 Se pavimento carril derecho a mayores losas sin refuerzo y
 llevo a campo 3 mixer; primera mixer 4" pulgadas la segunda
 mixer con 6" pulgadas y la tercera mixer 6.8" pulgadas, Se
 termina el vaciado hasta 5:00 pm. Contratista continua
 con la conformación de la estructura para pavimento y se
 encuentra operativo la maquinaria, en las actividades se
 presenta todos los equipos que se requieren para la actividad
 y tiene el control y seguimiento por parte de interventoría
 NOTA: para el día de hoy se presento lluvias intermitentes
 después de las 2:30 pm por una hora posteriormente se
 continua con actividades.

Personal


Ruta 2507 Tomolino - Cauya
 Contratista no tiene Personal Activo
 Ruta 2508 Cauya - la felisa: El contratista tiene 3 oficiales, 4 ayudantes
 Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia:
 Cuadrilla de canetas 1 Oficial, 7 ayudantes, 2 controladores,
 Cuadrilla del muro: 1. operador, 1. ayudante
 Cuadrilla HR: 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 operarios, topógrafo.

Maquinaria

Ruta 2507. Remolino - Cauya
 Contratista no tiene equipos, ni maquinaria
 Ruta 2508 Cauya - la felisa.
 Contratista no tiene activo equipos ni maquinaria
 Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia.
 Retro excavadora - Puente Uteibo - operativa
 excavadora - Apia - Activa - y Uteibo compactador.

Clima.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Día Seco
 Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia: Día Seco con 2 horas de lluvias

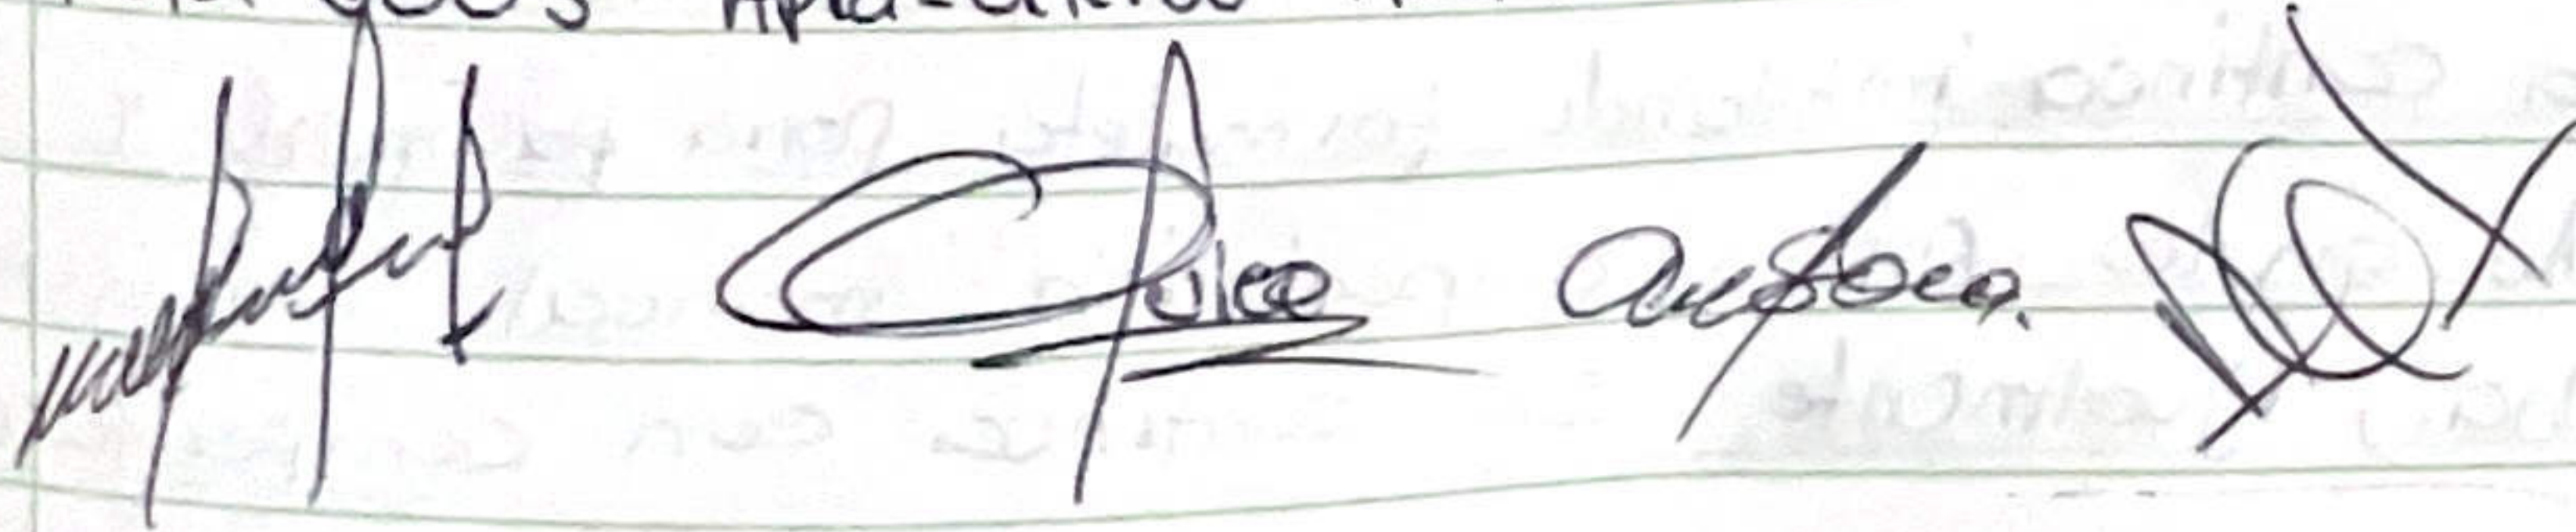

1. Montes
355

03 - Diciembre - 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cayuá.

Contratista no ha iniciado Actividades y a la fecha tiene pendiente construir el cabezal de descole de la alcantarilla PR 47+900, mas todos los mangos de aguas lluvias que den lugar en los tramos intervenidos.

Ruta 2508. Cayuá la felisa

Contratista solo tiene activado una obra que es construcción de canetas PR 9+550 y que a la fecha estan suspendido por que no se a definido niveles a los maestros por parte del contratista y PR 8+920 Se hace Solado 40 ml y la fundación de 17 pilotes con esta area de trabajo se proyecta armar acero en sitio para esta actividad asistio residente Contratista; Se mantiene sin iniciar actividades en el Divipador 34+600, construcción de 12 resacas, continuar con la señalización horizontal y vertical, al igual que el realce de muros por Seguridad Vial.

Ruta 5003

PR 77+100 muro de contención

Contratista informa que trabajo media jornada y que a la fecha se tiene 60 Geobulbas llenas pero estan sin coger ya que no tienen todos los equipos

PR 74+700 a PR 74+000 Conformación de terreno y la instalación de formaletes para vaciado al siguiente día 74+650 Adicional en 73+880

PR 63+250 Muro de contención

Contratista inicia con fijado de acero para iniciar armado de la zapata del muro, Modelo 2,

PR 49+450 Divipador no se encuentra operativo ya que no tiene el personal. Por renuncia de la coadyutora hasta que se reorganice el personal

Ruta 5003 PR 58+800 a 58+590 pavimento Apia

Contratista continua instalando formalete para pavimento y elistamiento en las pilas compactación manual con compactador de plancha; igualmente se continua con compactación

Con maquina vibro compactador, se hace la toma de densidades en dos puntos con un resultado 103% y la segunda con 100%, Para lo cual queda liberado para la instalacion de las losas; Se inicia vaciado 11:30 Am con la primera mixer con 4.6" pulgadas para Asentamiento y en la segunda mixer 2.5" pulgadas y la tercera mixer con 6" pulgadas segun prueba de Slom, y se realiza el vaciado de 7 losas por el canal izquierdo a mayores ubicado call 11 entre Carrera 5 y 6, ademas se continua con vaciado de bordillo.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauca.

El contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauca - La felix

Cuadrilla Conetas y dispersador: 3 oficiales, 5 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia

Cuadrilla muro: 1 operativo, 2 ayudantes

Cuadrilla conetas: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, conductor

Cuadrilla muro: 2 ayudantes, 2 controladores, 1 celador.

Cuadrilla ME: 5 ayudantes, 1. Oficial, 2 operarios, 2 volquetes

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolinos - la felix

Contratista no tiene equipos ni maquinaria Sobre la zona

Ruta 25003 Apia - Utebo - Apia

Retro excavadora - Puente Utebo - Activa

Excavadora - Apia - Activa


Vibro compactador - Apia - Activa

dos volquetes

Clima

Ruta 2507 - y Ruta 2508 Remolino - la felix: Dia Seco

Ruta 3003 Apia - Utebo - Apia: Dia Seco

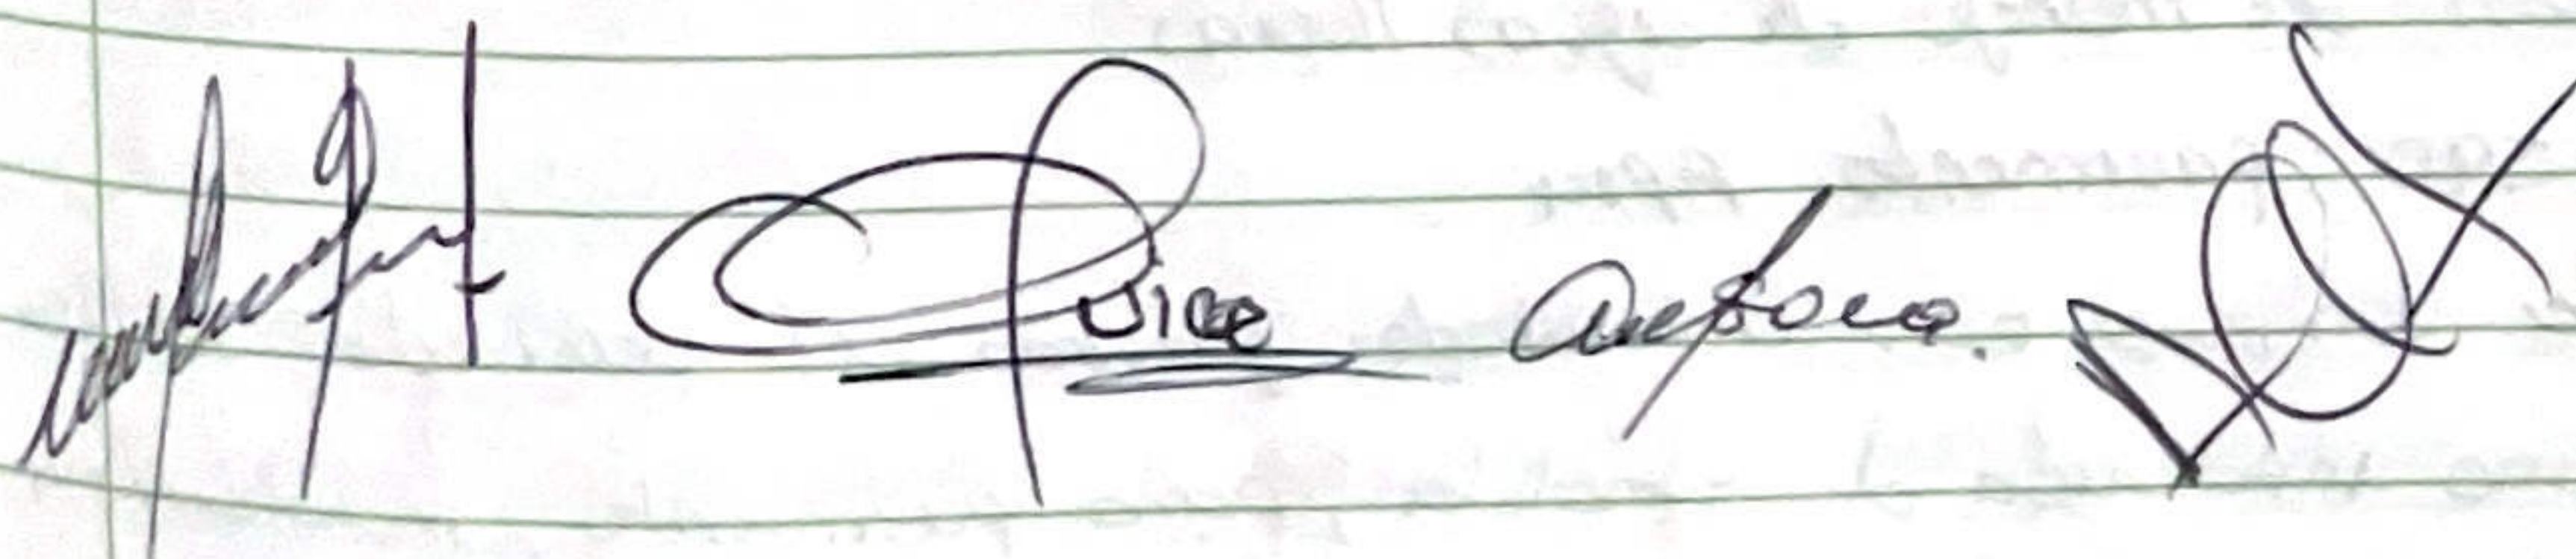

1 Miércoles
356

04 Diciembre 2024

Actividades

Rota 2507. Cuaya - Demolito

Contratista no tiene actividades programadas sobre esta rota tiene pendiente iniciar actividades en la construcción del cabozal de la transversal en PE 47+900 y el manejo de aguas lluvias sobre el sector intervenido en los temas con mejoramiento

Rota 2508 Cuaya - La Felicia

Contratista continua con actividades de armado, figurado e instalación de acero en el dissipador PE 8+920 y el frente de construcción de cunetas en el PE 9+550 continúa inactivo, por lo cual interventoria solicita reiniciar actividades. Adicional se tiene sin iniciar obras en dissipador PE 34+600 construcción de 12 resalto, sealee del muro PE 30+00, intersección Señalización Vertical.

Frente de pintura iniciaron hoy con pintura lineal 3 km del PE 42 al 45 con línea central amarilla doble.

Rota 5003 Apia - Utebo - Apia.

PE 77+00 Puente Utebo Contratista continua con actividades de llenado de Gababos continua sin caer.

PE 73+200 a 74+700 Cunetas Utebo

Se hace actividades de alistamiento para el vaciado de cunetas que en la jornada de la tarde se realiza vaciado PE 73+88, PE 74+540 a mayores, PE 74+550, PE 74+560, PE 74+60 a mayores, se vaciaron 10 losa y una entada en 73+880

PE 63+250 muro de contención

Contratista continua con figurado de acero para el muro en la Sección 2

PE 49+450 dissipador Contratista reinicia actividades de excavación nuevamente, interventoria solicita al contratista terminar obras iniciadas y que son de manejo de aguas lluvias

PE 58+390: pavimento Apia

Contratista continua con actividades previas al vaciado de los losas. como instalación de formaleta, para pavimento, instalación de formaleta para bordillo

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cuya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cuya - la felisa

Cuadrilla dispersador, J. maestro, 1 oficial, 5 ayudantes.

Ruta 5003 Apia Uteibo - Apia

Cuadrilla puente. 2. ayudante, 1. operador

Cuadrilla de conetas: 1. oficial. 4 ayudantes

Cuadrilla del muro: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 controladores

Cuadrilla dispersador: 1 oficial. 2 ayudantes

Cuadrilla Mz: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 operador

Maquina

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista no tiene equipos ni maquinaria a la fecha de hoy Solo tiene un vehiculo definido Pintura.

Ruta 25003 Apia - Uteibo - Apia

excavadora - Apia - Activa

Peto excavadora - Puente - Activa

dos volqueteros - Melenas.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cuya

Contratista no tiene personal activo

Ruta 2508 Cuya - felisa

Cuadrilla dispersador: 2 oficiales - 6 ayudantes

Cuadrilla de pintura: 3 oficiales - 2 controladores vides

Cuadrillas que se tienen en la zona.

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

Cuadrilla Puente: 2 ayudante, 1 operario

Cuadrilla: Conetas: 1. maestro, 5 ayudantes

Cuadrilla muro: 1. oficial, 4 ayudantes, 1. caidor

Cuadrilla dispersador: 2 ayudantes, 1 oficial

Cuadrilla Mz: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador, 1 conductor,

1. Auxiliar topografía.

Administrativos

1. Director, 1 residente, 1 Ambiental, 1 Social, 2 SST, 2 Auxiliares de ingeniería, 1 Topografo, 1. OIA, 1 calidad

Olima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Día Seco

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Asia

Día Seco.

Jueves
357

05 - Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauya

Contratista no programo actividades, interuentea le reitera al Contratista lo indicado en el anterior dia

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con la instalacion de acero y formaleta de dissipador 8+920 y continua suspendido las actividades de contruccion de conetas sobre pr 9+550. y las obras pendientes continuan tal como se mencionan el dia anterior

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Asia

PR 77+100 puente Uterbo.

Contratista continua con llenado de geobolsas para desvio del Caose para trabajos en la pila central del puente.

PR 74+700 a 73+280 Uterbo - conetas

Contratista continua descomprimiendo conetas, alitando para una nueva jornada de vaciado, interuentea reitera el inicio de Instalacion de bordillo ya que se evidencia suspendido ha varios dias

PR 63+250 muro de contención

Contratista continua con figurado de acero para iniciar con el muro de contencion modulo 2.

PR 59+450 dissipador

Continuan con excavacion manual. para constru conduccion de aguas lluvias hacia el dissipador existente

PR 58+590 pavimento en Apia

Contratista realizo actividades preliminares para vaciado y se

Intodo formateo para bordillo de la cuadra ubicada en el 11 entre
 carrera 647 lado derecho a mayores. y se inicia actividades
 de vaciado a las 9:00 Am y se hace vaciado con ayuda
 excavadora y se toma Slum de la mixer con el resultado
 de 3.5" pulgadas y se continua vaciado por carril izquierdo
 la mixer 2 llega a obra con un asentamiento 3.5" pulgadas
 y se inicia con placa reforzada ubicada con un domidero y
 11.20 am se inicia con vaciado de la tercera mixer en un
 asentamiento de 3.5" pulgadas segun prueba de slum y se
 vacia la ultima losa reforzada por estar en una tapa de
 alcantarillado y ser la losa de transición, en este sentido
 se termina de pavimentar las 3 cuadras por carril derecho
 y se programa vacia para el dia siguiente en el cual
 se terminara obra, Adicional se inicia vaciado de
 bordillo carril derecho cuadra central de menores a
 mayores.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Caoya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Caoya - La felisa

Cuadrilla distribuidor: 2 oficiales, 6 ayudantes

Ruta 2003 Apia - Uteibo - Apia

Cuadrilla puente: 2 ayudantes, 1 operador

Cuadrilla conector: 1 maestro, 5 ayudantes, 2 conductores vehiculo

Cuadrilla muro: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 celador

Cuadrilla distribuidor: 1 oficial, 1 ayudante

Cuadrilla M2: 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operador

Personal administrativo continua igual al dia anterior

Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La felisa

No hay equipos ni maquinaria

Ruta 2003 Apia - Uteibo - Apia

Reo excavadora - Puente - Activo

Excavadora - Apia - Activo


Clima

Ruta 2507 y 2508 Remolino - La felisa.

Día Seco.

Ruta 25003 Apia - Uteibo - Apia

Día Seco con lluvias en Apia en jornada de la tarde, jornada operativa normal

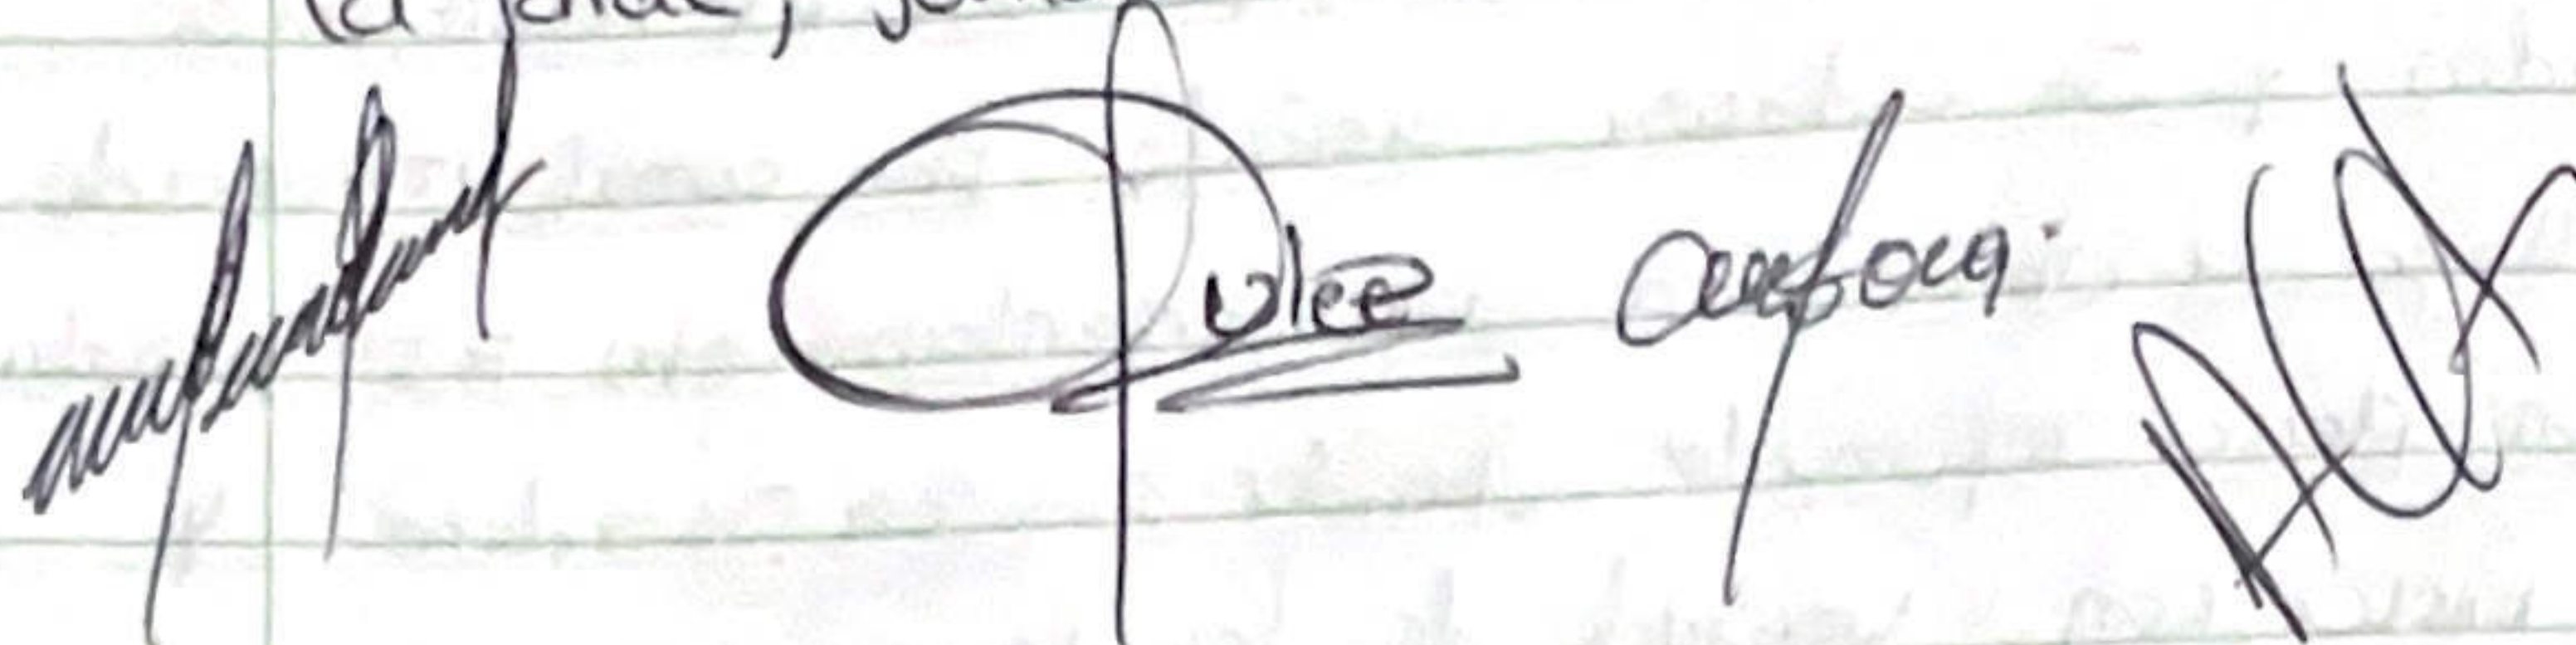

Viernes
358

06 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contrata no programo actividades en esta ruta.

Ruta 2508 Cauya - la felisa

Contratista continua con actividades de figurado e instalación de acero en el dissipador pr 84920 y las cunetas.

del frente. pr 94550 continua inactivo, se recomienda al contratista

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

PR 77400 puente Uteibo

Contratista continua con el llenado de geobatas para desvío del cauce, estas estan sin coser.

PR 75400 al PR 734200 Actividades de alutamiento de sección de cunetas, desenchufado y paisajismo

PR 634250 muro de contención, se presentó un deslizamiento desde horas de la noche y hasta medio día ya estan terminando el retiro manualmente,

PR 594450 dissipador frente de trabajo continua inactivo Se recomienda al contratista terminar estas actividades

PR 584590 pavimento de Apia.

Contratista hace vaciado en carril izquierdo, se indica con esta jornada se finaliza las dos cuadras del pavimento nuevo.

Para las 12.40 se inicia vaciado con la primera mixer y esta tiene un asentamiento de 2.8" pulgadas según slum Se recomienda al contratista fortalecer la logística de las obras para estos tiempos muertos del concreto en obra, Se continua con el llenado y/o vaciado de la segunda

mixer con un asentamiento de 4.5" pulgadas en la cual se reporta que la mixer espero 1 hora para ser vaciado se tomaron vigetas para laboratorio y se utilizo todos los equipos para el vaciado tales como regla vibratoria, vibrador, codal, llanas, flotador, demarcador, en esta actividad esta el acompañamiento de interconterica.

El día de hoy se termina de vaciar las losas de los dos carriles de la calle 11 entre cuadras 548, y a la fecha se tiene pendiente las siguientes actividades pendientes de la cuadra ubicada entre carrera 547, fundición de vigas de transición en carrera 645; adicional al cello de juntas.

Personal


- Ruta 2507 Remolinos - Cauya
- Contratista no tiene personal sobre esta zona
- Ruta 2508 Cauya - la felisa
- Cuadrilla de pipidos: 2 oficiales, 6 ayudantes
- Cuadrilla de pintura: 3 oficiales.
- Ruta 5003 Apia - Viteibo - Apia
- Cuadrilla puente: 1 operador, 2 ayudantes
- Cuadrilla conetas: 1 maestro, 5 ayudantes
- Cuadrilla muro: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 celador
- Cuadrilla MR. 5 ayudantes, 1 oficial.

Maquinaria

- Ruta 2507 Remolino - Cauya
- No hay equipos ni maquinaria
- Ruta 2508 Cauya - la felisa
- Un vehiculo de pintura horizontal
- Ruta 5003 Apia - Viteibo - Apia
- Petro excavadora - puente - Activa

Clima

Ruta (2507 - 2508 - 5003): Se presenta Dia Seco por leves lluvias en Apia al medio día.

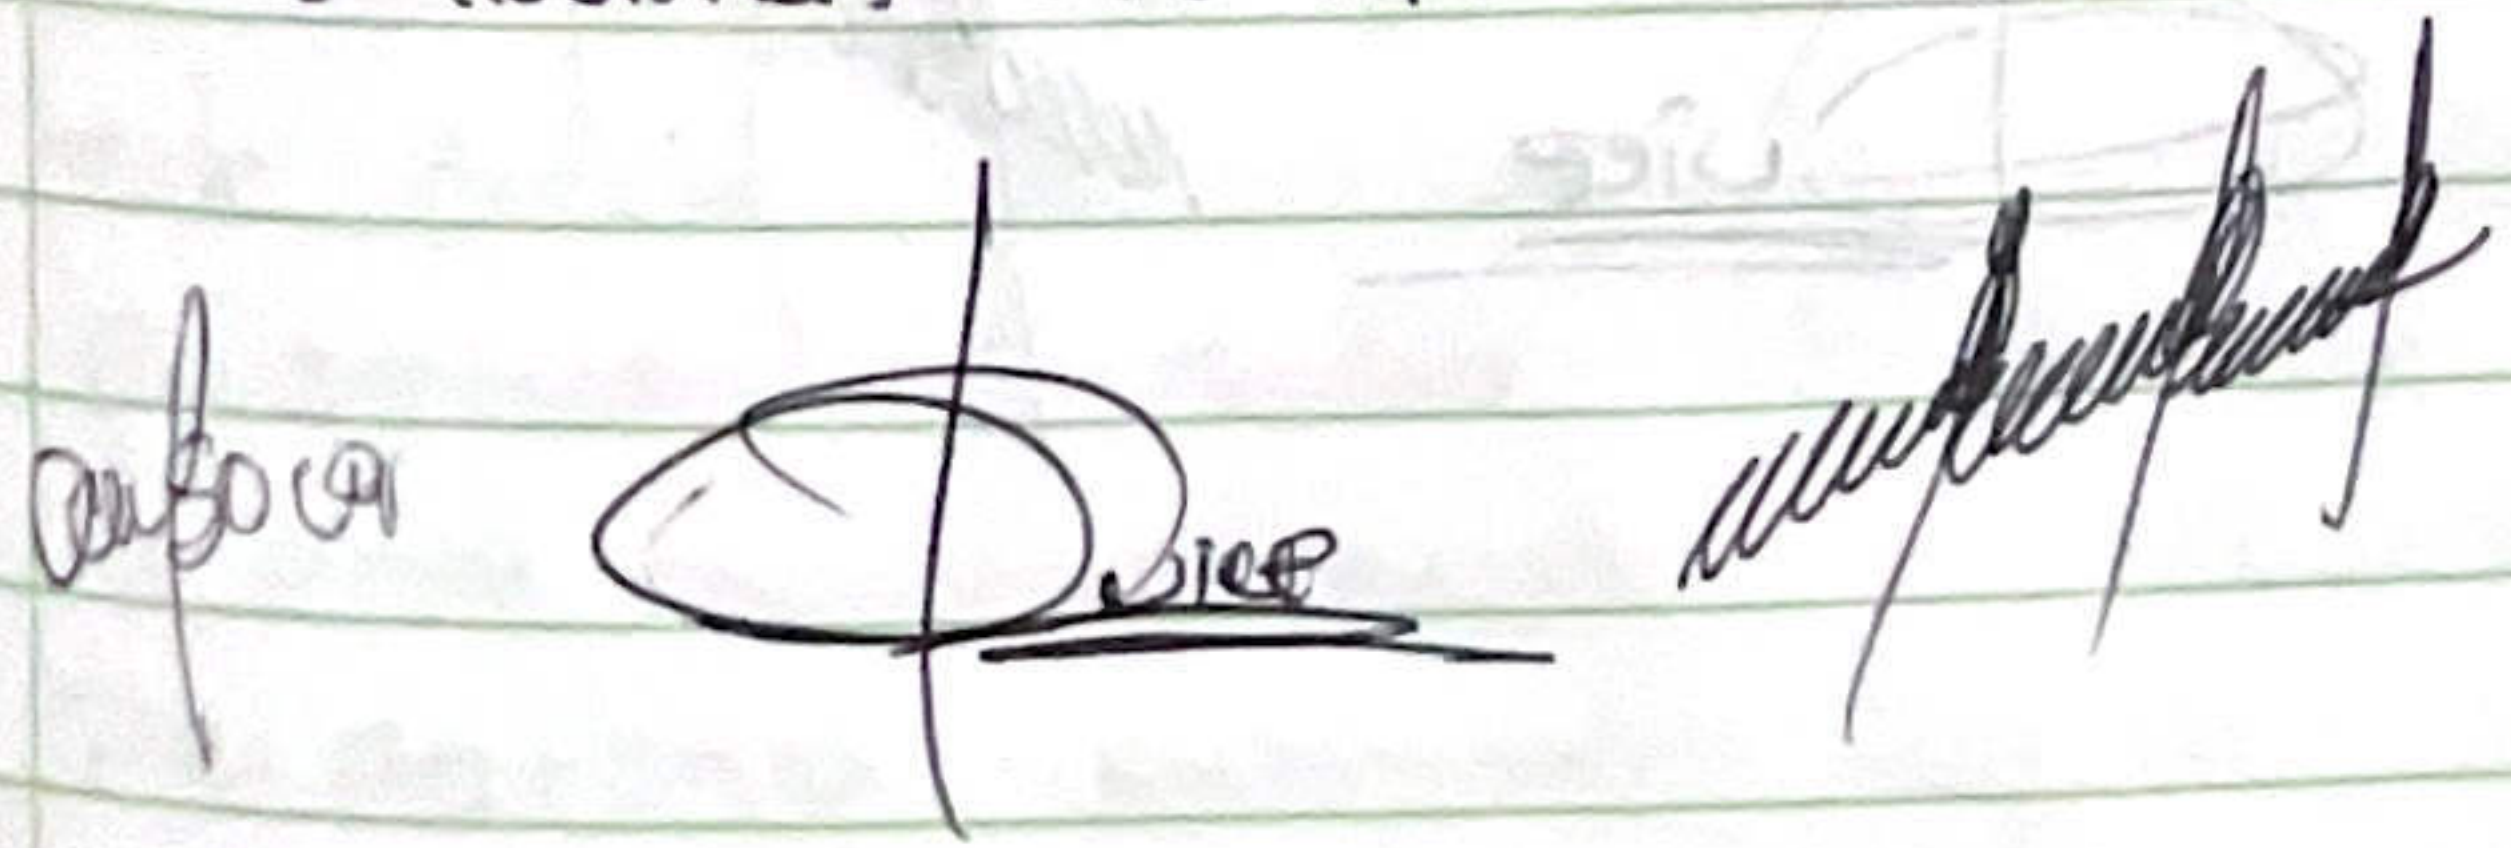

Sabado 07 Diciembre 2024

359

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Caya.

El contratista no programo actividades

Ruta 2508 Caya - la felisa

Contratista continua con actividades de armado y figurado de

cicero en el dissipador pe 8+920 y terminan de

pintar los 3 km en ansema con linea de borde

Segun lo evidenciado por interventoria en recorrido

Pr 5003 Apia - Uteibo - Apia

Pr 77+100 frente inactivo

Pr 75+00 a pr 78+250 inactivo

Pr 63+250 muro de contención se encuentran en figurado de acero.

Pr 59+450 dissipador inactivo

Pr 58+590 frente de obra inactivo

Personal

Ruta 2507 - Remolino - Caya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Caya - la felisa.

Coachilla de conatos : 2 oficiales, 5 ayudantes

Rebadora de pintura : 3 oficiales

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

Coachilla muro : 1 maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes.

Maquinaria


Ruta 2507 Remolino - Caya : No hay maquinaria


Ruta 2508 Caya - la felisa : 1 vehiculo de pintura - Activo


Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia : 1 Retro excavadora - inactiva


Clima

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003 : Clima Seco sin lluvias

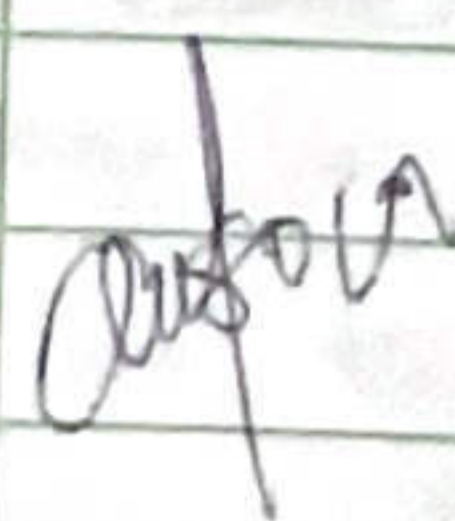

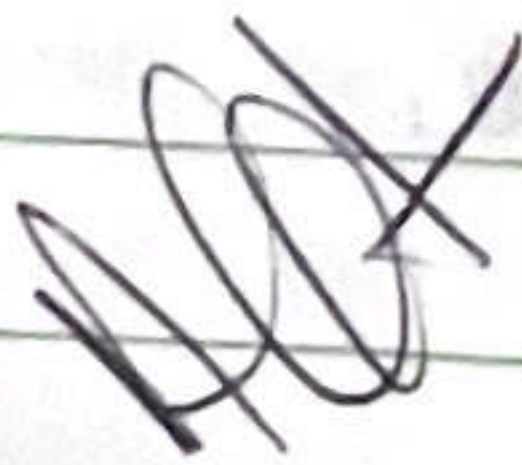

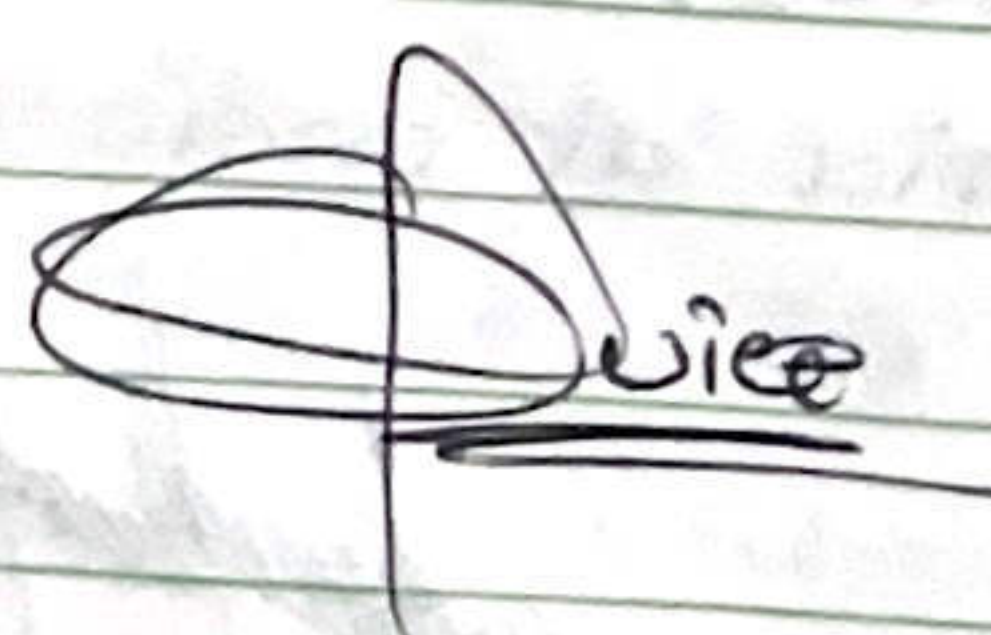

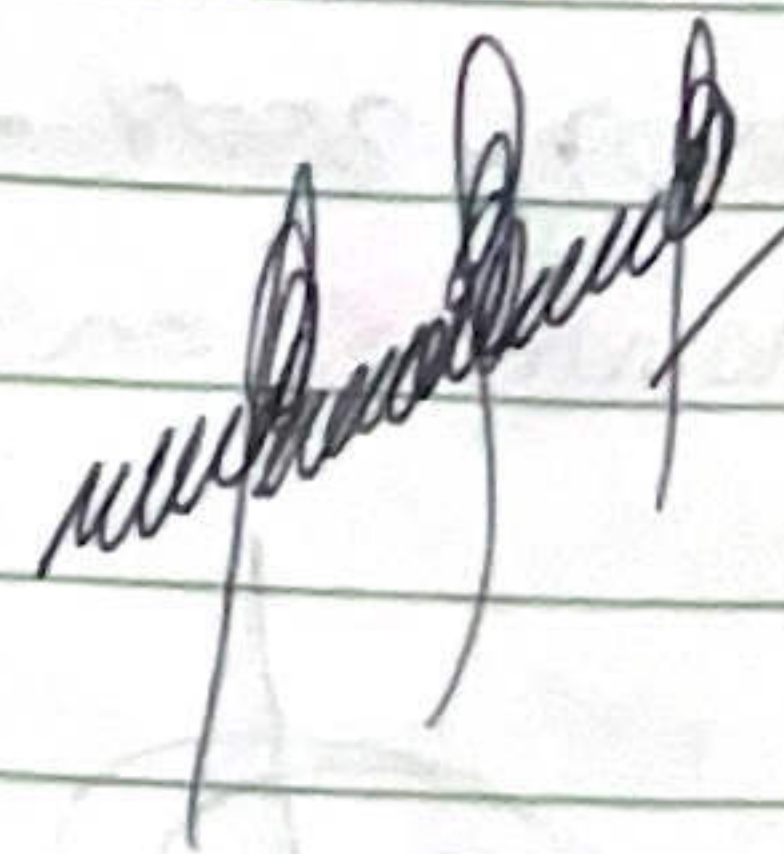


Domingo 08 Diciembre 2024
360

Actividades

No hay actividades en la Ruta 2507 y Ruta 2508
y en la Ruta 2508 Cuyo - la felisa

Segun informacion del contratista se trabajo en Señalización horizontal.

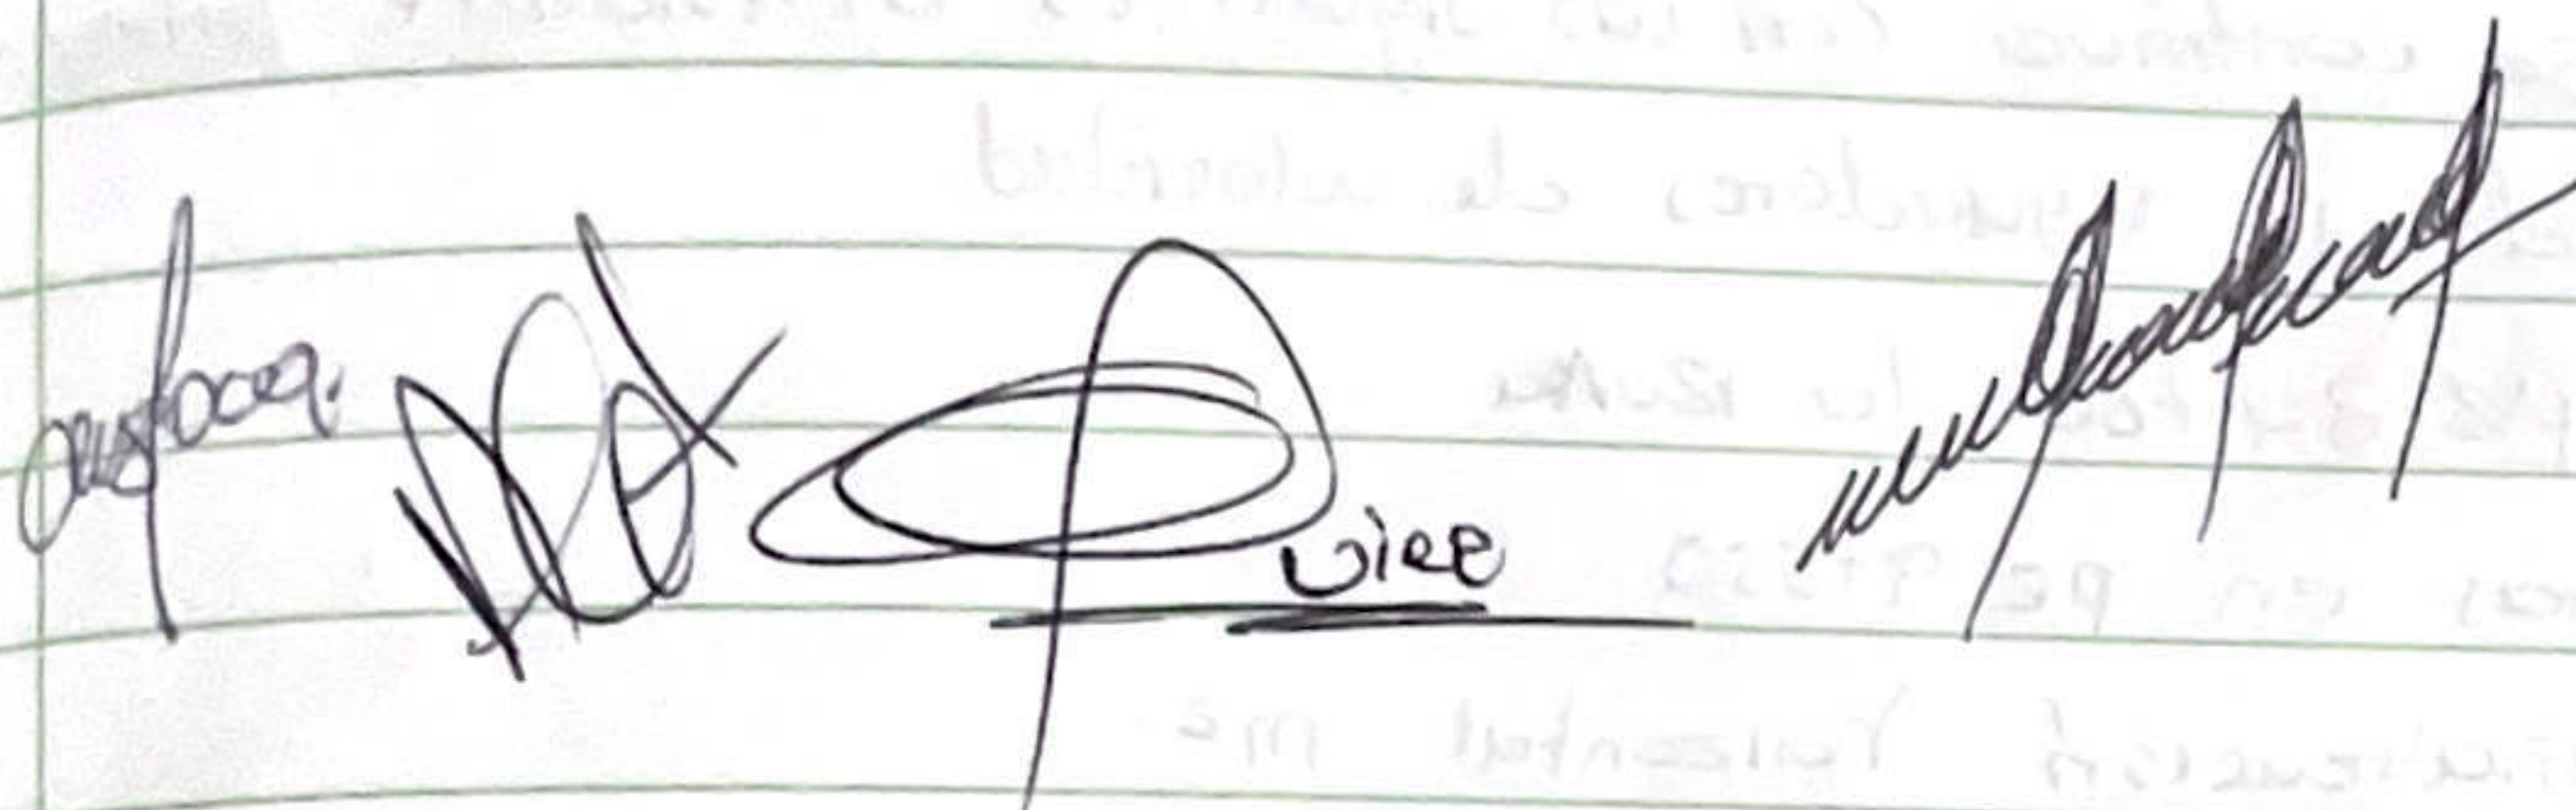

Lunes 09 Diciembre 2024
361

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cuyo

Contratista no tiene actividades programadas sobre esta Ruta; por parte interventoria se indica que tiene pendiente el contratista iniciar actividades en PE 47+900 y manejo de aguas lluvias sobre los tramos intervenidos en el mejoramiento de carpeta asfáltica

Ruta 25003 Apia - Utebo - Ajia

PE 77+100 puente Utebo: Contratista continua con el llenado de geobolas y exten acopiados; estas actividades presentadas y ejecutadas a la fecha no indican ningun avance por lo cual se muestra un atraso en este frente de actividades, Se solicita recuperar el atraso.

PE 75+00 a PE 73+200 frente las melenas: Contratista en la jornada de la mañana no tiene actividades ya que enviaron personal para el frente PE 63+250, ya que se continua retirando material sobrante; y en horas de la tarde se continua con la instalacion de bordillos

PE 63+250 muro de contención: contratista continua con el armado y figurado de acero y continua con atraso en este frente de actividades.

PE 59+500 drenador: contratista continua con el frente de obra inactivo, se reitera el reinicio de actividades.

PE 58+590 pavimento rígido

Contratista continua con figurado de acero de las vigas de transición y la instalación de formaleta de los bordillos Ruta 2508 Caya - la felisa

Contratista continua con el frente de actividades en pr 8720 Sin embargo se indica que solo hay la presencia de un solo oficial y el resto no asistieron por falta de pagos de sus honorarios; se continua con las siguientes actividades tales como:

- Instalación de 12 reguladores de velocidad

- Disipador pr 34+60 la Ruta

- Construir conetas en pr 9+50

- Terminar Señalización horizontal mz.

Frente pintura: Demarcación vial con pintura en frío El día 22 de noviembre de 2024, Se reunieron en la oficina de interventoría los ingenieros Ases Soto por Interventoría y Mauricio Monroy por parte del Contratista para socializar el alcance del ítem Señalización y Seguridad, donde se determinó la abscisa pr 42+000 con pr final de la línea de demarcación en frío. En recorrido realizado el día de hoy se observa que el contratista Endo Construcciones autorizó al subcontratista Táctico Comercializadora de Ingeniería para aplicar las líneas de demarcación hasta pr 49+150, sin consultar con la interventoría.

Personal:

Ruta 2507: Remolino - Caya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508: Caya - la felisa

- Cuadrilla de disipador: 1. Oficial, los ayudantes no asistieron por falta de pagos de la quincena según lo manifestado

Ruta 5003 Ape - Uteba - Aca.

Cuadrilla muro: 1. Operador, 2 ayudantes

Cuadrilla conetas: 1 oficial, 4 ayudantes

Cuadrilla ME: 1. maestro, 1 oficial - 4 ayudantes - 1 celador

Cuadrilla disipador: 1 oficial, 1 ayudante

profesional ambiental manifestado no estar en el proyecto

Maquinaria:


en Ruta 2507 y Ruta 2508 no se encuentra equipos ni maquinaria operativos

Ruta 5003 Apia - Utebo - Asia

Refo excavadora Puente Utebo operativa

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003: presenta un Día Seco

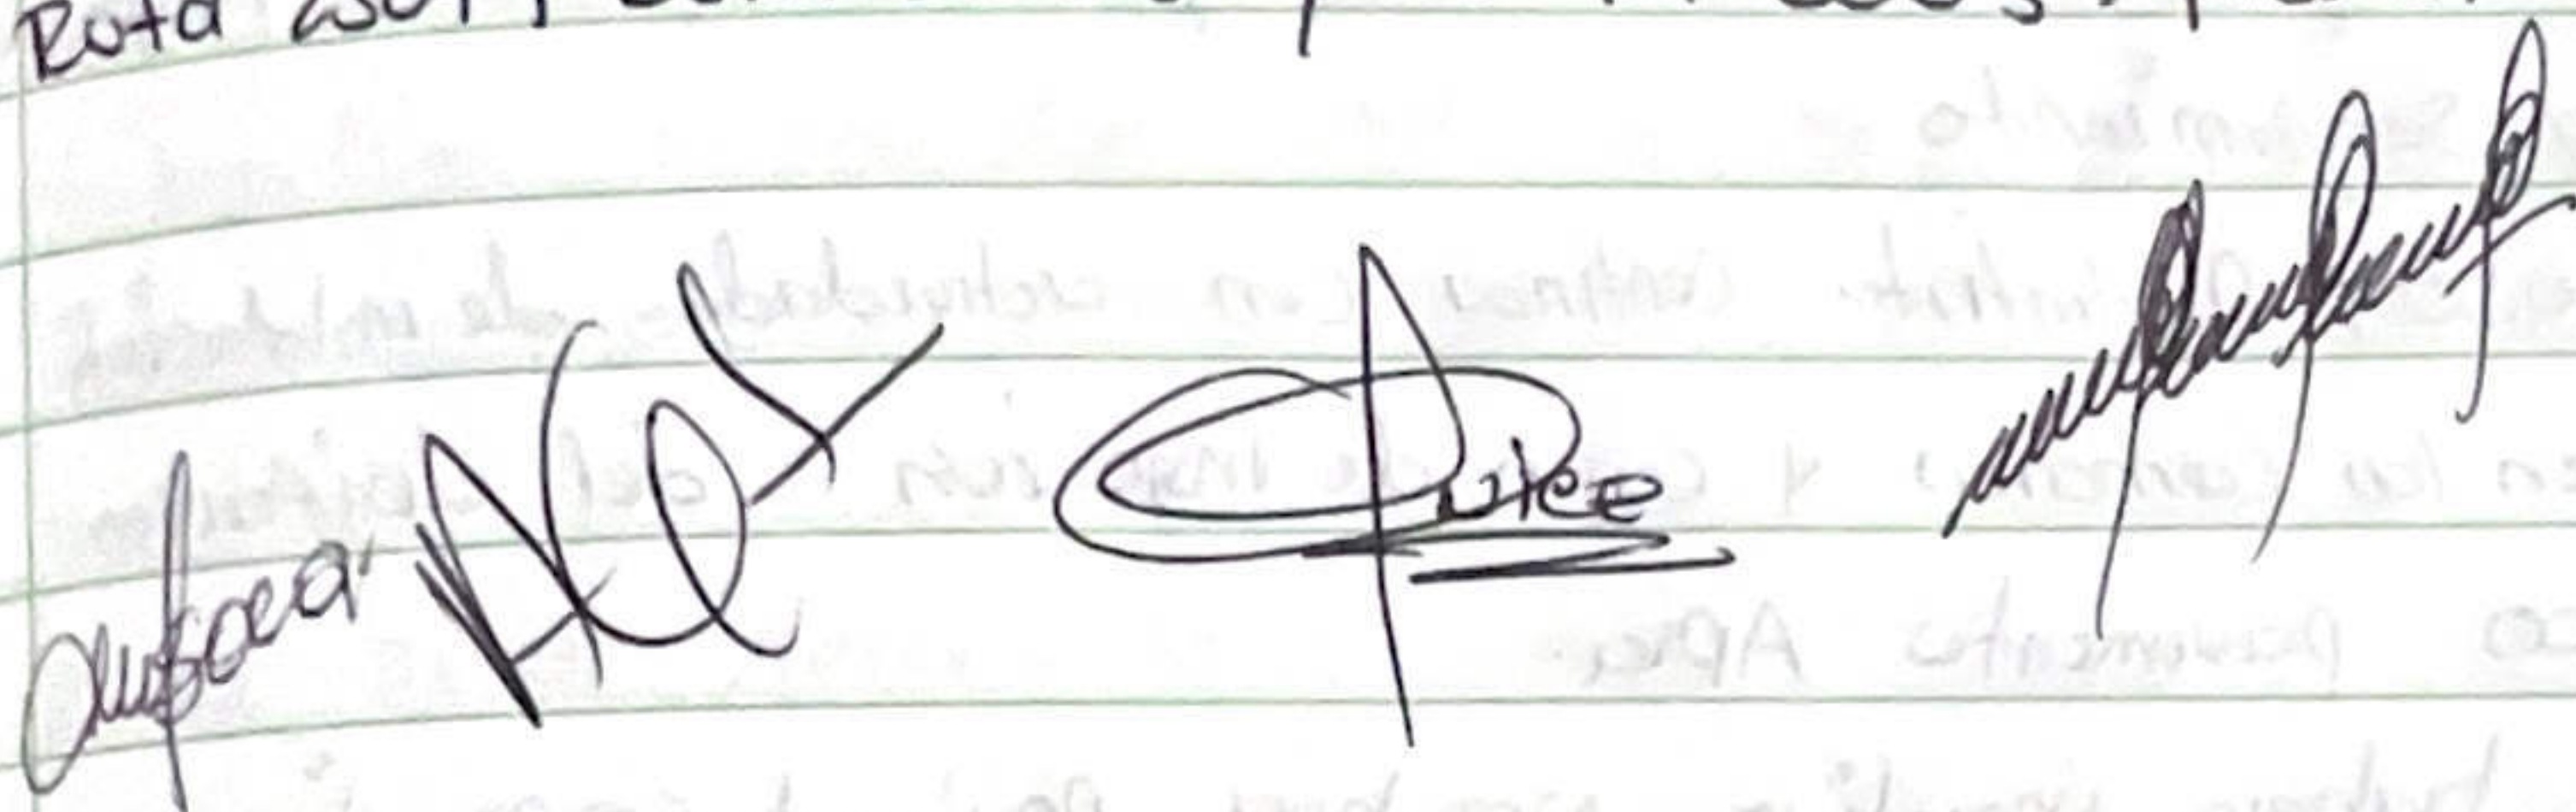

Montes 10 Diciembre 2024

362

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauyá

Contratista no tiene actividades programadas

Ruta 2508 Cauyá - La Felisa

Contratista continua con las actividades en PR 34920

con armado de acero, e instalación en el dissipador,

adicional se encuentran realizando una corrección

de cargas entre los pilotes y el dissipador, con el fin de

obtener su funcionalidad; Adicional el contratista continua

sin iniciar actividades en la construcción de cunetas PR 34550

Es importante hacer las respectivas correcciones y terminar

con las cunetas, ya que es de primordial solución el manejo

de aguas lluvias.

El contratista continua pendiente el inicio de actividades

en el PR 34460 en relación al dissipador, construcción de 12

dissipadores, terminar pintura m². Se evidencia que los ayudantes

de este frente regresaron pero no se le pagado sus

salarios por lo cual se presenta Inconformidades

Ruta 5003 Apia - Utebo - Asia

PR 33100 puente Utebo se continua con llenado de

geobolsas

PR 33100 a 331200 Las melenas

Contratista no tiene actividades de construcción

de conetas e instalación de bordillo, sin embargo se hace
 punteo para línea central en señalización horizontal
 P2 63+250 muro de contención
 Contratista hace el retiro de acero instalado según
 indicaciones del contratista porque instalaron de forma
 incorrecta, Interventoría solicita tener planos de
 construcción ploteados en obra, para hacer el respectivo
 control y seguimiento

P2 89+450; Contratista continúa con actividad de instalación
 de acero en las cámaras y cajas de inspección del dissipador
 P2 88+600 pavimento Apia.

Frete de trabajo inactivo, no hay personal operativo

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contratista continúa sin personal operativo

Ruta 2508 Cauya - la felisa

Cuadrilla dissipador P2 8+920: 1 oficial - 3 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Ajia

Cuadrilla puente: 1 operador, 2 ayudantes

Cuadrilla muro: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cadador

Cuadrilla dissipador: 1 oficial, 1 ayudante.

Maquinaria

Ruta 2507 - Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista no tiene maquinaria ni equipos

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Ajia

Reto excavadora puente Uteibo

Clima:

Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 25003 se tiene: Día Seco

Miércoles 11 Diciembre 2024

363

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

El contratista no programo actividades, intervenciones que se requiere terminar obras autorizadas para el manejo de aguas lluvias

Ruta 2508 Cauya - La felisa

Contratista Solo tiene operativo el frente del dissipador pe 8+920, se encuentran en actividades de alistamiento para vaciar placa del dissipador y se trabajo hasta 12:14 trabajadores suspenden actividades por falta de pago de la quincena y en los frentes pendientes por iniciar todo esta inactivo.

Ruta 5003 Apia - Uteibu - Ajia

pe 77+100 Contratista tiene actividades en operación conformación de en carretable y cocen la Geobolsas que ya estan llenas.

pe 75+00 al pe 73+200: El contratista se encuentra en actividades de parajismo con 2 ayudantes, no tiene personal instalando bordillos, ni adecuación de conetas

pe 63+250 muro de contención:

Contratista continua nuevamente con la intalación de acero y figurado para el Modelo B1

pe 59+550 : frente dissipador inactivo

pe 58+590 al pe 58+800 : pavimento apia

frente de actividades inactivo

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya:

No hay personal operativo

Ruta 2508 Cauya - La felisa

Cuadrilla dissipador: 2 aficades, 4 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Uteibu - Ajia

Cuadrilla del puente: 1. operador - 2 ayudantes, 2 controladoras vial

Cuadrilla en melonera: 2 ayudantes

Cuadrilla muro: 1. maestro. 1. oficial, 4 ayudantes

Maguamaria


Ruta 2507 - Ruta 2508 Remolino - La felisa

Contratista no tiene personal ni maquinaria en esta ruta


Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia
 Reto excavadora en el puente.
 Dos volquetes en el puente.

Clima.

Ruta 2507 y Ruta 2508 : Día Seco
 Ruta 5003 Día Seco.

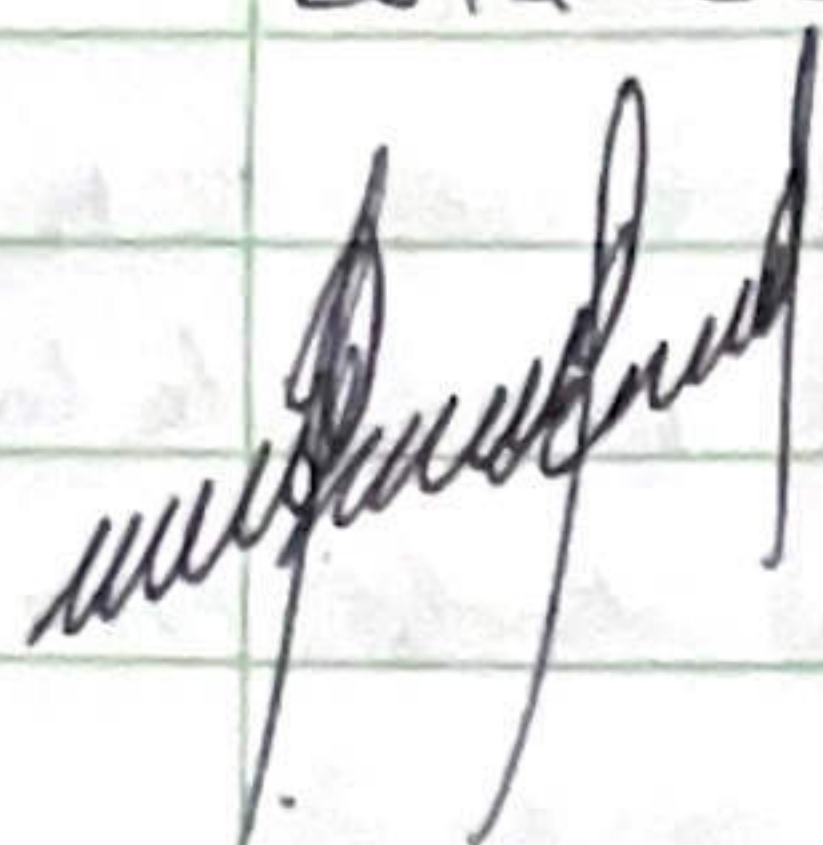

Quice

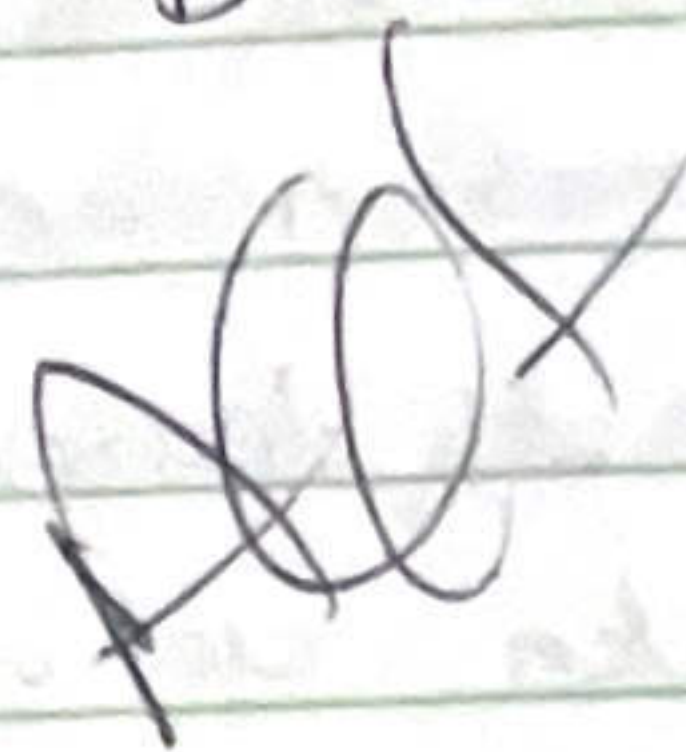

Jueves 12 Diciembre 2024

364

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cayua

Contratista no programo actividades

Ruta 2508 Cayua - la felba

Contratista hace vaciado de una mixer en el dissipador

PR 8+920, con esto que vaciaron placa del dissipador y la jornada laboral de los ayudantes y un oficial termino actividades y suspendieron actividades, hasta que el contratista este al día con el pago de los honorarios

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia

PR 77+100 Puente Uterbo

Contratista continuo con la adecuación de la plataforma y carreteable para la construcción de pilotes a la margen izquierda del puente, para esta actividad tiene dos Reto excavadoras para perfilar corrientes de río y Selección de material para posterior ser utilizado en el llenado de las geo bolsas. y se continua cosiendo geobolsas

PR 75+00 al PR 73+200 Las molenas

No se evidencia actividades en ejecución todo el sector inactivo, se informa que no asistieron por falta de pagos a los honorarios, Se solicita al contratista hacer efectivo todos los pagos pendientes.

PR 63+250 muro de Contención

Contratista continua con instalación de acero

con panilla Superior del modulo JB para Zarpa, se hace revisión por parte de interventoria

PE 59+550 dissipador: Contratista termina de instalar Acero de refuerzo de las cámaras (3) y se encuentra pendiente, instalar femaleta. Solo se encuentra el oficial PE 58+800 a 58+890 frente de trabajo inactivo interventoria realizó recorrido, se evidencia que ya realizaron vado en horas de la mañana de 2 piques de transición en cámara 6, Bordillos calle 11 entre cámara 6 y 7 finalizando esta cuadra y bordillo calle 11 entre cámara 5 y 6 margen izquierda; continúa pendiente bordillo margen derecha de esta cuadra y Ugas de transición de la cámara 5. Junto con las tapas de los sumideros y el cello de dilataciones.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Personal del contratista no se encuentra operativo, no hay contratado, ni asignado

Ruta 2508 Cauya - La felisa

Cuadrilla dissipador: 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 SST.

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia

Cuadrilla puente: 2 operario, 2 conductores, 4 ayudantes

Cuadrilla del muro: 1. oficial, 1. maestro, 1. Herrero, 5. ayudantes

Cuadrilla dissipador: 1. oficial. 1. Ayudante.

Los ayudantes de todos los frentes de obra después de la jornada de la mañana no trabajaron y se retiraron de los frentes de obra.

Maquinaria.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La felisa

Contratista no tiene equipos ni maquinaria

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia

Peto cruzadora: puente - Uterbo

Peto excavadora: puente - Uterbo




Dos volquetes.

Clima

Ruta 2507: Día seco

Rota 2508: Día Seco

Rota 5003: Día Seco

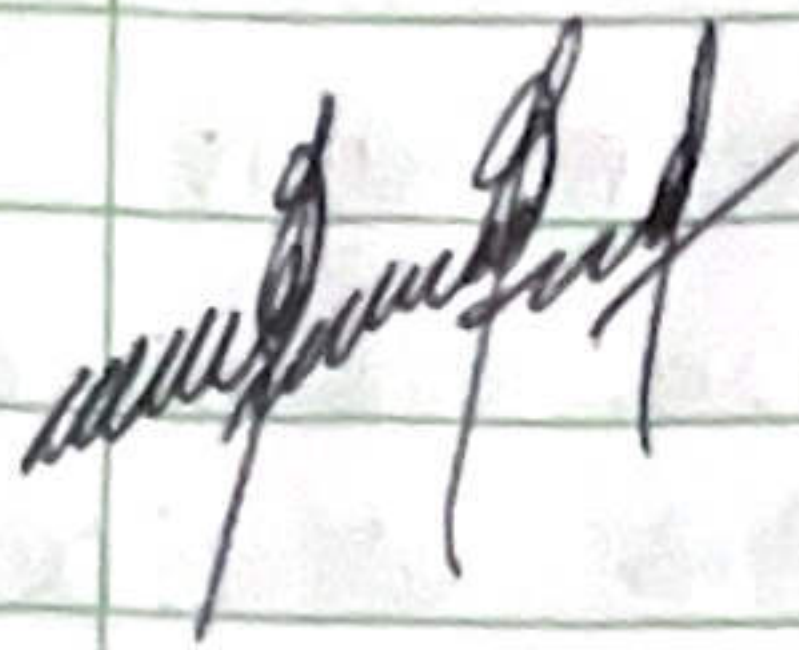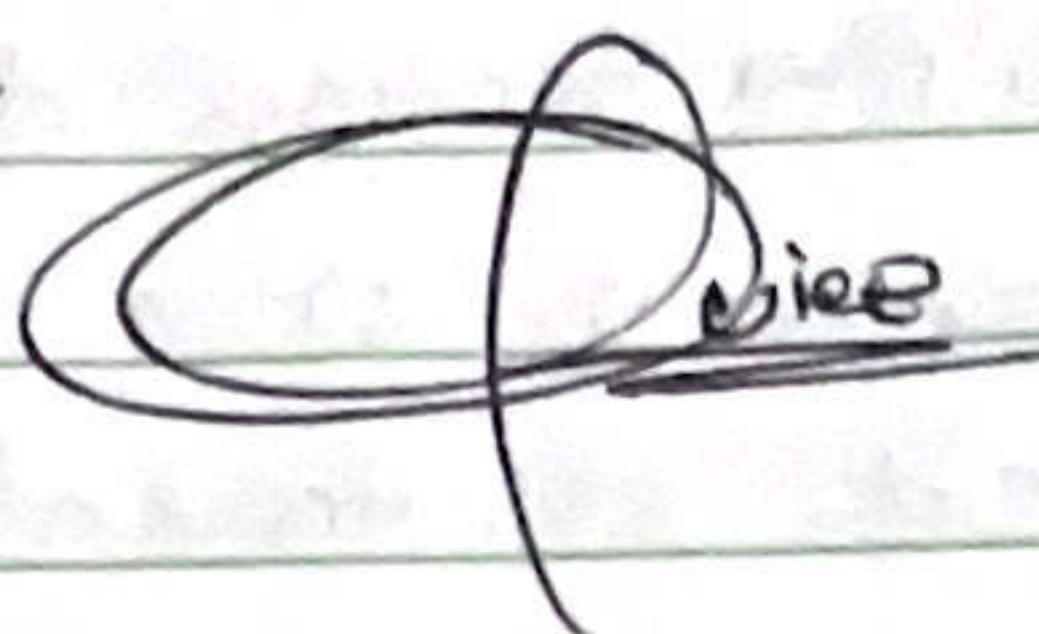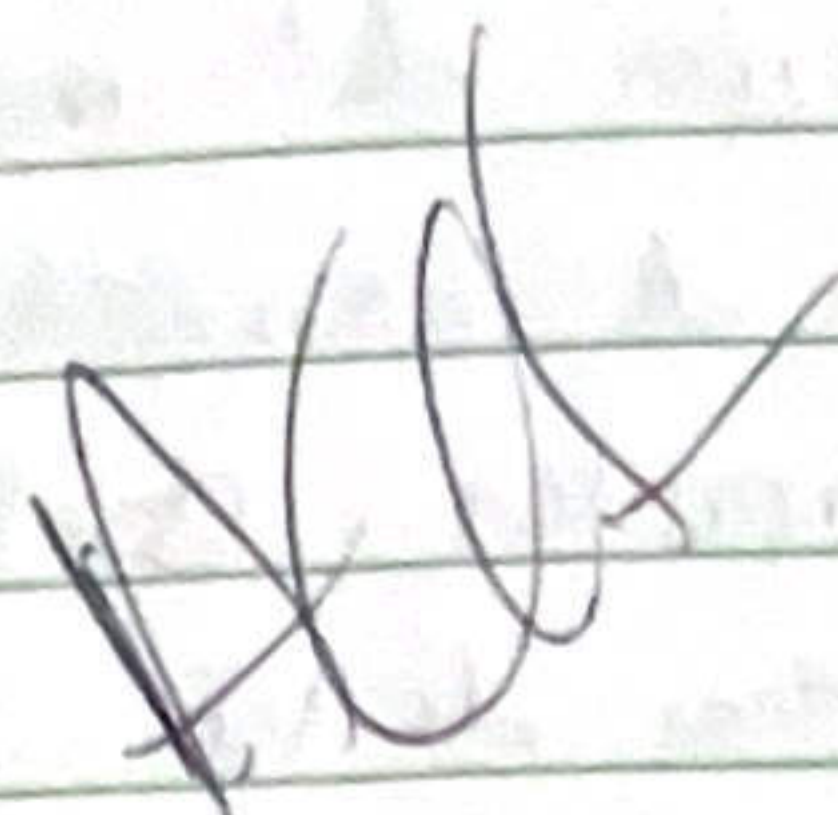Viernes
365

13 Diciembre 2024

Actividades

Rota 2507 Remolino - cauya

Contratista no tiene actividades en ejecución

Rota 2508 cauya - la felva

Contratista no tiene actividades se encuentra inactivo con los ayudantes en el frente de trabajo PR 87920 y se presenta 1 oficial y hace el desencofrado, y continua figurando acero.

Rota 5003 Apia - Uteibu - Asia

PR 77+100 puente citrbo contratista termino de hacer la seleccion de material y la colocación del carretable, se evidencia unas pequeñas fallas en la zona del estribo izquierdo del puente ya esta listo para iniciar actividades de pilotaje, igualmente se termino de caer todas las gestallas llenas, a la fecha para un total de ± 120 unidades, se tiene el apoyo de dos retro excavadoras y dos volquetas.

Frente las molinos inactivo

frente muro de contención PR 63+250 Contratista. termino de instalar acero de refuerzo de la Zorpa y acero longitudinal de la pantalla del muro, igualmente se hace la instalación de la formaleta metálica para programar liberación de acero, cotes de nivel y vaciado.

Frente del dissipador PR 59+550 inactivo

frente APIA PR 58+600 inactivo

todos los ayudantes continúan sin hacer presencia de los frentes inactivos, se solicita al Contratista.

hacer efectivo el pago de los honorarios de los trabajadores.

Personal

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista continua sin personal

Ruta 5003 Apia - Utebu - Apia

cuadrilla del puente: 2 operarios, 2 udquetas, 3 ayudantes, 1 oficial

cuadrilla muro: 1 maestro, 1 oficial - 1. Herero, 3 ayudantes

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

contratista no tiene maquinaria

Ruta 5003 Apia - Utebu - Apia

Dos retro excavadoras - puente.


Dos udquetas

Clima

Ruta 5003: Día seco

Ruta 2507: Día seco

Ruta 2508: Día seco

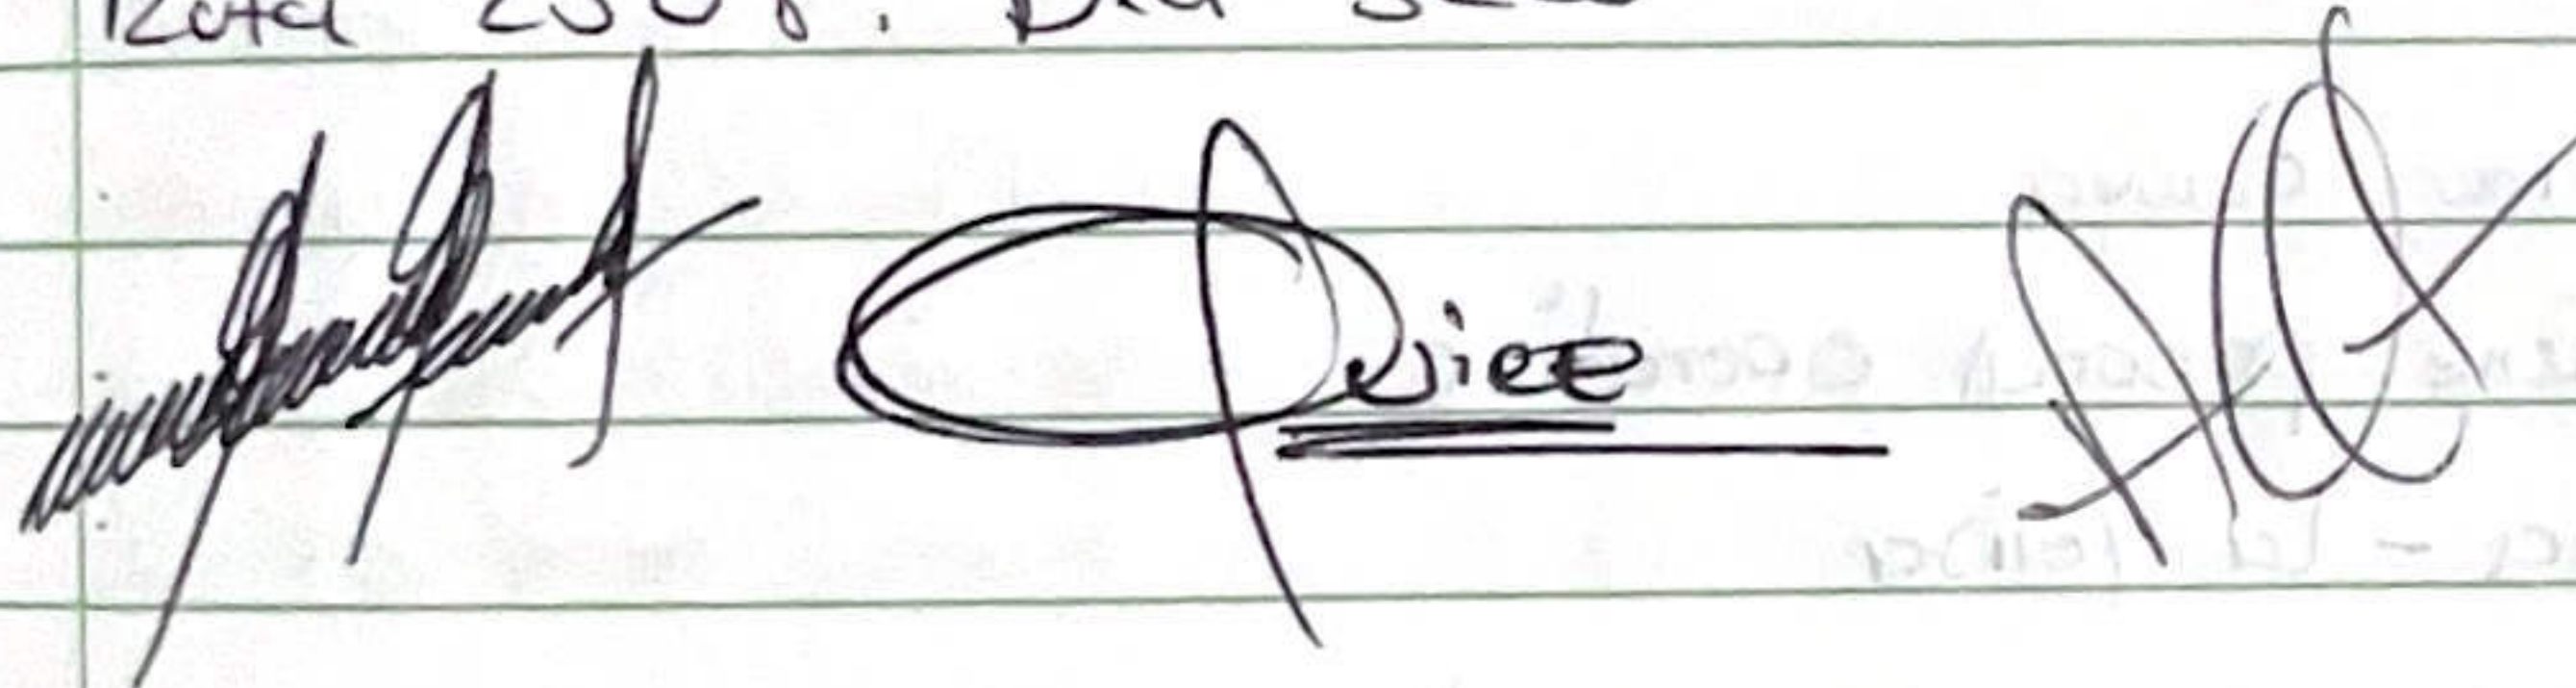

14 - Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cuya

Contratista no tiene actividades programadas, ni ejecutando

Ruta 2508 Cuya - la felisa

Contratista no tiene actividades operativas, no hay personal en el dopador pr 87920, interventoria y contratista

realizaron visita con topografía para revisar y solucionar

niveles de las cunetas de pr 94550, presentando una

Solución, con la finalidad de terminar esta obra.

Interventoria hace la observación que los testigos

de concreto se encuentran sin doencoprar e hidratados

desde 12/12/2024, se solicita aplicar procedimientos

de calidad y dos controles.

Ruta 5003.

Pr 77+100 puente Uterbo: Frente obra inactivo

Pr 75+00 a pr 73+200 Las Melenas:

Contratista realizó la Señalización horizontal en metro lineal con líneas de borde y líneas de centro, queda pendiente terminar m² el resto de actividades conexas y la instalación de bordillos está sin actividades

Pr 63+250 Muro de contención

Interventoría realizó visita al frente de trabajo y encuentro inactivo

Sin embargo se realizó liberación de acero de Módulo 2B

Donde se realizó la liberación del acero transversal y longitudinal de la panilla inferior y superior. Además de cara interior y exterior de la panilla del muro; para esta actividad por parte del Contratista realizó carta de presencia, Topógrafo para los chequeos de cotas de nivel y Ingeniero residente para confirmar y se tiene programado vaciado para el día Domingo.

Pr 59+550 y pr 59+600 en Apia se encuentran inactivos Personal.

Ruta 2507 Remolino - Cuya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cuya - La Felisa

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia

Contratista no tiene actividades en ejecución

Personal en recorrido: Ing residente, Topógrafo, Oficial, maestro por parte de contratista y de interventoría Ing residente, un ambiental en oficina: Asesor Administrativo, SST, Ing. Auxiliar, Social.




Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La Felisa Contratista no tiene Maquinaria

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Apia: 2 Retro excavadoras, 2 compactas inactivas

Clima:

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003: Día Seco.

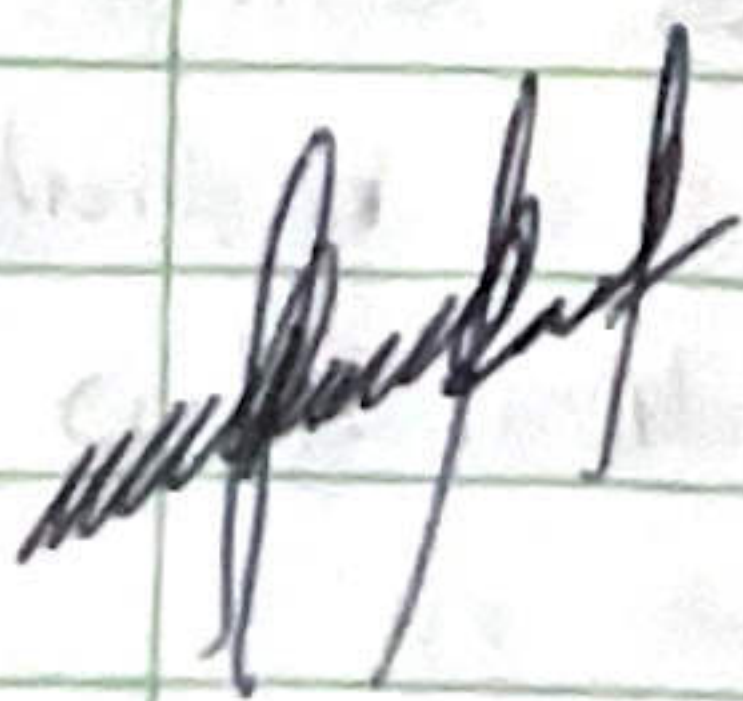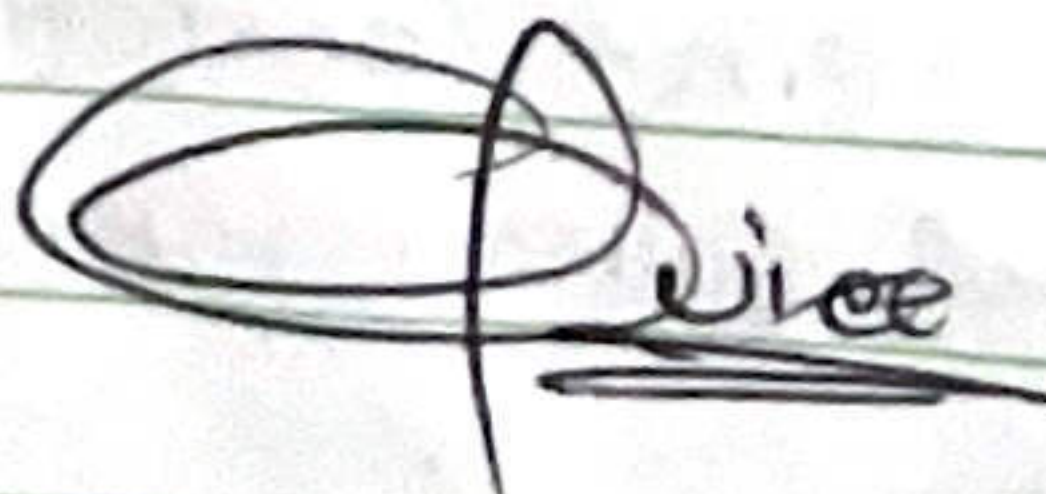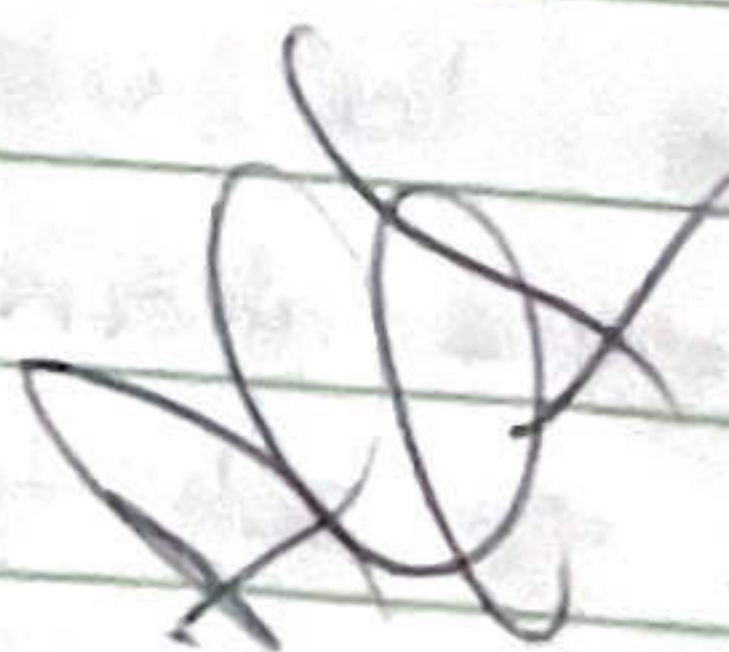15 diciembre del 2024

Actividades

Contratista no programo actividades en la ruta 2507 y 2508 todo esta inactivo

Ruta 5003 Apia - Utebu - Asic

Contratista no programo actividades en PR 77+100 puente Utebu, PR 54+550 dissipador, PR 58+600 bordillo.

En frente de trabajo muro de contención PR 63+250 se realizo vaciado de concreto de 4000 psi al modelo 2B, iniciando actividades a las 7:00 Am, con la mixer 1 de 5.5 m³ y un asentamiento de 5 pulgadas, la segunda mixer inicia vaciado 7:40 Am de 5.5 m³ y un asentamiento de 5 pulgadas, tercera mixer con volumen 5.5 m³ y un asentamiento de 6 pulgadas, inicia vaciado 8:20 Am, cuarta mixer se inicia 8:50 Am. y se toma para hacer cilindros para resistencia

para lo cual se tomo 3 cilindros; la quinta mixer tiene un asentamiento de 7 pulgadas, la quinta y sexta se tomaron muestra en el muro se vaciaron 7 mixer y cobraron ± 2 m³ lo cuales se vaciaron en canetas de las melenas PR 74+120 entrada al trapiche, y 3 canetas en pedregal PR 74+568.5, PR 74+581

Ampliación Contratista solo tomo 6 cilindros para resistencia por no tener mas cridades disponibles

Personal y Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino no hay personal ni maquinaria ya que no tienen actividades


Ruta 5003 Apia - Utebu - Asic

Cuadrilla muro: 1 maestro, 2 oficiales, 2 contratadores, 3 ayudantes

1 ingeniero y la maquinaria motriz

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508 - Ruta 5003: Dia Seco.

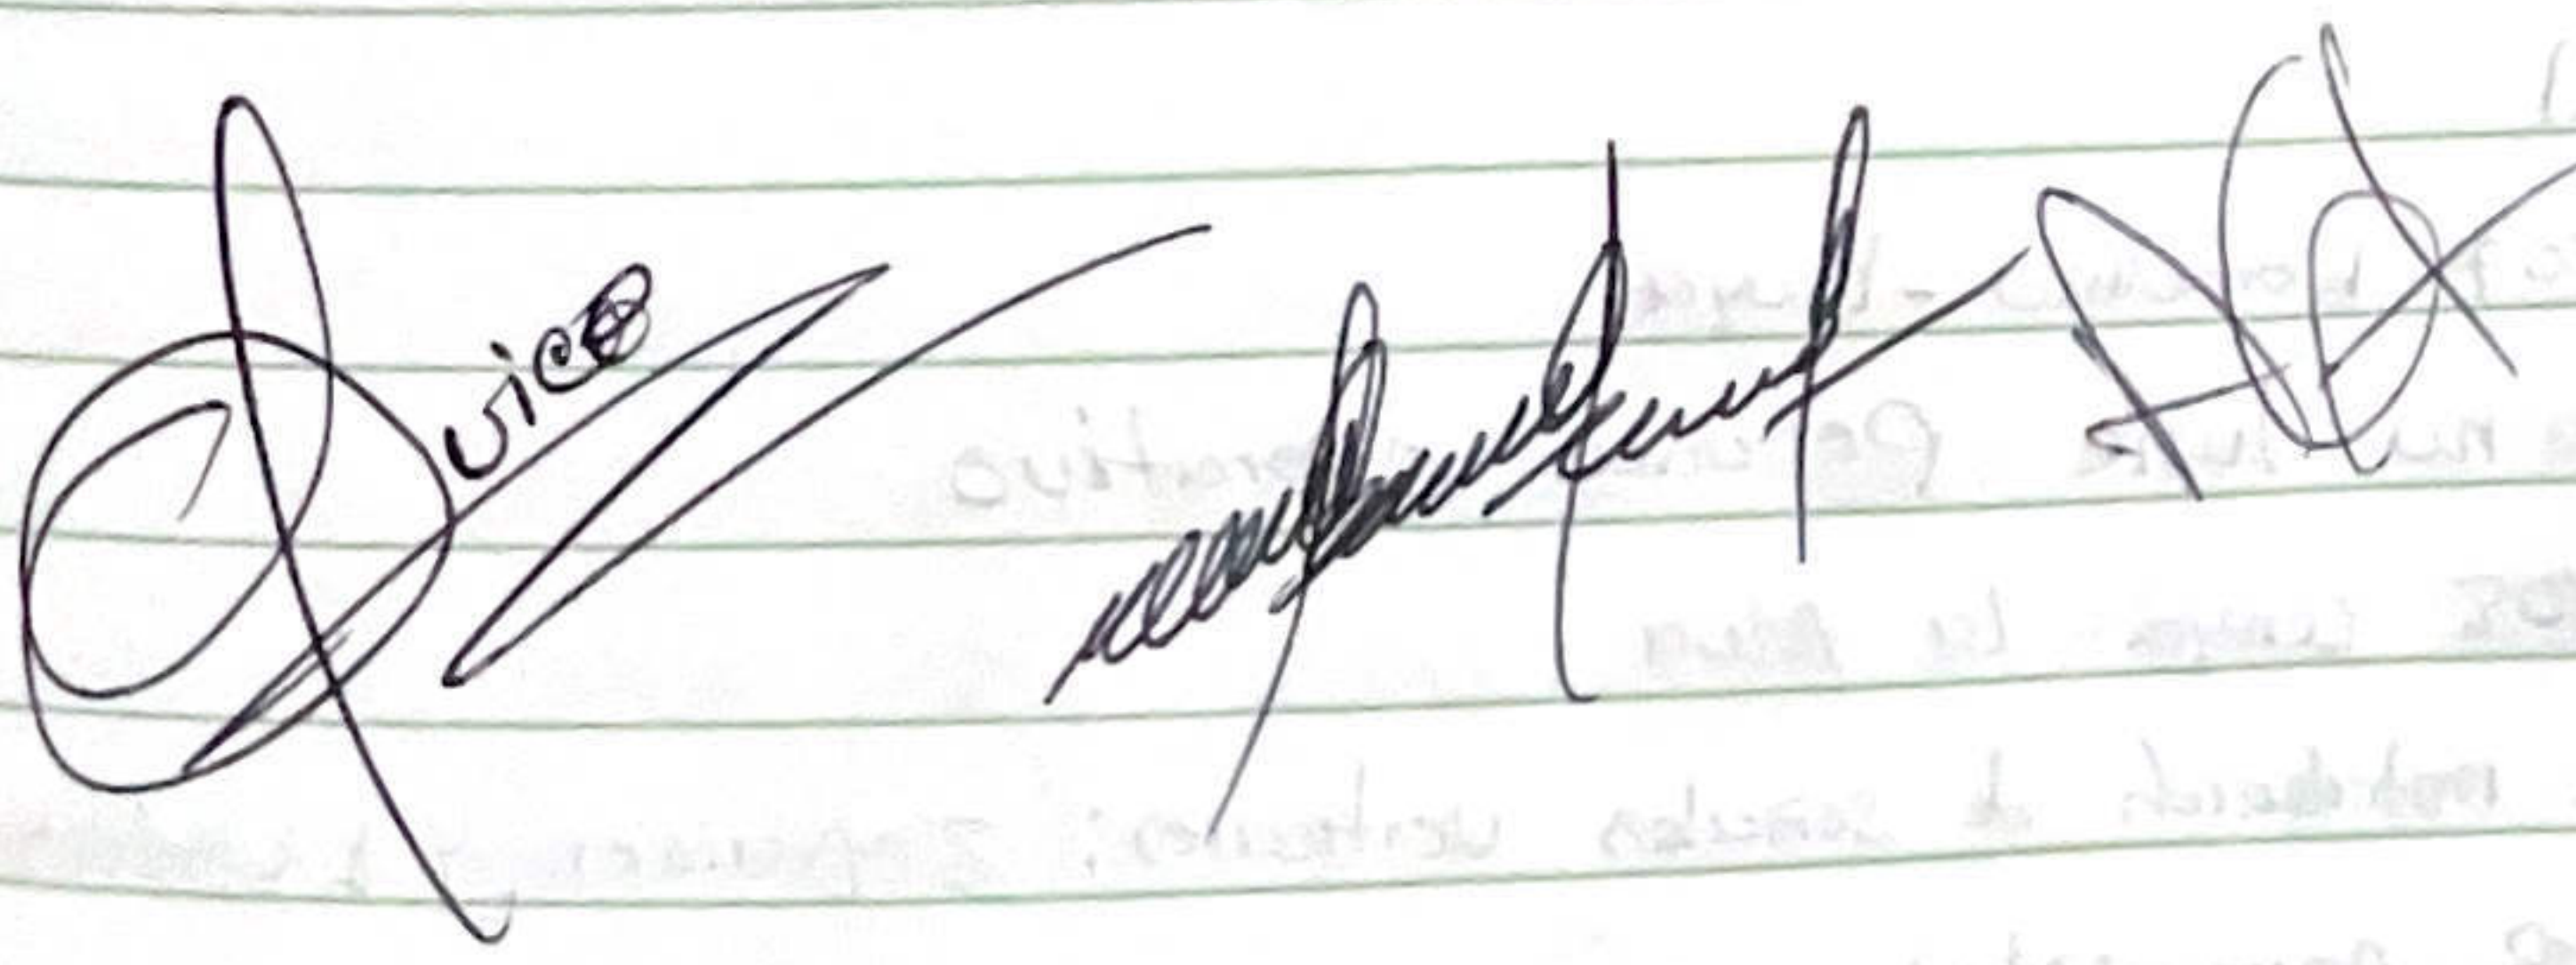

lunes
368

16 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cayuá
Contratista no tiene actividades programadas ni en ejecución
Por información en los diferentes comités especialmente desde #41
Se indica que inicia actividades después de terminar actividades en el
en la ruta 2508; en estas condiciones no se tiene actividades programadas
para el resto de año según lo indicado por el contratista.

Ruta 2508 Cayuá - La Felisa

Contratista continúa sin actividades en los frentes de trabajo activos,
PR 81920 desparecer. Según lo informado por el contratista, no programar
actividades por falta de materiales (acero de refuerzo) y PR 91350 el
Contratista no ha iniciado con corrección de niveles para el manejo de
aguas lluvias, ya que se tiene pendiente construcción de cunetas y
un canal. Para la entrega en recorrido de la intervención se
realizó la verificación de la pintura lineal desde el PR 141060 al
PR 381000 línea de borde y centro, adicional se verificó cantidades del
PR 291000 al PR 30100; también se verificó la instalación de 20 postes
verticales entre ellos se tiene instalado en el colegio la Rosa, colegio
Rio Socio, Sector las Pitas, Quebra Lomo para un total de 8 unidades de 25
y 12 unidades de 25A, continúa pendiente el resto de actividades
ubicadas en los siguientes PR 341600, PR 291970, Reiniciar pintura m²
instalación de 12 resaltes.

Ruta 5003 Apia - Utebo - Asia

PR 771100 puente Utebo: Contratista continúa con la instalación de geobolsas
para fortalecer el desvío de Rio Escondida del estero Asia y se trabajó con
dos rotos excavadoras y 2 volquetes.

Sector las melanas reiniciarán actividades de instalación de bordillos

PR 631250 Muro de Contención; Se continúa con figurado de acero del muro
Frente de Apia PR 381600 y PR 391350 se encuentran inactivos.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cayuá.

Contratista no tiene Personal Operativo

Ruta 2508 Cayuá - La Felisa

Cercadilla instalación de postes verticales: 3 oficiales y 1 conductor

Ruta 5003 Apia - Utebo - Asia

Cuadrilla de puente: 2 operadores, 2 conductores, 2 ayudantes

Cuadrilla de bordillos: 2 ayudantes.

Cuadrilla de muro: 1. Celador, 1 maestro, 1. oficial, 4 ayudantes


Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa no hay maquinaria

Ruta 5003 Apia - Uteibu - Asia: 2 retroexcavadoras, 2 volquetas

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003: Día Seco

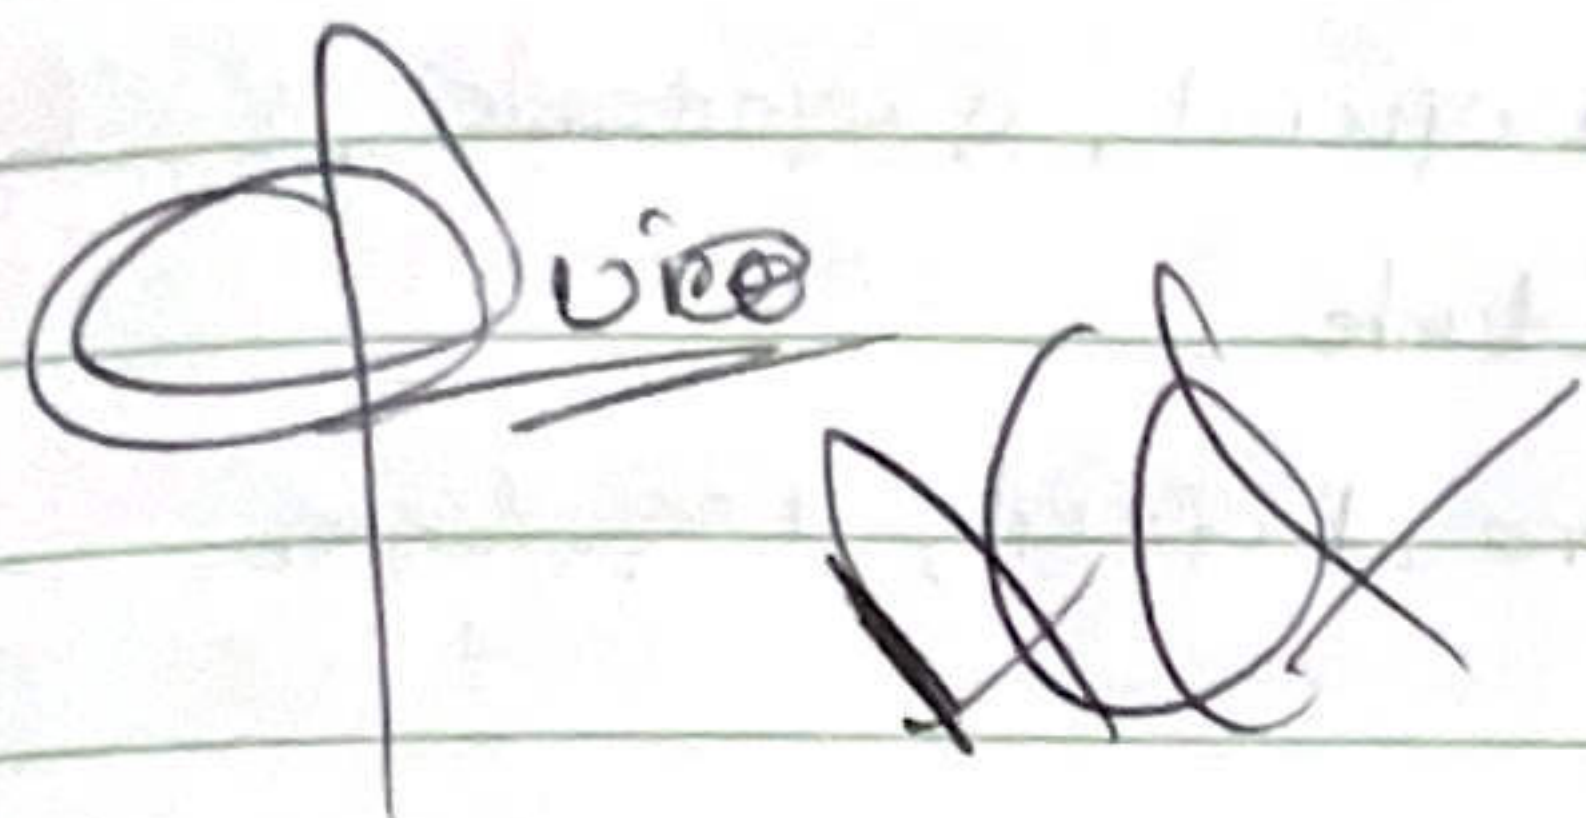 Vice

17 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - cuyá

Contratista no tiene actividades programadas para ejecución tal como se indica en 16 de diciembre del 2024.

Ruta 2508 cuyá - la felisa

Contratista continua con la instalación de señalización vertical para un total de 23 unidades, se continua con el figurado de acero de dropador pr 8+920, y se activa el realce de muros en pr 30+00; Contratista continua sin iniciar las actividades que estan pendientes sobre esta ruta y que se mencionan en el día anterior

Ruta 5003 Apia - Uteibu - Asia

PR 77+100 puente Uteibu: Contratista continua con trasego de material interno y con la instalación de geo bolsas para fortalecer el desvio del río Waralda y se continua despegando el estribo lado Asia

Sector las melenas continua con la cuadrilla de instalación de bordillos

PR 63+250 muro de contención, se continua figurando acero para continuar con la construcción del muro.

frentes de apia pr 58+600 y pr 59+550 se encuentran inactivos sin personal.

Personal:

Ruta 2507: Remolino - Cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - La Felisa

cuadrilla meros : 1 ayudante, 1 oficial

cuadrilla dispersores : 1 oficial, 2 ayudantes

cuadrilla de instalacion señalizacion vehicular: 1 oficial, 2 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia

cuadrilla puente : 2 operadores, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 volquetes

cuadrilla burlillo : 1 oficial, 1 ayudante

cuadrilla mero : 1 calador, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino y la felisa

El contratista no tiene maquinaria ni equipos

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia


2 Retro excavadoras puente Utebo

2 volquetes Activos

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 = Dia Seco

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia : Dia Seco

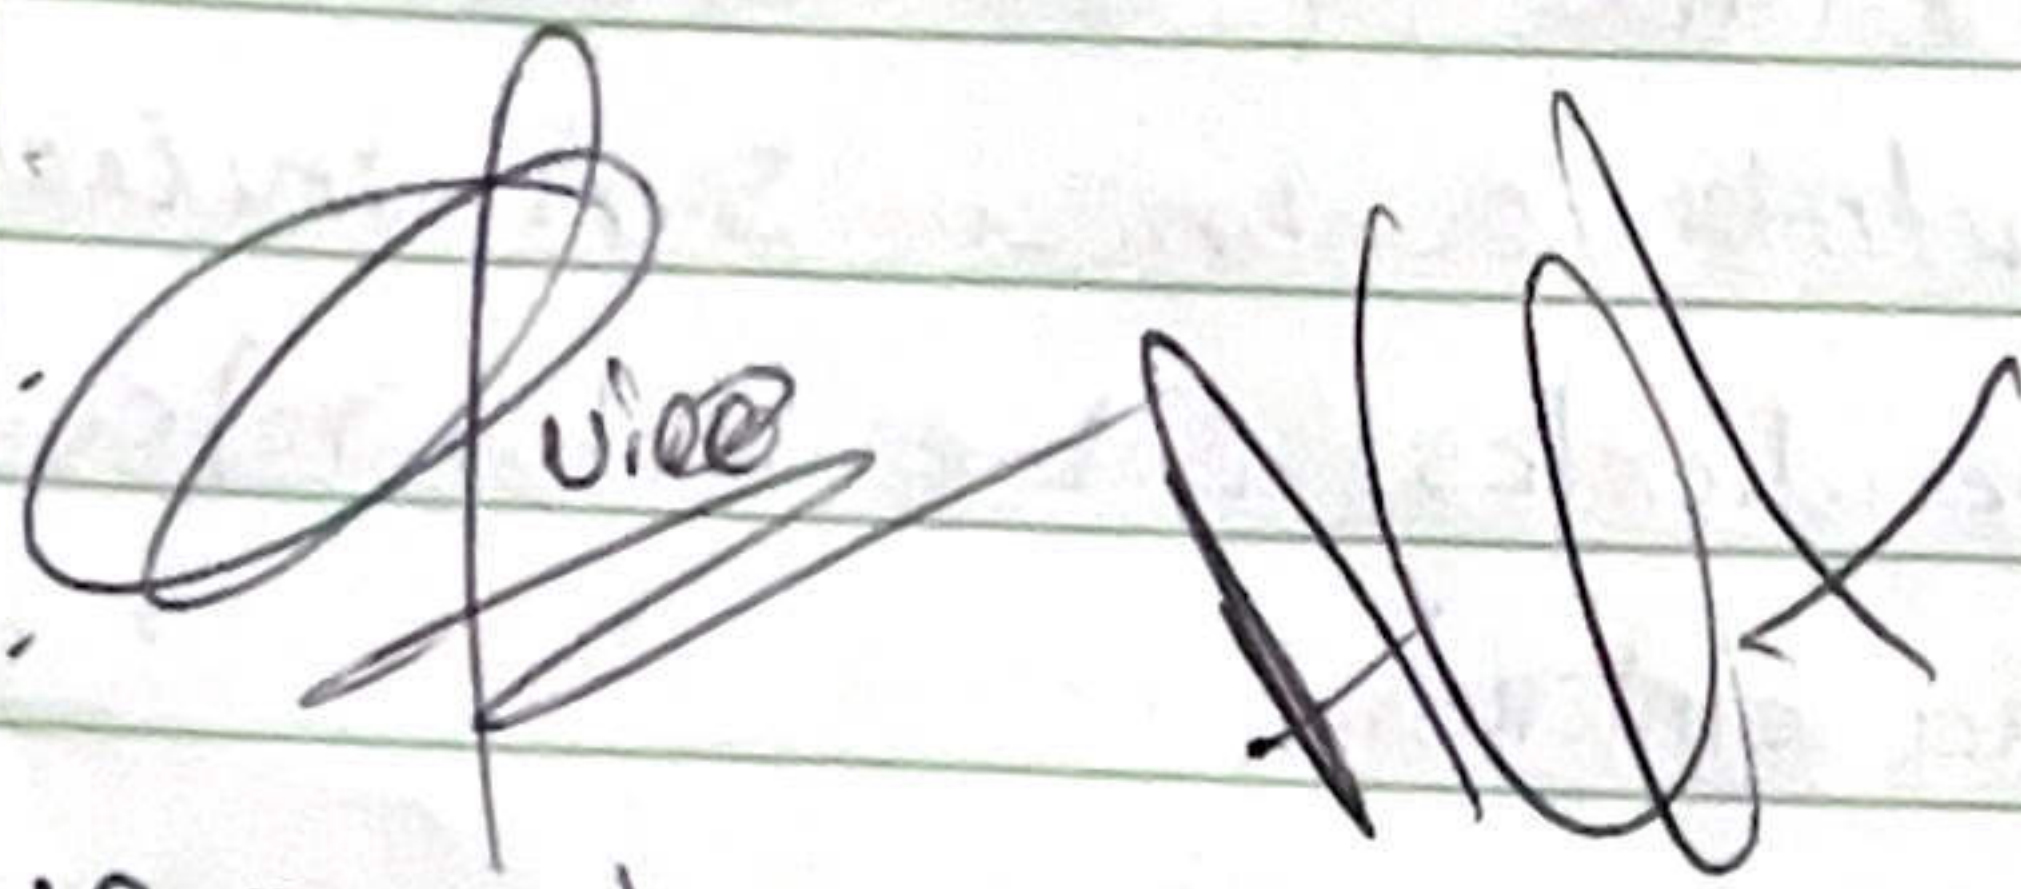

Microcole 18 diciembre 2024
370

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contratista no tiene actividades y continua pendiente todas las actividades Autorizadas

Ruta 2508 Cauya - La Felisa

Contratista continua con las perforaciones para el realce de meros PR 29+850 a PR 30+00; Adicionalmente contratista inicio con la instalacion de resaltes Se tiene autorizados 12 unidades iniciando PR 30+300, PR 30+210, PR 33+794, PR 33+708 en los cuales se instalan 6 unidades y la jornada inicio al medio dia hasta horas de noche.

Contratista continua con el armado y figurado de acero del
 disparador PR 8+920. Además se continua con la instalación de
 Señales de trazo vertical para lo cual se instaló 20
 unidades y se continua con la jornada; es importante indicar
 que el contratista debe terminar las actividades pendientes por
 iniciar tales como se mencionan PR 9+330, PR 34+600
 continuar señalización horizontal m²

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

PR 58+590 al PR 58+800 Pavimento Apia

Contratista mantiene el frente de trabajo inactivo

PR 59+550 Disparador: frente de trabajo continua inactivo

PR 63+250 Muro de Contención

Contratista continua con el figurado de acero para el modelo 2C y
 modelo 2A; y en el sector los Medanos continúan con la
 instalación de bardillo

PR 77+100 Puente de Uteibo: Contratista continua organizando fogón
 para desviar el cauce del río y trabajar sobre el estribo lado Apia.

Personal

2507 Remolino - cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 cauya - la felisa

Cuadrilla muros: 2 oficiales, 2 ayudantes

Cuadrilla de la instalación señalización vertical: 1 oficial, 2 ayudantes

Cuadrilla Resalto: 1 oficial, 2 controladores, 5 ayudantes, 2 volqueteos

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

Cuadrilla muro: 2 operadores, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 volqueteos, 1 maestro

Cuadrilla bardillo: 1 oficial, 1 ayudante

Cuadrilla muro: 1 celador, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes

Maquinaria.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino y la felisa

El contratista no tiene maquinaria ni equipos

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

2 Reto excavadora puente

1 Excavadora puente.

2 volqueteos puente.

Clima.

Ruta 2507 - y Ruta 2508 Remolino - felisa : Día Seco

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia : Día Seco

Utebo

Jueves
371

19 noviembre del 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauyá

Contratista no tiene actividades en ejecución y programadas

Ruta 2508 cauyá - la felisa

Contratista continúa con la instalación de señal vertical: inicia en peotoc a mayores; también se continúa con la construcción de los resaltes y hoy se terminó de construir 12 resaltes. Interventoria recomienda tener señalizado y solicitar que después de hacer hacer la respectiva pintura para evitar algún incidente; en continuación se indica los pr de los resaltes: PR 38+300, PR 38+218, PR 33+894, PR 33+708, PR 23+390, PR 23+510, PR 20+908, PR 20+800, PR 9+135, PR 9+072, PR 1+395, PR 1+508. Como anotación a la fecha se tiene pendiente señalización horizontal m² por lo cual se solicita reiniciación de inmediato.

Ruta 5003 Apia - Utebo - Apia

PR 58+590 al PR 58+800 Apia pavimento rígido frente de trabajo inactivo y a la fecha tienen pendiente bordillos y cello de juntas y la viga de transición calle a carretera S.

PR 59+550 empicador frente de trabajo inactivo

PR 63+250 muro de contención

Contratista continúa: fijando e instalando acero en los módulos 2C y 2A en pantalla inferior y pantalla de muro. Interventoria hace sus respectivas observaciones del proceso. Sección las melenas. Contratista continúa con la instalación de bordillo, en el PR 77+100 Continúan con movimiento de material y el contratista hace el descargue de la pilotadora para iniciar actividades el 23 de diciembre, ya que

es necesario hacer la demolición de unas estructuras por lo cual es necesario ingresar un minicargador con martillo.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya

el contratista no tiene actividades en ejecución

Ruta 2508 Cauya - La felisa

cuadrilla de puentes: 2 oficiales, 3 ayudantes

cuadrilla de puentes: 1. oficial, 6. ayudantes este personal cubre toda la jornada y el día 18 de diciembre 2024.

cuadrilla de muros de contención: 1. oficial, 2 ayudantes.

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

cuadrilla del puente: 3 operarios, 2 vagoneros, 3 ayudantes, 1 oficial

cuadrilla de bordillos: 1. oficial, 2 ayudantes

cuadrilla del muro, 2 oficiales, 1. maestro, 4 ayudantes, 1. celador.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La felisa

contratista no tiene equipos ni maquinaria

Ruta 5003. Apia - Uteibo - Apia

2 Retro excavadoras puente

1 excavadora - puente

1 mini cargador con martillo - puente. inactivo

1 piloteadora en puente - inactivo

2. Vagoneros

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La felisa

Contratista: Día Seco

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Apia

Día Seco

Fecha 20 Diciembre 2024

372

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contratista no tiene actividades programadas en la zona

Ruta 5003. Apia - Utebo - Ajici.

PE 58+590 al PE 58+80 pavimento

El Contratista reactiva actividades en este Tronk para hacer vaciado de la viga de fundición en calle 11 y carrera 5. en la cual estaban organizando Acero y formateal al igual que los fijos de los Sumideros ubicados lado derecho y el lado izquierdo. y no terminaron el vaciado de bndillo y una caja de sumidero del lado derecho.

PE 59+550 disipador continua inactivo.

PE 73+800 continua con instalacion de bndillos

PE 63+250 muro de contención Contratista continua figurando e instalando acero Sobre los Modelos 2C y 2A

PE 77+100 puente Utebo Contratista continua con movimiento de material en el 110 e inicia con actividades de demolición Sobre el estibo izquierdo del puente Utebo

Ruta 2508 Cauya la felisa

Contratista para la cuadrilla de construcción de resaltes y hace el vaciado en el disipador 8+920 y según el asentamiento en campo indica 6 pulgadas, se hace la forma de cilindros para resistencia de concreto. y se hace la rección de 5m³ en la actividad Se hace vaciado 18m de placa de longitud y 18 metros de ancho, se continua con instalación de señalización vertical

Personal

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Brigada Disipador PE 8+920: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Brigada instalación señalización vertical: 1 oficial. 2 ayudante.

Ruta 5003 Apia - Utebo - Ajici

Brigada Muro: 1 oficial, 4 ayudantes

Brigada Apia: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ingeniero Auxiliar

Brigada puente: 3 operadores, 1 maestro, 3 ayudantes, 2 conductores

Brigada bndillo: 1 oficial, 1 ayudante.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista no tiene maquinaria

Ruta 5003 Utebo - Apia - Ajici

2 Retro excavadoras - puente uleibo

1 excavadora

1 Minicargador con martillo

2 vaquetas

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Dia Seco

Ruta 6003 Apia - Uleibo - Apia

Dia Seco

Sábado 21 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - la felisa

Contratista no tiene actividades programadas

Ruta 2508 Cauya la felisa

PR 8+920 disipador contratista continua con armado de acero

y limpieza, ante la insistencia del Supervisor y la interventoria

el contratista realiza la aplicación de pintura en filo se inicia

actividades donde PR 38+300 a menores. esto con la finalidad

de mitigar incidentes, con la salvedad que la aplicación de pintura

es provisional.

Ruta 5003 Apia - Uleibo - Apia

PR 77+100 puente uleibo

Contratista continua con demolición del estibo izquierdo y con

el figurado del acero, no hay movimiento de material

Frete las melenas: frente inactivo

PR 63+250 Muro de contención

Contratista continua con figurado de acero e instalación sobre

modulo 2C y modulo 2A

PR 54+550 y PR 58+590 frente Apia se encuentra inactivo

Personal

Ruta 2507 Remolino Cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - la felisa

Pintura rescatos: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ingeniero residente

dispador 81920: 1 oficial, 2 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Aia

cuadrilla puente 1 operador, ayudante, 1 oficial, 1 maestro

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista no tiene maquinaria

Ruta 25003 Apia - Uterbo - Aia

2 Retro excavadoras - inactiva puente Uterbo

1 Excavadora - inactiva puente Uterbo

1 Minicargador - Activo puente Uterbo

2 Volquetes - inactivo puente Uterbo

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Dia seco

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Aia : Dia seco

375

Domingo 22 Diciembre 2024. No se realizan actividades. Día festivo.

lunes Actividades 23 Diciembre 2024.

376

Ruta 2507 Remolino - ~~la felisa~~ Cauya

Contratista no realiza labores de obra en esta Ruta.

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Aia

PR 59+000 Parque principal municipio de Apia

Se realiza demarcación vial con pintura en frío, línea central y de borde, pasos peatonales, zona de camperos y mototaxis. No se inician demarcación de intersecciones.

PR 63+250 Muro de contención

Se continúan actividades en este frente

PR 73+2-10 - PR 74+5-16 Frente las Melenas.

No se realizan actividades en este frente, el contratista no da razones en cuanto a la ausencia de personal y finalización de actividades como en el canal dispensador de

los Pasos PR-73+450.

PR-77+100 Reforzamiento estructural Puente Viterbo.

Se realiza demolición de escalones de estribo.

Ruta 2508 Remolinos - Cauya

PR-1920 Se continúa con vaciado de canal disipador.

PR-9+070 a mayores. Se realiza pintura de resaltes instalados.

Controlista no cuenta con más actividades.

Personal:

Ruta 2507: No presenta personal

Ruta 5003:

Cuadrilla pintura: 3 ayudantes.

Cuadrilla muro: 2 oficiales, 5 ayudantes.

Cuadrilla Puente: 1 conductor volqueta, 1 operario retroexcavadora, 1 operario piloteador, 1 soldador, 2 ingenieros auxiliares, 1 ayudante.

Ruta 2508: Cuadrilla disipador: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Cuadrilla pintura: 3 ayudantes.

Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508: No cuentan con maquinaria.

Ruta 5003:

PR-63+250 no cuenta con maquinaria.

PR-77+100 Puente: 1 piloteador, 1 volqueta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador.

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003: Día seco.

Pie

Mier 24 de Diciembre del 2024

378 El controlista no ejecutó actividades el día de hoy en ninguno de los frentes de las tres rutas.

Pie

Mier 25 de Diciembre del 2024

378 No se realizan actividades debido a día festivo.

Jue
379

26 de Diciembre del 2024 Actividades.

Rub 2507 Remolinos - Cauya.

Contratista no realiza labores de obra en esta ruta.

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Apia.

PR59+000 Parque principal municipio de Apia.

Se realiza demarcación vial con pintura en frío, línea central y de borde, para peatonales, zona de camperos y mototaxis. Contratista no inicia con demolición de intersecciones.

PR63+250 Muro de contención.

Se continúan actividades en este frente.

PR73+210 - PR74+516 Frente las Melinas.

No se realizan actividades en este frente, contratista continúa sin dar razones sobre la ausencia de personal para la construcción del dissipador los Pasales PR73+450.

PR77+100 Reforzamiento estructural puente Viteibo. Se continúan con actividades de pilotaje.

Ruta 2508 Cauya - La Felisa.

PR8+920 Dissipador, se continúa con vaciado de bases y paredes de canal.

PR9+070 a mayores Se realiza pintura de resaltes instalados.

Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508: No cuenta con maquinaria.
Ruta 5003.

PR77+100: 1 piloteador, 1 volqueta, 1 retroexcavadora.
Personal:

Ruta 2507: No cuenta con personal.

Ruta 5003:

Cuadrilla pintura: 3 ayudantes.

Cuadrilla muro: 2 oficiales, 5 ayudantes.


Cuadrilla Puente: 1 conductor volqueta, 1 operario piloteador, 1 operario retroexcavadora, 1 soldador, 1 auxiliar de ingeniería, 1 ayudante, 1 auxiliar SST.

Ruta 2508: Cuadrilla pintura: 3 ayudantes.

Cuadrilla dissipador: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003. Día seco

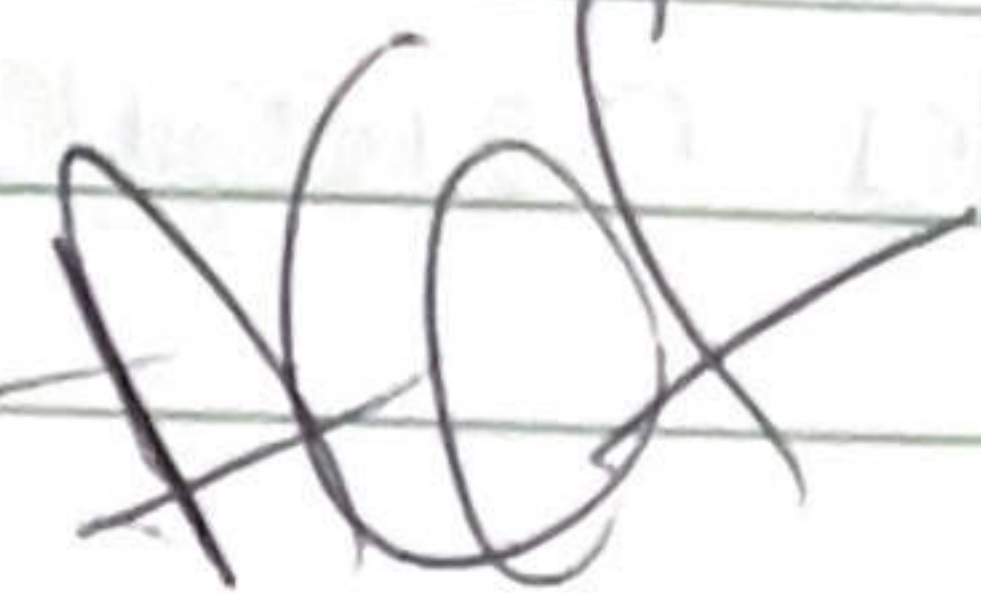27 de diciembre del 2024

Ver 380
Actividades

Ruta 2507: Remolinos - Cauya

Contratista no realiza labores de obra en esta ruta.

Ruta 5003: Apia - Viterbo - Asia

PR 63+250 Muro de contención

Se continúan labores de obra en este frente

PR 73+210 - PR 74+516 Frenelas Melenas

Contratista no realiza labores de obra en este frente

PR 77+100 Reforzamiento estructural Puente Viterbo

Se continúan con actividades de pilotaje.

Ruta 2508: Cauya - La Felisa

PR 8+920 Disipador

Se continúa con vaciado de losas y paredes de canal

Personal.

Ruta 2507: No cuenta con personal.

Ruta 5003:

Cuadrilla pintura 3 ayudantes

Cuadrilla Muro: 2 oficiales, 5 ayudantes

Cuadrilla Puente: 1 conductor volqueta, 1 operario

retroexcavadora, 1 soldador, 2 auxiliares de ingeniería

1 ayudante, 1 auxiliar SST.



Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508: No cuentan con maquinaria

Ruta 5003: 1 retroexcavadora, 1 piloteadora, 1

volqueta.

Clima: Día nublado ceco.

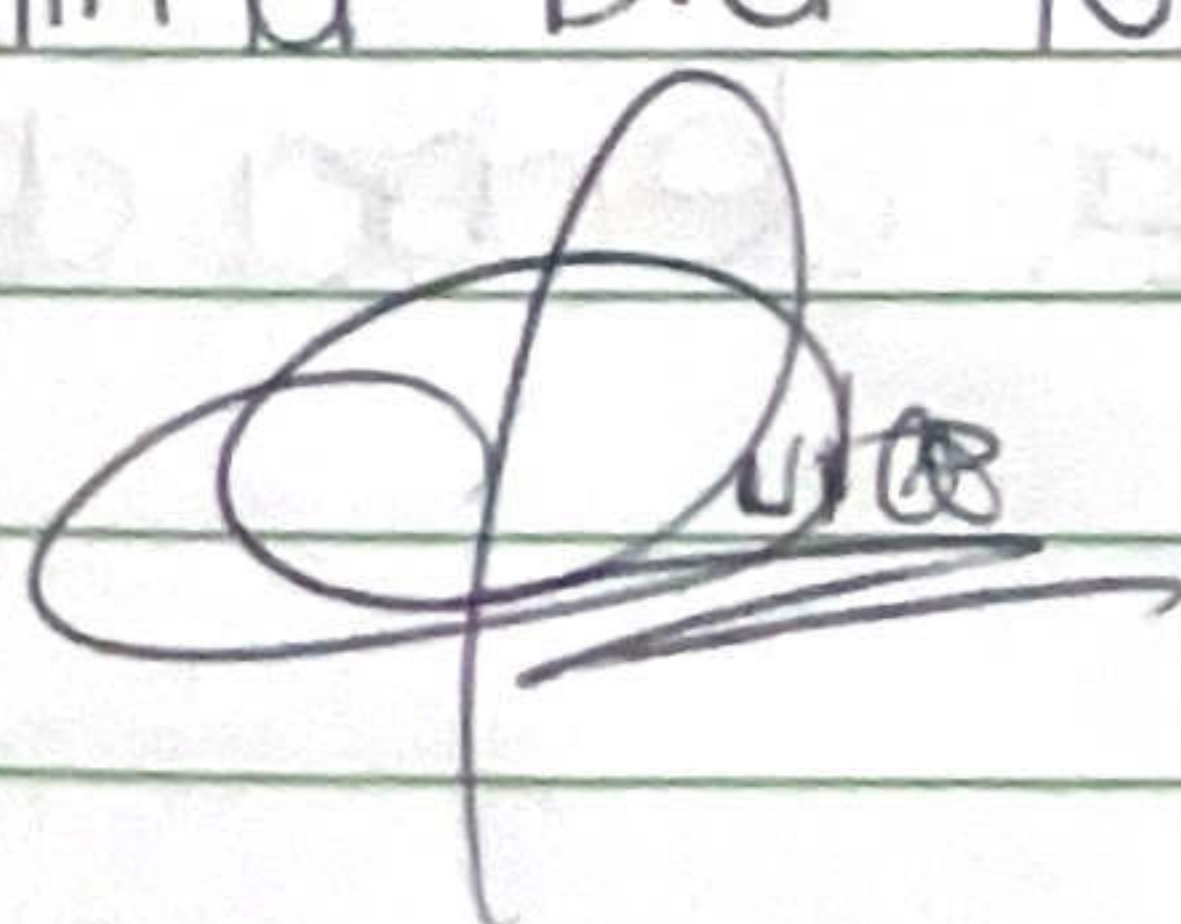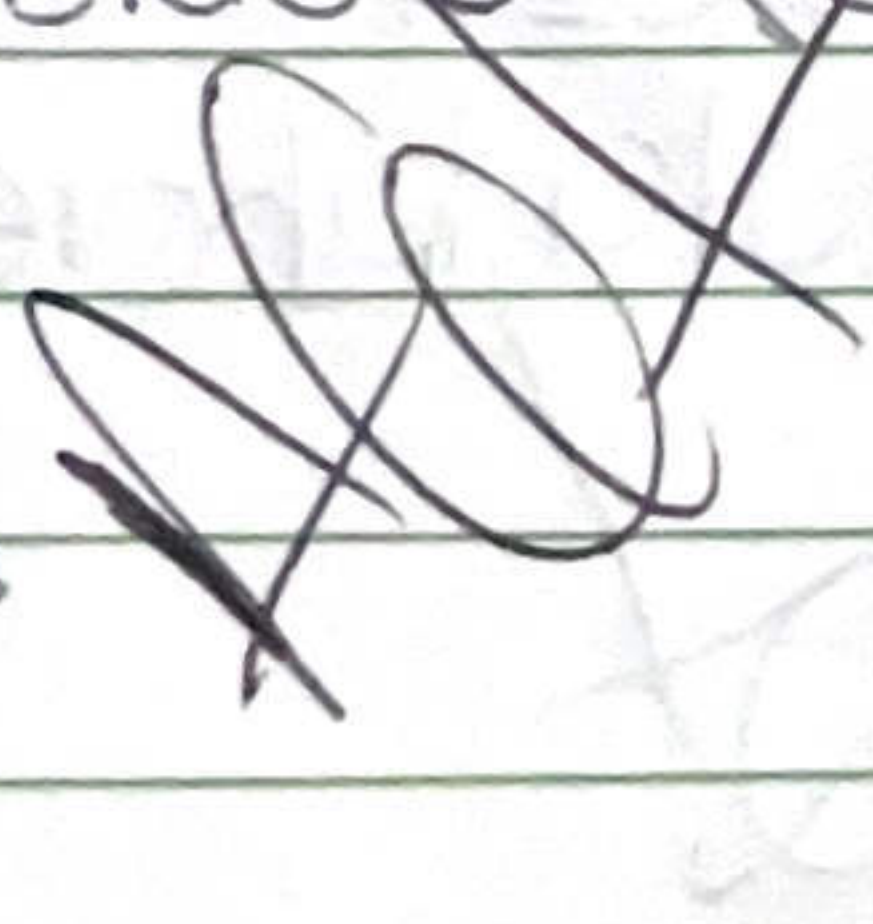Sab

381

28 de Diciembre del 2024

Actividades:

Ruta 2507: Contratista no realiza actividades en este frente.

Ruta 5003:

PR63+250 Muro de contención: Se continúan labores de obra en este frente.

PR77+100 Puente vehicular Viterbo.

Se continúan actividades de pilotaje.

Ruta 2508:

PR8+920 Disipador: Se continúa con actividades de instalación de acero y formaleta para vaciado de canal disipador.

Personal:

Ruta 2507: No cuenta con personal en esta Ruta.

Ruta 5003:

Cadrilla Muro: 2 oficiales, 5 ayudantes.

Cadrilla Puente: 1 conductor de volqueta, 1 operario retroexcavadora, 1 operario piloteadora, 2 auxiliares de ingeniería, 1 auxiliar SST.

Ruta 2508:

Cadrilla disipador: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Maquinaria:

Ruta 2507 y 2508 No cuentan con maquinaria.

Ruta 5003:

Frente Puente PR77+100: 1 piloteadora, 1 retroexcavadora, 1 equipo de soldadura.

Clima: Nublado seco.

Dom

382

30 de Diciembre del 2024

El contratista no ejecuta labores de obra debido a día festivo.

Lun

383

31 Diciembre del 2024
 El contratista no ejecuta labores de obra en
 ninguno de los frentes

vice vice FELIZ 2025.

1 Enero del 2025
 El contratista no programa actividades el día de hoy debido
 a día festivo

vice

2 Enero del 2025
 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido
 a festividades de fin de año.

vice

3 Enero del 2025
 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes
 debido a festividades de fin de año

vice

4 de Enero del 2025
 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes
 debido a festividades de fin de año.

vice

5 de Enero del 2025
 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes
 debido a festividades de fin de año

vice


6 de Enero del 2025
 Ruta 2507 Remolinos - Cauya.
 Contratista no ejecuta labores de obra en esta ruta.


Ruta 5003 Apía - Viterbo - Asía



PR63+250 No se ejecutan labores en este frente.

PR77+100 Mantenimiento Puente Vehicular Viterbo

8.85 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

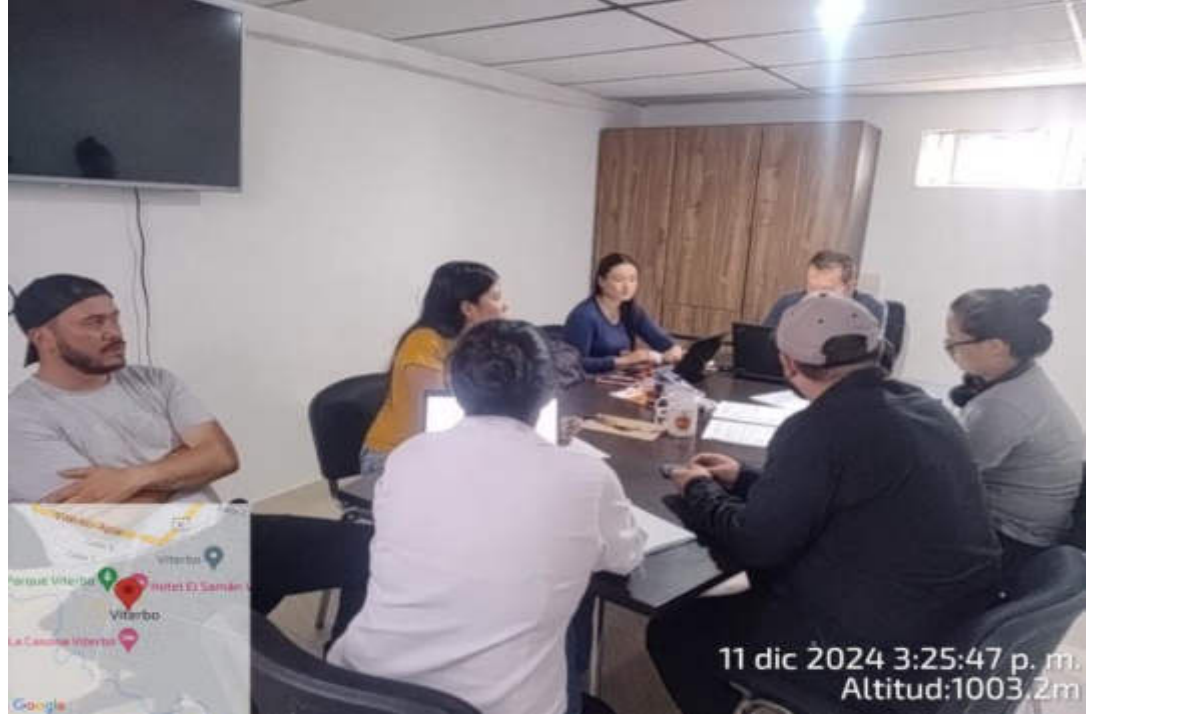	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
					VERSIÓN	1			
					PAGINA	1	DE		
					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023		FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.								
									
Fotografía 1: Comportamiento del cauce Rio Risaralda PR77+100 RUTA 5003					Fotografía 2: Vacidos de concreto para manejo de aguas lluvias PR74+700 RUTA5003				
									
Fotografía 3: Se continua con el llenado de geobolsas para el manejo del cauce del Rio Risaralda puente Viterbo PR77+100					Fotografía 4: Actividades de manejo de aguas lluvias PR8+920 RUTA 2508 - Derecho de petición				
									
Fotografía 5: Paisajismo y terminado de obras en PR74+470 RUTA5003					Fotografía 6: Comité de sistemas integrados y seguimiento de compromisos y acciones de mejora.				

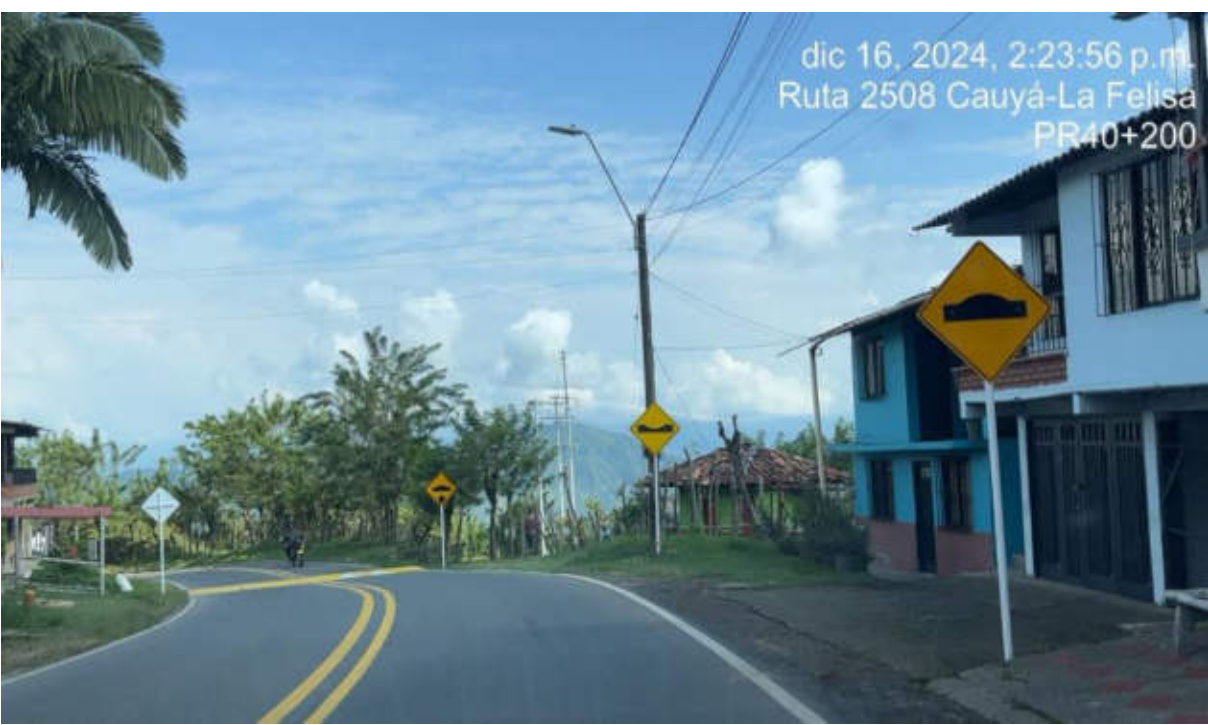	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	
					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023		FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.								
									
Fotografía 7: Maquinaria sobre el Rio Risaralda con adecuaciones del cauce Rio Risaralda					Fotografía 8: Señalización horizontal y vertical PR75+000 A PR73+200 RUTA5003				
									
Fotografía 9: Señalización horizontal y vertical PR40+080 RUTA2508					Fotografía 10: Señalización horizontal y vertical PR40+200 RUTA2508				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

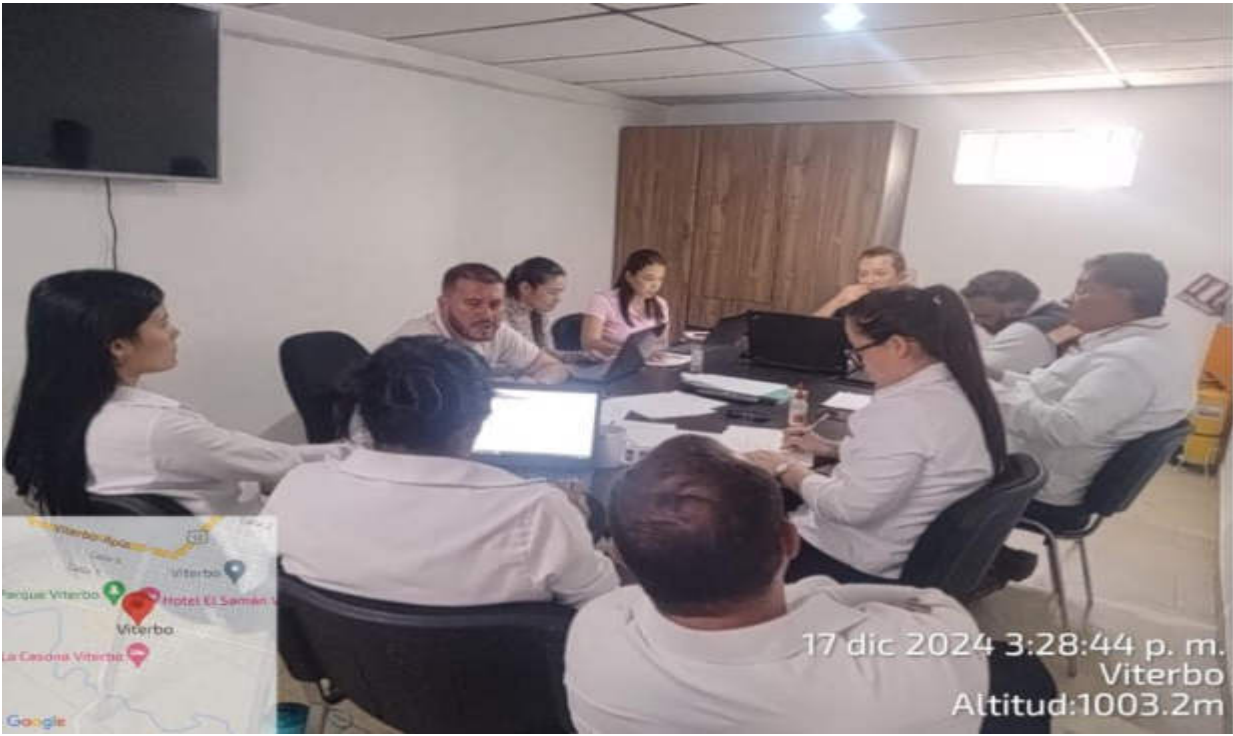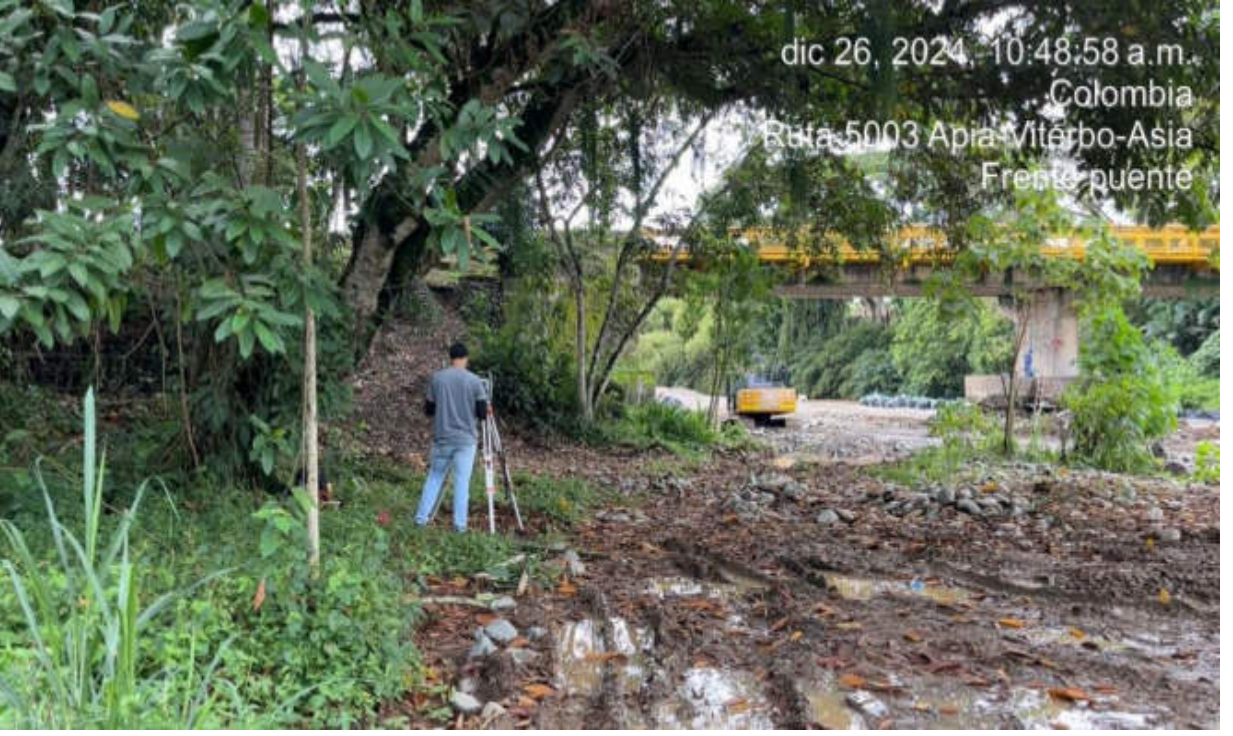	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA	1	DE	
				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES							
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023				
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.						
							
							
Fotografía 13: Vaciado concreto del muro de Contención PR63+250 RUTA5003				Fotografía 14: Trabajos de excavación puente Viterbo PR77+100 RUTA5003			
							
Fotografía 15: Señalización de puntos intervenidos sobre el PR58+950 RUTA5003				Fotografía 16: Instalción y vaciados de bosrdillos de pavimento rígido PR58+600 RUTA5003			


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	
					FECHA ELABORACIÓN		31	12	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023		FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.								
									
Fotografía 17: Protección del talud superior muro de contención PR63+250 RUTA5003					Fotografía 18: Maquinaria sector de las melenas PR74+990 RUTA5003				
									
Fotografía 19: Actividades de manejo de aguas lluvias sobre el tramo PR8+920 RUTA2508					Fotografía 20: Actividades de manejo de aguas lluvias sobre el tramo PR8+920 RUTA2508				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA						
			FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 Apia			Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 PR63+250			
Descripción: Señalización RUTA5003 Apia PR 59+455			Descripción: Señalización RUTA5003 Apia			

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA		FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
						
Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA5003 PR74+200		Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA2508 PR8+920				
						
Descripción: Pausa activa Interventoría		Descripción: Comité de sistemas integrados obra-interventoría				

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA		FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
						
Descripción: Ubicación Equipos de emergencia			Descripción: Inspección Equipos de emergencia			
						
Descripción: Revisión de actividades RUTA 5003 PR77+100			Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100			

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA						
			FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023		FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
						
Descripción: Inspección maquinaria y volquetas RUTA 5003 PR77+100			Descripción: Verificación de controladores viales RUTA2508			
						
Descripción: Tablero informativo actualizado			Descripción: Verificación cauce del río RUTA 5003 PR77+100			

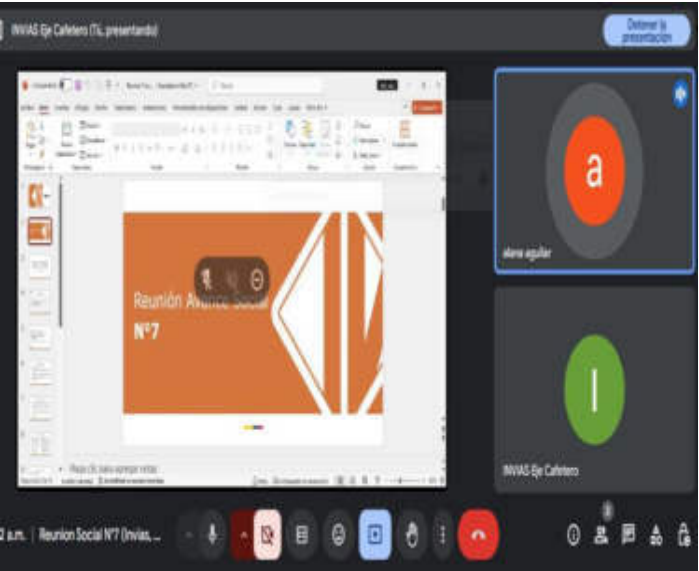	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL		FECHA ELABORACIÓN		31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:		
INTERVENTORIA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES					
<div><div></div><div><p>dic 23, 2024 11:01:27 a.m. Colombia Ruta 5003 Apia Viterbo-Asia Frente Apia</p></div></div>						
Descripción: Reunion con profesional social INVIAS, para seguimiento del componente social en el proyecto						
Descripción:Actividades de obra en el frente del municipio de Apia PR 58+800- 58+590						
<div><div><p>17 dic 2024 3:28:44 p. m. Viterbo Altitud:1003.2m</p></div><div><p>14 de diciembre de 2024, 1:15 p.m +5.0700,-75.8621 50 Viterbo</p></div></div>						
Descripción: Comité de los sistemas integrados de gestion -Obra e interventoria)						
Descripción: Punto de atencion al ciudadano ruta 5003 PR 77+100 Puente de Viterbo						

8.86 Registro fílmico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.
