





	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 1 de 8

ACTA No.	4
-----------------	----------

TEMA	Comité No. 4 del contrato No. CO1.PCCNTR.7030654 de 2024.
FECHA	9 de diciembre de 2024.
HORA	2:00 pm.
LUGAR	Secretaría de Servicios Públicos.
MODALIDAD	Semipresencial.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Secretaría de Servicios Públicos – Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ASISTENTES.				
Nombre	Email	Dependencia	Cargo	Firma
Rubén Estrada Gámez (virtual).		Contratista.	Representante Legal.	
Luis Fernando Sabogal.		Secretario de Servicios Públicos.	Supervisor.	
Antonio Rudas Muñoz (virtual)		Contratista.	Coordinador.	
Oscar Espriella.		Contratista.	Apoyo técnico.	
Se anexa lista de asistentes.				

ORDEN DEL DIA.	
No.	TEMA
1.	Presentación de asistentes.
2.	Verificación de cumplimiento de compromisos y cronograma de actividades.
3.	Nuevos compromisos.

DESARROLLO.
<p>1. Presentación de asistentes:</p> <p>En representación de la fundación se encuentran de forma virtual Rubén Estrada, representante Legal de FUVDAMIS, Antonio Rudas Muñoz, coordinador del proyecto; de forma presencial, Oscar Espriella, apoyo técnico del contratista.</p> <p>Por parte del Departamento, asistió el Ingeniero Luis Fernando Sabogal, en calidad de Secretario de Servicios Públicos y supervisor del convenio.</p> <p>2. Verificación de cumplimiento de compromisos y cronograma de actividades.</p> <p>El supervisor indica que se deja constancia de que la visita programada para el 02 de diciembre no fue posible llevarla a cabo, teniendo en cuenta las lluvias presentadas, por lo que fue reprogramada para el 4 de diciembre. La visita de campo, fue realizada con el personal de la fundación el día 4 de</p>

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 2 de 8

diciembre a las 3:30 pm en el sitio donde se está realizando la construcción de macetas, y se pudo evidenciar el inicio de trabajo y materiales requeridos para elaborar las macetas, por lo que se anexa a la presente acta la lista de asistencia de la visita de inspección técnica.

El coordinador del proyecto, Antonio rudas, indicó que la construcción de las macetas no pudo iniciarse el 2 de diciembre como se tenia estipulado, por las constantes lluvias, solo hasta el 4 de diciembre en horas de la mañana, se pudo iniciar; e indica que hace entrega de los diseños de arte en pintura y cerámica, y son entregados en la reunión al supervisor por el ingeniero Espriella; una vez revisados, el supervisor decide aprobar los diseños entregados. el ingeniero Espriella, manifiesta que el día de hoy también se empezaron a hacer los moldes de las artes en cerámica.

A su vez, el representante de **FUVDAMIS**, Rubén Estrada, indica que también se culminó al 100% la actividad de limpieza, poda y embellecimiento de parques, y hace entrega de un informe sobre esta actividad; que se compraron los 45 árboles frutales de acuerdo con las especies escogidas e indica la cantidad de cada uno: yunplon (03), cocotero (30); mango rosa (2); naranja (02), limón (02), aguacate (03); guanábana (02); mamey (01).

El ingeniero Espriella, indica que la siembra de estos árboles se comenzó a realizar desde el mismo día, es decir el 6 de diciembre, con personal de apoyo de la fundación, y que a la fecha se encuentra terminada la siembra de 45 arboles frutales. El supervisor indica que se requiere que la fundación haga un seguimiento al crecimiento y evolución de las plantas antes de su recepción.

El supervisor del convenio indica la necesidad de realizar una visita de campo en el día de hoy, una vez culmine el comité, para verificar la ejecución de la actividad de limpieza y embellecimiento de parques, teniendo en cuenta que la fundación presenta un informe donde se establece que se culminó con dicha actividad. También pregunta si se ha podido avanzar con las macetas, a lo que el ingeniero Espriella indica que se ha avanzado, pero no al ritmo esperado, pues las lluvias han ralentizado las labores de campo. Se suspende el comité a las 3:30 pm para realizar la visita.

Se retoma el comité a las 5:00 pm, el supervisor indica que luego de hacer un recorrido por los parques manawar, Natania y school house, se evidenció que se encuentran ejecutadas las actividades de poda, limpieza y embellecimiento.

Posteriormente, se sintetizaron los avances del convenio con el siguiente porcentaje:

Actividad	% de avance de actividad	% de avance conforme al contrato	Fecha de inicio de actividades
Macetas Artísticas Ecológicas.	20,00%	16,55%	4 de diciembre.
Siembra de frutales.	100,00%	0,36%	6 de diciembre.
Limpieza y Embellecimiento.	100,00%	6,80%	27 de noviembre.
Talleres de educación ambiental.	0,00%	0,00%	NO INICIADA.
Total		23,71%	

Con el análisis anterior, el Coordinador del convenio recalcó los siguientes conceptos:

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 3 de 8

- El inicio de las actividades fue satisfactorio, aunque viéndose afectado por las constantes precipitaciones en la Isla. Por esto, el porcentaje de avance del contrato hasta la fecha de corte de la presente acta, se presenta un avance significativo en la ejecución y logística de las actividades.
- La limpieza y el embellecimiento fue desarrollado en el Parque Scholl House, Parque Manawar y Parque Principal Natania, del cual se obtuvo que los espacios intervenidos muestran mejoras evidentes en limpieza, funcionalidad y estética, acompañado del aumento en el uso y apropiación de los espacios públicos por parte de las comunidades.
- La siembra de frutales fue desarrollado conforme a las consideraciones previstas en la propuesta presentada por **FUVDAMIS**, siendo sembradas la cantidad y especies anteriormente mencionadas.
- El porcentaje de la actividad **"MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS"** corresponde al avance logístico del desarrollo de este ítem, siendo desarrolladas una cantidad esperada de macetas, diseños de estas y compra de insumos que permite el despliegue efectivo del equipo de trabajo en el desarrollo del contrato.

3. Compromisos:

Compromisos	Responsable	Fecha Entrega	Cumplimiento	Comentarios
Visita de sitio de trabajo.	SSSPYMA	4 de diciembre.	Cumplido.	N/A.
Inicio de construcción de macetas.	FUVDAMIS	4 de diciembre.	Cumplido.	N/A.
Entregar los diseños en pintura al supervisor.	FUVDAMIS	9 de diciembre.	Cumplido.	N/A.
Entregar al supervisor los diseños de arte en cerámica.	FUVDAMIS	9 de diciembre.	Cumplido.	N/A.
Ejecución de moldes de arte en cerámica.	FUVDAMIS	9 de diciembre.	En ejecución	N/A.
Compra de 45 árboles frutales.	FUVDAMIS	6 de diciembre.	Cumplido.	Fueron comprados yunplon (03), cocotero (30); mango rosa (2); naranja (02), limón (02), aguacate (03); guanábana (02); mamey (01).
Establecimiento de 45 árboles frutales.	FUVDAMIS	6 al 15 de diciembre.	Cumplido.	La fundación sembró los 45 árboles en los sitios escogidos.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: Veinte (20) de diciembre de 2024, a las 9:00 A.M.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 4 de 8

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: ☒ Si ☐ No ☐ Parcialmente

ANEXOS:

Proyectó:
Revisó:
Archivó:

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 5 de 8

Sitio de construcción de macetas.



Inicio de trabajo y materiales macetas (cenizas RSU, arena de vidrio, cemento, arena de río).




	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 6 de 8



	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 7 de 8

Limpieza y embellecimiento de parques:

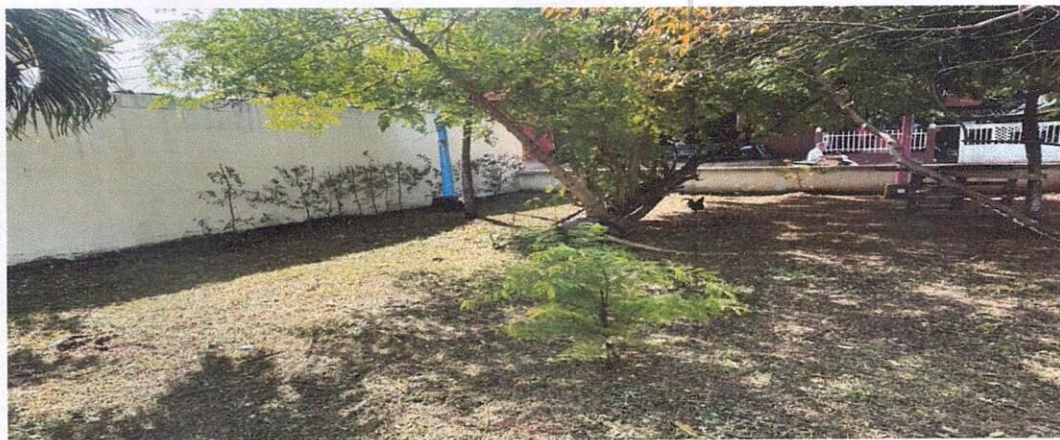

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 8 de 8



ALEN LEONARDO JAY STEPHENS
ARQUITECTO
TARJETA PROFESIONAL No. 76700-67487.

MEZCLA DE PRUEBA 1 CONCRETO 5000 PSI DECORATIVO

		Humedades			
Elemento a fundir		Agregado	ARENA DE VIDRIO SAI	0,00	0,00
Piezas a fundir	1	Peso inicial	650,0	650,0	650,0
Volumen de la pieza	10500 LITROS	Peso final	600,0	650,0	650,0
Volumen de producción	10500 LITROS	% humedad	8,3%	0,0%	0,0%

Item	Pesos corregidos		Verificación M3	Con Compensación 10%
	Cantidad	Unidad		
ARENA DE VIDRIO SAI	17.688,13	kg	10,50	11,6
0	-	kg		
0	-	kg		
Agua	1.367,20	kg		
0	-	gr		
TUF STRAND TXT	73.500,00	gr		
Plastiment R790	28.875,00	gr		
0	-	gr		
CEMENTO ARGOS ART CARTAGENA	5.250,00	kg		
Ceniza SAI	367,50	kg		

CALCULOS VOLUMENES	
LOZA DE FONDO MACETA	
LARGO*ANCHO*ESPESOR	
L	0,7
A	0,7
E	0,1
VOL M3	0,049
MUROS MACETA	
LARGO*ALTURA*ESPESOR	
L	2,8
A	0,9
E	0,05
VOL M3	0,126
VOLUMEN TOTAL M3	0,175
VOLUMEN 60 MACETAS	10,5

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	ACTA DE RECIBO PARCIAL 001	Versión: 00	Página 1 de 1


**EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA.**

CERTIFICA

Que se recibieron conforme al convenio de asociación No. CE-SGE 0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654, cuyo objeto consiste en: *"AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMÁTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"*, suscrito entre el Departamento Archipiélago de San Andrés y la Fundación Vida Digna y Desarrollo Ambientalmente Sostenible- FUV DAMIS, identificada con NIT. 900450733-5, las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR DE ACTIVIDAD	CANTIDAD PACTADA	CANTIDAD ENTREGADA	CUMPLE	NO CUMPLE	PORCENTAJE
1	Limpieza y embellecimiento	\$51.103.800 (contrapartida de Fuvdamis).	3	3	x		100%
2	Siembra de frutales	\$2.729.782	45	45	x		100%

Se firma en San Andrés Islas, a los 9 días del mes de diciembre de 2024.



LUIS FERNANDO SABOGAL ANGULO
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
