

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 de noviembre al 30 de noviembre 2023

**1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1205 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.**

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONVENIO MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 16/08/2023 A LA FECHA
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO
	DESDE EL 29/11/2023 A LA FECHA
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo no. 1205 de 2023, suscrito entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; Las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con las infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO, se asignaron a FINDETER 152 sistemas de abastecimiento de agua para rehabilitación, concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 40.219 aproximadamente

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023	Total
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000	\$ 32.097.000.000
Totales	\$ 32.097.000.000	\$ 32.097.000.000
%Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 510990146
Nombre Entidad Bancaria:	Banco Davivienda
Titular de la cuenta:	Financiera de desarrollo Territorial S.A -FINDETER

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.3. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

A la fecha no se han presentado desembolsos por parte del Ministerio.

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, DESEMBOLSOS				

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre de 2023 y paralelo a la revisión de la lista de chequeo para la radicación de la cuenta de cobro del contratista, se tramitó la marcación de exención de gravámenes ante el Ministerio de Hacienda, dicho proceso se encuentra en trámite.

Adicionalmente, el 30 de noviembre de 2023 se radico ante la subdirección de finanzas y presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cuenta de cobro n° FDTC-1209, por un valor de \$18.000.000.000, por concepto de:

"En virtud de lo estipulado en el Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, que establece en su cláusula SÉPTIMA: RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACIÓN por la suma de TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.097.000.000), de los cuales se solicita DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000,000) según disponibilidad de PAC del MINISTERIO, cuyo recurso aportado se respalda con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el MINISTERIO:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	18.000.000.000	13.508.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	18.000.000.000	13.508.764.706

Dicho documento se encuentra en trámite de revisión por el área competente para el desembolso, en el marco de contrato interadministrativo.

5 RESUMEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS.	0.0%**

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	0.0%**
---	--	--------

** Durante el mes de noviembre se iniciaron visitas de entrada a las comunidades priorizadas y asignadas por el MVCT para socialización del alcance del aseguramiento, diagnóstico y rehabilitación; el avance esta supeditado a la entrega de la información por parte de FINDETER.

6 Conclusiones y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Introducción En mi calidad de supervisor del Convenio de Cooperación Internacional N° 1205 de 2023 celebrado entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER., con el objeto de: <i>“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.”</i>, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 2023. 2. Avances mes de noviembre de 2023 El 01 de noviembre y en atención a la Cláusula tercera del Contrato, del ítem 3.2 “Obligaciones específicas de Findeter”, numeral 7 en el que se establece solicitar la no objeción del ministerio frente a los términos de referencia, se recibe correo electrónico por parte del FINDETER de solicitud de no objeción en los estudios previos para la celebración del convenio solidario cuyo objeto consiste en “Realizar intervenciones en la infraestructura para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en atención de la sentencia T-302-2017 en el departamento de La Guajira - Grupo 6” para el contratista Consorcio Construir Guajira. (ANEXO 1) El 01 y 09 de noviembre, se suscriben las actas de inicio de los contratistas derivados de FINDETER con su respectiva interventoría, dando cumplimiento al numeral 3 del ítem 3.2 “Obligaciones específicas de Findeter” de la cláusula tercera

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

en el cual se estipula adelantar las actividades y tramites precontractuales y **contractuales** a que haya lugar para los procesos de selección y **contratación que se requieran para ejecutar el objeto del contrato:** (ANEXO 2)

Numero de Contrato	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO (MESES)	FECHA ACTA DE INICIO
002-2023	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES TERRITORIO ÉTNICO WAYUU	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.000.000.000,00	4	09/11/2023
003-2023	ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	3.000.000.000,00	4	01/11/2023
004-2023	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.200.000.000,00	4	01/11/2023
005-2023	LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO	"REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 5"	2.200.000.000,00	4	09/11/2023
001-2023	CONSORCIO HIDROGUAJIRA	REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 1	5.000.000.000,00	5	01/11/2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

006-2023	LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON LOS CUALES SE REALIZARÁN INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"	3.695.962.610,00	8	01/11/2023
-----------------	--	--	------------------	---	------------

El 06 de noviembre: Se emite observaciones al primer informe emitido por FINDETER mediante comunicado No. 2023EE0100198 del 27 de octubre de 2023 en atención a la Cláusula tercera del Contrato, del ítem 3.2 "Obligaciones específicas de Findeter", numeral 6 en el que se establece enviar al supervisor del MINISTERIO: (i) un informe mensual que contenga el avance de cada uno de los proyectos, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente al que se reporta. (ANEXO 3)

El 17 y 23 de noviembre y en atención a la cláusula tercera del contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales de FINDETER", numeral 1 en el que se establece participar y apoyar al Ministerio en todas las reuniones relacionadas con la ejecución del contrato, se realiza comité de seguimiento a cronogramas presentados para conocer el estado los diagnósticos que se debían realizar hasta la fecha. En estos se le hizo las observaciones pertinentes frente al desarrollo de las actividades que, estando estipuladas en el plan de acción, debían estar realizando.

Se presentan a continuación las gestiones realizadas para el desarrollo del contrato Interadministrativo 1205 de 2023, en relación con los comités de seguimiento (Anexo 4):

FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
17/11/23	- Carlos Alfonso Vargas Muñoz - Eladia Beatriz Jiménez Medina - Aura Gisella Ospino Rico - Alcides José Escobar Pimienta - Henry Andres Gañan Lopez - Xiomara Alexandra Almanza - Allan Alvarado Ruiz - Jose Agustín Parodi Martinez	- Enviar los cronogramas. - Realizar las respectivas correcciones en el componente de aseguramiento y enviar la programación específica de la siguiente semana. - Revisar con el equipo de recursos humanos de Findeter en que va el proceso de contratación de personal. - Definir el proceso de contratación de los contratistas faltantes. - Dar respuesta a Findeter acerca de la destinación total de los rubros totales para avanzar en la contratación.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27


	- Giovanni José Zuñiga Sotillo	- Confirmar por correo electrónico las asociaciones que arrancan el día lunes con su programación específica. - Dar respuesta acerca de los recursos destinados a Findeter los cuales a la fecha aún no se ha recibido y la seguridad del trámite antes de que acabe noviembre. - Enviar por correo electrónico de manera oficial la reasignación de los puntos establecidos a las asociaciones. - Revisar e implementar opciones de mejora en la ejecución de las actividades del Consorcio Hidroguajira. - Revisar los proveedores para tenerlos seleccionados al momento de iniciar las rehabilitaciones.	
23/11/23	- Carlos Alfonso Vargas Muñoz - Eladia Beatriz Jiménez Medina - Diana Marcela Medina Henao - Jaher Enrique Mendoza Tirado - Ismeira Fince Lopez - Henry Andres Gañan Lopez - Xiomara Alexandra Almanza - Allam Alvarado Ruiz - Jose Agustín Parodi Martinez - Giovanni José Zuñiga Sotillo	- Enviar los cronogramas con las respectivas correcciones en el componente de aseguramiento - Enviar formato de avance semanal. - Ficha de resumen de las comunidades Makú y Camino verde. - Cuadro de trazabilidad de la contratación. - Revisión de las actividades de rehabilitación menores con las asociaciones y/o consorcio. - Revisar tema de vallas y pendones y presentar propuesta. Solicitar pendones a las asociaciones - Coordinar los laboratorios de cada una de las asociaciones, para identificar plazos y disponibilidad. - Verificación de precios Laboratorio. - Reunión de revisión al cuadro de avances	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL No. 001 17 de noviembre del 2023	Código: MC-FO-18 Versión: 7 Fecha de Aprobación: 23-Nov-2021 Clasificación: Clasificada de acceso restringido
--	---	--

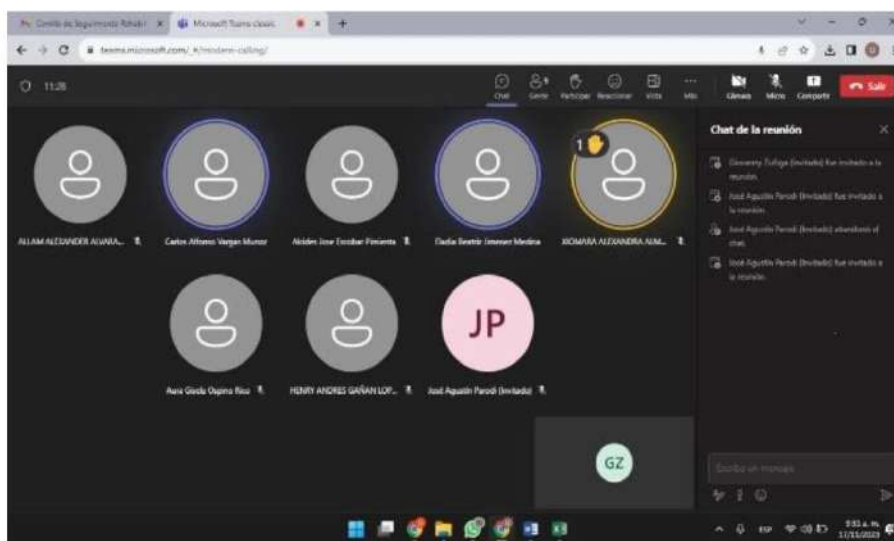

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL No. 002 23 de noviembre del 2023	Código: MC-FO-18 Versión: 7 Fecha de Aprobación: 23-Nov-2021 Clasificación: Clasificada de acceso restringido
--	---	--

**Las firmas y asistencias del presente comité están sustentadas en la captura de pantalla de la reunión realizada de manera virtual adjuntada a continuación.*

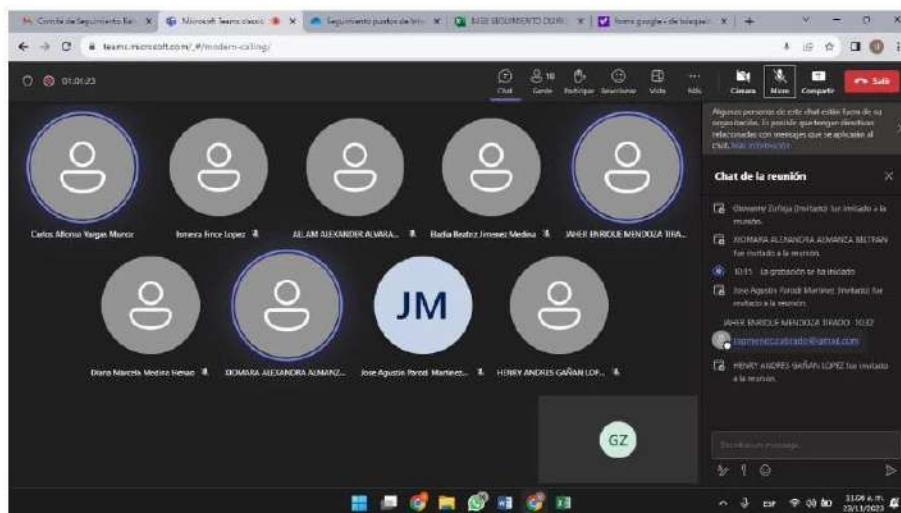

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Asociación de trabajadores independientes sol guajiro

CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	OBSERVACIÓN
FINDETER	2,55%	2,07%	Se evidencia un retraso del 0,48%

- Asociación de autoridades tradicionales territorio Étnico Wayuu

ITEM	DESCRIPCION	Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4					
		2011/02/22	2011/03/01	2011/03/08	2011/03/15	2011/03/22	2011/03/29	2011/04/05	2011/04/12	2011/04/19	2011/04/26	2011/05/03	2011/05/10	2011/05/17	2011/05/24	2011/05/31	2011/06/07	2011/06/14	2011/06/21	2011/06/28					
1	COMUNIDAD PANCHO GRANDE - COTO FLOR DEL PARAISO																								
1.1	Asamblea Social																								
1.1.1	Primer acercamiento a la comunidad																								
1.1.2	Recorrido de caminos																								
1.1.3	Censo comunal																								
1.1.4	Entrevista a los miembros de la comunidad																								
1.2	Diagnostico ambiental																								
1.2.1	Visualización del patrimonio cultural del sitio																								
1.2.2	Recorrido industrial a los alrededores																								
1.2.3	Entrevista con los actores de la comunidad																								
1.2.4	Recorrido de los alrededores del sitio																								
1.2.5	Topografía y estudio de suelos																								
1.2.6	Mapa de la zona																								
1.2.7	Entrevista a los actores																								
1.2.8	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.9	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.10	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.11	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.12	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.13	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.14	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.15	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.16	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.17	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.18	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.19	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.20	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.21	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.22	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.23	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.24	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.25	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.26	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.27	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.28	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.29	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
1.2.30	Entrevista de los actores de la comunidad para diagnóstico																								
2	COMUNIDAD WONGORORO - COTO CASTILLETES																								
2.1	Asamblea Social																								
2.1.1	Primer acercamiento a la comunidad																								
2.1.2	Recorrido de caminos																								
2.1.3	Censo comunal																								

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

[illegible][illegible][illegible]

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

En las fechas establecidas en el siguiente cuadro y con el objetivo de dar cumplimiento al alcance del contrato y como parte de la etapa de adelantar las actividades y tramites precontractuales y contractuales a que haya lugar para los procesos de selección y contratación que se requieran para ejecutar el objeto del contrato, establecidas en el numeral 3 del ítems 3.2 "Obligaciones específicas de Findeter" de la cláusula tercera, se presenta las visitas de entrada social, aseguramiento y diagnóstico para el desarrollo del contrato Interadministrativo 1205 de 2023, en relación con el proceso de acercamiento social y técnico a las comunidades priorizadas y asignadas por el Ministerio a FINDETER:

Comunidades visitadas para Socialización de Diagnóstico y Rehabilitaciones.

MUNICIPIO	CONTRATISTA	COMUNIDAD	FECHA VISITA SOCIAL, ASEGURAMIENTO, DIAGNOSTICO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA
Manaure	Sukuaipa	Paraíso	09/11/2023	Molino de viento
Manaure	Sukuaipa	Eirratamano	09/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Amatunau	09/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Aishimana	10/11/2023	Pozo
Manaure	Consorcio Hidroguajira	Icipa	10/11/2023	Molino de viento
Manaure	Sukuaipa	Perrakat	10/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Kawayance	10/11/2023	Molino de viento
Maicao	Consorcio Hidroguajira	Ceura Zoila	10/11/2023	Pozo - Molino - Microacueducto
Maicao	Consorcio Hidroguajira	Loma Fresca	14/11/2023	Pozo Artesanal
Maicao	Consorcio Hidroguajira	Iramasira	14/11/2023	Molino de Viento
Maicao	Consorcio Hidroguajira	Maku	15/11/2023	Molino - Potabilizadora
Manaure	Sukuaipa	Playon	15/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Masheishaka	15/11/2023	Pozo artesanal
Manaure	Sukuaipa	Kanaan	15/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Ahulalia	15/11/2023	Pozo
Manaure	Sukuaipa	Maniature	16/11/2023	Molinos
Manaure	Sukuaipa	Cojemana	16/11/2023	Molino
Manaure	Sukuaipa	Perraka (Sector Pancho)	16/11/2023	Pozo
Uribia	Araurayu	Paraíso	18/11/2023	Microacueducto
Uribia	Araurayu	Aiparao, Pozo	18/11/2023	Pozo
Uribia	Araurayu	Kaipawou	18/11/2023	Pozo
Uribia	Araurayu	Monterey (2)	19/11/2023	Pozo

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Uribia	Araurayu	Chiriguana - Jiruwalanai	19/11/2023	Pozo artesanal Pozo + Molino Molino de viento
Uribia	Araurayu	Urruachi - Meesou	19/11/2023	Pozo
Uribia	Araurayu	Wararalapu	19/11/2023	Pozo
Maicao	Consortio Hidroguajira	Maicaito	20/11/2023	Pozo profundo - con tubería
Maicao	Consortio Hidroguajira	San Felipe I / Rafael	20/11/2023	Pozo
Uribia	Sol Guajiro	Juyapararen - Ishinchon	20/11/2023	Molino de viento con una PTAP y paneles solares
Uribia	Sol Guajiro	Villa Lourdes Camino Verde	20/11/2023	Acueducto con planta desalinizadora - molino
Uribia	Étnico Wayúu	Rancho Grande	20/11/2023	Pozo
Uribia	Étnico Wayúu	Wososopo	20/11/2023	Molino de viento
Uribia	Étnico Wayúu	Mashuramana	20/11/2023	Molino de viento
Uribia	Étnico Wayúu	Ayutpana	20/11/2023	Molino
Maicao	Consortio Hidroguajira	Ceura Miraflores	20/11/2023	pozo
Maicao	Consortio Hidroguajira	Guayabita	21/11/2023	Molino de Viento
Maicao	Consortio Hidroguajira	Merratush	21/11/2023	Pozo con bomba sumergible
Uribia	Sol Guajiro	Merrachon	21/11/2023	Pozo artesanal
Uribia	Sol Guajiro	Capernaum	21/11/2023	Pozo artesanal
Uribia	Étnico Wayúu	Barranca	21/11/2023	Molino de viento
Uribia	Étnico Wayúu	Chorroluu	21/11/2023	Reservorio
Uribia	Étnico Wayúu	Julatshi	21/11/2023	Pozo artesanal
Uribia	Étnico Wayúu	Kalajaliipa	21/11/2023	Pozo artesanal
Riohacha	Consortio Hidroguajira	Pesua Alcaldía	22/11/2023	Pozo artesanal - bomba
Riohacha	Consortio Hidroguajira	La Isla (Manamon) Matilde	22/11/2023	Pozo
Riohacha	Consortio Hidroguajira	Alewa Los Monos Irama	22/11/2023	Pozos artesanal - Microacueducto
Riohacha	Consortio Hidroguajira	Esperanza	23/11/2023	Molino de viento, con pozo
Manaure	Consortio Hidroguajira	Totoopana Angel	23/11/2023	Molino de viento - Microacueducto
Uribia	Sol Guajiro	Samutshirra	23/11/2023	Molino de viento con pozo artesanal
Uribia	Sol Guajiro	Namunashito	23/11/2023	Pozo artesanal
Riohacha	Consortio Hidroguajira	Buenavista Irama	23/11/2023	Pozo
Maicao	Consortio Hidroguajira	Botoncho 2	27/11/2023	Molino de viento
Uribia	Consortio Hidroguajira	Zapatamana	27/11/2023	Molino

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Maicao	Consortio Hidroguajira	Toromana Corte	28/11/2023	Pozo profundo
Uribia	Sol Guajiro	Kotoirra	29/11/2023	Pozo
Uribia	Sol Guajiro	Taiwachon,	29/11/2023	Molino de viento
Uribia	Sol Guajiro	Casiporchi	29/11/2023	Pozo
Manaure	Consortio Hidroguajira	Katshuanarak	29/11/2023	Molino de viento

Conforme a las visitas realizadas referidas en la tabla, se concluye la satisfacción de las comunidades en el acercamiento realizado por Findeter, contratistas derivados e interventoría con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda en aras de la socialización del inicio de las actividades de diagnóstico, aseguramiento y rehabilitaciones.

A continuación, se incluye registro fotográfico de las visitas de entrada social e inicio de diagnóstico.



Foto 1: 27/11/23 (Capernaum), panorama de visitas de entrada social a comunidades por parte de FINDETER, Contratistas Derivados, Interventoría y MVCT



Foto 2: 24/11/23 (Chorrosi), panorama de visitas de entrada social a comunidades por parte de FINDETER, Contratistas Derivados, Interventoría y MVCT

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

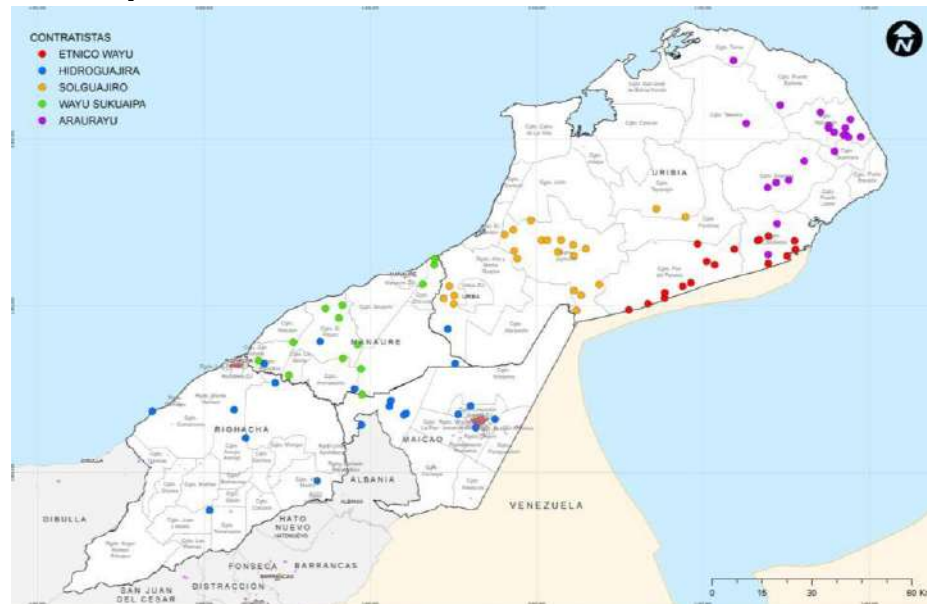


Foto 3: 30/11/23 (Wososopo), trabajos de actividades técnicas para el diagnóstico de las infraestructuras



Foto 4: 30/11/23 (Buena Vista), trabajos de actividades técnicas para el diagnóstico de las infraestructuras

Mapa de Localización de las 93 Infraestructuras



El 30 de noviembre de 2023 y en atención a la cláusula séptima “Recursos objeto de Administración”, FINETER hace requerimiento y se emite al Ministerio de Hacienda todos los soportes para el primer desembolso por un monto de \$18.000.000.000 para continuar con las actividades con base a los recursos disponibles de \$30.000.000.000 objeto de la contratación con base a las actividades en proceso de ejecución por parte de los contratistas derivados. (ANEXO 6):

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

3. Pendientes de la Supervisión para el mes de diciembre del año 2023

Se continuará por parte de los contratistas derivados de FINDETER con las 36 visitas faltantes de entrada de socialización y aseguramiento, como también las actividades de diagnóstico social y actividades de diagnóstico técnico como caracterizaciones de agua y pruebas de bombeo según se estipula los cronogramas de actividades presentados por los contratistas derivados.

Se continuará por parte de FINDETER, con los procesos precontractuales y contractuales de las empresas privadas: Milenial S.A.S, J.P.M. ingeniería y Jose Luis Suaza, con el fin de continuar los diagnósticos de pozos y molinos priorizados por parte del Ministerio de Vivienda, que garanticen el cumplimiento del alcance del presente Contrato Interadministrativo.

Se continuará con los comités de seguimiento con FINDETER y su interventoría como control de las actividades de diagnóstico en ejecución.

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante este periodo y acorde al apoyo a la supervisión técnica no se presentaron alertas o situaciones jurídicas que deban emprender el cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco de la supervisión.

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.

No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular.

RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1540 de 2023		
1	Aportes Nación - MVCT	\$ 32.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$ 0
3	Saldo de Aportes (1-2)	\$ 32.097.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 0
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 32.097.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información de los numerales 1,2 y 3 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT.

La información de los numerales 4 y 5 fue tomada de los datos financieros especificada en los Estudios Previos del Contrato con FINDETER con corte a 30 de noviembre de 2023.



DIANA MARCELA MEDINA HENAO

Supervisor

Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico 

VoBo. Jaher Mendoza – Profesional de Apoyo Social *Jaher Mendoza*

VoBo. Carolina Bello- Profesional de Apoyo Financiero  _____
