

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de abril 2024

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
------------------------------	---

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	DESDE EL 15/08/2023 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO
	DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023	Total
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000	\$ 15.000.000.000
Estos recursos se encuentran discriminados de la siguiente manera:		
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema;

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL, DESEMBOLSOS				\$24.528.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación <u>(1+2)</u>	\$26.408.000.000

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000
----------	---	--------------------------

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Si No 3 del 14 de julio de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)**6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
14 DE JULIO DE 2023**

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/202	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
26 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

**6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
29 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS.	5,39%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	0,65%

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Durante el mes de abril se tuvieron los siguientes avances:

Los contratistas Araurayu, Étnico, Sol Guajiro, Hidroguajira y Sukuaipa no continuaron con las visitas de reconocimiento y validación hasta tanto no presenten las 21 propuestas económicas, incluyendo los diagnósticos. Por otra parte, el contratista José Luis Suaza da inicio con las visitas a sus comunidades asignadas.

Se ajustó la metodología del porcentaje de avance, incluyendo el total de las 191 rehabilitaciones estipuladas en los documentos contractuales ``estudios previos`` y Otro Sí No. 3 (anexo 4)

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024

8.1 Introducción

En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: *“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2024.

8.2 Avances mes de abril de 2024 (Anexo 3)

En el marco de las obligaciones de Findeter y el MVCT para el mes de abril, realizaron las actividades que se describen a continuación de manera cronológica:

- El 04 de abril de 2024 se lleva a cabo el comité de aprobación No. 3 en el cual se presentan los proyectos de las siguientes comunidades:

1. JUYAPAREN – ICHINCHON (Sol Guajiro)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

CCOM-FO-001 V16 / 15-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 003 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023		JUYAPAREN (ICHICHON)		
PRESUPUESTO		CRONOGRAMA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	FINAL
OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO	\$ 3.667.112,64	4	01/04/2024	04/04/2024
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA CRUDA.	\$ 9.283.628,00	2	05/04/2024	06/04/2024
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 33.630.850,00	9	09/04/2024	17/04/2024
SUMISTRO DE INSUMOS DE OPERACIÓN	\$ 8.867.800,00	2	16/04/2024	17/04/2024
COMPONENTE ELECTRICO	\$ 38.069.462,50	4	05/04/2024	09/04/2024
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 93.518.853	19	01/04/2024	17/04/2024
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.870.377			
TOTAL PROPUESTA	\$ 95.389.230			

19 DÍAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

2. **RANCHO GRANDE (Asociación Étnico Wayuu)**

CCOM-FO-001 V16 / 15-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 003 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023		RANCHO GRANDE		
PRESUPUESTO		CRONOGRAMA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	FINAL
PREELIMINARES	\$ 972.486	1	01/04/2024	02/04/2024
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 18.094.848	14	03/04/2024	16/04/2024
PLACA PARA TANQUES	\$ 9.186.033	9	19/04/2024	30/04/2024
ESTRUCTURAS METALICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.284.188	5	16/04/2024	20/04/2024
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 164.613.093	14	26/04/2024	09/05/2024
COMPONENTE ELECTRICO	\$ 49.903.021	4	22/04/2024	25/04/2024
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 22.084.287	8	16/04/2024	23/04/2024
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 273.201.831	39	01/04/2024	09/05/2024
IMPREVISTOS 2%	\$ 5.464.036			
TOTAL PROPUESTA	\$ 278.665.867			

39 DÍAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

- Sin objeciones ni preguntas adicionales, queda consignado en la presente acta la aprobación del presupuesto y la propuesta de rehabilitación para la intervención en la comunidad de **Juyaparen (Ichichon)**, presupuestada en **NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA**

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

PESOS MCTE (\$95.389.230) y con una ejecución estimada de aproximadamente 19 días calendario. El Ministerio respalda y aprueba esta decisión.

- De la misma forma, sin objeciones ni preguntas adicionales, se consigna en el acta actual la aprobación del presupuesto para la intervención en la comunidad de **Rancho Grande**, valorada en **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$278.665.867)** y con una ejecución estimada de aproximadamente 39 días calendario. El Ministerio respalda y aprueba esta decisión.
- El 27 de abril de 2024 se lleva a cabo el comité de aprobación No. 4 en el cual se presentan los proyectos de las siguientes comunidades:

1. **IRRAMASHIRA (Consorcio Hidroguajira)**

CCOM-FC-001 Y16 / 16-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

IRRAMASHIRA

PROPUESTA

SISTEMA DE TRATAMIENTO
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 15 m3/día

GENERACIÓN ENERGÉTICA
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts

ALMACENAMIENTO
1 Tanque 10000Lts en PVC para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC para agua tratada

SISTEMA DE ADUCCIÓN
Molino de viento

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 972.486	2
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.213.257,51	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 5.246.741,83	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.083.454,50	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 127.758.537,62	32
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 53.357.488,12	14
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 19.224.781,77	7
TOTAL, PROPUESTA	\$ 310.010.908	42

42 DIAS DE EJECUCIÓN

Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

2. **LOMA FRESCA (Consorcio Hidroguajira)**

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE
REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023**

LOMA FRESCA

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 15 m3/día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 460Watts
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 5000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 10000Lts en Fibra.
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Bomba sumergible
Caudal de 0,34 Lts/seg

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DÍAS)
PRELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 19.258.327,35	7
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.255.869,40	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 5.830.947,90	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.086.131,04	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 128.326.088,90	32
COMPONENTE ELECTRICO	\$ 51.544.707,42	14
TOTAL PROPUESTA	\$ 309.242.418	42

42 DÍAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

3. MERRATUSH (Consortio Hidroguajira)

**COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE
REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023**

MERRATUSH

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 34 m3/Día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts
52 kVA de capacidad de producción energética.
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 10000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 10000Lts en PVC.
para agua tratada
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Bomba sumergible tipo lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.613.650,53	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 5.995.792,08	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.161.074,31	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 174.924.847,28	32
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 49.907.693,82	14
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 20.197.100,29	7
TOTAL, PROPUESTA	\$ 370.619.892	42

42 DÍAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

4. SAN FELIPE (Consortio Hidroguajira)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

SAN FELIPE

PROPUESTA



SISTEMA DE TRATAMIENTO
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 50 m3/día



GENERACIÓN ENERGÉTICA
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts



ALMACENAMIENTO
1 Tanque 10000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC.
para agua tratada



SISTEMA DE ADUCCIÓN
Bomba sumergible tipo lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.732.320,37	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 6.049.736,90	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.193.185,78	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 180.153.620,28	32
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 50.073.662,82	14
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 20.505.264,92	7
TOTAL, PROPUESTA	\$ 378.417.967	42

42 DIAS DE EJECUCIÓN

Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

5.

MAICAITO (Consorcio Hidroguajira)

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MAICAITO

PROPUESTA



SISTEMA DE TRATAMIENTO
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 60 m3/día



GENERACIÓN ENERGÉTICA
Sistema fotovoltaico directo
22 paneles de 550Watts



ALMACENAMIENTO
2 Tanque 10000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 10000Lts en PVC.



SISTEMA DE ADUCCIÓN
Bomba sumergible
Caudal de 1,5 Lts/seg

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DÍAS)
PREELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 22.349.594,46	7
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.533.005,50	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 9.114.317,13	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.903.731,04	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 201.537.145,28	32
COMPONENTE ELECTRICO	\$ 53.982.410,32	14
TOTAL PROPUESTA	\$ 418.958.352	44

44 DIAS DE EJECUCIÓN

Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

6. **MAKU (Consorcio Hidroguajira)**

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

CCOM-FO-001 V16 / 15-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

MAKÚ

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 20 m3/Día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts.
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 10000Lts en PVC para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC. para agua tratada
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Bomba sumergible tipo lapicero

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17.215.175,49	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 5.825.901,65	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.083.836,86	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 144.340.699,02	32
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 53.362.582,12	14
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 19.229.580,28	7
TOTAL PROPUESTA	\$ 332.679.946	42

42 DIAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

7. ICIPA (Consortio Hidroguajira)

CCOM-FO-001 V16 / 15-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

ICIPA

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 15 m3/Día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts.
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 10000Lts en PVC para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC. para agua tratada
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Molino de viento

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 972.486,98	2
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 16.900.625,90	12
PLACA PARA TANQUES	\$ 5.131.657,03	8
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.021.129,23	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 127.266.799,42	32
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 52.527.166,122	14
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 18.444.093,49	7
TOTAL PROPUESTA	\$ 306.588.425	42

42 DIAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

8. WOSOSOPO (Asociación Étnico Wayuu)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

WOSOSOPO

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 30 m3/Día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts.
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 10000Lts en PVC para agua
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Bomba sumergible Tipo Lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 636.189,00	1
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 18.431.391,29	17
PLACA PARA TANQUES	\$ 6.359.215,56	9
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.334.841,60	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 180.769.921,78	14
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 50.073.603,02	4
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 22.266.753,39	8
TOTAL PROPUESTA	\$ 295.669.354	39

39 DIAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

9. BARRANCA (Asociación Étnico Wayuu)

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

BARRANCAS

PROPUESTA

- SISTEMA DE TRATAMIENTO**
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 20 m3/Día
- GENERACIÓN ENERGÉTICA**
Sistema fotovoltaico directo
18 paneles de 565Watts.
- ALMACENAMIENTO**
1 Tanque 10000Lts en PVC para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC. para agua tratada
- SISTEMA DE ADUCCIÓN**
Bomba sumergible tipo lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 636.189,00	1
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 19.507.635,37	17
PLACA PARA TANQUES	\$ 6.834.123,79	9
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 11.550.749,58	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 144.278.981,28	14
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 50.819.640,62	4
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 24.652.909,63	8
TOTAL PROPUESTA	\$ 263.445.834	39

39 DIAS DE EJECUCIÓN
Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

10. KAIPAWOU (Asociación Wayuu Araurayu)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

KAIPAWOU

PROPUESTA



SISTEMA DE TRATAMIENTO
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 16 m3/Día



GENERACIÓN ENERGÉTICA
Sistema fotovoltaico directo
13 paneles de 545Watts.



ALMACENAMIENTO
2 Tanques 5000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC.
para agua tratada



SISTEMA DE ADUCCIÓN
Bomba sumergible tipo lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 558.129,00	1
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 22.115.690,00	18
PLACA PARA TANQUES	\$ 12.242.580,00	10
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 8.724.339,00	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 131.982.496,00	14
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 46.612.583,00	4
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 27.929.976,00	8
TOTAL PROPUESTA	\$ 258.148.916	41

41 DIAS DE EJECUCIÓN

Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

11.

AIPARAO (Asociación Wayuu Araurayu)

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

AIPARAO

PROPUESTA



SISTEMA DE TRATAMIENTO
Planta de Osmosis Inversa
Capacidad: 16 m3/Día



GENERACIÓN ENERGÉTICA
Sistema fotovoltaico directo
13 paneles de 545Watts.



ALMACENAMIENTO
2 Tanques 5000Lts en PVC
para agua cruda
1 tanque de 5000Lts en PVC.
para agua tratada



SISTEMA DE ADUCCIÓN
Bomba sumergible tipo lapicero

DOTACIÓN: 20 Lts hab/día Agua potable
6 horas de operación de la planta

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	TIEMPO
PRELIMINARES	\$ 558.129,00	1
CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 22.264.812,00	18
PLACA PARA TANQUES	\$ 12.323.851,00	10
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PANELES SOLARES	\$ 8.740.212,00	5
COMPONENTE HIDRAULICO	\$ 132.526.921,00	14
COMPONENTE ELÉCTRICO	\$ 48.990.182,00	4
CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 28.194.306,00	8
TOTAL PROPUESTA	\$ 261.652.188	41

41 DIAS DE EJECUCIÓN

Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades

Decisión:

- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Irramashira**), valuada en \$310.010.908 pesos, con un tiempo de ejecución de 42 días, ha sido aprobada en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.
- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Loma fresca**), valuada en \$309.242.418 pesos, con un tiempo de ejecución de 42 días, ha sido

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

aprobada en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.

- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Merratush**), valuada en \$370.619.892 pesos, con un tiempo de ejecución de 42 días, ha sido aprobada en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.
- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Maicaito**), valuada en \$418.958.352 pesos, con un tiempo de ejecución de 44 días, ha sido aprobada en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.
- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Maku**), valuada en \$332.679.946 pesos, con un tiempo de ejecución de 42 días, ha sido aprobada en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.
- MVCT ha declarado que la propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Icipa**), valuada en \$306.588.425 pesos, con un tiempo de ejecución de 42 días, ha sido **aprobada** en comité. Tanto MVCT como Findeter han confirmado que no tienen ninguna objeción al respecto.

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter

BOLSA DE CONSUMO

HIDROGUAJIRA	VALOR TOTAL	\$ 5.000.000.000,00
	COSTO DIRECTO	\$ 3.787.878.788
	AIU 32%	\$ 1.212.121.212

DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS EJECUTADAS	\$ 504.870.226,1
REHABILITACIONES AVALADAS	\$ 3.203.003.639
TOTAL USADO COSTO TOTAL	\$ 3.807.873.865
DISPONIBLE COSTO TOTAL	\$ 1.192.126.135

- MVCT y Findeter sin objeciones ni preguntas, aprueban en el acta en curso las dos comunidades de la asociación Étnico Wayuu.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- La propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Wososopo**), valuada en \$295.669.354 pesos, con un trámite de ejecución de 39 días.
- La propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Barranca**), valuada en \$263.445.834 pesos, con un trámite de ejecución de 39 días.

CCOM-FO-001 V16 / 15-Dic-2022 / Clasificada

COMITÉ DE APROBACIÓN 004 DE PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN – CI 1205 - 2023

Findeter
Banco de Desarrollo Tecnológico

BOLSA DE CONSUMO

ETNICO WAYUU	VALOR TOTAL	\$ 2.000.000.000,00
	COSTO DIRECTO	\$ 1.560.000.000,00
	ADMINISTRACION	\$ 440.000.000,00

DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS EJECUTADAS	\$ 163.633.431
REHABILITACIONES AVALADAS	\$ 837.781.056
TOTAL USADO COSTO DIRECTO	\$1.001.414.487
DISPONIBLE COSTO DIRECTO	\$ 558.585.513

MVCT y Findeter sin objeciones ni preguntas, aprueban en el acta en curso las dos comunidades de la asociación Wayuu Araurayu.

- La propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Kaipawou**), valuada en \$258.148.916 pesos, con un trámite de ejecución de 41 días.
- La propuesta de rehabilitación para la comunidad de **Aiparao**), valuada en \$261.652.188 pesos, con un trámite de ejecución de 39 días.

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	VALOR PROPUESTA OBRA CIVIL
SOL GUAJIRO	Juyapararen Ichichon	Uribia	\$ 95.389.230,00
ÉTNICO	Rancho Grande	Uribia	\$ 316.704.620,92
ÉTNICO	Barranca	Uribia	\$ 263.445.834,00
ÉTNICO	Wososopo	Uribia	\$ 313.035.946,42
HIDROGUAJIRA	maicaito	Maicao	\$ 440.326.611,00
HIDROGUAJIRA	Icipa	Manaure	\$ 330.463.457,72
HIDROGUAJIRA	maku	Maicao	\$ 347.277.309,88
HIDROGUAJIRA	Irramashira	Maicao	\$ 310.010.908,00
HIDROGUAJIRA	Loma Fresca	Maicao	\$ 309.242.418,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

HIDROGUAJIRA	merratush	Maicao	\$	370.619.892,00
ARAURAYU	Aiparao	Uribia	\$	261.652.188,00
ARAURAYU	Kaipawou	Uribia	\$	258.148.916,00

Porcentaje de avance por contratistas y total: PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	9,70%
SOL GUAJIRO	10,50%
ÉTNICO WAYUU	7,50%
HIDROGUAJIRA	11,10%
SUKUAIPA	12,10%
JOSE LUIS SUAZA	5,60%
CONSTRUIR GUAJIRA	5,90%
TOTAL CONVENIO	6,04%

Gestión Social

- El 01 de abril de 2024, se empezó a la socialización sobre la rehabilitación del sistema de agua de la comunidad de Villa Lourdes – Camino Verde, en la zona rural del municipio de Uribia. En esta comunidad no está funcionando el sistema desde una semana atrás por un daño eléctrico. Se informa sobre los trabajos que se realizarán en materia de tratamiento para que tengan agua potable, se presentan resultados del diagnóstico (prueba de bombeo y análisis de calidad de agua).

En la socialización participaron las autoridades tradiciones y ancestrales de las comunidades beneficiarias del sistema de Camino Verde. Nota: Al llegar a la comunidad nos informaron que el sistema no está funcionando desde hace una semana por un daño eléctrico. Asistieron: - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Equipo territorial de La Guajira - Findeter - Interventoría - Contratistas Sol Guajiro a) Se les realizó un contexto desde los inicios del proyecto a los miembros de las comunidades b) Se les informó que su sistema a rehabilitar producirá agua potable para las comunidades. c) La rehabilitación hace parte de las acciones aprobadas en el marco de la Sentencia T-302. d) Se presentaron los resultados del diagnóstico (prueba de bombeo y análisis de calidad de agua) y con base a ellos las decisiones técnicas que se tomaron e) Presentación de las fases de la rehabilitación del sistema dando inicio con la socialización Comentarios de la comunidad - “Nos sentimos felices porque nos escucharon, como líderes de la sentencia llevaba años dando a conocer la problemática de nuestro sistema y por fin una puerta se abrió y fue con este gobierno del cambio” Miembro de la comunidad - ¿Cuándo terminan la obra? -

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Si se necesita un apoyo en mano de obra de la comunidad estamos dispuestos ayudar - La garantía de los equipos quién los cubre - Que nos enseñen a operar los nuevos equipos,

El 6 de abril de 2024

- Socialización de inicio de obra a la comunidad de Isichonkat

En compañía de Findeter, la Interventoría y el contratista Sol Guajiro, se inició la socialización de las obras para rehabilitar el sistema del molino de viento ante los miembros de la comunidad. Se presentó el paso a paso de la propuesta técnica de la rehabilitación en donde se indicó como tendría que ser el cambio de piezas del molino y el montaje de las baterías para la recarga de los paneles solares. Luego se presentaron las siguientes líneas a) Se les realizó un contexto desde los inicios del proyecto a los miembros de las comunidades b) Se les informó que su sistema a rehabilitar producirá agua potable para las comunidades. c) La rehabilitación hace parte de las acciones aprobadas en el marco de la Sentencia T-302. d) Se presentaron los resultados del diagnóstico (prueba de bombeo y análisis de calidad de agua) y con base a ellos las decisiones técnicas que se tomaron e) Presentación de las fases de la rehabilitación del sistema dando inicio con la socialización Comentarios de la comunidad La comunidad se inquieta muchísimo acerca del tiempo de ejecución, una de las preguntas más frecuentes en la socialización es - ¿Cuándo terminan la obra? - Si se necesita un apoyo en mano de obra de la comunidad estamos dispuestos ayudar - La garantía de los equipos quién los cubre.

El 16 de abril de 2024

Implementación de los módulos 0 y 1. M 0: Se socializó a las comunidades priorizadas sobre la estrategia Wüin Ülees, además de generar espacios de acuerdos y compromisos. Se realizó la cartografía social y línea del tiempo sobre el abastecimiento de agua con las comunidades participantes de la estrategia. Además, se realizó el mapa y relación con los actores presentes en las comunidades: Ishichonkat y Camino Verde (Uribia)

Se brindó apoyo en la continuación de la implementación de la estrategia de aseguramiento y gestión social para fortalecer a las comunidades de Uribia (Camino Verde, Ishichonkat) con el propósito de realizar procesos de socialización y reconocimiento con las comunidades beneficiarias en la estrategia Wüin Ülees. Es importante destacar que durante la socialización del Momento 0, se trabajó en los diferentes productos, como es la cartografía social, la línea de tiempo del agua y la identificación de los actores presentes en el territorio y sus relaciones Los miembros de las comunidades participaron de manera activa en la actividad, compartiendo sus expectativas y lo que esperan del equipo del MVCT/VASB. Se fomentó la participación y la corresponsabilidad de la comunidad en la implementación de la estrategia, promoviendo la integración

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

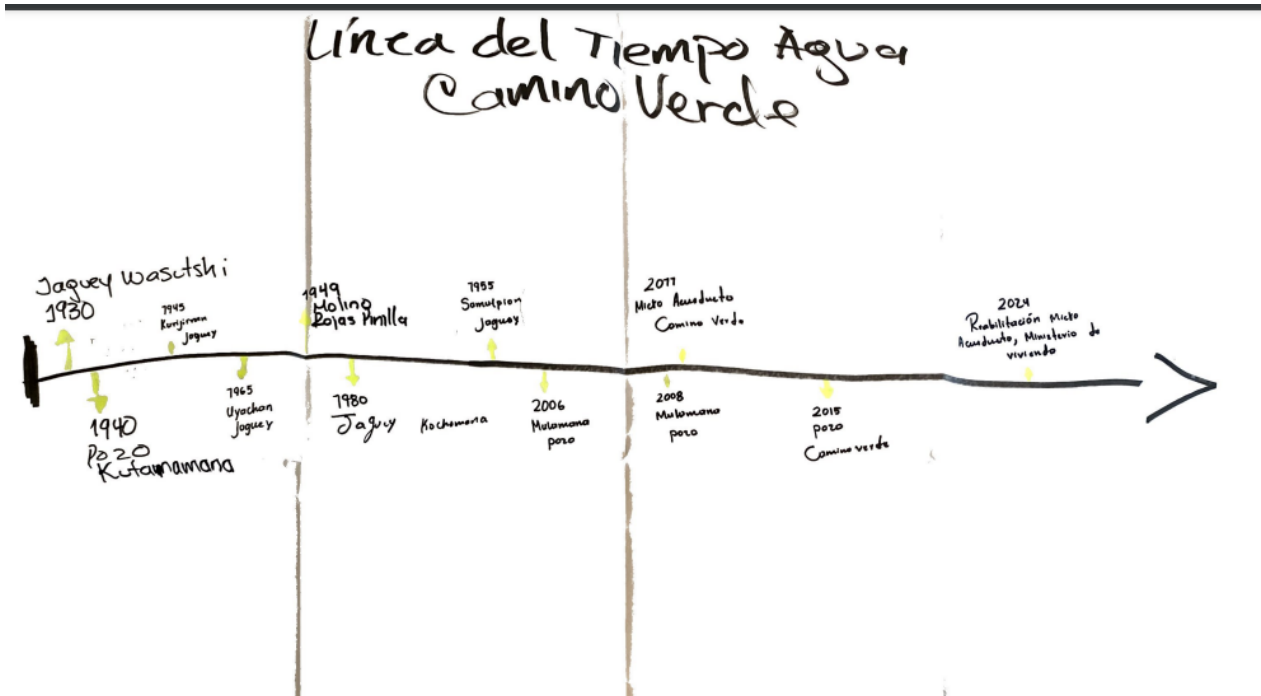


Foto: Elaboración propia de la línea del tiempo por los miembros de la comunidad indígena de Camino Verde.




Foto: Elaboración propia de la comunidad de Ishichonkat acerca de cartografía de su comunidad.

9. Relación de comunicaciones (anexo 5)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

RADICADO	ASUNTO	Remitente	FECHA DE RADICADO
2024ER0060040	Vivienda, Ciudad y Territorio	Angélica Benavides	30/04/2024
2024ER0077334	CORREO ELECTRÓNICO - 2202463005323, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO CI...	MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ / FINDETER	30/05/2024
2024ER0078583	CORREO ELECTRONICO - 2202450505417, Propuesta adición convenios solidarios y contratos derivados del...	JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ / FINDETER	31/05/2024
2024ER0078583 C1	CORREO ELECTRONICO - 2202450505417, Propuesta adición convenios solidarios y contratos derivados del...	JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ / FINDETER	31/05/2024
2024ER0087134	CORREO ELECTRONICO - 2202450505673, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL ...	JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ / FINDETER	11/06/2024
2024ER0087145	Vivienda, Ciudad y Territorio	Angélica Benavides	11/06/2024

10. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de abril de 2024 que correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica, se informa que existen riesgos jurídicos asociados y/o alertas de situaciones que constituyen incumplimiento en las obligaciones contractuales y derivadas de los compromisos que se adquieren por FINDETER S.A. en cada comité de seguimiento, toda vez que los avances que se evidencian en la ejecución no han sido los esperados, por lo que puede representar un retraso en lo programado y en el cumplimiento de las obligaciones, y que repercute en el impacto del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 así como en el Plan Provisional de Acción presentado a la Corte Constitucional el 28-08-2023.


Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.



DIANA MARCELA MEDINA HENAO

Supervisor

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 

VoBo. Claudia Marcela Velásquez – Gestora Guajira VASB – Equipo Guajira 

VoBo. Alcides Escobar Pimienta – Profesional de Apoyo Social 
