



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Bogotá, D. C., 8 de agosto de 2025

Informe de supervisión correspondiente del 01/07/2025 al 31/07/2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	JAMES ADIDER FLOREZ CAICEDO
Cedula de ciudadanía	16377245
Cargo en la dependencia	OPERACIONES AEREAS
Unidad de dependencia	COAVI - BOGOTA
Correo electrónico	ADIDER.FLOREZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3192066727

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-010-2024		
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA		
Contrato No.	117-1-2024		
Unidad	DIRAN – AVIPO		
Objeto	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COBERTIZOS MODULARES PARA AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCOTICOS AVIACIÓN -POLICIAL		
Valor Inicial	MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.198.818.870) MOMEDA CORRIENTE		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.198.818.870) MOMEDA CORRIENTE		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
18/07/2025	22/11/2024	18/07/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FERNANDO CESAR BUITRAGO SUAREZ	79043929	FAST JOB AB S.A.S	900.592.195-1

1/6

08 AGO 2025
ms
24



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
25624	15/08/2024	\$ 266.676.929,15
25724	15/08/2024	\$ 121.790.586,51
25524	15/08/2024	\$ 811.538.461,54

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
135724	14/11/2024	\$ 811.538.461,54
135824	14/11/2024	\$ 266.676.929,15
135924	14/11/2024	\$ 120.603.479,31

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST): se aplicarán las recomendaciones del INSTRUCTIVO PARA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CON CRITERIOS SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. (Código: 1-2-1-01V2 del 2021-12-23), el contratista, dará estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en el mismo en razón al objeto de los estudios y documentos previos. **PARÁGRAFO SEGUNDO- REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST APLICABLES:** -Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". Resolución Nro. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

En el informe de supervisión de marzo se entrega materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista allego las certificaciones correspondientes a las instalaciones de los cobertizos modulares para su revisión y verificación por la supervisión.

El personal de FastJOB realiza una visita para verificar el estado general de las instalaciones de los cobertizos modulares y su sistema eléctrico. De la misma forma se llevó a cabo una capacitación de instalación y desarme de los mismos, a algún personal de la Compañía Aérea de Aviación Policial Bogotá.

El día 18 de julio de 2025 se da por finalizada la ejecución del contrato de funcionamiento de los transformadores y estado eléctrico.

Se encontraba el contrato en suspensión desde el día 05/05/2025 hasta el día 01/06/2025.

De acuerdo con la prórroga número 4 del contrato en mención, el 18 de julio al 2025, termina el plazo de ejecución del mismo.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se verifica el estado de los hangares en compañía del contratista.

Se analizan las certificaciones entregadas por la empresa FAST JOB relacionadas con las características técnicas exigidas por el contrato y la normatividad vigente que rige la materia de la lona que compone el recubrimiento de los hangares instalados. Una vez realizado el análisis se remite mensaje de correo electrónico el día 18 de julio a la empresa contratista, en el cual se manifiesta que las certificaciones entregadas de la lona parecen no cumplir con las características convenidas y la normatividad vigente. No se dio contestación del mismo por parte del contratista.

5.3 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

De acuerdo con el numeral 10 del capítulo de antecedentes de la prórroga No. 4 al Contrato 117-1-2024, debía realizarse estudio de mercado de las puertas de los hangares modulares contratadas que permitiera establecer su valor individual toda vez que ningún documento pre contractual ni contractual hizo discriminación alguna de los componentes de la estructura contratada. Lo anterior debido a que las partes de común acuerdo, evaluando las consecuencias de una posible instalación, decidieron desistir de su montaje. En cumplimiento de ello, la supervisión remitió a varios posibles fabricantes solicitud de cotización mediante correo electrónico, dicha información fue entregada a la entidad contratante para su evaluación y respectivo análisis para el descuento de las puertas por la no instalación de las mismas, al contratista, como consta en oficio 2025-201-01478-R, del 21 de julio del 2025.



Por otra parte, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no ha logrado certificar la calidad del material que recubre los cobertizos modulares (lona), el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas, ni con las normas técnicas aplicables para estructuras en plataforma aeronáuticas, conforme a lo establecido en el decreto 1294 del 2021 y los lineamientos de la organización de aviación civil internacional (OACI); por lo tanto, la supervisión no ha recibido el bien contratado.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 8
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

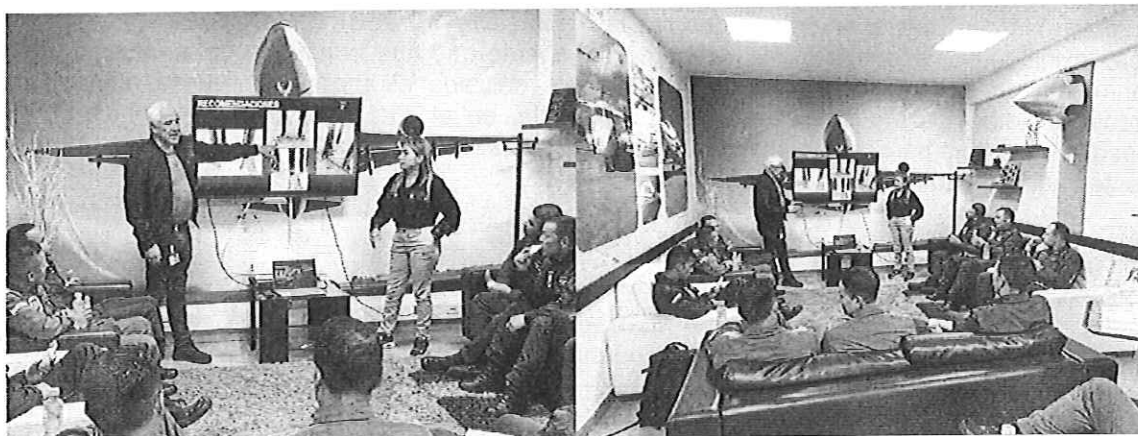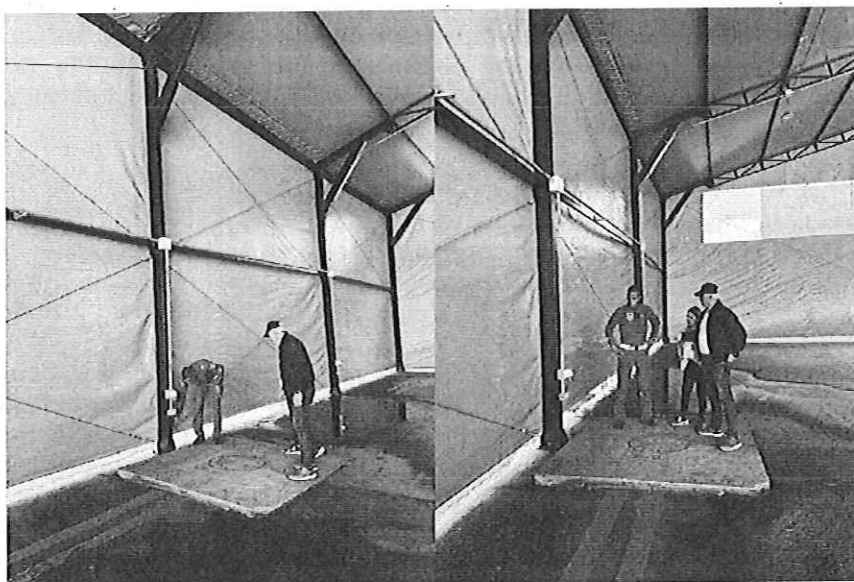

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Pago parcial 50%	FAST12	\$ 599.409.435,00	12/02/2025	\$ 599.409.435,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	ABRIL	FASJ 1	\$ 599.409.435	\$0,00	% 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 5 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

TOTAL	\$ 599.409.435	\$ 0,00	% 0,00
SALDO	\$ 599.409.435	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	90,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	50,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	01	20/12/2024	N/A	01/02/2025	SE PRORROGO EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 01/02/2025
	02	01/02/2025	N/A	29/03/2025	SE PRORROGO EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 29/03/2025
	03	31/05/2025	N/A	30/06/2025	SE PRORROGO EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 30/06/2025
	04	07/06/2025	N/A	18/07/2024	SE PRORROGO EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 18/07/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	01	29/03/2025	N/A	27/04/2025	SE SUSPENDE EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 27/04/2025
Suspensión	01	27/04/2025	N/A	05/05/2025	SE SUSPENDE EL CONTRATO 117-1-24 HASTA EL DIA 05/05/2025
Reinicio	N/A	31/05/2025	N/A	N/A	SE REINICIA EL CONTRATO
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 ANEXO 0	15/11/2024	\$ 899,114,152.50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	239.763.774,00	08/11/2024	20/12/2025
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	20/06/2026

3/6

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 8

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,00	08/11/2024	20/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	239.763.774,00	08/11/2024	20/12/2027

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 anexo 0	03/02/2025	\$ 260,000,000
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	100	260.000.000,00	08/11/2024	20/12/2024

PÓLIZA DE PRÓRROGA N°1 Y MODIFICACIÓN N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 ANEXO 1	23/12/2024	\$ 899,114,152.50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	239.763.774,00	08/11/2024	01/02/2026
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	01/08/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,00	08/11/2024	01/02/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	239.763.774,00	08/11/2024	01/02/2028

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 anexo 1	03/02/2025	\$ 260,000,000
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	100	260.000.000,00	08/11/2024	01/02/2025

PÓLIZA DE PRÓRROGA N°2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 ANEXO 2	03/02/2025	\$ 899,114,152.50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	239.763.774,00	08/11/2024	29/03/2026
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	29/09/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,00	08/11/2024	29/03/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	239.763.774,00	08/11/2024	29/03/2028



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 anexo 2	03/02/2025	\$ 260,000,000
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	100	284.700.000,00	08/11/2024	29/03/2025

PÓLIZA DE REINICIO

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 Anexo 16	18/06/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	239.763.774,00	08/11/2024	01/06/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,50	08/11/2024	01/06/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	239.763.774,00	08/11/2024	01/06/2028
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	01/06/2026

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 Anexo 14	18/06/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	284.700.000,00	08/11/2024	01/06/2025

PÓLIZA DE PRÓRROGA N°3

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 Anexo 17	18/06/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	239.763.774,00	08/11/2024	30/06/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,50	08/11/2024	30/06/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	239.763.774,00	08/11/2024	30/06/2028
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	30/06/2026

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 Anexo 15	18/06/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	284.700.000,00	08/11/2024	30/06/2025

2/6



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 8 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

PÓLIZA DE PRÓRROGA N°4

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-44-101223500 Anexo 20	09/07/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	239.763.774,00	08/11/2024	18/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales	5	59.940.943,50	08/11/2024	18/07/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	239.763.774,00	08/11/2024	18/07/2028
Calidad del servicio	30	359.645.661,00	08/11/2024	18/07/2026

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		14-40-101069129 Anexo 17	18/06/2025	\$ 899.114.152,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	284.700.000,00	08/11/2024	18/07/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.


12. Observaciones del Supervisor

El día 18 de julio de 2025 expiro el plazo de ejecución del contrato, se está a la espera de la entrega de certificación de cumplimiento de norma técnica del material de los cobertizos modulares (lona) por parte del contratista y así mismo se espera un acuerdo entre las partes, para realizar un descuento por concepto de las puertas que no fueron instaladas.

Finalmente, se aclara que solo se ha pagado el 50% del valor del contrato.

Anexos:

1. Oficio recibido 2025-201-01478-R, del 21 de julio.


Mayor **JAMES A FLOREZ CAICEDO**
C.C. 16.377.245

8 AGO 2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS REGIONAL No 1



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad _____
Radicado No _____
Recibido por _____
Fecha _____ Hora _____

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Carrera 66 a No 43-18
Bogotá D.C.



Al contestar cite radicado:
2025-201-01478-R

Fecha: 2025-07-21 Hora: 10:30:41
Remitente(s): JAMES ACHIDER FLOREZ
CAICEDO
Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL
Folios: 3
Adjuntos/Anexos: 0



Asunto: Estudio de mercado y solicitud de apoyo a la supervisión de equipo interdisciplinar para determinar el valor de descuento por puertas de cobertizos modulares del contrato de compraventa No. 117-1-2024

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel que de conformidad con la comunicación oficial No. 084-FORPO-302-10-29 INFRAESTRUCTURA del 13 de junio de 2025, en la cual se solicita la remisión del estudio de mercado correspondiente a las puertas de los cobertizos modulares adquiridos mediante el contrato No. 117-1-2024, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado, la supervisión procedió a realizar las siguientes acciones:

1. **Cotización pública en SECOP:** Se inició un proceso de cotización pública a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), permitiendo a posibles oferentes presentar sus propuestas durante 15 días, a partir del 10 de junio de 2025.
2. **Contacto con proveedores:** Ante la ausencia de oferentes en SECOP, se enviaron solicitudes de cotización desde el correo institucional lina.galindo@forpo.gov.co a posibles proveedores, como Aerotapiz, Grupo Empresarial Oriental S.A.S. y JVC Constructora S.A.S.
3. **Cotizaciones recibidas inicialmente:** Las tres organizaciones mencionadas remitieron las siguientes cotizaciones:

Oferente	Precio
JVC Constructora S.A.S.	\$45.000.000
Grupo Empresarial Oriental S.A.S.	\$49.000.000
Aerotapiz	\$297.500.000
Promedio de cotizaciones	\$130.500.000

4. **Nuevas cotizaciones:** Dos semanas después, se recibieron cotizaciones adicionales de Carpas Miami S.A.S. (por primera vez) y una actualización de Aerotapiz:

Oferente	Precio
Carpas Miami S.A.S.	\$350.102.000
Aerotapiz	\$297.500.000


5. Otras solicitudes: Se enviaron solicitudes de cotización a Carpas Solaire S.A.S. y Carpas Full de Colombia, quienes manifestaron no estar en capacidad de cotizar la elaboración de las puertas requeridas. Asimismo, Carpas IKL S.A.S. comunicó por correo electrónico su imposibilidad de participar en el proceso.
6. Análisis técnico: Tras revisar las cotizaciones, se determinó que solo las presentadas por Carpas Miami S.A.S. y Aerotapiz cumplen con las características técnicas requeridas para las puertas de los cobertizos modulares.

Vale la pena señalar que una vez revisada la etapa precontractual no se evidencia documento alguno que permita inferir a la supervisión el valor de las puertas contratadas toda vez que el análisis del sector contenido en el estudio previo engloba el bien a entregar en su totalidad.

Dado lo anterior, y con el fin de garantizar que cualquier ajuste al contrato se realice conforme a los principios de economía, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación pública, solicito respetuosamente se evalúe la viabilidad de asignar un equipo interdisciplinar técnico, jurídico y financiero (abogado, economista y arquitecto o las disciplinas que a bien tenga) para apoyar a la supervisión en la determinación del valor que debe descontarse al contratista por la no entrega de las puertas de los cobertizos contratados. Lo anterior con la finalidad de formalizar adecuadamente el descuento por la no instalación de las mismas, sin generar afectaciones a los intereses de la entidad contratante, posibles desequilibrios financieros para el contratista o la violación del debido proceso del tercero que suministra el bien a la entidad.

Asimismo, de manera respetuosa mi coronel, solicito muy comedidamente que la entidad informe oficialmente al señor Fernando César Buitrago Suárez, representante legal de la empresa contratista Fast Job AB S.A.S., sobre el valor a descontar por la no instalación de las puertas, garantizando que tenga pleno conocimiento de la decisión tomada por el equipo interdisciplinario técnico jurídico y económico.

Agradezco a mi coronel de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atenta a cualquier instrucción o requerimiento adicional.


 Mayor JAMES ADIDER FLOREZ CAICEDO
 Supervisor Contrato 117-1-2024

Asesoría Jurídica
 Aeropuerto Internacional El Dorado entrada No 6
 Teléfono 3192066727
 Adider.florez@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CARPAS MIAMI

WAGNER & S.A.
CARPAS MIAMI S.A.S
NIT. 900.405.901-5

Cotización

N° cotización: 15233
Fecha: viernes 18 de julio de 2025
Asesor: Sandra Mora

Empresa: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Nombre:

E-mail: sandra.mora@corpasmiami.com

Ciudad: Bogotá

Teléfono:


312266727

Ciudad	Bogotá	Medidas																							
Cont	Producto	Descripción	Valor unidad	Valor total																					
2	PUERTA METALICA PARA HANGAR DE AVIACION DE 28 METROS DE ANCHO POR 10 METROS DE ALTO CON SUS RESPECTIVOS MOTORES	<p>Lona nacional para protección banda ancha de 10x10, impermeable, uniones con electrosoldado resistente al rasgado, estabilidad de color protectora.</p> <p>La puerta del hangar debe tener una estructura única diseñada con gran tamaño y peso y tiene que ser fácil de abrir. Para facilitar la entrada y salida de los aviones del hangar, la puerta debe estar diseñada en función de la altura total del hangar.</p> <p>La longitud total estará dividida en varios abanicos. Se requiere que el marco sea individual y diseñado a la estructura del hangar. La puerta debe ser independiente a la estructura del hangar, debe ser liviana en perfil de 50mm 59mm x 2mm con los guías que corresponden, lona tensada a una tensión 18 orzas y algunas áreas serán micro perforadas.</p> <p>El mecanismo de acción correcta de los paneles será motorizado debe contar con motores eléctricos que realicen la carga de cada panel y garanticen el funcionamiento de apertura y cierre. Los siguientes son las medidas específicas por puerta.</p> <table><tr><th colspan="2">MEDIDAS ESPECÍFICAS</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th></tr><tr><td>ALTURA TOTAL</td><td>10</td><td>m</td></tr><tr><td>ANCHO TOTAL</td><td>28</td><td>m</td></tr><tr><td>NÚMERO DE HOJAS</td><td>10 aprox.</td><td>und</td></tr><tr><td>ANCHO DE CADA HOJA</td><td>2.80</td><td>m</td></tr><tr><td>ALTURA DE CADA HOJA</td><td>10</td><td>m</td></tr><tr><td>MOTOR</td><td>1</td><td>und</td></tr></table>	MEDIDAS ESPECÍFICAS		UNIDAD DE MEDIDA	ALTURA TOTAL	10	m	ANCHO TOTAL	28	m	NÚMERO DE HOJAS	10 aprox.	und	ANCHO DE CADA HOJA	2.80	m	ALTURA DE CADA HOJA	10	m	MOTOR	1	und	\$ 142.900.000	\$ 285.800.000
MEDIDAS ESPECÍFICAS		UNIDAD DE MEDIDA																							
ALTURA TOTAL	10	m																							
ANCHO TOTAL	28	m																							
NÚMERO DE HOJAS	10 aprox.	und																							
ANCHO DE CADA HOJA	2.80	m																							
ALTURA DE CADA HOJA	10	m																							
MOTOR	1	und																							

ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS DISEÑOS SEGÚN FICHA TÉCNICA ENVIADA

Terminos y condiciones				SUB TOTAL	\$	285.800.000
Validez de la propuesta	30 días	Forma de pago	60% Anticipo 40% contra entrega	IVA 19%	\$	54.302.000
Tiempo de entrega	45 días háb	Garantía	1 año	TOTAL	\$	340.102.000

Referencia de producto

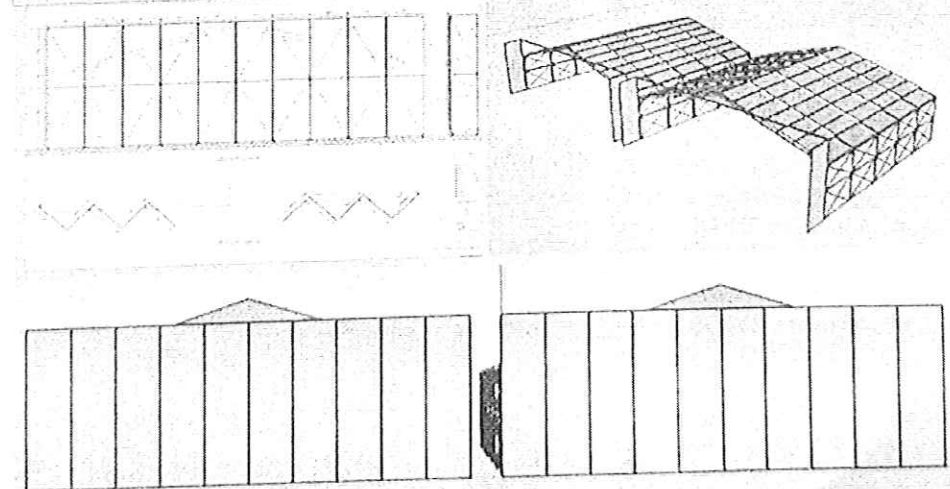

Gracias por confiar en nosotros
Cordialmente,

Sandra Mora

CARPAS MIAMI SAS

6/6

		PROPUESTA DE SERVICIOS	
CODIGO: GCO-FT-002	VERSION: 02	FECHA: 6/03/2018	Página 1 de 2

Bogotá D C: 17 de Junio del 2025

Propuesta de Servicios No.694

Señores;
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ref: Propuesta de Servicios de fabricación

Estimados Señores:

De manera cordial y en atención a su amable solicitud, a continuación, nos permitimos presentar la propuesta de servicios "Cotización" para los trabajos de tapicería requeridos para la siguiente aeronave.

PUERTA METALICA DE 28 METROS DE ANCHO POR 10 METROS DE ALTO CON SUS RESPECTIVOS MOTORES				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>La puerta del hangar tiene una estructura única debido a su gran tamaño y peso, y tiene que ser fácil de abrir, para facilitar la entrada y salida de los aviones del hangar, la puerta está diseñada en función de la altura total del hangar.</p> <p>La longitud total está dividida en varios abanicos.</p> <p>El marco sera individual y adosado a la estructura del hangar.</p> <p>La puerta sera independiente a la estructura del hangar, sera liviana en perfil de 50mmx50mmx2mm con las guías que corresponden, lona tensada dura lona 18 onzas y algunas áreas serán micro perforado.</p> <p>El mecanismo de acción corrediza de los paneles será motorizado, contara con motores eléctricos que resistan la carga de cada panel y garanticen el accionamiento de apertura y cierre.</p> <p>TODO LO INCLUIDO Y CUMPLIENDO CON EL DOCUMENTO TECNICO, INCLUYE TRASPORTE E INSTALACION EN BOGOTA, NO INCLUYE MAQUINARIA DE ISADO COMO PLUMAS MONTACARGAS Y ANDAMIOS, UNIAMENTE PERSONAL CERTIFICADO.</p>	2	\$125.000.000	\$250.000.000
SUBTOTAL				\$250.000.000
IVA				\$47.500.000
TOTAL				\$297.500.000

www.aerotapiz.com
contactenos@aerotapiz.com - aerotapiz@gmail.com
 Tel.: 468 21 66 - Cel.: 321 308 37 60
 Cra. 69 M No. 68 - 74 La Estrada Bogotá D.C.
