

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIOL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			7			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	2	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 1 de 9			

CONSORCIO VIAS 2024

CONTRATO N° 1999 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL

INFORME MENSUAL N° 7

PERIODO: DEL 30 DE DICIEMBRE AL 2 DE FEBRERO DE 2025

VIAS: 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260- 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			7		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	2	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 2 de 9					

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, con el fin de “Optimizar la Gestión y Administración de las Carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial Norte de Santander, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”, realizó el Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual derivó al Contrato No. 1999 de 2024 con CONSORCIO VIAS 2024, cuyo objeto es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.”.

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía.

El INVIAS, realizaron los proceso **LP-DEO-SGI-088-2023 y SA-MC-DEO-SGI-014-2024** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER : Contrato 1540 de 2024 SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.) con inicio el 22 de mayo de 2024, contrato 3822 de 2024 SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8 con inicio el 4 de octubre de 2024 y el contrato 3856 de 2024 SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9) con inicio el 4 de octubre de 2024

En atención al Contrato No. 1999 de 2024, nos permitimos poner a consideración de la Dirección Territorial Norte de Santander el Informe Mensual No. 1 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 a 30 de junio del 2025.

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			7			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	2	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 3 de 9			

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contempla las actividades de Mantenimiento Rutinario y la Administración de Mantenimiento Vial y se desarrolla en los tramos 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.), 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000, 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) ,5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA).

El mantenimiento rutinario, es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.


Las actividades de mantenimiento rutinario, denominadas “indicadores”, consisten en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

El programa de Administración de Mantenimiento Vial busca “Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		7		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		3	2	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0		
Página 4 de 9				

3. LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la provincia oriental del departamento de Norte de Santander, distribuida de la siguiente manera:

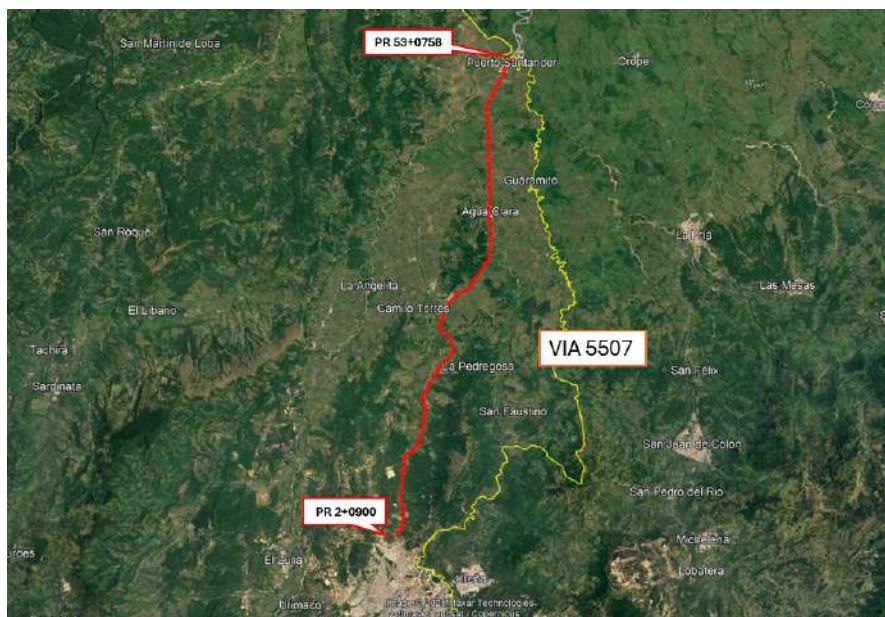

Ruta 55 – Troncal central del norte, Tramo 5507 Nueva Terminal de Cúcuta - Puente Internacional Pedro de Hevia carretera del PR 2+0900 al PR 53+0758 en una longitud de 50.760 kms



Ruta 55- Conexión Colombia-Venezuela, Tramo 55NS09 Cúcuta (Redoma El Salado) - La China del PR 0+0000 al PR 29+0660 en una longitud de 28.203 kms

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		7			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	2	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
	VERSION 1.0				
Página 5 de 9					



Ruta 55 – Alternas a la troncal central del norte, Tramo 55NSA Glorieta K8- Redoma el Salado – anillo vial oriental de Cúcuta del PR 0+0000 al PR 18+0160 en una longitud de 18.202 kms.



Ruta 70 – Conexión Colombia – Venezuela, Tramo 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas del PR 0+0000 al PR 1+0272 en una longitud de 1.27 kms.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			7		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	2	2025	
		Contrato No. 1999 de 2024			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 6 de 9					

COMENTARIOS GENERALES:

Durante este período se realizaron las siguientes actividades de obras de mantenimiento y de mejoramiento en ejecución de contratos vigentes en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

1.- Vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander.

Contrato 3471/2023:

- Se terminaron las obras de confinamiento y recuperación de la calzada en el PR 23 + 0469.

2.- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Contrato 3080/2024

- Actividades de demarcación horizontal en sectores entre el PR 0 al PR 18.
- Construcción de cunetas y disipadores en ambas márgenes entre el PR 4 + 0000 al PR 4 + 0150.

3.- Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino - La China.

Contrato 3262/2024

- Actividades de construcción de cunetas. PR 0 + 0400 al PR 0 + 0700 en ambas márgenes.
- Construcción de alcantarilla en el PR 5 + 0354.
- Recalce en el pontón PR 15 + 0527.

Este informe mensual incluye los informes semanales **N° 26 al 30 (Ver Anexos 1).**

En el **Anexo 2** se presenta el consolidado de las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario por parte de las Cooperativas La Samaria, Tonchala y Microcolma, realizadas durante el mes de Enero.

En el **Anexo 3** se presenta el consolidado de la correspondencia generada por la Administración Vial durante el período.

CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, CODIGO 55NS09

ESTADO DE LA VIA

La vía presenta condición crítica en casi toda su longitud con un % de 82.40 de estado malo y un % de 3.44 de estado muy malo según la evaluación con criterio técnico realizada en Abril 2024.

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			7			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	2	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 7 de 9			

La anterior condición ofrece un nivel de servicio muy bajo a los usuarios de la vía dada la existencia de patologías manifestadas en baches, fisuras, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, desgaste, deformaciones.

Primeramente, se hace necesario con CARÁCTER URGENTE realizar actividades de parcheo de emergencia en todo el sector para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas. Se está a la espera de asignación de recursos por parte del Invías para el suministro de mezcla asfáltica y de esta manera proceder a realizar un parcheo tipo tapahuecos con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario.

Son críticos los sectores entre el PR 3 + 0100 al PR 3 + 0500, PR 14 + 0200 al PR 14 + 0650 y PR 17 + 0100 al PR 18 + 0300, los cuales requieren obras de rehabilitación del pavimento.

•Adicionalmente la demarcación horizontal en todo el sector presenta condición mala, lo cual hace necesario atender esta necesidad con carácter URGENTE con el fin de mejorar la señalización a los usuarios y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

A LA FECHA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRITICOS POR ATENDER:

- PR 1+0732 Pontón presenta afectación de aletas.
- PR8+0300 al PR8+0400: se requiere obras de estabilización del talud superior
- PR9+0200 al PR9+0400: es necesario ejecutar las obras de estabilización del talud superior y recuperación de la calzada en el sitio.
- PR9 +00650 - PR 9+0700: Talud superior inestable
- PR12+0450: se requiere obras de estabilización del talud superior
- PR24+0500 y PR25+0150: Sitios con perdida parcial de la calzada en el carril izquierdo. Se requiere obra de estabilización, de drenaje y de recuperación de la calzada.

NECESIDADES DE PUENTES:

Con relación a necesidades de los Puentes se requiere principalmente continuar las obras de rehabilitación del puente Paso Dos Ríos (PR16+0160) consistente en la reconstrucción de la Pila No.1 con cimentación profunda y en el reforzamiento de los dos estribos con cimentación profunda.

CARRETERA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507

- Se observa un alto desgaste de la carpeta asfáltica y los daños estructurales en el pavimento. La presencia de fisuramiento generalizado, de baches de gran tamaño, piel de cocodrilo y deformaciones del terraplén es evidente día tras día, desmejorándose el nivel de servicio de la vía.
- Es necesario realizar con carácter preventivo obras de mejoramiento y mantenimiento en los sectores críticos del pavimento.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			7		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	2	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 8 de 9					

- Condición crítica presenta la demarcación horizontal de la vía en varios sectores. Esta situación es un factor potencial generador de accidentes de tránsito y un argumento para futuras demandas al INVIAS en caso de víctimas (heridos y/o muertos)

EN ESTA VÍA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRÍTICOS POR ATENDER:

- PR14+0030: Se presenta deformación de la calzada en una longitud de 50 metros que afecta el normal flujo vehicular. Es de carácter prioritario su atención para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito. Se hace necesario como medida provisional y preventiva realizar renivelación del sector.
- PR16+0850 al PR17+0050 y PR 19+0000 al PR 19+0200: Se presenta deformación a lo largo del sector. Se requiere obras de manejo de aguas de infiltración y obras de estabilización y recuperación de la estructura del pavimento.

EN ESTA VIA SE PRESENTA NOVEDAD EN LOS SIGUIENTES PUENTES:

- PR5+0875 PUENTE PATILLALES: La estructura presenta daño en las juntas, fisuramiento en el estribo derecho y daño en la carpeta asfáltica.
- PR7+0789 PUENTE LAS QUESERAS: La estructura presenta agrietamiento en el estribo sur debajo del apoyo de las vigas, se requiere inspección especial para determinar el grado de vulnerabilidad y definir las obras de reparación. Presenta colmatación del cauce aguas arriba y aguas abajo. Requiere urgentemente obras de manejo del cauce.
- PR47+0750 PUENTE PAMPLONITA ANTIGUO: Puente con gálibo mínimo que en épocas de invierno se afecta por el nivel de las aguas del río. Requiere construcción de barandas y obras de mantenimiento general de la estructura. Se debe definir por el INVIAS la viabilidad de la demolición de esta estructura.
- **PR53+0686 PUENTE INTERNACIONAL UNION - PEDRO DE HEVIA:** Puente metálico sobre el río La Grita que une las poblaciones de Puerto Santander (Colombia) y Boca de Grita (Venezuela). La estructura presenta asentamiento en los estribos y tiene restricción de carga para 10 toneladas.

CARRETERA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA, CODIGO 55NSA

Esta vía actualmente presenta en general en la doble calzada un % 65,23 en condición regular, según evaluación de criterio técnico a abril 2024.

Sin embargo, el caso especial se presenta en el sector entre el PR 3 + 0900 al PR 7 + 0500, donde se manifiesta una deformación generalizada de la doble calzada (hundimiento y abultamientos sucesivos), que afectan el normal flujo vehicular. Esta situación obedece a la presencia de arcillas expansivas en la subrasante, lo cual implica la necesidad de realizar actividades de estabilización del terreno y recuperación de la estructura del pavimento.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			7		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	2	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
	VERSION 1.0				
Página 9 de 9					

• El Puente denominado García Herreros, localizado en el PR16+0058 manifiesta procesos erosivos en el cauce que afecta la cimentación de las pilas 1 y 2 (socavación) ante las crecidas periódicas del río Pamplonita. Se requiere la construcción de obras de control consistente en un dique sedimentador aguas abajo y obras de adecuación y manejo del cauce. Se ha solicitado reiteradamente a la Territorial y está a Planta Central la ejecución de los estudios necesarios para definir las obras de control de erosión y de socavación que asegure la estabilidad de la estructura.

• El puente internacional Francisco de Paula Santander localizado en el PR 13 + 0600, presenta socavación de las pilas 6 a la 9 y un alto proceso erosivo y de socavación en el estribo y talud derecho que puede aislar la estructura en el aproche ante una crecida del río Táchira. Es necesario con carácter URGENTE realizar obras de manejo del cauce del río, ya que a la fecha está totalmente recostado sobre la margen del lado venezolano.

• Es necesario evaluar la necesidad de la construcción de una redoma o glorieta en el PR3+0200 al PR 3+0300 (sector Hogar Santa Rosa de Lima) donde actualmente se localiza un sitio de retorno y donde se intercepta con la calzada izquierda una vía municipal. Las condiciones geométricas actuales en el sector no garantizan seguridad vial para las maniobras de cruce de vehículos y para los giros de entrada y/o salida de la vía municipal que intercepta en el sitio. Sector de alta accidentalidad.



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

ANEXO 1



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-01-07 14:24:45

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 26 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-001112

Fecha Radicación: 2025-01-07 14:27:50

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene
Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco
Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-010-25 Entrega Informe Semanal No. 26**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 26.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 26, correspondiente al período 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 26 (45) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular: 313-2162881 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com
Cúcuta-Colombia

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 26		
				FECHA	DIA	MES
	07	01	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 1 de 45			

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 26

PERIODO: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 2 de 45					

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	AL 5 DE ENERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	186 DIAS	% TIEMPO: 24,57%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 3 de 45			

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 4 de 45			

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 94 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 14,14%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: PR0+0000 al PR7+0400.
- Limpieza de bermas: PR0+0000 al PR1+0300.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR12+0000.
- Limpieza de encoles y descoles: Del PR0+0000 al PR12+0000.

• La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido

• El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

• Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DÍA	MES
				07	01
					AÑO 2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 5 de 45		

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realizan actividades de demarcación horizontal de líneas de borde en la calzada izquierda.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 6 de 45					

CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA)
(DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 94 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 14,14 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

- 1+0732:** Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.
- 5+0354:** La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.
- 8+0268:** Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.
- 8+0300 AL 8+0400:** talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.
- 9+0200 AL 9+0400:** Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.
- 9+0650 AL 9+0700:** talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES
				07	01
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 7 de 45		

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 229 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 28,63%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR20+0000 al PR24+0000.
- Remoción de derrumbes: Del PR8+0100 al PR8+0300.
- Bacheo con material de fresado: Del PR3+0500 al PR18+0300.
- Limpieza de calzada: Del PR5+0000 al PR6+0000.
- Poda, corte y retiro de árboles: Del PR10+0000 al PR11+0000 y del PR23+0000 al PR24+0000.
- Recolección de basuras de zona de berma y cunetas: Del PR9+0000 al PR29+0000.
- Arreglo de señales verticales y despeje: Del PR9+0000 al PR18+0000.
- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DÍA	MES
				07	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		AÑO 2025		

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 8 de 45

- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REAHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realizan actividades de excavación para construcción de cunetas en concreto, instalación de formaleta, parrilla de refuerzo y fundida con concreto premezclado, en la margen derecha e izquierda entre el PR 0 + 0460 al PR0+0700 Ambas márgenes.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Avenida del rio· 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771

Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 9 de 45					

Plazo: CUATRO (4) MESES.
Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

- Se continúan las actividades de atención de sitio critico en el PR8+0268 de la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

Se realiza movimiento del material deslizado en el talud superior.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

- PR 4+0256:** Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce
- PR 14+0030 al PR 14+0060:** Deformación de la calzada. Requiere estudio
- PR 16+0950 al PR 17+0050:** Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio
- PR 23+0469:** Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable
- PR 47+0681:** Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha
- PR 53+0686:** Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 94 DIAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 10 de 45					

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 14,14%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2 +0900 al PR14+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 94 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 14,14%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR14+0000 al PR16+0000.
- Limpieza de cunetas: Del PR14+0000 al PR16+0000.
- Bacheo con tierra: PR50+0000 al PR52+0000.
- Parcheo con mezcla asfáltica: Del PR50+0000 al PR52+0000.
- Limpieza de puentes: PR 46+0000 al PR53+0678.
- Limpieza de pontones del PR46+0000 al PR52+0000.
- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 11 de 45			

- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

- Reglamentación ambiental contractual.
- Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Durante esta semana no se realizaron actividades en este sector.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E-VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 12 de 45					

mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

En inspección a la vía nacional 55NSA - Anillo Vial Oriental de Cúcuta, donde se desarrolla por parte de la Constructora Serranova S.A.S. una obra nueva localizada entre el PR11+0250 al PR 11+0350 en la margen de la calzada derecha, con licencia de urbanismo y licencia de construcción del Municipio de Villa del Rosario, se observa que se ha intervenido el descole de la obra de drenaje, perteneciente a la infraestructura vial nacional que se localiza en el PR11+0341.

Esta intervención que ha implicado en el encerramiento lateral y cerramiento de la parte superior de la caja de salida del box coulvert y adicionalmente en el taponado y eliminación del descole que existía como drenaje natural en el predio , afectando el drenaje de las aguas lluvias de la vía nacional y afectando la estabilidad de la infraestructura vial por el represamiento de las lluvias que se genera y con la alta probabilidad de afectación a los predios y a la comunidad del sector por posible desbordamiento de aguas lluvias en época de invierno.

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-188-24 de fecha 19/12/2024 con copia a la Territorial del Invías se solicitó a la Alcaldía de Villa del Rosario hace , como autoridad en el sector realizar la gestión ante el propietario de la obra en ejecución, con el fin de que se garantice la continuación del descole para el drenaje natural de las aguas lluvias del sector y adicionalmente se adecue la caja de salida del box coulvert de tal manera que quede abierta , con el fin de poder realizar por parte del Invías el mantenimiento y limpieza rutinario para garantizar su normal funcionamiento.

3. COMPONENTE SST. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 30 de diciembre de 2024 hasta el 05 de enero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1.Se realiza inspección del extintor de la cooperativa la samaria, evaluando limpieza, funcionalidad y fecha de vencimiento.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 13 de 45					

2. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NS09, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, correcta implementación de la señalización vial y uso adecuado de EPP.
3. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NS09.
4. Seguimiento al preoperacional y limpieza de los vehículos de la oficina.
5. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
6. Durante la semana, no se presentó ningún accidente de trabajo.
7. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de elementos de protección personal, posturas adecuadas, realización de pausas activas, protocolo lavado y desinfección de manos, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
8. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
9. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 30 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 30/12/2024 **Hora:** 7:30 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios

Tipo de cierre: Cierre preventivo en la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR0+0450

PR final: PR0+0450

Descripción del evento: Novedad por presencia de un artefacto tipo granada, en la zona de berma en la margen de la calzada derecha.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por orden público: presencia de artefacto explosivo en zona de vía nacional.

Plan de acción: La zona es señalizada preventivamente. Hace presencia la fuerza pública y es detonado el artefacto por personal especializado. No se afecta la infraestructura vial nacional.

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 30/12/2024 **Hora:** 8:52 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 14 de 45					

Municipio: Los Patios
Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda
Código vía: 55NSA
Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta
PR inicial: PR3+0300
PR final: PR3+0300
Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque, - motocicleta, sentido Cúcuta - Los Patios, con saldo de un lesionado.
Rutas alternas N/A
Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque vehículo tipo automóvil - motocicleta.
Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI hace presencia tránsito de Villa del Rosario.

5. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE.

Se realizó la solicitud ante las Secretarías de Tránsito de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, al Corregidor de San Faustino y al Consorcio NSA 2024, copia de los registros y reportes de accidentalidad ocurrida durante el período del 1 al 31 de diciembre, en la red vial a cargo de esta Administración Vial.

Se prepara el respectivo informe para la Territorial y Planta Central. TERMINACIÓN DE EJECUCION Y ENTREGA DEL INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE.

6. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I- VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I- VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

7. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Se viene realizando por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central.

Se realiza esta actividad en la vía 55NSA.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIG-PAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que afecta el rendimiento y avance del trabajo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DÍA	MES
				07	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024 VERSION 1.0 Página 15 de 45		

8. TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024.

Para dar cumplimiento al compromiso contractual de la entrega por parte de la Administración Vial, relacionado con el informe trimestral del periodo octubre- diciembre de 2024, se viene realizando la toma de información de campo y la actualización de información correspondiente.

9. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08- 2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

10. ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DEL MES DE DICIEMBRE.

Mediante el oficio AV2-C1999-001-25 de fecha 2/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-000324 de fecha 02/01/2025 se hizo entrega de los informes correspondientes a las actividades programadas y realizadas por parte de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector, durante el mes de diciembre, relacionadas con el ornato y embellecimiento de las vías.

11. ENTREGA DE INFORMES DE RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE DICIEMBRE.

Mediante el oficio AV2-C1999-009-25 de fecha 3/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-000672 de fecha 03/01/2025 se hizo entrega a la Territorial, de los informes revisados y avalados por el Administrador Vial correspondientes a las actividades programadas y realizadas por parte de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector, durante el mes de diciembre, relacionadas con los rendimientos alcanzados en su ejecución.

12. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE ENERO 2025.

Mediante el oficio AV2-C1999-008-25 de fecha 3/12/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-000613 de fecha 03/01/2025, se entregó a la Territorial, las programaciones de actividades de

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 16 de 45			

servicio de mantenimiento rutinario a realizar por parte de las microempresas, en la red vial a cargo de esta Administración Vial, durante el período del 1 al 31 de enero de 2025.

13. INFORME PARA DAR RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADO CON SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VÍA 5507, REALIZADO POR EL SEÑOR JORGE LUIS RUEDA. BARRERA.

De acuerdo a lo solicitado por la Territorial, vía correo electrónico de fecha 27/12/2024, se realizó visita de inspección al sector denominado La Jarra entre el PR35+0700 al PR36+0100 de la vía 5507 Cúcuta-Puerto Santander, con el fin de revisar el estado de la vía y la señalización horizontal y vertical existente, para dar respuesta a lo solicitado por el señor Jorge Luis Rueda Barrera de necesidad de instalar reductores de velocidad en el sector.

Mediante el oficio AV2-C1999-002-25 de fecha 02/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-000358 de fecha 03/01/2025, se entregó al respectivo informe a la Territorial.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Solicitud de reportes de accidentalidad del mes de diciembre.
- Ejecución y entrega de los siguientes informes:
 - *Informe de actividades de ornato y embellecimiento de las vías, correspondiente al mes de diciembre.
 - *Informes de rendimientos de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de diciembre.
 - *Programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el mes de enero de 2025.
- Toma de información de campo y cargue en el aplicativo SIG-PAV, de la evaluación del estado de pavimentos flexibles en la red vial a cargo, SIG-PAV.
- Toma de información de campo para actualización del informe trimestral del periodo octubre - diciembre de 2024. Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 45			

Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con carácter URGENTE habilitar el encole (actualmente obstruido) del box coulvert localizado en el PR8+0268 de la vía 55NS09, con el fin de prevenir afectación al flujo vehicular cuando ocurran lluvias en el sector, por flujo de lodos y material del talud superior sobre la calzada.

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 18 de 45					

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 19 de 45					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 20 de 45			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJA CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJA CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJA CORONACION (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



SEÑALIZACION (ANTES)



SEÑALIZACION (DURANTE)



SEÑALIZACION (DESPUES)



SEÑALIZACION (ANTES)



SEÑALIZACION (DURANTE)



SEÑALIZACION (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 23 de 45			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



PARCHEO (ANTES)

PARCHEO (DURANTE)

PARCHEO (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CALZADAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CALZADAS (DESPUES)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07	01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 24 de 45		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024

		
VIGILANCIA 55NS09	VIGILANCIA 55NS09	VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09	VIGILANCIA 55NS09	VIGILANCIA 55NS09
-------------------	-------------------	-------------------

RETIRO DE ARBOL (ANTES)	RETIRO DE ARBOL (DURANTE)	RETIRO DE ARBOL (DESPUES)
-------------------------	---------------------------	---------------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 27 de 45					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024

		
VIGILANCIA (5507)	VIGILANCIA (55NSA)	VIGILANCIA (70NSA06-1)
		
VIGILANCIA (5507)	VIGILANCIA (55NSA)	VIGILANCIA (70NSA06-1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
			FECHA	DIA	MES
	07	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 30 de 45					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 31 de 45			

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



RETIRO DE SEÑAL (ANTES)



RETIRO DE SEÑAL (DURANTE)



RETIRO DE SEÑAL (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



PINTURA DE RESALTOS (ANTES)



PINTURA DE RESALTOS (DURANTE)



PINTURA DE RESALTOS (DESPUES)



PINTURA DE RESALTOS (ANTES)



PINTURA DE RESALTOS (DURANTE)



PINTURA DE RESALTOS (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DIA	MES
				07	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		AÑO 2025		

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 34 de 45			

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



DESPEJE DE SEÑALES (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALES (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALES (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				07	01
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 37 de 45		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO ORIENTAL DE CUCUTA
APOYO A LA SUPERVICION



Toma de información en campo en la vía 55NSA, del estado del pavimento para el SIG- PAV

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER
APOYO A LA SUPERVICION



Actividad de recuperación y limpieza de calzada, obstruida por material proveniente de acceso a instalación de laboratorio de minería de la UFPS. PR 5 + 0500 VÍA 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 38 de 45			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
APOYO A LA SUPERVISION

<p>Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.</p> <p>Se realizan actividades de movimiento de tierra para estabilización del talud superior y habilitación del encole y del box coulvert en el sitio crítico del PR 8 + 0280</p>
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
				07	01
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 39 de 45		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
 Se realizan actividades de movimiento de tierra para estabilización del talud superior y habilitación del encole y del box coulvert en el sitio crítico del PR 8 + 0280

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 40 de 45			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



DT NSA Departamento: Norte de Santander Municipio: Los Patios Tipo de cierre: Cierre preventivo en la calzada derecha. Código vía: 55NSA Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta PR inicial: PR 0 + 0450 PR final: PR 0 + 0450 *Descripción del evento: Novedad por presencia de un artefacto tipo granada, en la zona de berma en la margen de la calzada derecha. Rutas alternas no hay Tipo de evento: Novedad por orden público: presencia de artefacto explosivo en zona de vía nacional. Plan de acción: * La zona es señalizada preventivamente. Hace presencia la fuerza pública y es detonado el artefacto por personal especializado. No se afecta la infraestructura vial nacional.
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DIA	MES
				07	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024 VERSION 1.0 Página 41 de 45		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Fecha: 30/12/2024. Hora: 8:52 am
DT NSA
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Los Patios
Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda
Código vía: 55NSA
Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta
PR inicial : PR 3 + 0300
PR final: PR 3 + 0300
*Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque, - motocicleta , sentido Cúcuta - Los Patios, con saldo de un lesionado.
Rutas alternas N/A
Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque .vehiculo tipo automóvil - motocicleta.
Plan de acción : Es atendido .por el servicio de atención al usuario SAU- GVI,, hace presencia tránsito de Villa del Rosario.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPPS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE ROCERIA.



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

**55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA).
INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO
SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD
DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)**

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO
DE MANOS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE
SEGURIDAD



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 26		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		07	01	2025	
		CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0				
	Página 45 de 45				

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST
ADMINISTRACION VIAL
OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1

 <p>3 ene. 2025 9:24:37 a. m. 8.04732539N 72.4103113W #PR17 #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09</p>	 <p>3 ene. 2025 12:13:10 p. m. 7.98406310N 72.44323982W #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09 #PR8+250</p>	 <p>3 ene. 2025 9:40:01 a. m. 8.09798025N 72.38265362W #PR25+200 #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09</p>
INSPECCION CORRECTO USO DE EPPS	ACOMPANAMIENTO ACTIVIDADES EN LA VIA	ACOMPANAMIENTO EN LA SEÑALIZACION VIAL
 <p>3 ene. 2025 9:49:13 a. m. 8.09416343N 72.38424611W #PR24+800 #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09</p>	 <p>3 ene. 2025 9:38:46 a. m. 8.0779566N 72.38298636W #PR25+200 #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09</p>	 <p>3 ene. 2025 10:21:01 a. m. 8.04801172N 72.409994703W #PR19+107 #CONSORCIO VIAS 2024 #RUTA 55NS09</p>
SEGUIMIENTO A SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS	SEGUIMIENTO A SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS	INSPECCION EXTINTOR
 <p>31/12/2024 12:10 p.m. 7.8338N 72.4928 W #VIA 55NSA #PR 2+800 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	 <p>03 ENERO 2025 1:31:37 p.m. 7.8701N 72.4788W #VIA 55NSA #PR 7+250 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	 <p>3 ene. 2025 8:04:26 a. m. 7.92535951N 72.48617419W Norte de Santander #CONSORCIO VIAS 2024</p>
INSPECCION CORRECTO USO DE EPPS	INSPECCION CORRECTO USO BARRERA DE SEGURIDAD	SEGUIMIENTO AL PREOPERACIONAL VEHICULOS



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-01-13 15:46:35

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 27 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-003215

Fecha Radicación: 2025-01-13 15:56:40

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene
Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco
Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-021-25 Entrega Informe Semanal No.27**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 27.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 27, correspondiente al período del 6 al 12 de enero 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 27 (49) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
		Contrato No. 1999 de 2024			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 1 de 49					

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 27

PERIODO: DEL 6 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 2 de 49					

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 6 DE ENERO DE 2025	AL 12 DE ENERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	193 DIAS	% TIEMPO: 25,50%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL			
			No. 27			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO	
			13	01	2025	
				Contrato No. 1999 de 2024		
				VERSION 1.0		
		Página 3 de 49				

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

Avenida del río 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Río – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 4 de 49			

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 101 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 15,19%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR7+0400 al PR 12 + 0000.
- Poda de árboles: Del PR0+0000 al PR12+0000
- Limpieza de cunetas: Del PR0+0000 al PR8+0000.
- Limpieza de calzada: Del PR0+0000 al PR18+0000.
- Instalación de señales verticales: Del PR1+0000 al PR6+0310.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR0+0000 al PR2+0500
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 5 de 49					

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIAAV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante esta semana se terminó la ejecución de la demarcación horizontal de líneas de borde y línea discontinua central en la calzada izquierda entre el PR0+0000 al PR18+0000 y en los sectores faltantes en la calzada derecha.
- Se dio inicio a los trabajos de construcción de cuneta y dissipador para el drenaje de las aguas lluvias en el sector del PR4+0050, margen de la calzada derecha.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 6 de 49					

SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 101 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 15,19 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

Avenida del río 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Río – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 7 de 49			

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de dissipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 236 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 29,50%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR0+0000 al PR5+0600.
- Limpieza de calzada: Del PR0+0000 al PR5+0600.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR5+0600.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR5+0600.
- Rocería: Del PR0+0000 al PR6+0000.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR0+0000 al PR4+0000.
- Limpieza de zanjas de coronación: Del PR1+0000 al PR4+0000.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR0+0000 al PR1+0500.
- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		13	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 8 de 49						

• Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REAHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Se terminaron de realizar actividades de excavación para construcción de cunetas en concreto, instalación de formaleta, parrilla de refuerzo y fundida con concreto premezclado, en la margen derecha e izquierda entre el PR0+0460 al PR0+0700 en ambas márgenes.
- Se realizan actividades para el recalce con concreto ciclópeo del pontón localizado en el PR 15+0527.
- Se realizan actividades de excavación para construcción de cunetas en concreto, instalación de formaleta, parrilla de refuerzo y fundida con concreto premezclado, en la margen derecha e izquierda entre el PR 0 + 0460 al PR0+0700 Ambas márgenes.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL- DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Avenida del río 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Río – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL			
			No. 27			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO	
			13	01	2025	
				Contrato No. 1999 de 2024		
				VERSION 1.0		
		Página 9 de 49				

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Se continúan las actividades de atención de sitio critico en el PR8+0268 de la vía 55NS09 Cúcuta-Dos Ríos-San Faustino-La China.
- Se realizó movimiento del material deslizado del talud superior y que había originado la colmatación del box coulvert localizado en el sitio. De esta manera se habilita la obra para el drenaje de las aguas lluvias del talud superior.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			13	01	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
	VERSION 1.0				
Página 10 de 49					

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 101 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 15,19%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 101 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 15,19%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR20+0200 al PR33+0500
- Limpieza de cunetas: Del PR17+0050 al PR21+0400.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR17+0050 al PR21+0400.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR 17 + 0050 al PR21+0400.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
		Contrato No. 1999 de 2024			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 11 de 49					

- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR14+0000 al PR24+0200.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR14+0000 al PR24+0000.
- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Durante esta semana no se realizaron actividades en este sector.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invias (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 27			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES	AÑO
			13	01	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
		Página 12 de 49			

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E-VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

En inspección a la vía nacional 55NSA - Anillo Vial Oriental de Cúcuta, donde se desarrolla por parte de la Constructora Serranova S.A.S. una obra nueva localizada entre el PR11+0250 al PR 11+0350 en la margen de la calzada derecha, con licencia de urbanismo y licencia de construcción del Municipio de Villa del Rosario, se observa que se ha intervenido el descole de la obra de drenaje, perteneciente a la infraestructura vial nacional que se localiza en el PR11+0341.

Esta intervención que ha implicado en el encerramiento lateral y cerramiento de la parte superior de la caja de salida del box couvert y adicionalmente en el taponado y eliminación del descole que existía como drenaje natural en el predio, afectando el drenaje de las aguas lluvias de la vía nacional y afectando la estabilidad de la infraestructura vial por el represamiento de las lluvias que se genera y con la alta probabilidad de afectación a los predios y a la comunidad del sector por posible desbordamiento de aguas lluvias en época de invierno.

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-188-24 de fecha 19/12/2024 con copia a la Territorial del Invías se solicitó a la Alcaldía de Villa del Rosario hacer, como autoridad en el sector realizar la gestión ante el propietario de la obra en ejecución, con el fin de que se garantice la continuación del descole para el drenaje natural de las aguas lluvias del sector y adicionalmente se adecue la caja de salida del box couvert de tal manera que quede abierta, con el fin de poder realizar por parte del Invías el mantenimiento y limpieza rutinario para garantizar su normal funcionamiento.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL				
				No. 27				
	FECHA	DIA	MES	AÑO				
		13	01	2025				
	CONSORCIO VÍAS 2024				Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION				VERSION 1.0			
VIAL				Página 13 de 49				

1. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NSA, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas correctas en el manejo de las herramientas de trabajo.
2. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NSA y 70NS06-1.
3. Sensibilización sobre los riesgos por el uso del celular, a través de infografía.
4. Inspección inventario de herramientas del vehículo de la oficina, placa EHQ 609.
5. limpieza y seguimiento al preoperacional de los vehículos de la oficina.
6. Entrega de Dotación colaboradores Consorcio Vías 2024.
7. Durante la semana, se reportó un accidente de trabajo que involucró a un cooperado de la Cooperativa Tonchala, se realizó el seguimiento correspondiente a la ruta de emergencia, la atención médica inmediata y el trámite de las incapacidades, los cuales fueron gestionados por el inspector SST de las cooperativas.
8. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
9. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, realización de pausas activas, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, y las charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
10. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
11. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 06 al 12 de enero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR13+0600

PR final: PR13+0600.

Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 14 de 49					

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

4.2 Vía 70NS06-1 Cúcuta-Puente Binacional Tienditas.

Fecha: Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 55NSA

Sector: Cúcuta-Puente Binacional Tienditas.

PR inicial: PR1+0280

PR final: PR1+0280

Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Binacional Tienditas.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

4.3 Vía 5507 Cúcuta-Puerto Santander.

Fecha: Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Puerto Santander.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta-Puerto Santander.

PR inicial: PR53+0680

PR final: PR 53+0680.

Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Unión - Pedro de Hevia.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 08/01/2025. Hora: 8:23 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda.

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				13	01
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 15 de 49		

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR8+0900

PR final: PR8+0900

Descripción del evento: Accidente de tránsito por volcamiento de motocicleta, sentido Cúcuta - Los Patios, con saldo de un lesionado leve.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por volcamiento de vehículo tipo motocicleta, al perder el control del vehículo por tratar el conductor de evadir un retén de tránsito de Villa del Rosario.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI, hace presencia tránsito de Villa del Rosario.

4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 10/01/2025. Hora: 14:38 pm

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 12 + 0400

PR final: PR 12 + 0400

Descripción del evento: Accidente de tránsito de choque de motocicleta - tractocamión, sentido Los Patios -Cúcuta, con saldo de un lesionado.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por choque de vehículo tipo motocicleta que impacta con un tractocamión cuyo conductor frena bruscamente, quedando la motorizada lesionada en sus dos manos.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI.

4.6 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 10/01/2025. Hora: 18:30 pm

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril derecho de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR14+0830.

PR final: PR14+0830.

Descripción del evento: Accidente de tránsito de salida de la vía de automóvil, sentido Los Patios -Cúcuta, sin saldo de lesionados. Solo daños materiales.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por salida de la vía de vehículo tipo automóvil cuyo conductor pierde el control al invadir el otro carril por exceso de velocidad.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI,

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 27			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			13	01	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
		Página 16 de 49			

5. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO.

Se realizó la recopilación ante las Secretarías de Tránsito de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, al Corregidor de San Faustino y al Consorcio NSA 2024, de la copia de los registros y reportes de accidentalidad ocurrida durante el período del 1 al 31 de diciembre, en la red vial a cargo de esta Administración Vial.

Se realizó la toma de información de campo de los eventos ocurridos.

Se prepara el respectivo informe para la Territorial y Planta Central.

6. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I- VBOG- 060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I- VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

7. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

8. TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024.

Para dar cumplimiento al compromiso contractual de la entrega por parte de la Administración Vial, relacionado con el informe trimestral del periodo octubre - diciembre de 2024, se viene realizando la toma de información de campo y la actualización de información correspondiente.

9. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP – SIPUCOL

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 17 de 49			

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08- 2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

10. ENTREGA DE PLEGABLES ALUSIVOS A LAS VÍAS.

Se viene realizando la entrega a las autoridades con jurisdicción en las vías a cargo, del plegable alusivo a la Ley 1228 de 2008, referente a la reglamentación vigente de zona de reserva o zona de retiro obligatorio en las vías nacionales.

Lo anterior para la socialización con las comunidades de cada jurisdicción.

11. INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE OBSTÁCULOS EN LA VÍA 55NSA.

A través del ítem de insumos del contrato de Administración Vial, se viene realizando con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario TONCHALÁ, la instalación de señales tipo delineadores de obstáculos, en el separador de la doble calzada en los sitios de retorno.

Lo anterior para mejorar la señalización preventiva a los usuarios de la vía y para prevenir la ocurrencia de accidentalidad en el sector.

12. DEMARCACIÓN DE REFERENCIACIÓN VIAL EN LA CALZADA.

Se dio inicio a la pintura de la referenciación vial en la calzada, cada 50 metros, con pintura tráfico amarillo.

Lo anterior para referenciar con precisión, el trabajo que se realiza de levantamiento de información para el SIG - PAG.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			13	01	2025
				Contrato No. 1999 de 2024	
			VERSION 1.0		
		Página 18 de 49			

- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP- SIPUCOL.
- Recopilación de reportes de accidentalidad del mes de diciembre y toma de información de campo, para ejecución del respectivo informe.
- Toma de información de campo y cargue en el aplicativo SIG-PAV, de la evaluación del estado de pavimentos flexibles en la red vial a cargo, SIG-PAV.
- Toma de información de campo para actualización del informe trimestral del periodo octubre - diciembre de 2024.
- Entrega de plegables alusivos a la Ley 1228 de 2008.
- Instalación de señales tipo delineadores de obstáculos en sitios de retorno en el separador de la doble calzada de la vía 55NSA.
- Actividad de demarcación de referenciación vial en la calzada, en las vías a cargo.
- Toma de información de campo para actualización del informe trimestral del periodo octubre - diciembre de 2024. Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:


Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con carácter URGENTE habilitar el encole (actualmente obstruido) del box couvert localizado en el PR8+0268 de la vía 55NS09, con el fin de prevenir afectación al flujo vehicular cuando ocurran lluvias en el sector, por flujo de lodos y material del talud superior sobre la calzada.

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box couvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
 Administración vial Grupo 2
 Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 19 de 49		

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
			FECHA	DIA	MES
	13	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 20 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA(ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES
			13	01
				2025
			Contrato No. 1999 de 2024	
			VERSION 1.0	
			Página 21 de 49	

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON
(DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON
(DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
			FECHA	DIA	MES
	13	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 22 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS (ANTES)



SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS (DURANTE)



SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS (DESPUES)



MARCACION VIAL (ANTES)



MARCACION VIAL (DURANTE)



MARCACION VIAL (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				13	01
			AÑO		
			2025		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 24 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			13	01
		AÑO		
		2025		
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 25 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETA
(ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA
(DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA
(DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA
(ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA
(DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA
(DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 27		
				FECHA	DIA	MES
	13	01	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
				Página 26 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



DESPEJE DE RAMAS Y LIMPIEZA
(ANTES)



DESPEJE DE RAMAS Y LIMPIEZA
(DURANTE)



DESPEJE DE RAMAS Y LIMPIEZA
(DESPUES)



LIMPIEZA DE LINEA (ANTES)



LIMPIEZA DE LINEA (DURANTE)



LIMPIEZA DE LINEA
(DESPUES)



ROCERIA (DESPUES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



DESPEJE DE SEÑAL VIAL (ANTES)



DESPEJE DE SEÑAL VIAL (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑAL VIAL (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)



CAMBIO DE SEÑALES (DESPUES)



CAMBIO DE SEÑALES (DURANTE)



CAMBIO DE SEÑALES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 28 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (5507)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		13	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
				Página 30 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTE (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ESCOLE(ANTES)



LIMPIEZA DE ESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)




LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024

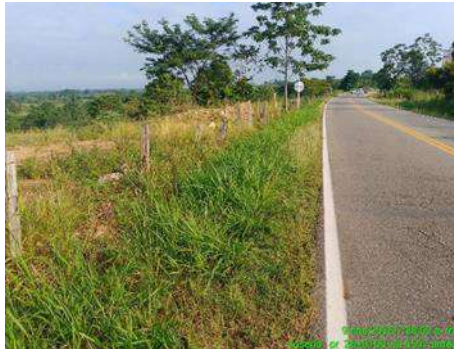

ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)



MARCACION VIAL (ANTES)



MARCACION VIAL (DURANTE)



MARCACION VIAL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			FECHA	DIA	MES
					13	01
						AÑO
			2025			
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 32 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507




VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 33 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA
APOYO A LA SUPERVISION

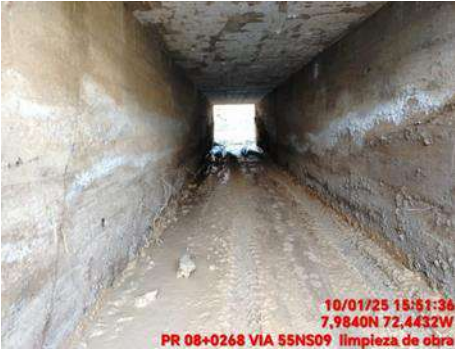 <p>10/01/25 12:52:12 7.9838N 72.4431W PR 08+0268 VIA 55NS09 limpieza de obra</p>	 <p>10/01/25 12:51:40 7.9839N 72.4431W PR 08+0268 VIA 55NS09 limpieza de obra</p>	 <p>10/01/25 12:55:54 7.9839N 72.4431W PR 08+0268 VIA 55NS09 limpieza de obra</p>
 <p>10/01/25 15:52:30 PR 08+0268 VIA 55NS09 limpieza de obra</p>	 <p>10/01/25 15:51:34 7.9840N 72.4432W PR 08+0268 VIA 55NS09 limpieza de obra</p>	

<p>Actividades en ejecución contrato 4365/2024.</p> <p>Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.</p> <p>Se realizó habilitación del box coulvert para el drenaje de aguas lluvias del talud superior</p>
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				13	01
			AÑO		
			2025		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 34 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

APOYO A LA SUPERSION



Actividades en ejecución contrato 3262/2024.

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

Registro de los trabajos realizados de recalce del pontón del PR 15 + 0527 de la vía 55NS09

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 35 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024.

Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Actividades de demarcación horizontal, de líneas de borde y línea discontinua central en la calzada izquierda, vía 55NSA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			13	01
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 36 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024.

Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Inicio de trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL				
		No. 27				
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		13	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 37 de 49				

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.



4.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha : Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial : PR 13 + 0600

PR final: PR 13 + 0600 .

*Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción :* Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES
			13	01
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 38 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 70NS06-1 CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS.

Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.



4.2 Vía 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas.

Fecha: Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 55NSA

Sector: Cúcuta - Puente Binacional Tienditas.

PR inicial: PR1+0280

PR final: PR1+0280.

*Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Binacional Tienditas.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			13	01
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 39 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.



4.3 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.

Fecha: Desde el día viernes 10 de enero a las 6:00 am, hasta el día 12 de enero a las 24 horas.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Puerto Santander.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

PR inicial: PR53+0680

PR final: PR53+0680.

*Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Unión - Pedro de Hevia.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 40 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 08/01/2025. Hora: 8:23 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR8 + 0900

PR final: PR8 + 0900

*Descripción del evento: Accidente de tránsito por volcamiento de motocicleta, sentido Cúcuta - Los Patios, con saldo de un lesionado leve.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por volcamiento de vehiculo tipo motocicleta, al perder el control del vehículo por tratar el conductor de evadir un retén de tránsito de Villa del Rosario.


Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI, hace presencia tránsito de Villa del Rosario.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 41 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

ACCIDENTE

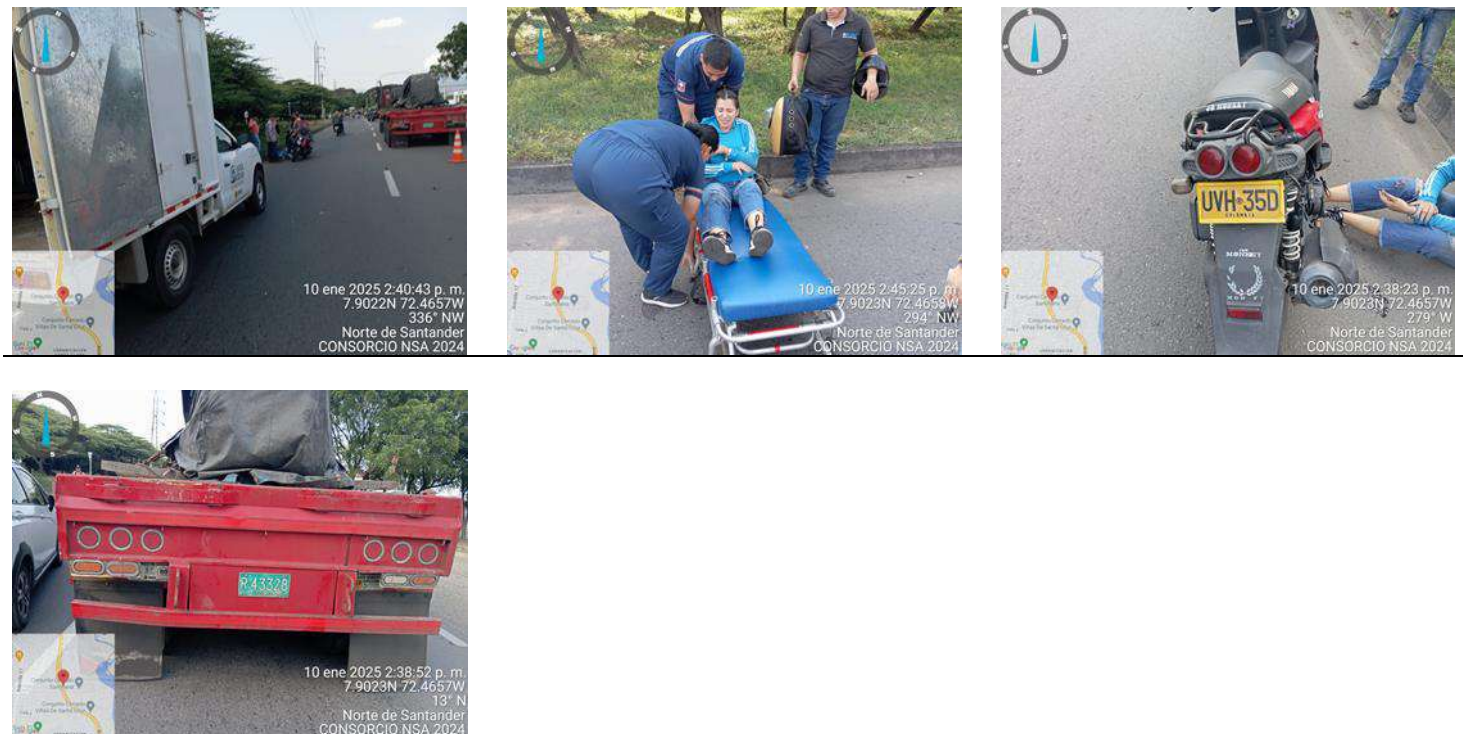

4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 10/01/2025. Hora: 14:38 pm

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 12 + 0400

PR final: PR 12 + 0400

*Descripción del evento: Accidente de tránsito de choque de motocicleta - tractocamión, sentido Los Patios - Cúcuta, con saldo de un lesionado

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por choque de vehiculo tipo motocicleta que impacta con un tractocamión cuyo conductor frena bruscamente, quedando la motorizada lesionada en sus dos manos.

Plan de acción : Es atendido .por el servicio de atención al usuario SAU- GVI,

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 42 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

ACCIDENTE



4.6 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 10/01/2025. Hora: 18:30 pm

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril derecho de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 14 + 0830.

PR final: PR 14 + 0830.

*Descripción del evento: Accidente de tránsito de salida de la vía de automóvil, sentido Los Patios - Cúcuta, sin saldo de lesionados, Solo daños materiales.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por salida de la vía de vehículo tipo automóvil cuyo conductor pierde el control al invadir el otro carril por exceso de velocidad.

Plan de acción: Es atendido. por el servicio de atención al usuario SAU- GVI,

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 43 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



7 ene 2025 6:44:26 a.m.
8.0647N 72.4061W
Cooperativa La Samaria
(Inspección De Herramientas)



7 ene 2025 6:48:11 a.m.
8.0648N 72.4060W
Cooperativa La Samaria
(Lavado de Manos)



7 ene 2025 6:46:51 a.m.
8.0647N 72.4060W
Cooperativa La Samaria
(Inspección de EPPS)

SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS

SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS

SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPPS



7 ene 2025 6:46:08 a.m.
8.0647N 72.4060W
Cooperativa La Samaria
(Inspección de Vehículo)



7 ene 2025 7:03:01 a.m.
8.0647N 72.4061W
Cooperativa La Samaria
(Pausa Activa)



7 ene 2025 7:02:21 a.m.
8.0647N 72.4061W
Cooperativa La Samaria
(Charla de Seguridad)

SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO

SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS

SEGUIMIENTO CHARLA SST



9 ene 2025 8:57:29 p.m.
7.9452N 72.4690W
VIA 55NS09 PR 03+0900
ROCERIA (DURANTE)



10 ene 2025 10:40:37 a.m.
7.9452N 72.4652W
por 04+0553 via 55NS09 limpieza de descarte durante



9 ene 2025 9:19:17 a.m.
7.9452N 72.4687W
VIA 55NS09 PR 00+6700
SEÑALIZACION (DURANTE)

SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS

SEGUIMIENTO SEÑALIZACION SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES
			13	01
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 44 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST
SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				13	01
			AÑO		
			2025		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 45 de 49		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICA



SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO

SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS

SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS

SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS

SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 46 de 49			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVIDADES EN LA VIA



ACOMPAÑAMIENTO EN LA
SEÑALIZACION VIAL



INSPECCION CORRECTO USO
DE EPPS



SEGUIMIENTO AL
PREOPERACIONAL
VEHICULOS



SEGUIMIENTO A
SEÑALIZACION SITIOS
CRITICOS



INSPECCION EXTINTOR



INSPECCION CORRECTO USO
DE SEÑALIZACION EN
ACTIVIDADES





SEGUIMIENTO A
SEÑALIZACION SITIOS
CRITICOS





INSPECCION CORRECTO USO
DE SEÑALIZACION EN
ACTIVIDADES

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
		Contrato No. 1999 de 2024			
	CONSORCIO VÍAS 2024		VERSION 1.0		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Página 47 de 49			


REGISTRO DE REPORTES DE ERROR EN SINCRONIZACION E INICIO DE SESION APLICATIVO SIGPAV 9 ENERO 2024

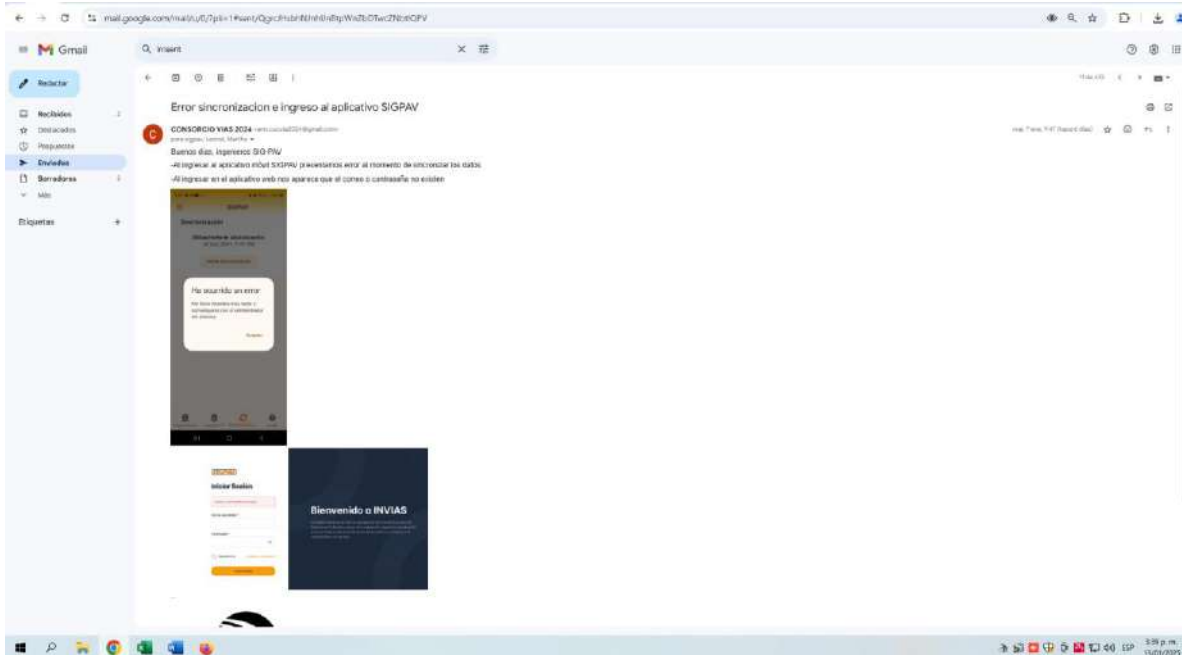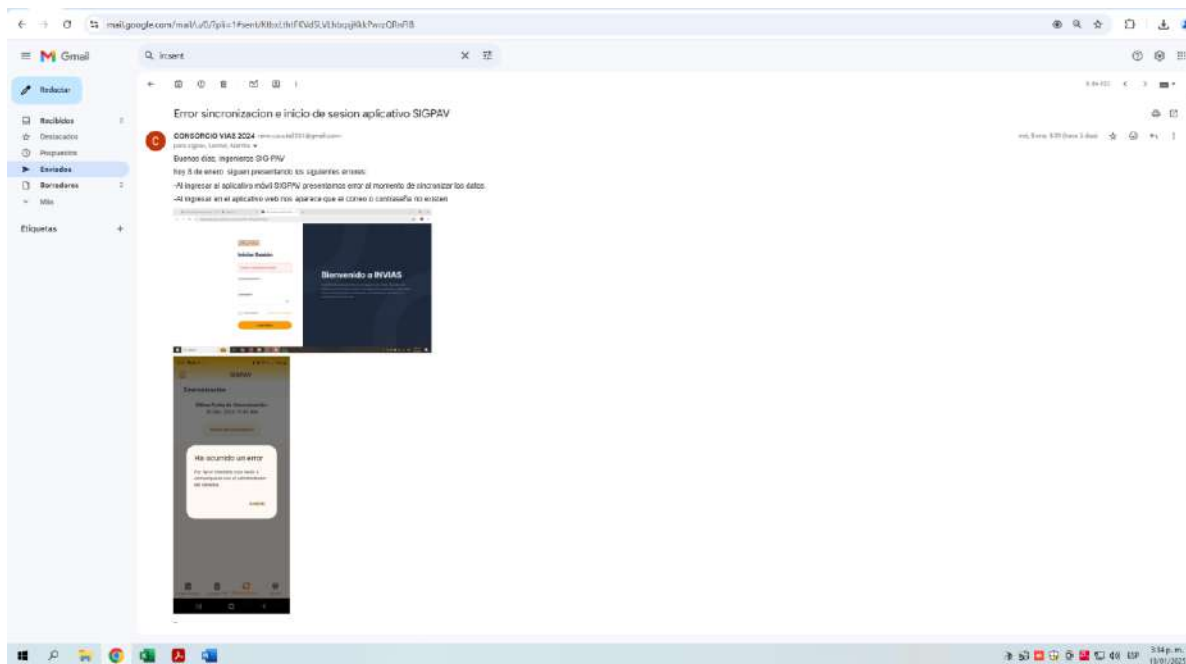

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 27		
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES	AÑO
			13	01	2025
		INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024	
			VERSION 1.0		
		Página 48 de 49			

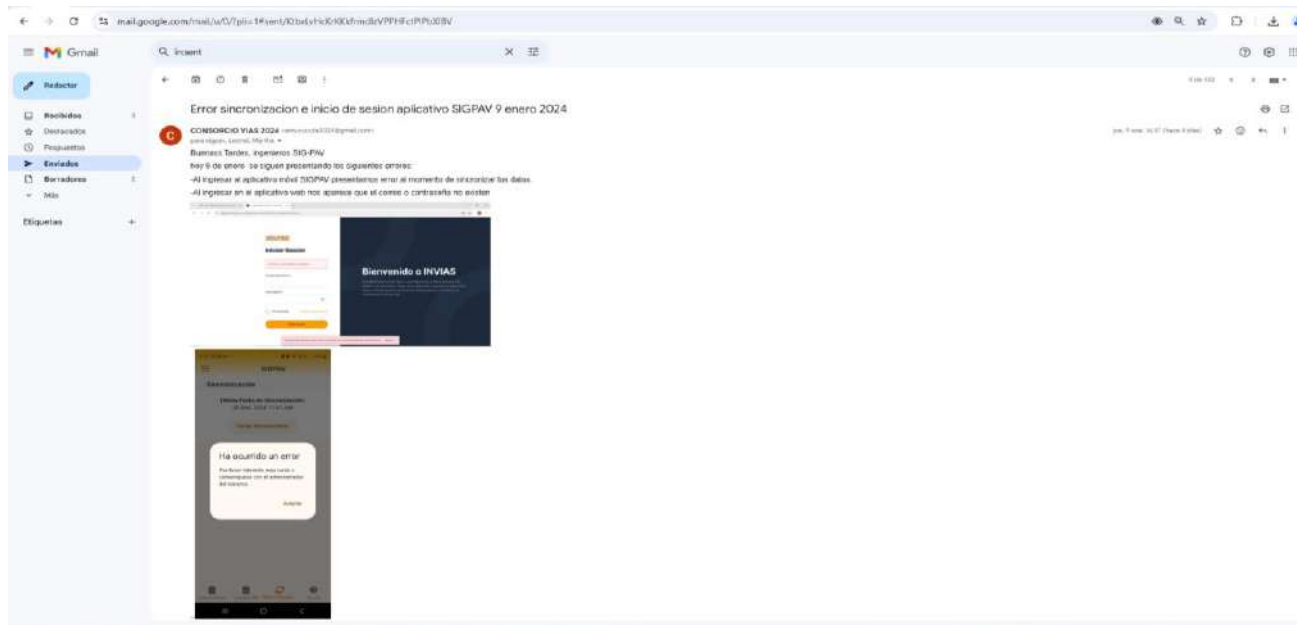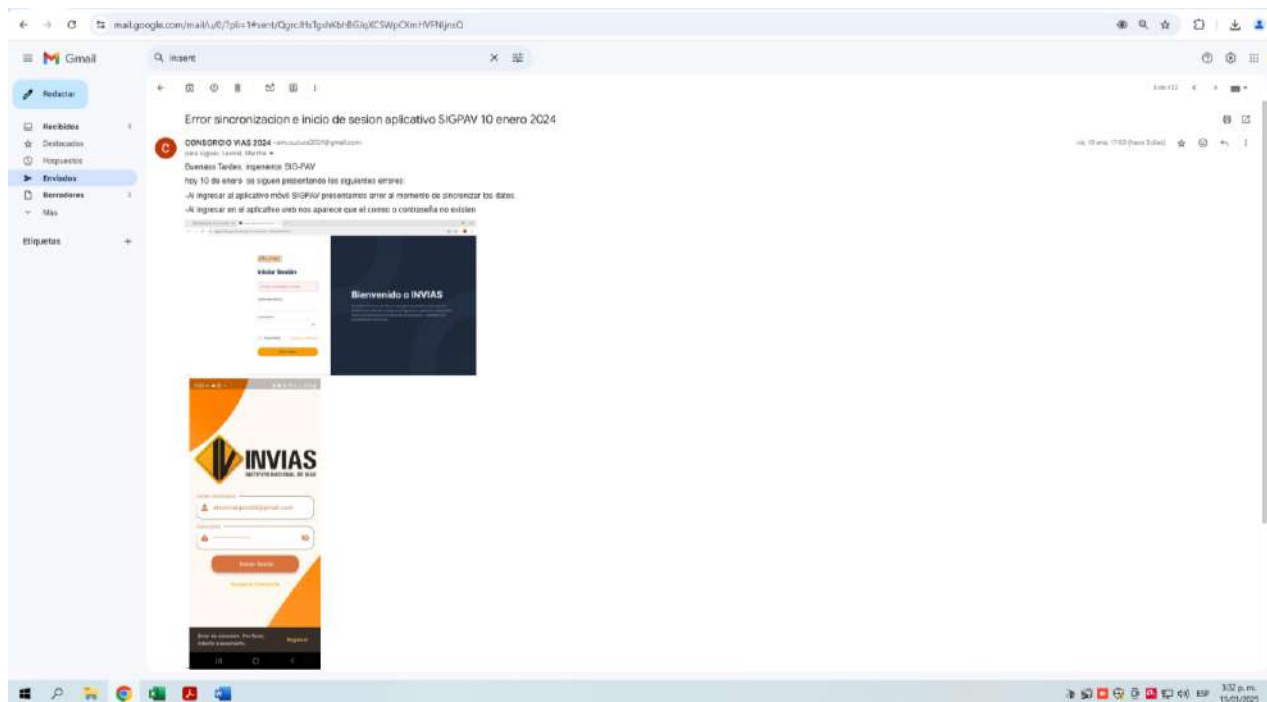

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 27			
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		13	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 49 de 49			

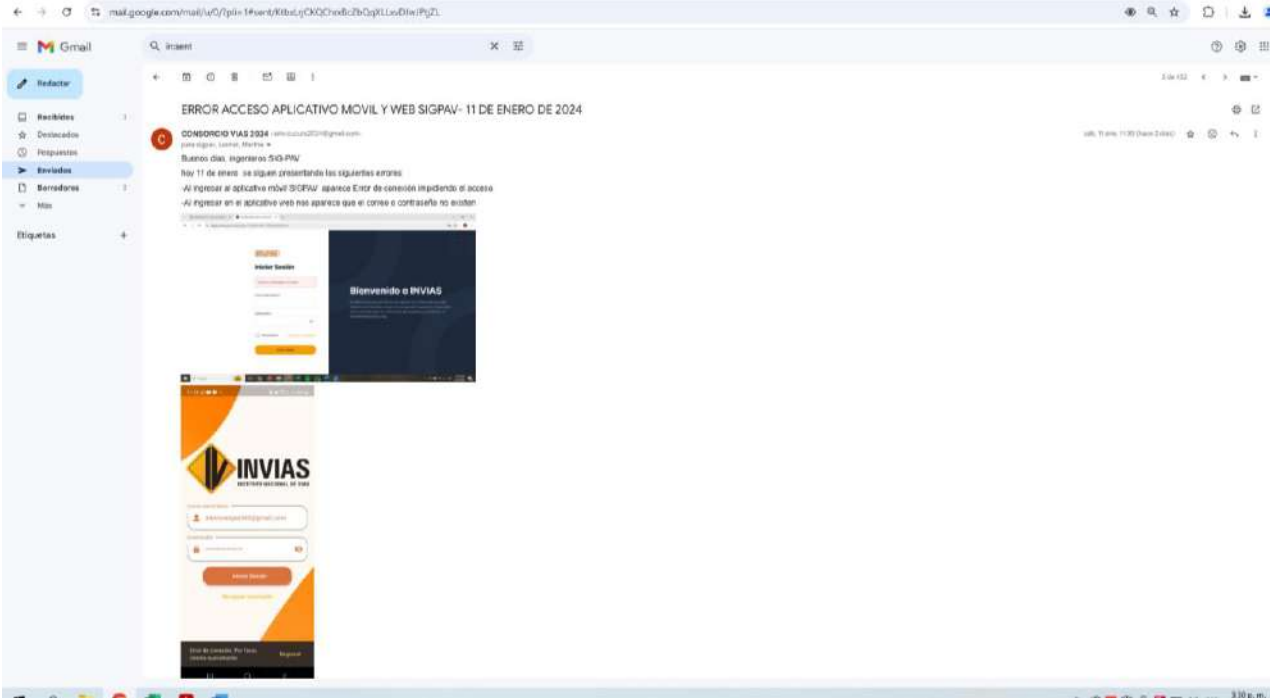



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-01-20 17:05:03

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 28 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-005856

Fecha Radicación: 2025-01-21 08:24:38

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene
Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco
Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-028-25 Entrega Informe Semanal No.28**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 28.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 28, correspondiente al período del 13 al 19 de enero 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 28 (53) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 1 de 53					

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 28

PERIODO: DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 28		
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES
			20	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024	
		VERSION 1.0		
		Página 2 de 53		

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 13 DE ENERO DE 2025	AL 19 DE ENERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	200 DIAS	% TIEMPO: 26,42%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024**

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 3 de 53					

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

Avenida del rio· 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771 Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 4 de 53					

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 108 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 16,24%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR12+0000 al PR18+0160.
- Poda de árboles: Del PR12+0000 al PR14+0000.
- Instalación de señales verticales: Del PR6+0310 al PR18+0100. (Marcadores de obstáculos)
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR2+0500 al PR11+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR12+0000 al PR18+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR12+0000 al PR18+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

- Reglamentación ambiental contractual.
- Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 28		
		FECHA	DIA	MES
	20		01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL	VERSION 1.0			
	Página 5 de 53			

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUA CLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR4+0050, margen de la calzada derecha e inicio de la misma actividad en la margen de la calzada izquierda.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 6 de 53					

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 108 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 16,24 %

Actividades realizadas en la semana:

- Rocería: Del PR0+0000 al PR1+0200.
 - Limpieza de calzada: Del PR0+0000 al PR1+0200.
 - Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR1+0200.
 - Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR1+0200.
 - Limpieza de puentes: PR1+0083.
 - Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
- Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

- 1+0732:** Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.
- 5+0354:** La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.
- 8+0268:** Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.
- 8+0300 AL 8+0400:** talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.
- 9+0200 AL 9+0400:** Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.
- 9+0650 AL 9+0700:** talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 7 de 53			

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 243 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 30,38%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR5+0600 al PR13+0800.
- Limpieza de calzada: Del PR16+0200 al PR16+0300.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR5+0600 al PR13+0800.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR5+0600 al PR13+0800.
- Rocería: Del PR6+0000 al PR17+0000.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR4+0000 al PR12+0000.
- Limpieza de zanjas de coronación: Del PR4+0000 al PR13+0800.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR1+0500 al PR3+0450.
- Bacheo con material de fresado: Del PR14+0300 al PR14+0400.
- Poda de árboles: Del PR20+0000 al PR27+0000.

• La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 8 de 53					

- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REAHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realizan actividades de habilitación de la tubería de la alcantarilla en el PR5+0354.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL- DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 9 de 53					

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 108 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 16,24%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR14+0000.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 10 de 53					

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 108 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 16,24%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR33+0500 al PR48+0500.
- Limpieza de cunetas: Del PR21+0400 al PR25+0350.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR21+0400 al PR21+0350.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR21+0400 al PR21+0350.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR14+0000 al PR24+0200.
- Limpieza de berma: Del PR38+0800 al PR39+0400 y del PR44+0800 al PR45+0222.
- Arreglo de señales verticales y despeje: Del PR 23 + 0650 al PR24+0750.

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 11 de 53		

- Reglamentación ambiental contractual.
- Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023
Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER
Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024
Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.
Fecha de inicio: 14/11/23
Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Durante esta semana no se realizaron actividades en este sector.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG--061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

Por lo anterior mediante el oficio AV- C1999- 108- 24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E - VUVRAZ- 100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 12 de 53			

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA EN LAS VÍAS 55NSA Y 5505B.

El día jueves 16 de enero en horario 9 am a 10:30 am, se participó en el salón de juntas de la Alcaldía de Cúcuta, en la reunión programada con asistencia del secretario Privado de la Alcaldía, funcionarios de la secretaria de Gobierno, de la secretaria de Infraestructura, el Ing. director del Invías, funcionarios de la Territorial del Invías, personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se socializó la afectación que se presenta por invasiones y daño de la infraestructura vial nacional en la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, en las vías nacionales con jurisdicción del municipio de Cúcuta, específicamente en los anillos viales Oriental y Occidental.

Se establecieron acciones a realizar tanto por el Invías como por las autoridades municipales y se programó una reunión de seguimiento a las acciones y gestiones priorizadas, para el próximo 6 de febrero.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 06 de enero hasta el 12 de enero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NSA, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas correctas en el manejo de las herramientas de trabajo.
2. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NSA y 70NS06-1.
3. Sensibilización sobre los riesgos por el uso del celular, a través de infografía.
4. Inspección inventario de herramientas del vehículo de la oficina, placa EHQ 609.
5. limpieza y seguimiento al preoperacional de los vehículos de la oficina.
6. Entrega de Dotación colaboradores Consorcio Vías 2024.
7. Durante la semana, se reportó un accidente de trabajo que involucró a un cooperado de la Cooperativa Tonchala, se realizó el seguimiento correspondiente a la ruta de emergencia, la atención médica inmediata y el trámite de las incapacidades, los cuales fueron gestionados por el inspector SST de las cooperativas.
8. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
9. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, realización de pausas

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 13 de 53		

activas, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, y las charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.

10. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
11. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO

Durante el período del 13 al 19 de enero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.

Fecha: 15/10/2025 Hora: 6:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre parcial.

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

PR inicial: PR15+0600

PR final: PR15+0600.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque entre buseta y motocicleta, sector Oripaya.

Rutas alternas No aplica.

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque entre un vehículo de transporte urbano (buseta) y una motocicleta. Como consecuencia del accidente se presenta 2 víctimas: fallece el conductor de la motocicleta y un herido grave (pasajera de la moto). Hace presencia personal de la microempresa Microcolma de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realizó señalización y manejo de tránsito en el sitio. Hizo presencia autoridades de tránsito y judiciales de Cúcuta. La herida fue trasladada a un centro asistencial.

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 14/01/2025. Hora: 8:08 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril derecho de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR14+0350.

PR final: PR 14+0350.

Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo buseta, sentido Los Patios - Cúcuta, sin saldo de lesionados.

Rutas alternas N/A

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 14 de 53					

Tipo de evento: Accidente por salida de vehículo de la vía y posterior volcamiento, al perder el conductor el control del vehículo (buseta), por exceso de velocidad. El vehículo transitaba sin pasajeros.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI.

4.3 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 14/01/2025. Hora: 8:08 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril derecho de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR14+0350.

PR final: PR14+0350.

Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo buseta, sentido Los Patios - Cúcuta, sin saldo de lesionados.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por salida de vehículo de la vía y posterior volcamiento, al perder el conductor el control del vehículo (buseta), por exceso de velocidad. El vehículo transitaba sin pasajeros.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI.

4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 18/01/2025. Hora: 19:18.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios.

Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR0+0250.

PR final: PR0+0250.

Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo motocicleta, sentido Cúcuta - Los Patios. sin saldo de lesionados.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente por salida de vehículo de la vía, al perder el conductor el control del vehículo (motocicleta), por exceso de velocidad.

Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI. Policía de Los Patios.

5. ENTREGA DEL INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE.

Mediante el oficio AV2-C1999/025/25 de fecha 27/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-005111 de fecha 17/01/2025, se hizo entrega a la Territorial y a Planta Central, del informe de accidentalidad correspondiente al periodo del mes de diciembre de 2024.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 15 de 53					

La información adicionalmente fue cargada en el aplicativo HERMES.

6. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I- VBOG- 060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

7. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

8. ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024.

Para dar cumplimiento al compromiso contractual de la entrega por parte de la Administración Vial, relacionado con el informe trimestral del periodo octubre - diciembre de 2024, mediante el oficio AV2-C1999-023-25 de fecha 15/01/2025 y radicado Invías 2025E-VNSA-004513 de fecha 16/01/2025, se realizó la entrega en medio físico a la Territorial. Igualmente, mediante correo electrónico se envió a Planta Central y a la Territorial.

9. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08- 2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 16 de 53			

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 16 de 53

10. ENTREGA DE PLEGABLES ALUSIVOS A LAS VÍAS.

Se viene realizando la entrega a las autoridades con jurisdicción en las vías a cargo, del plegable alusivo a la Ley 1228 de 2008, referente a la reglamentación vigente de zona de reserva o zona de retiro obligatorio en las vías nacionales.

Lo anterior para la socialización con las comunidades de cada jurisdicción.

11. INSTALACIÓN DE MARCADORES DE OBSTÁCULOS EN LA VÍA 55NSA.

A través del ítem de insumos del contrato de Administración Vial, se terminó de realizar con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario TONCHALÁ, la instalación de señales tipo marcadores de obstáculos (15), en el separador de la doble calzada en los sitios de retorno. Lo anterior para mejorar la señalización preventiva a los usuarios de la vía y para prevenir la ocurrencia de accidentalidad en el sector.

Mediante el oficio AV2 -C1999- 026-25 de fecha 17/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-005249 de fecha 20/01/2025, se presentó informe con el respectivo registro fotográfico a la Territorial, de esta actividad realizada.

12. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MES DE ENERO DE 2025

Mediante el oficio AV2 -C1999-022-25 de fecha 14/01/2025 y radicado Invías 2925E- VUVRAZ-003401 de fecha 14/01/2025, se presentó a la Territorial, la programación y tema de la capacitación al personal de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector, correspondiente al mes de enero.

El día sábado 18 de enero en horario de 8 am a 12 am, se desarrolló la actividad, con presencia del ING director Leonel Valero.

Se prepara el respectivo informe para la Territorial.

13. MESA DE TRABAJO ZONA CENTRO ORIENTE TEMÁTICA GRUPO 4 ESTUDIO DE MERCADO. REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES.

Personal de la Administración Vial participó en reunión virtual el día 13 de enero en horario de 2:30 pm a 4:00 pm, relacionado con MESA DE TRABAJO ZONA CENTRO ORIENTE TEMÁTICA GRUPO 4 ESTUDIO DE MERCADO. REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES.

14. PRESUPUESTOS DE NECESIDADES DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO. RESPUESTA RADICADO INVÍAS 2025S-VNSA-001535

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 53			

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 17 de 53

Atendiendo lo solicitado en el oficio radicado Invías 2025S-VNSA-001535 de fecha 14-01-2025, se presentaron los presupuestos de las necesidades de demarcación horizontal en las vías a cargo de esta Administración Vial.

1. VÍA 5507 CÚCUTA-PUERTO SANTANDER.
2. VÍA 55NS09 CÚCUTA -DOS RÍOS-SAN FAUSTINO-LA CHINA.
3. VÍA 70NS06-1 CÚCUTA -PUENTE BINACIONAL TIENDITAS.
4. VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

Mediante el oficio AV2-C1999-024-25 de fecha 16/01/2025 y radicado Invías 2024E-VUVRAZ-0044240 de fecha 16/01/2025, se presentó el respectivo informe a la Territorial

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP- SIPUCOL.
- Entrega del informe de accidentalidad del mes de diciembre de 2024.
- Toma de información de campo y cargue en el aplicativo SIG-PAV, de la evaluación del estado de pavimentos flexibles en la red vial a cargo, SIG-PAV.
- Entrega del informe trimestral del periodo octubre -diciembre de 2024.
- Entrega de plegables alusivos a la Ley 1228 de 2008.
- Instalación de señales tipo delineadores de obstáculos en sitios de retorno en el separador de la doble calzada de la vía 55NSA.
- Actividad de demarcación de referenciación vial en la calzada, en las vías a cargo.
- Programación y ejecución de capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, mes de enero/2025.
- Ejecución de presupuestos de necesidades de señalización horizontal en la red vial a cargo.
- Participación en reunión de socialización por afectación de zona de reserva de vía nacional, con autoridades del municipio de Cúcuta.
- Participación en la reunión virtual APU.s.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 18 de 53		


Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con carácter URGENTE habilitar el encole (actualmente obstruido) del box coulvert localizado en el PR8+0268 de la vía 55NS09, con el fin de prevenir afectación al flujo vehicular cuando ocurran lluvias en el sector, por flujo de lodos y material del talud superior sobre la calzada.

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 19 de 53					

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 20 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



PINTURA DE REFERENCIACION VIAL
(ANTES)



PINTURA DE REFERENCIACION VIAL
(DURANTE)



PINTURA DE REFERENCIACION VIAL
(DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 21 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 22 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(ANTES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DURANTE)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DESPUES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(ANTES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DURANTE)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 23 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 24 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 26 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)

ROCERIA (DURANTE)

ROCERIA (DESPUES)



PODA (ANTES)

PODA (DURANTE)

PODA (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)

REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)

REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 27 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)

ROCERIA (DURANTE)

ROCERIA (DESPUES)



INSTALACION DE MARCADORES DE OBSTACULO (ANTES)

INSTALACION DE MARCADORES DE OBSTACULO (DURANTE)

INSTALACION DE MARCADORES DE OBSTACULO (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)

LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)

LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 28 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ANDENES (ANTES)



LIMPIEZA DE ANDENES (DURANTE)



LIMPIEZA DE ANDENES (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 28		
		FECHA	DIA	MES
	20		01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0			
	Página 29 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



CARGADA DE VOLQUETA (ANTES)



CARGADA DE VOLQUETA (DURANTE)



CARGADA DE VOLQUETA (DESPUES)



CARGADA DE VOLQUETA (ANTES)



CARGADA DE VOLQUETA (DURANTE)



CARGADA DE VOLQUETA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 30 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024

		
PODA (ANTES)	PODA (DURANTE)	PODA (DESPUES)
		
REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)	REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)	REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)
		
ROCERIA (ANTES)	ROCERIA (DURANTE)	ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 31 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 32 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 33 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024

		
ROCERIA (ANTES)	ROCERIA (DURANTE)	ROCERIA (DESPUES)
		
LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)	LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)	LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)
		
LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)	LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)	LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS
(DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS
(DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS
(DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 35 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ERRADICACION DE BASURAS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS (DESPUES)



INSTALACION DE SEÑALES (ANTES)



INSTALACION DE SEÑALES
(DURANTE)



INSTALACION DE SEÑALES (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 36 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



INSTALACION DE SEÑALES (ANTES)

INSTALACION DE SEÑALES (DURANTE)

INSTALACION DE SEÑALES (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)

LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 38 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVICON



Se realizan actividades de habilitación de la tubería de la alcantarilla en el PR 5 + 0354.
 Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 39 de 53					



REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVISION



Inicio de trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha. Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha e inicio de la misma actividad en la margen de la calzada izquierda.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		20	01	2025		
		CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024	
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 40 de 53						

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVICON



Registro de participación por parte del personal de la Administración Vial, en reunión virtual el día 13 de enero en horario de 2 :30 PM a 4:00 pm, relacionado con MESA DE TRABAJO ZONA CENTRO ORIENTE TEMÁTICA GRUPO 4 ESTUDIO DE MERCADO. REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES.

REGISTRO FOTOGRAFICO
ALCALDIA DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



Registro de reunión en la Alcaldía de Cúcuta, para socialización, revisión y acciones a implementar por las afectaciones de la zona de reserva o zonas de retiro obligatorio en las vías nacionales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 41 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

APOYO A LA SUPERVICION



Capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario. Mes de Enero.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
			FECHA	DIA	MES
	20	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 42 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER
APOYO A LA SUPERVICON



Registro de revisión de logística de: personal, seguridad social, dotación de uniformes, herramienta, elementos de seguridad personal EPP, personal y logística para trabajo seguro en altura y medio de transporte , de la microempresa MICROCOLMA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 43 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA

APOYO A LA SUPERVISION



Registro de revisión de logística de: personal, seguridad social, dotación de uniformes, herramienta, elementos de seguridad personal EPP, personal y logística para trabajo seguro en altura y medio de transporte, de la microempresa TONCHALÁ

 <p>CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5</p>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		20	01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 44 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.1 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
Fecha: 15/10/2025 Hora: 6:00 am.
DT NSA
*Departamento: *Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Tipo de cierre: Cierre parcial.
Código vía: 55 07
Sector: Cúcuta - Puerto Santander.
PR inicial: PR 15 + 0600
PR final: PR 15 + 0600.
Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque entre buseta y motocicleta, sector Oripaya.
Rutas alternas No aplica.
Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque entre un vehículo de transporte urbano (buseta) y una motocicleta. Como consecuencia del accidente se presenta 2 víctimas: fallece el conductor de la motocicleta y un herido grave (pasajera de la moto). Hace presencia personal de la microempresa Microcolma de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realizó señalización y manejo de tránsito en el sitio. Hizo presencia autoridades de tránsito y judiciales de Cúcuta. La herida fue trasladada a un centro asistencial.

 <p>CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5</p>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		20	01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 45 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.2 Vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander.
 Fecha: 16/01/2024 Hora: 1:00 pm.
 DT NSA
 *Departamento: *Norte de Santander
 Municipio: Cúcuta
 Tipo de cierre: Cierre total.
 Código vía: 55 GC 07
 Sector: Cúcuta - Puerto Santander.
 PR inicial: PR 24 + 0500
 PR final: PR 25 + 0200
 Descripción del evento: Situación de orden público. Atentado con bomba a policías que transitaban en una motocicleta por la vía nacional. SECTOR DE PUERTO NUEVO.
 Rutas alternas No hay.
 Tipo de evento: Atentado con bomba al paso de 2 motorizados de la policía nacional. Como consecuencia del accidente se presenta 2 víctimas: (heridos). Controló la situación personal de la policía nacional.

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.3- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Fecha: 14/01/2025. Hora: 8:08 am
DT NSA
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta.
Tipo de cierre: Cierre parcial, carril derecho de la calzada derecha.
Código vía: 55NSA
Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta
PR inicial: PR 14 + 0350.
PR final: PR 14 + 0350.
*Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo buseta, sentido Los Patios - Cúcuta, sin saldo de lesionados.
Rutas alternas N/A
Tipo de evento: Accidente por salida de vehículo de la vía y posterior volcamiento, al perder el conductor el control del vehículo (buseta), por exceso de velocidad. El vehículo transitaba sin pasajeros.
Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI.

 <p>CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5</p>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 28			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
			20	01	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 47 de 53			

<p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
<p align="center">VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.</p>
<p align="center">ACCIDENTE</p>



4.4- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
 Fecha: 18/01/2025. Hora: 19:18.
 DT NSA
 Departamento: Norte de Santander
 Municipio: Los Patios.
 Tipo de cierre: Cierre parcial, carril izquierdo de la calzada izquierda.
 Código vía: 55NSA
 Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta
 PR inicial: PR 0 + 0250.
 PR final: PR 0 + 0250.
 *Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo motocicleta, sentido Cúcuta - Los Patios. sin saldo de lesionados.
 Rutas alternas N/A
 Tipo de evento: Accidente por salida de vehículo de la vía, al perder el conductor el control del vehículo (motocicleta), por exceso de velocidad.
 Plan de acción: Es atendido por el servicio de atención al usuario SAU- GVI. Policía de Los Patios.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 48 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO CHARLA SST

SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS

SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPPS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS

SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS

SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE SEÑALIZACION VIAL

SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 49 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO CORRECTO USO EPPS



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 50 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024




SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS

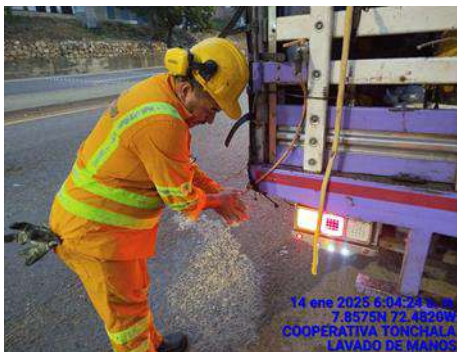

SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS EN ACTIVIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 51 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



CAPACITACION



REVISION LOGISTICA MICROCOLMA



REVISION LOGISTICA TONCHALA



SENSIBILIZACION SOBRE USO DE
EPPS



REVISION LOGISTICA HERRAMIENTAS



REVISION LOGISTICA SEÑALIZACION
VIAL



INSPECCION BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS



INSPECCION EXTINTOR



ACOMPÑAMIENTO EN LA VIA,
SEÑALIZACION VIAL

REGISTRO DE REPORTES DE ERROR EN SINCRONIZACION E INICIO DE SESION
APLICATIVO SIGPAV 9 ENERO 2024

20/1/25, 16:52

Gmail - DIFICULTADES APLICATIVO SIGPAV AMV-2 DT-NSA

 CONSORCIO VÍAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

DIFICULTADES APLICATIVO SIGPAV AMV-2 DT-NSA

1 mensaje

CONSORCIO VÍAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

16 de enero de 2025, 17:40

Para: sigpav@invias.gov.co

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>

Se relacionan para su consideración, las novedades que se continúan presentando en el trabajo en campo que se realiza en la vía 55NSA para el levantamiento y cargue de información para el SIG-PAV.

En la recopilación de datos en campo, se presenta estas novedades en el registro de los datos referentes a la revisión de patologías en una unidad de medida:

- 1.- Al capturar las fotografías y al seleccionar 'aceptar', se produce error en el aplicativo. Este error hace que el sistema salga de la patología y regrese al menú inicial, donde se debe seleccionar nuevamente el tramo a trabajar.
- 2.- Al reingresar al tramo y a la unidad de medida, se observa que las patologías ingresadas anteriormente no quedan guardadas, obligando al usuario a ingresar cada patología repetidamente.
- 3.- Esta situación se presenta en manera recurrente, requiriendo hasta cuatro intentos para que una misma patología quede registrada correctamente.
- 4.- Una vez que se logra en el aplicativo guardar una patología, se obliga al usuario a salir del módulo y presionar "sincronizar" para poder continuar con el proceso de toma de información.
- 5.- Esta situación genera retrasos significativos en la recolección de datos en campo, afectando la eficiencia del proceso.

Otras novedades presentadas en el trabajo en campo:

- Los equipos (celulares) con los que se está trabajando, vienen presentando periódicos eventos de recalentamiento debido a las altas temperaturas y el sol permanente en el sector de la vía 55NSA - ciudad de Cúcuta, con temperaturas promedio entre 28 a 35 °C. Esta situación obliga a suspender las actividades mientras el equipo vuelve a una temperatura normal. Adicional a la afectación al rendimiento del trabajo en campo en la toma y registro de la información, estas altas temperaturas ocasionan desgaste en el procesador y probabilidades de daño en los equipos.

- Los días 12 y 13 de diciembre de 2024 se presentaron lluvias intensas durante el día en el sector de las vías a cargo, imposibilitando la recolección de información y por consiguiente afectando el rendimiento y avance del trabajo para el SIGPAV.



Revisada la asignación de tramos en la Territorial Norte de Santander para la recopilación de información en campo, se observa que la vía 70NS06-1. CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS, NO está asignada a la Administración Vial 2. Norte de Santander - CONSORCIO VÍAS 2024.

Actualmente, están asignadas las vías 55NSA, 55NS09 y 5507.

Por lo anterior, se solicita la asignación de la vía 70NS06-1 a esta Administración Vial, dado que contractualmente está a cargo del contrato 1999/2024 y de esta manera se pueda proceder con la

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=d704d04144&view=pt&search=ai&permthid=thead-ar-4600366823578585204&siml=msg-ar-19975952936518...> 1/2

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 28		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		20	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 53 de 53					

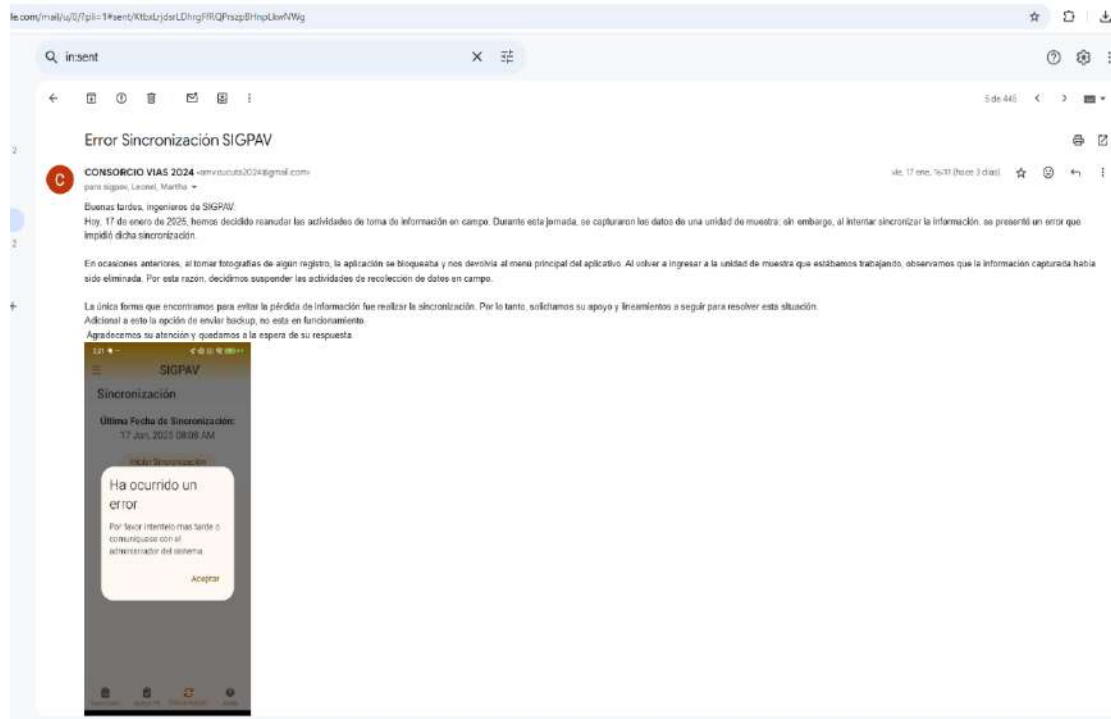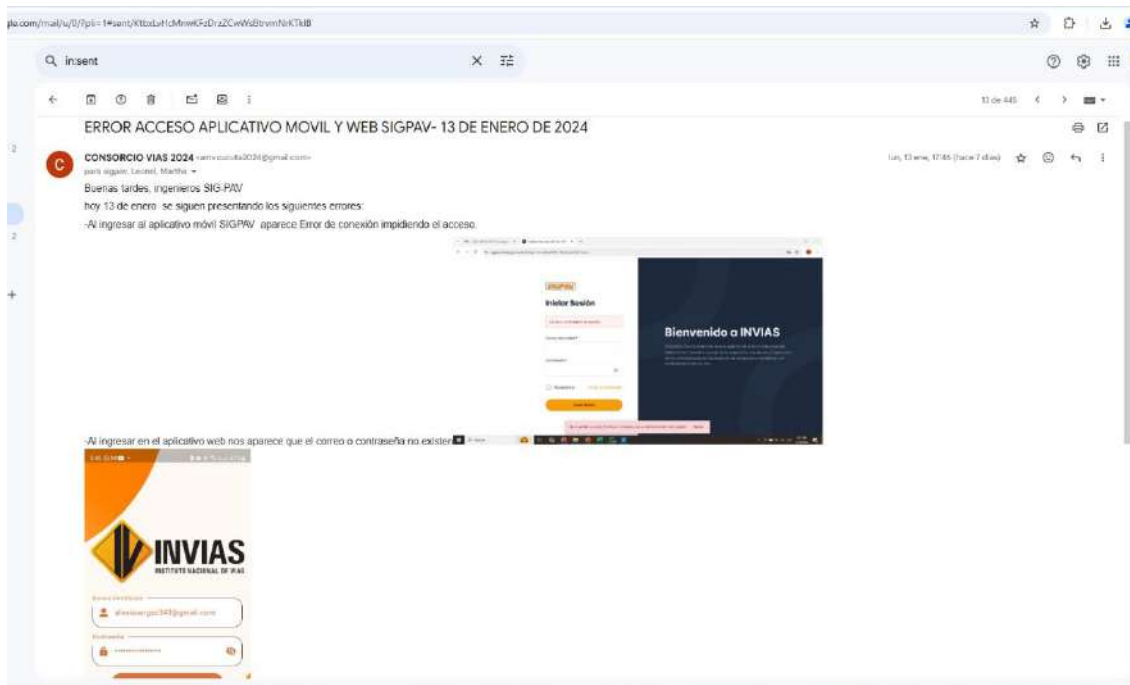



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-01-27 15:38:47

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 29 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-008526

Fecha Radicación: 2025-01-27 15:41:41

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-033-25 Entrega Informe Semanal No.29**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 29.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 29, correspondiente al período del 20 al 26 de enero 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 29 (54) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 1 de 54			

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 29

PERIODO: DEL 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 2 de 54			

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 20 DE ENERO DE 2025	AL 26 DE ENERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	207 DIAS	% TIEMPO: 27,34%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 3 de 54			

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

Avenida del rio- 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771 Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 4 de 54			

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 115 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 17,29%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Poda de árboles: Del PR14+0000 al PR18+0160.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR11+0000 al PR17+0000.
- Limpieza de puentes: Del PR11+0000 al PR17+0000.
- Poda de ramas de árboles: Del PR 17+ 0000 al PR 18 + 0000.
- Limpieza de cuneta: Del PR8+0000 al PR15+0800.
- Retiro de empalizada de las pilas del puente García Herreros: PR16+0058.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 5 de 54			

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR4+0050, margen de la calzada derecha e inicio de la misma actividad en la margen de la calzada izquierda.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha.
- En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta y demolición de muro en concreto.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 6 de 54			

CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 115 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 17,29 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 7 de 54			

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 250 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 31,25%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR13+0800 al PR20+0000.
 - Limpieza de calzada: Del PR13 +0800 al PR14+0850.
 - Limpieza de obras de drenaje: Del PR13+0800 al PR20+0000.
 - Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR13+0800 al PR20+0000.
 - Rocería: Del PR17+0000 al PR29+0680.
 - Limpieza de puentes y pontones: Del PR12+0000 al PR20+0000.
 - Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR3+0450 al PR20+0000
- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 8 de 54			

- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realizan actividades de habilitación de la tubería de la alcantarilla en el PR5+0354.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL- DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 9 de 54			

- Durante la semana se realizan actividades de excavación, instalación de solado en concreto e inicio de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert y obras de reconstrucción de aleta a la salida del box coulvert.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 115 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 17,29%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR2+0900 al PR 14+0000.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
		CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0				
	Página 10 de 54				

- Limpieza de puentes y pontones: Del PR3+0000 al PR5+0000.
- Limpieza de cunetas: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR+0900 al PR14+0000.
- Poda de ramas de árboles: Del PR8+0000 al PR14+0000.

- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR14+0000.

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 115 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 17,29%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR48+0000 al PR52+0000.
- Limpieza de cunetas: Del: PR25+0350 al PR30+0000 y del PR46+0000 al PR52+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR25+0350 al PR30+0000 y del PR46+0000 al PR52+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR25+0350 al PR30+0000.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR24+0200 al PR52+0000.
- Limpieza de puentes: Del PR47+0600 al PR53+0678.
- Arreglo de señales verticales y despeje: Del PR24+0750 al PR36+0300.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 11 de 54			

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Durante esta semana no se realizaron actividades en este sector.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
				FECHA	DIA	MES
	27	01	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 12 de 54						

Por lo anterior mediante el oficio AV- C1999-108- 24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E -VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA EN LAS VÍAS 55NSA.

El día miércoles 22 de enero en horario 10 am a 11:00 am, se participó en el salón de juntas de la Alcaldía de Los Patios, en la reunión programada con asistencia de la alcaldesa encargada, funcionario de la secretaria de Gobierno, de la secretaria de Planeación e infraestructura, de Inspectores de Policía municipales, del Ing. Jackson Núñez Rangel por parte del Invías, personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se socializó la afectación que se presenta por invasiones y daño de la infraestructura vial nacional en la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, en las vías nacionales con jurisdicción del municipio de Los Patios, específicamente entre el PR0+0000 al PR5+0000 de la vía 55NSA.

Se establecieron acciones a realizar tanto por el Invías como por las autoridades municipales y se programó una reunión de seguimiento a las acciones y gestiones priorizadas, para el próximo 20 de febrero.

2.2 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA CALZADA POR PARQUEO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 55NSA.

El día viernes 24 de enero en horario 10 am a 11:00 am, se participó en las instalaciones de la empresa Jerónimos Martin's, en la reunión programada con asistencia, del secretario de Planeación e infraestructura y del Inspector de Tránsito municipal de Los Patios, personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se socializó la afectación que se presenta por parqueo continuo dentro de la calzada de la infraestructura vial nacional, por parte de conductores de vehículos de carga que deben realizar actividades dentro de la empresa, obstruyendo un carril de la vía nacional, específicamente entre el PR3+0100 al PR2+0900 de la vía 55NSA.

Se establecieron acciones a realizar tanto por la empresa Jerónimos Martin's (bodegas ARA) como por las autoridades municipales y de tránsito de Los Patios. Se realizó un acta de compromisos.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 13 de 54			

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 20 de enero hasta el 26 de enero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 5507, verificando el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto incluye, supervisión del uso adecuado de Elementos de Protección Personal, correcta implementación de la señalización vial, y posturas correctas en el manejo de las herramientas de trabajo.
2. Acompañamiento y apoyo en las actividades en las vías, realizadas en la ruta 55NS09 y ruta 5507.
3. Se efectuó el acompañamiento a la administración en actividades relacionadas con la seguridad vial.
4. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, realización de pausas activas, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, y las charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
5. Seguimiento al preoperacional y limpieza de los vehículos de la oficina.
6. Durante la semana, no se presentó ningún accidente laboral.
7. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
8. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
9. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 20 al 26 de enero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 70NS06-1 Cúcuta- Puente Binacional Tienditas.

Fecha: 22/01/2025 HORA 7:00 am.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL				
			No. 29				
			FECHA	DIA	MES	AÑO	
	CONSORCIO VÍAS 2024			27	01	2025	
			Contrato No. 1999 de 2024				
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0				
			Página 14 de 54				

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 70NS06-1

Sector: Cúcuta - Puente Binacional Tienditas.

PR inicial: PR1+0280

PR final: PR1+0280.

Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Binacional Tienditas.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

4.2 Vía 55NS09 Cúcuta-Dos Ríos- San Faustino- La China.

Fecha: 24/01/2025 Hora 6:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Sin cierre de vía.

Código vía: 55NS09

Sector: Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

PR inicial: PR21+0900

PR final: PR21+0900.

Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de vehículo de la vía, que transitaba en sentido La China - Cúcuta. Causa posible: micro sueño.

Rutas alternas No aplica.

Tipo de evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo camioneta, con saldo de una víctima (conductor), quien queda herido, como consecuencia del impacto del vehículo al chocar con una cerca.

Plan de acción: Hace presencia personal de la microempresa LA SAMARIA de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realiza señalización y manejo de tránsito en el sitio. El herido es trasladado a un centro asistencial por personas particulares. No hay presencia de autoridades. Sector vereda la Sabana.

4.3 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.

Fecha 23/01/2025 Hora: 4:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre carril derecho

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 15 de 54			

PR inicial: PR27+0240.

PR final: PR27+0240.

Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de vehículo de la vía, que transitaba en sentido Cúcuta- Puerto Santander Causa posible: micro sueño, exceso de velocidad y embriaguez del conductor. En el sitio se localiza un resalto físico dentro de la infraestructura vial nacional.

Rutas alternas No hay

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque de vehículo contra árbol, sin saldo de víctimas.

Plan de acción: Hace presencia personal de la microempresa MICROCOLMA de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio. El vehículo es abandonado en el sitio por el conductor, obstruyendo el carril derecho de la vía.

4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha 25/01/2025 Hora: 8:30 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

PR inicial: PR11+0900.

PR final: PR11+0900.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de automóvil y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor del automóvil que transitaba en sentido Cúcuta- Los Patios, por exceso de velocidad, choca contra motocicleta.

Rutas alternas No aplica

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, con saldo de víctimas, 2 heridos graves.

Plan de acción: Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Los heridos son trasladados al centro asistencial más cercano. Hace presencia Transito de Villa del Rosario.

5. ENTREGA DEL INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE.

Mediante el oficio AV2-C1999/025/25 de fecha 27/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-005111 de fecha 17/01/2025, se hizo entrega a la Territorial y a Planta Central, del informe de accidentalidad correspondiente al periodo del mes de diciembre de 2024.

La información adicionalmente fue cargada en el aplicativo HERMES.

6. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 16 de 54					

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

7. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG-PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo.

El día 23/01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

Adicionalmente se solicita realizar la evaluación del estado de la red vial con criterio técnico, en forma manual dado las dificultades que presenta el aplicativo, con fecha de entrega el 31/01/2025.

Se está a la espera de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo.

8. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I-VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

9. ENTREGA DE PLEGABLES ALUSIVOS A LAS VÍAS.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 54			

Se viene realizando la entrega a las autoridades con jurisdicción en las vías a cargo, del plegable alusivo a la Ley 1228 de 2008, referente a la reglamentación vigente de zona de reserva o zona de retiro obligatorio en las vías nacionales.

Durante la semana se programó y realizó la entrega de plegables a los usuarios de las vías y a la comunidad residente en proximidades de las carreteras, a través de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario: La Samaria, Tonchalá y Microcolma.
La entrega se realizó en las vías 5507 y 55NS09.

Lo anterior para la socialización con las autoridades, usuarios de las vías y las comunidades de cada jurisdicción.

10. ENTREGA DEL INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MES DE ENERO DE 2025.

Mediante el oficio AV2 -C1999-022-25 de fecha 14/01/2025 y radicado Invías 2925E-VUVRAZ-003401 de fecha 14/01/2025, se presentó a la Territorial, la programación y tema de la capacitación al personal de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector, correspondiente al mes de enero.

El día sábado 18 de enero en horario de 8 am a 12 am, se desarrolló la actividad, con presencia del Ing. director Leonel Valero.

Mediante el oficio AV2-C1999-027-25 de fecha 20/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-005557 de fecha 20/01/2025 se realizó la entrega a la Territorial del respectivo informe.

11. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario e inspección de la señalización vertical existente en la infraestructura vial a cargo.

Se realiza a la fecha el inventario e inspección de señales verticales en la vía 55NSA, Anillo Vial Oriental.

12. DEMARCACIÓN DE REFERENCIACIÓN VIAL EN LA CALZADA EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial con apoyo de la mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, la demarcación (cada 50 metros), de la referenciación vial en cada una de las vías a cargo.

13. INFORME PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO ALPUS 1066-24 DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER RADICADO INVÍAS 2024E-VUVRAZ-115567 del 18/11/2024.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 18 de 54		

Atendiendo lo solicitado por la Territorial , vía correo electrónico en fecha 17/01/2025 , relacionado con solicitud de la Secretaria de Planeación del Municipio de Puerto Santander, según oficio ALPUS 1066-24 de fecha 15/11/2024 y radicado Invías 2024E-VUVRAZ- 115567 de fecha 18/11/2024, se realizó visita de inspección a sector de la vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander, entre el PR50+0000 al PR53+0300, para revisar las condiciones de la vía y dar respuesta a lo requerido por parte del municipio.

Mediante el oficio AV2-C1999-031-25 de fecha 24/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-007487

de fecha 24/01/2025, se presentó al respectivo informe a la Territorial.

14. ACTIVIDAD DE REMOCIÓN DE EMPALIZADA EN LAS PILAS DEL PUENTE GARCÍA HERREROS EN LA VIA 55NSA.

Según lo programado por el Administrador Vial se viene realizando con mano de obra de la Microempresa TONCHALÁ, la remoción de la empalizada que se localiza en las pilas del puente García Herreros en el PR16+0058 de la vía 55NSA, Anillo VIAL Oriental de Cúcuta.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitio críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Entrega del informe de accidentalidad del mes de diciembre de 2024.
- Toma de información de campo y cargue en el aplicativo SIG-PAV, de la evaluación del estado de pavimentos flexibles en la red vial a cargo, SIG-PAV.
- Entrega del informe trimestral del periodo octubre -diciembre de 2024.
- Entrega de plegables alusivos a la Ley 1228 de 2008.
- Instalación de señales tipo delineadores de obstáculos en sitios de retorno en el separador de la doble calzada de la vía 55NSA.
- Actividad de demarcación de referenciación vial en la calzada, en las vías a cargo.
- Programación y ejecución de capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, mes de enero/2025.
- Ejecución de presupuestos de necesidades de señalización horizontal en la red vial a cargo.
- Participación en reunión de socialización por afectación de zona de reserva de vía nacional, con autoridades del municipio de Cúcuta.
- Participación en la reunión virtual APUS.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023,

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 19 de 54			

Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:


Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con carácter URGENTE habilitar el encole (actualmente obstruido) del box coulvert localizado en el PR8+0268 de la vía 55NS09, con el fin de prevenir afectación al flujo vehicular cuando ocurran lluvias en el sector, por flujo de lodos y material del talud superior sobre la calzada.

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 20 de 54			

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 21 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024




ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

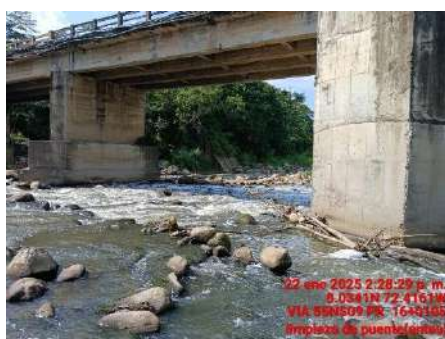

RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(ANTES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DURANTE)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DESPUES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(ANTES)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DURANTE)



RETIRO DE ARBOL CON RIESGO
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 25 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



DESPEJE DE SEÑALES (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALES (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALES (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



PODA Y DESPEJE DE SEÑALES (ANTES)



PODA Y DESPEJE DE SEÑALES (DURANTE)



PODA Y DESPEJE DE SEÑALES (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO
<p>55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8</p>
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE Puentes (ANTES)



LIMPIEZA DE Puentes (DURANTE)



LIMPIEZA DE Puentes (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 31 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (DESPUES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



DESPEJE DE SEÑALES (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALES (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALES (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA
(ANTES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE LA CALZADA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 29			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024		27	01	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	Página 36 de 54				

REGISTRO FOTOGRAFICO
ALCALDIA DE LOS PATIOS
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de participación en reunión de socialización en la Alcaldía de Los Patios, por la afectación de la zona de reserva de vía nacional y de la infraestructura vial por construcciones, instalación de publicidad visual, depósito de basuras y escombros y daños en la infraestructura, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio, establecida en la Ley 1228 de 2008.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 37 de 54						

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de reunión con funcionarios de la Alcaldía y de la Secretaría de Tránsito de Los Patios, personal de la empresa Jerónimo Martins (bodegas ARA), personal de la GVI del área metropolitana de Cúcuta y personal de la Administración Vial Grupo 2, para definir gestiones a realizar de control de obstrucción de la calzada de la vía nacional, por parqueo de vehículos de carga sobre la calzada derecha.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN	INFORME SEMANAL		
		No. 29		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL	FECHA	DÍA	MES
			27	01
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 38 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta – Puerto Santander
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de entrega de plegables en sectores de la vía 5507, por parte de personal de la Microempresa Microcolma, alusivos a la Ley 1228 de 2008, zonas de reserva o zonas de retiro obligatorio en vías nacionales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 39 de 54					

<div> REGISTRO FOTOGRAFICO </div>
<div> Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta </div>
<div> APOYO A LA SUPERVICION </div>



Registro de entrega de plegables en sectores de la vía 5507, por parte de personal de la Microempresa TONCHALÁ, alusivos a la Ley 1228 de 2008, zonas de reserva o zonas de retiro obligatorio en vías nacionales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 40 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de entrega de plegables en sectores de la vía 55NS09, por parte de personal de la Microempresa LA SAMARIA, alusivos a la Ley 1228 de 2008, zonas de reserva o zonas de retiro obligatorio en vías nacionales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		27	01	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 41 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 42 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de actividad programada y ejecutada, con personal de la Microempresa TONCHALÁ, de retiro de empalizada de las pilas del puente García Herreros en el PR 16 + 0058, en la vía 55NSA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 29		
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES
			27	01
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	AÑO		
		2025		
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 43 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de programación, revisión y ejecución de demarcación de referenciación vial en la calzada (cada 50 metros) en la red vial a cargo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Durante la semana se realizan actividades de excavación, instalación de solado en concreto e inicio de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert y obras de reconstrucción de aleta a la salida del box coulvert.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 3262/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Se realizan actividades de habilitación de la tubería de la alcantarilla en el PR 5 + 0354.

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha e inicio de la misma actividad en la margen de la calzada izquierda.
Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha
En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta y demolición de muro en concreto.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 47 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 70NS06-1 Cúcuta- Puente Binacional Tienditas
ACCIDENTE



4.1 Vía 70NS06-1 Cúcuta- Puente Binacional Tienditas.

Fecha: 22/01/2025 HORA: 7:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre total en el lado venezolano.

Código vía: 70NS06-1

Sector: Cúcuta - Puente Binacional Tienditas.

PR inicial: PR 1 + 0280

PR final: PR 1 + 0280.

*Descripción del evento: Novedad por cierre total al flujo vehicular y peatonal por el puente internacional Binacional Tienditas.

Rutas alternas no hay

Tipo de evento: Novedad por acción unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cierre de vía.

Plan de acción: * Es competencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, habilitar el paso por el puente internacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 48 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta-Dos Ríos- San Faustino- La China.
ACCIDENTE



<p>4.2 Vía 55NS09 Cúcuta-Dos Ríos- San Faustino- La China.</p> <p>Fecha 24/01/2025 Hora: 6:00 am.</p> <p>DT NSA</p> <p>*Departamento: *Norte de Santander</p> <p>Municipio: Cúcuta</p> <p>Tipo de cierre: Sin cierre de vía.</p> <p>Código vía: 55 NS09</p> <p>Sector: Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.</p> <p>PR inicial: PR 21 + 0900</p> <p>PR final: PR 21 + 0900.</p> <p>Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de vehículo de la vía, que transitaba en sentido La China - Cúcuta. Causa posible: micro sueño.</p> <p>Rutas alternas No aplica.</p> <p>Tipo de evento: Accidente de tránsito por salida de la vía de vehículo tipo camioneta, con saldo de una víctima (conductor), quien queda herido, como consecuencia del impacto del vehículo al chocar con una cerca.</p> <p>Plan de acción: * Hace presencia personal de la microempresa LA SAMARIA de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realiza señalización y manejo de tránsito en el sitio. El herido es trasladado a un centro asistencial por personas particulares. No hay presencia de autoridades. Sector vereda la Sabana.</p>
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 29		
			FECHA	DIA	MES
	27	01		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 49 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
ACCIDENTE



4.3 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
Fecha 23/01/2025 Hora: 4:00 am.
DT NSA
*Departamento: *Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Tipo de cierre: Cierre carril derecho.
Código vía: 5507
Sector: Cúcuta - Puerto Santander.
PR inicial: PR 27 + 0240.
PR final: PR 27 + 0240.
Descripción del evento: Accidente de tránsito por salida de vehículo de la vía, que transitaba en sentido Cúcuta- Puerto Santander. Causa posible: micro sueño, exceso de velocidad y embriaguez del conductor. En el sitio se localiza un resalto físico dentro de la infraestructura vial nacional.
Rutas alternas No hay
Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque de vehículo contra árbol, sin saldo de víctimas.
Plan de acción: * Hace presencia personal de la microempresa MICROCOLMA de servicio de mantenimiento rutinario del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio. El vehículo es abandonado en el sitio por el conductor, obstruyendo el carril derecho de la vía.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 29		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		27	01	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 50 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha 25/01/2025 Hora: 8:30 am.

DT NSA

*Departamento: *Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.

Código vía: 55 NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

PR inicial: PR 11 + 0900.

PR final: PR 11 + 0900.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de automóvil y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor del automóvil que transitaba en sentido Cúcuta- Lis Patios, por exceso de velocidad, choca con motocicleta.

Rutas alternas No aplica

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, con saldo de víctimas, 2 heridos graves.

Plan de acción: * Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Los heridos son trasladados al centro asistencial más cercano. Hace presencia Transito de Villa del Rosario.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPPS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO CORRECTO USO EPPS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

**55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA).
INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO
SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD
DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)**

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE VEHICULO



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO CORRECTO USO EPPS

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



SEGUIMIENTO SST EN ACTIVIDADES



SEGUIMIENTO SST EN ACTIVIDADES



SEGUIMIENTO SST EN ACTIVIDADES



ACOMPANIAMIENTO REUNION
ALCALDIA DE LOS PATIOS



ACOMPANIAMIENTO EN LA VIA



ACOMPANIAMIENTO EN LA VIA



INSPECCION VEHICULO,
PREOPERACIONAL



ACOMPANIAMIENTO EN LA VIA,
SEÑALIZACION VIAL



ACOMPANIAMIENTO EN LA VIA,
SEÑALIZACION VIAL



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-02-03 17:02:16

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 30 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-011447

Fecha Radicación: 2025-02-04 09:08:52

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-043-25 Entrega Informe Semanal No.30**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 30.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 30, correspondiente al período del 27 de enero al 2 de febrero de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 30 (53) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular: 313-2162881 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com
Cúcuta-Colombia

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
				FECHA	DIA	MES
	03	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 1 de 53			

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 30

PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 2 de 53			

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 27 DE ENERO DE 2025	AL 02 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	214 DIAS	% TIEMPO: 28,27%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 3 de 53					

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%,
Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%
CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%
Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 4 de 53					

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 122 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 18,35%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR17+0000 al PR18+0160.
- Limpieza de puentes: Del PR16+0058.
- Limpieza de señales marcadores de obstáculos Del PR0+0000 al PR18+0160.
- Parcheo con mezcla asfáltica: Del PR0+0000 al PR 18+0000
- Recolección de basura: Del PR0+0000 al PR 18+0000
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 5 de 53			

- Reglamentación ambiental contractual.
- Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR4+0050, margen de la calzada derecha y margen de la calzada izquierda.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha.
- En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta, instalación de refuerzo y fundida de secciones de cuneta y demolición de muro en concreto.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 6 de 53					

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 122 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 18,35 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 7 de 53			

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 257 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 32,13%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR20+0000 al PR29+0000.
- Limpieza de calzada: Del PR16+0200 al PR16+0300, del PR20+0000 al PR23+0900 y del PR26+0300 al PR29+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR20+0000 al PR29+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR20+0000 al PR29+0000.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DÍA	MES
				03	02
					AÑO 2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 8 de 53		

- Limpieza de puentes y pontones: Del PR20+0000 al PR27+0000.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR20+0000 al PR29+0000.
- Recolección de basuras de zonas de berma y cuneta. Del PR0+0000 al PR29+0000.
- Arreglo y despeje de señales verticales. Del PR0+0000 al PR 20+0000.

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

- Reglamentación ambiental contractual.
- Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REAHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realizan actividades de habilitación de la tubería de la alcantarilla en el PR5+0354.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DÍA	MES
				03	02
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024 VERSION 1.0 Página 9 de 53		

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024
Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.
Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.
Plazo: CUATRO (4) MESES.
Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert y obras de reconstrucción de aleta a la salida del box coulvert.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce
PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio
PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio
PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable
PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha
PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.
CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 10 de 53		

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 122 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 18,35%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de puentes y pontones: Del PR5+0000 al PR14+0000.
 - Poda de ramas de árboles: Del PR8+0000 al PR2+0900.
 - Demarcación de referenciación vial en la calzada: Del PR2+0900 al PR14+0000.
 - Recolección de basuras de zona de berma y cuneta: Del PR2+0900 al PR14+0000.
 - Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR4+000
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
 - El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
 - Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 122 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 18,35%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 11 de 53					

- Rocería: Del PR14+0000 al PR20+0000.
- Limpieza de cunetas: Del PR30+0000 al PR39+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR30+0000 al PR39+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR30+0000 al PR39+0000.
- Pintura de referenciación vial en la calzada: Del PR24+0200 al PR53+0000.
- Arreglo de señales verticales y despeje: Del PR36+0300 al PR44+0000.
- Recolección de basuras en zonas de berma y cuneta: Del PR14+0000 al PR52+0000.
- Limpieza de pontones: Del PR33+0657 al PR38+0524.

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza construcción de cunetas en concreto, en ambas márgenes de la vía, en el sector intervenido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1. SOLICITUD DE USUARIO Y CLAV DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 12 de 53					

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

Por lo anterior mediante el oficio AV- C1999- 108- 24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E -VUVRAZ- 100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA EN LAS VÍAS 55NSA.

El día jueves 29 de enero en horario 9 am a 10:00 am, se participó en el salón de juntas de la Alcaldía de Villa del Rosario, en la reunión programada con asistencia del alcalde, funcionarios de la secretaria de planeación, funcionarios de control urbano, funcionarios tránsito municipal, Ing. Leonel Valero, director de la Territorial del Invías. el Ing. Jackson Núñez Rangel por parte del Invías, personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se socializó la afectación que se presenta por invasiones y daño de la infraestructura vial nacional en la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, en las vías nacionales con jurisdicción del municipio de Villa del Rosario específicamente entre el PR5+0000 al PR12+0000 de la vía 55NSA.

Se establecieron acciones a realizar tanto por el Invías como por las autoridades municipales y se programó una reunión de seguimiento a las acciones y gestiones priorizadas, para el próximo 19 de febrero en la mañana.

2.2 VÍA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

Mediante el oficio AV2 -C1999-035-25 de fecha 30/01/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al corregidor de Buena Esperanza, realizar gestión de control dado que en inspección a la vía nacional 5507 Cúcuta-Puerto Santander, se observa que se ha realizado intervención

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 13 de 53					

no autorizada por el INVÍAS, de una sección de la cuneta de drenaje de aguas lluvias, que forma parte de la infraestructura vial en el PR4+0005 frente a las instalaciones de la planta de Norgas.

Intervención y afectación consistente en obstrucción mediante la construcción de un acceso en concreto al predio que se localiza en la margen derecha de la vía nacional, lo cual incide en reducción del área hidráulica de la sección de cuneta intervenida.

Adicionalmente, es necesario que se le solicite al propietario del predio realizar la gestión ante el Invías de permiso de construcción de acceso al predio, previo cumplimiento de requisitos y de diseño establecido.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 27 de enero hasta el 02 de febrero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Acompañamiento y apoyo en las actividades de la administración, reunión con la alcaldía de villa del rosario.
2. Sensibilización sobre la prevención de lesiones de espalda a través de infografía.
3. Seguimiento ala política de orden y limpieza oficina.
4. Evaluación del estado y funcionamiento del mobiliario de trabajo para garantizar condiciones ergonómicas adecuadas.
5. Recopilación y sistematización de información sobre las características demográficas, laborales y sociales de los colaboradores del Consorcio Vías 2024, a través de encuesta.
6. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, realización de pausas activas, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, y las charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
7. Seguimiento al preoperacional y limpieza de los vehículos de la oficina.
8. Durante la semana, no se presentó ningún accidente laboral.
9. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
10. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
11. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 27 de enero al 2 de febrero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 14 de 53					

4.1 Vía 5507 Cúcuta -Puerto Santander.

Fecha: 30 /01/2025 **Hora:** 10:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre total.

Código vía: 55-07

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

PR inicial: PR25+0000.

PR final: PR25+0250

Descripción del evento: Situación de orden público. Por posible localización de artefactos explosivos en zona de carretera. SECTOR DE PUERTO NUEVO.

Rutas alternas No hay.

Tipo de evento: Se presentó afectación al normal flujo vehicular por posible localización de artefactos explosivos en zona de vía. Controló la situación personal del ejército nacional. No se presentó afectación a la infraestructura vial nacional.

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 29/01/2025 **Hora:** 3:00 PM

DT-NSA

Departamento: Norte de Santander.

Municipio: Villa del Rosario

Tipo de cierre: Cierre total calzada izquierda y cierre parcial carril izquierdo de la calzada derecha

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental

PR inicial: 6+0050

PR final: 6+0050

Descripción del Evento: Manifestación por parte de habitantes del sector Navarro Wolf del municipio de Villa del rosario debido a la falta del servicio de agua, la comunidad solicitó la presencia de funcionario de la Alcaldía y de la empresa Aqualia.

Rutas alternas carril derecho de la calzada derecha habilitado.

Tipo de evento: cierre total calzada izquierda

plan de acción: Policía Nacional y agentes de tránsito de Villa del Rosario. La comunidad habilitó el flujo vehicular ante la solicitud de las autoridades.

4.3 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 01/02/2025. **Hora:** 9:30 am Norte de Santander.

DT NSA

Municipio: Villa del Rosario.

Departamento: Norte de Santander.

Tipo de cierre Cierre total calzada izquierda y derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental

PR inicial: 5+0250

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DÍA	MES
				03	02
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024 VERSION 1.0 Página 15 de 53		

PR final: 5+0250

Descripción del Evento: Manifestación por parte de habitantes del sector Navarro Wolf del municipio de Villa del rosario debido a la falta del servicio de agua, la comunidad solicitó la presencia de funcionario de la Alcaldía y de la empresa Aqualia.

Rutas alternas Paso intermitente de vehículos cada 30 minutos.

Tipo de evento: cierre total

plan de acción: Policía Nacional y agentes de tránsito de Villa del Rosario. la comunidad habilitó el normal flujo vehicular una vez realizó presencia las autoridades municipales.

4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha 27/01/2025 **Hora:** 8:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.

Código vía: 55 NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

PR inicial: PR10 +0200.

PR final: PR 10+0200.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de camión y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor de la motocicleta que transitaba en sentido Cúcuta- Los Patios, por exceso de velocidad, choca contra camión.

Rutas alternas No aplica

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, sin saldo de víctimas.

Plan de acción: Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia Transito de Villa del Rosario.

4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha 28/01/2025 **Hora:** 10:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.

Código vía: 55 NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

PR inicial: PR5+0980.

PR final: PR5+0980.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de camionetas y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor de la motocicleta que transitaba en sentido Los Patios - Cúcuta, por exceso de velocidad, choca contra camioneta.

Rutas alternas No aplica

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, con saldo de víctimas (1 herido).

Plan de acción: Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia Transito de Villa del

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 16 de 53					

Rosario y política nacional. El herido es trasladado a un centro asistencial por ambulancia particular.

4.6 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha 29/01/2025 Hora: 12:05 pm.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta.

Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.

Código vía: 55 NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

PR inicial: PR13+0550.

PR final: PR13+0550.

Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de dos camionetas.

Rutas alternas No aplica

Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, sin saldo de víctimas.

Plan de acción: Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia personal de la policía nacional. Los conductores de los vehículos realizan acuerdo.

5. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

6. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 53			

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo.

El día 23 /01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

Se está a la espera de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo.

7. INFORME DEL ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. (ACTUALIZADO DE FORMA MANUAL).

Atendiendo lo requerido en el MEMORANDO CIRCULAR No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, recibido vía correo electrónico en fecha 24/01/2025, donde se solicitó se realice en forma manual antes del 31 de enero de 2025, la actualización del estado de la red vial con criterio técnico, dada las dificultades que ha venido presentando desde el inicio de su implementación el aplicativo SIGPAV, lo cual ha impedido realizar esta actividad, el Administrador Vial para dar cumplimiento a esta solicitud, dedicó el personal a la ejecución en el corto plazo dado, a la toma de información de campo y a m dándose cumplimiento a esta actividad.

Mediante el oficio AV2- C1999-036-25 de fecha 30/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-010133 de fecha 31/01/2025, se realizó la entrega del respectivo informe a la Territorial.

8. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I-VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

9. ENTREGA DE PLEGABLES ALUSIVOS A LAS VÍAS.

Se viene realizando la entrega a las autoridades con jurisdicción en las vías a cargo, del plegable alusivo a la Ley 1228 de 2008, referente a la reglamentación vigente de zona de reserva o zona de retiro obligatorio en las vías nacionales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 18 de 53			

Durante la semana se programó y realizó la entrega de plegables a la Alcaldía de Villa del Rosario.

Lo anterior para la socialización con los usuarios de las vías y las comunidades residentes en proximidades de la vía nacional.

10. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario e inspección de la señalización vertical existente en la infraestructura vial a cargo.

Se realiza a la fecha el inventario e inspección de señales verticales en la vía 55NSA, Anillo VIAL Oriental.

11. DEMARCACIÓN DE REFERENCIACIÓN VIAL EN LA CALZADA EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial con apoyo de la mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, la demarcación (cada 50 metros), de la referenciación vial en cada una de las vías a cargo.

12. ACTIVIDAD DE REMOCIÓN DE EMPALIZADA EN LAS PILAS DEL PUENTE GARCÍA HERREROS EN LA VIA 55NSA.

Según lo programado por el Administrador Vial se terminó de realizar con mano de obra de la Microempresa TONCHALÁ, la remoción de la empalizada que se localizaba en las pilas del puente García Herreros en el PR 16 + 0058 de la vía 55NSA, Anillo VIAL Oriental de Cúcuta. Adicionalmente, se realizó limpieza general de la estructura.

13. EJECUCIÓN DE LAS ACTAS DEL MES DE ENERO, DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Se realizaron las actas correspondientes al periodo del 1 al 31 de enero de los tres contratos de servicio de mantenimiento rutinario a cargo de esta Administración Vial, y se enviaron a la Territorial para la revisión y aprobación respectiva.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.Actividades de defensa de las vías.
- Ejecución de las actas del mes de enero de 2025, de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, a cargo de esta Administración Vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 19 de 53					

- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Entrega de plegables alusivos a la Ley 1228 de 2008.
- Actividad de demarcación de referenciación vial en la calzada en las vías a cargo.
- Participación en reunión de socialización por afectación de zona de reserva de vía nacional, con autoridades del municipio de Villa del Rosario.
- Inventario e inspección de señalización vertical, en la red vial a cargo.
- Entrega del informe de actualización del estado de la red vial a cargo, con criterio técnico. Realizado de forma manual, según indicaciones de planta Central
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.


NOTAS:

Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 20 de 53					

ANEXOS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 21 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
				FECHA	DIA	MES
	03	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 22 de 53						

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



ERRADICACION DE BASURAS (ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS (DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 23 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ERRADICACION DE BASUREROS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



ARREGLO DE SEÑALES (ANTES)



ARREGLO DE SEÑALES (DURANTE)



ARREGLO DE SEÑALES (DESPUES)



ORNATO Y EMBELLECIMIENTO (ANTES)



ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
(DURANTE)



ORNATO Y EMBELLECIMIENTO (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
				FECHA	DIA	MES
	03	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 24 de 53						

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024

 <p>31 ene 2025 1:16:38 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (antes)</p>	 <p>31 ene 2025 1:19:15 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (durante)</p>	 <p>31 ene 2025 2:45:25 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (despues)</p>
LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)	LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)	LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)
 <p>31 ene 2025 3:02:44 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (antes)</p>	 <p>31 ene 2025 3:05:00 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (durante)</p>	 <p>31 ene 2025 3:07:21 p. m. 8.1183N 72.3697W PR 28+0050 VIA55NS09 limpieza de calzada y berma (despues)</p>
LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)	LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)	LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)
 <p>31 ene 2025 3:09:45 p. m. 8.712091 N 73.2301 W VIA 55NS09 PR 27+0920 poda (antes)</p>	 <p>31 ene 2025 3:12:22 p. m. 8.712091 N 73.2301 W VIA 55NS09 PR 27+0920 poda (durante)</p>	 <p>31 ene 2025 3:14:26 p. m. 8.712091 N 73.2301 W VIA 55NS09 PR 27+0920 poda (despues)</p>
PODA (ANTES)	PODA (DURANTE)	PODA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 25 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DESPUES)



ERRADICACION DE BASUREROS (ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



ERRADICACION DE BASUREROS (ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ERRADICACION DE BASUREROS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 30 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 31 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)

LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)

LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)

ROCERIA (DURANTE)

ROCERIA DESPUES)



REFERENCIACION DE LA CALZADA (ANTES)

REFERENCIACION DE LA CALZADA (DURANTE)

REFERENCIACION DE LA CALZADA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 32 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ERRADICACION DE BASUREROS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS
(DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 33 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



ERRADICACION DE BASUREROS (ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS (DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 36 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER
APOYO A LA SUPERVICION



Intervención y afectación de infraestructura vial nacional en el PR 4 + 0005 de la vía 5507.
--

VIA 55NSA ANILLO ORIENTAL DE CUCUTA
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de visita al PR 11 + 0341, calzada derecha de la vía 55NSA, para revisar con personal de la constructora Serranova SAS, la afectación por intervención de box coulvert de la calzada en infraestructura vial.
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DÍA	MES
				03	02
			AÑO		
			2025		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 37 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de construcción de cuneta en concreto en ambas márgenes en el PR 23 + 0458 de la vía 5507. Contrato 2471/2023 y adicionales.

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de participación en reunión de socialización en la Alcaldía de Villa del Rosario, por la afectación de la zona de reserva de vía nacional y de la infraestructura vial por construcciones, instalación de publicidad visual, depósito de basuras y escombros y daños en la infraestructura, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio, establecida en la Ley 1228 de 2008.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 38 de 53					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISCION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert y obras de reconstrucción de aleta a la salida del box coulvert.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
				FECHA	DIA	MES
	03	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 39 de 53						

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVISION



<p>Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha y margen de la calzada izquierda.</p> <p>Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha</p> <p>En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta, instalación de refuerzo y fundida de secciones de cuneta y demolición de muro en concreto.</p>

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 40 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de programación, revisión y ejecución de demarcación de referenciación vial en la calzada (cada 50 metros) en las vías 55NSA y 5507. Microempresa TONCHALÁ.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 41 de 53		


REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de programación, revisión y ejecución de demarcación de referenciación vial en la calzada (cada 50 metros) en la vía 55NS09. Microempresa La Samaria.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 42 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta // Vía 70NS06-1 PUENTE INTERNACIONAL TIENDITAS
APOYO A LA SUPERVISON

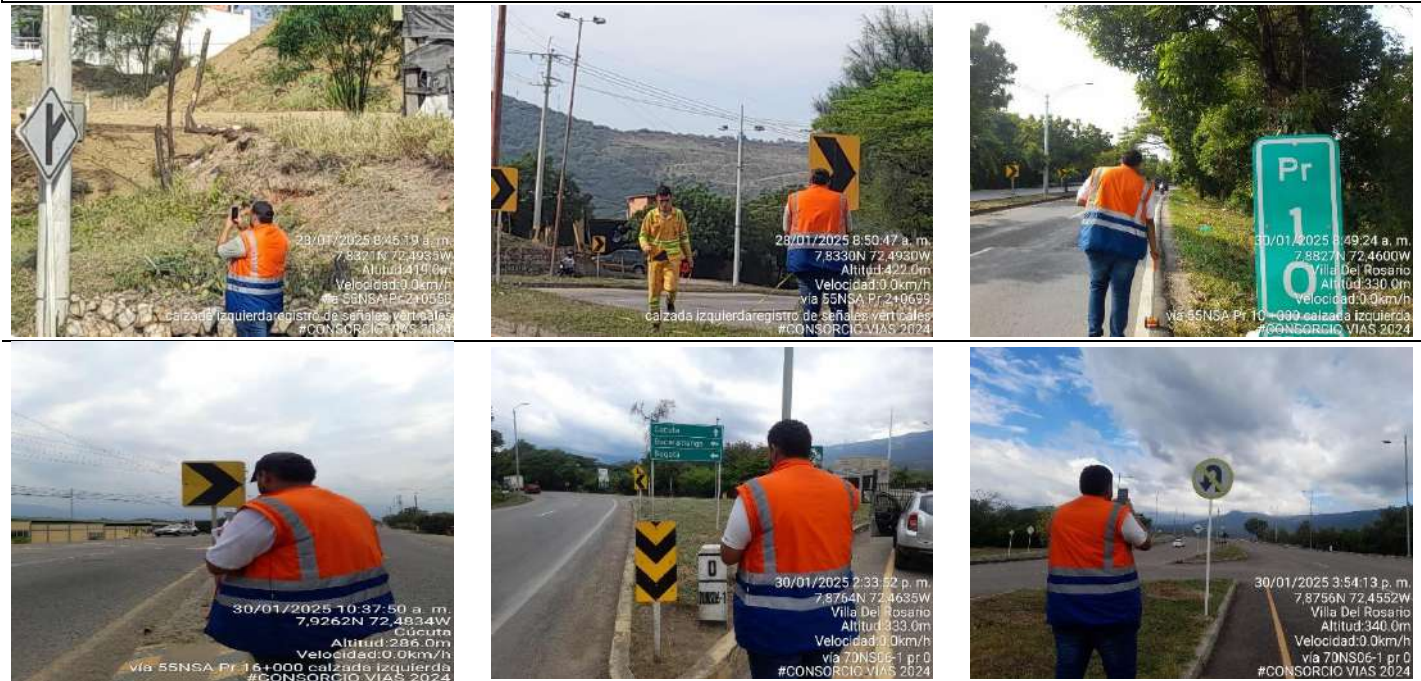

Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		03	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 43 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de actividad programada y ejecutada, con personal de la Microempresa TONCHALÁ, para terminación de retiro de empalizada de las pilas del puente García Herreros y de limpieza general de la estructura, en el PR 16 + 0058 de la vía 55NSA.

Actividad de remoción de la empalizada de las pilas y limpieza general del puente García Herreros. Microempresa TONCHALÁ.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
			FECHA	DIA	MES
	03	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 44 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 70NS06-1 Cúcuta- Puente Binacional Tienditas
ACCIDENTE



4.1. Vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander.

Fecha: 30 /01/2025 Hora: 10:00 am.

DT NSA

*Departamento: *Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre total.

Código vía: 55-07

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

PR inicial: PR 25 + 0000.

PR final: PR 25 + 0250

Descripción del evento: Situación de orden público. Por posible localización de artefactos explosivos en zona de carretera. SECTOR DE PUERTO NUEVO.

Rutas alternas No hay.

Tipo de evento: Se presentó afectación al normal flujo vehicular por posible localización de artefactos explosivos en zona de vía. Controló la situación personal del ejército nacional. No se presentó afectación a la infraestructura vial nacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 45 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta-Dos Ríos- San Faustino- La China.
ACCIDENTE



4.2- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 29/01/2025 Hora: 3:00 PM

DT-NSA

Departamento: Norte de Santander.

Municipio: Villa del Rosario

Tipo de cierre total calzada izquierda y cierre parcial carril izquierdo de la calzada derecha

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental

PR inicial: 6+0050

PR final: 6+0050

Descripción del Evento: Manifestación por parte de habitantes del sector Navarro Wolf del municipio de Villa del rosario debido a la falta del servicio de agua, la comunidad solicitó la presencia de funcionario de la Alcaldía y de la empresa Aqualia.

Rutas alternas carril derecho de la calzada derecha habilitado.

Tipo de evento: cierre total calzada izquierda

plan de acción: Policía Nacional y agentes de tránsito de Villa del Rosario. La comunidad habilitó el flujo vehicular ante la solicitud de las autoridades.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		03	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 46 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
ACCIDENTE



4.3- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Fecha: 01/02/2025. Hora: 9:30 am Norte de Santander.
DT NSA
Municipio: Villa del Rosario.
Departamento: Norte de Santander.
Tipo de cierre total calzada izquierda y derecha.
Código vía: 55NSA
Sector: Anillo Vial Oriental
PR inicial: 5+0250
PR final: 5+0250

Descripción del Evento: Manifestación por parte de habitantes del sector Navarro Wolf del municipio de Villa del rosario debido a la falta del servicio de agua, la comunidad solicitó la presencia de funcionario de la Alcaldía y de la empresa Aqualia.
Rutas alternas Paso intermitente de vehículos cada 30 minutos.
Tipo de evento: cierre total
plan de acción: Policía Nacional y agentes de tránsito de Villa del Rosario. La comunidad habilitó el normal flujo vehicular una vez realizó presencia las autoridades municipales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 47 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



4.4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Fecha 27/01/2025 Hora: 8:00 am. DT NSA *Departamento: *Norte de Santander Municipio: Villa del Rosario. Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda .. Código vía: 55 NSA Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta. PR inicial: PR 10 + 0200. PR final: PR 10 + 0200. Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de camión y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor de la motocicleta que transitaba en sentido Cúcuta- Los Patios, por exceso de velocidad, choca con camión. Rutas alternas No aplica Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, sin saldo de víctimas. Plan de acción: * Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia Transito de Villa del Rosario.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 30		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		03	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 48 de 53			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



<p>4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>Fecha 28/01/2025 Hora: 10:00 am.</p> <p>DT NSA</p> <p>*Departamento: *Norte de Santander</p> <p>Municipio: Villa del Rosario.</p> <p>Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.</p> <p>Código vía: 55 NSA</p> <p>Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>PR inicial: PR 5 + 0980.</p> <p>PR final: PR 5 + 0980.</p> <p>Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de camionetas y motocicleta. Causa posible: exceso de velocidad. Conductor de la motocicleta que transitaba en sentido Los Patios - Cúcuta, por exceso de velocidad, choca con camioneta.</p> <p>Rutas alternas No aplica</p> <p>Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, con saldo de víctimas (1 herido).</p> <p>Plan de acción: * Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia Transito de Villa del Rosario y política nacional. El herido es trasladado a un centro asistencial por ambulancia particular.</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				03	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 49 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.
ACCIDENTE



<p>4.6 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>Fecha 29/01/2025 Hora: 12:05 pm.</p> <p>DT NSA</p> <p>*Departamento: *Norte de Santander</p> <p>*Municipio: Cúcuta.</p> <p>Tipo de cierre: Cierre carril derecho de la calzada izquierda.</p> <p>Código vía: 55 NSA</p> <p>Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>PR inicial: PR 13 + 0550.</p> <p>PR final: PR 13 + 0550.</p> <p>Descripción del evento: Accidente de tránsito tipo choque de dos camionetas.</p> <p>Rutas alternas No aplica</p> <p>Tipo de evento: Accidente de tránsito tipo choque, sin saldo de víctimas.</p> <p>Plan de acción: * Hace presencia personal de la GVI del sector. Se realiza señalización preventiva en el sitio y manejo del tránsito vehicular. Hace presencia personal de la policía nacional. Los conductores de los vehículos realizan acuerdo.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DEL VEHICULO



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO
DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO POSTURAS
ADECUADAS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE
SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE
EPPS



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE
EPPS ALTURAS



SEGUIMIENTO CORRECTA SEÑALIZACION
VIAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 30		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				03	02
			AÑO		
			2025		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 53 de 53		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION



INSPECCION MOBILIARIO DE
TRABAJO



REALIZACION PERFIL
SOCIODEMOGRAFICO



REALIZACION PERFIL
SOCIODEMOGRAFICO



INSPECCION VEHICULO,
PREOPERACIONAL



INSPECCION VEHICULO,
PREOPERACIONAL





INSPECCION VEHICULO, LIMPIEZA

ANEXO 2


<div>CONSORCIO VIAS 2024</div>			<div>INVIAS</div>			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS																						
						TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER																						
						EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS																						
CONSORCIO VIAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			COOPERATIVA: TONCHALA REPRESENTANTE: JAIRO GUERRERO CONTRATO NO. 3822 DE 2024										MES: ENERO															
			1/01/2024										AL						31/01/2024									
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO												EJECUTADO													
			CANTIDAD TOTAL			55NSA		5507		70NS06-1		% PROGRAMADO			CANTIDAD EJECUTADA			55NSA		5507		70NS06-1		% EJECUTADO				
			55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1	55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1		
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3																										
257	Parcheo	m3																										
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3																										
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m																										
380	Limpieza de bermas en afirmado	m																										
425	Limpieza manual de cunetas L y V	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%	100%	10048	3145		00+0000	15+700	2+0900	14+0000			100%	100%			
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m																										
434	Limpieza de encole y/o descole	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	1897	475		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%			
497	limpieza de obras	ml				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	79	19		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%			
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m																										
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%		426	92,2	142			2+0900	14+0000	00+0000	01+0200		100%	100%		
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml																										
545	Limpieza manual del lecho del rio	u																										
547	Limpieza manual cursos de agua	u																										
548	Limpieza y pintura de barandas	m																										
600	Limpieza de gaviones																											
625	Despeje de derrumbes	m3																										
630	Limpieza de la calzada	m2	18.000	6900	2400			02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	18400		5000	00+0000	18+0000			0+0000	1+0200	100%		100%		
636	Roceria y desmonte manual	ha	20	6,5	1	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	18,01	6,5	1,8	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200																	
667	Reposición de la lamina de las sefales (No incluye suministro)	u																										
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u																										
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u												4														
673	Reposición de mojones de referencia	u																										
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u																										
678	Limpieza de señales y mojones	u																										
679	Arreglo de señales y despeje	u																										
686	Limpieza de defensas metalicas	m																										
694	vigilancia	km	18	11	1,2	00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	18	11	1,2	0+0000	18+0000	2+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%		
695	Emergencias	gl																										
700	pintura de cabezotes	u																										
701	pintura de muros	u																										
702	pintura resaltos	u																										
703	pintura bordillos	m																										
704	pintura de retornos	u																										
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km													18	11,1		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%			
707	pintura de marcas viales	u																										
708	Erradicacion de basureros	m3				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000					4	4		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000				100%	100%			
711	Construcción de mojones	u																										
710	Retiro de avisos	GL																										
714	Instalación de captafaros	u																										
499	Limpieza de muros (concretos y gaviones)	ml																										
500	Arreglo de defensas metalicas	ml																										
709	Pintura de refereneción en infraestructura vial	u																										

OBSERVACIONES: La Microempresa Tochala cumple al 100% las actividades programadas.Ademas se realizaron actividades de parcheo, limpieza de bermas y reposicion de la señal completa que no estaban programadas.


JAIRO GUERRERO
R. Legal " COOPERATIVA TONCHALA"
C.C. 5.493.917 de Toledo (N de S)


ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

ANEXO 2

				INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
				TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER					
				EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS					
CONSORCIO VIAS 2024		55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA PR 0+0000 (REDOMA EL SALADO) - PR 29+0680 (LA CHINA) LOTE 13.							
		COOPERATIVA: LA SAMARIA		MES: ENERO DE 2025					
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 DT-NSA		REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO FLOREZ VELASCO		1/01/2025		AL		31/01/2025	
CONTRATO No. 1999 DE 2024		CONTRATO NO. 1540 DEL 2024							
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO 55NS09			EJECUTADO 55NS09			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	Cantidad	PR Ini	PR Fin	PORCENTAJE %
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3							
257	Parcheo	m3	8	03+0800	17+0000	18	08+0000	19+0275	225%
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3							
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m							
380	Limpieza de bermas en afirmado	m							
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	17.859	00+0000	29+0000	18.029	00+0000	29+0000	101%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m	811	01+0000	12+0000	811	01+0000	12+0700	100%
434	Limpieza de encole y/o descole	m	4.285	00+0000	29+0000	3363	00+0000	29+0000	100%
497	limpieza de obras	u	155	00+0000	29+0000	161	00+0000	29+0000	104%
498	limpieza de pequeñas obras hidráulicas (canales, cámaras)	m							
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	4	00+0000	20+0000	3	00+0000	20+0000	75%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	15	01+0000	25+0000	15	00+0000	25+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u							
547	Limpieza manual cursos de agua	u							
548	Limpieza y pintura de barandas	m							
600	Limpieza de gaviones	ml							
625	Despeje de derrumbes	m3	20	08+0000	09+0000	13	08+0100	09+0300	100%
630	Limpieza de la calzada	m2	500	00+0000	17+0000	1.480	00+0000	29+0680	296%
636	Roceria y desmonte manual	ha	13,6	00+0000	29+0680	13,4	00+0000	29+0680	99%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u				50	13+0000	29+0000	100%
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u							
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u							
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u							
673	Reposición de mojones de referencia	u							
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u							
678	Limpieza de señales y mojones	u							
679	Arreglo de señales y despeje	u				16	00+0000	29+0000	100%
686	Limpieza de defensas metálicas	m							
694	vigilancia	km	29.680	00+0000	29+0680	29.680	00+0000	29+0680	100%
695	Emergencias	gl							
700	pintura de cabezotes	u							
701	pintura de muros	u	135	00+0000	07+0000				
702	pintura resaltos	u							
703	pintura bordillos	m							
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km				30,9	00+0000	29+0000	100%
707	Pintura de marca viales	u							
708	Erradicacion de basureros	m3	4	00+0000	29+0680	4	00+0000	29+0680	100%
710	Retiro de avisos	GL							
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u							
803	Excavacion apra reparacion de pavimento existente	m3							
OBSERVACIONES: se realizaron las actividades al 100%, y se realizo pintura de referenciacion vial de la calzada y arreglo de despeje de señales, que no estaban programadas,									
<div><div></div><div></div></div>									
GREGORIO FLOREZ VELASCO R. Legal "COOPERATIVA LA SAMARIA"			ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES Ing. Residente de A. Vial Grupo 2 Consortio VIAS 2024						

ANEXO 2

<div> CONSORCIO VIAS 2024 NIT 901.838.214-5</div>			<div> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS</div>									
CONSORCIO VIAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			CARRETERA: 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER									
			COOPERATIVA: MICROCOLMA				MES: ENERO					
			REPRESENTANTE: MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO				1/01/2025	AL		31/01/2025		
			CONTRATO No. 3856 DE 2024									
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO				EJECUTADO					
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	%	Cantidad	PR Ini	PR Fin	%		
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3										
257	Parcheo	m3		14+0000	52+0000	100%						
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3										
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m		14+0000	30+0000	100%	19550	38+0800	45+0200	100%		
380	Limpieza de bermas en afirmado	m										
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	22.000	14+0000	38+0000	100%	25300	14+0000	38+0000	115,0%		
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m										
434	Limpieza de encole y/o descole	m	1900	14+0000	52+0000	100%	1544	14+0000	38+0000	81,3%		
497	limpieza de obras	u	130	14+0000	52+0000	100%	125	14+0000	38+0000	96,2%		
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m										
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	214	14+0000	52+0000	100%	198	14+0000	53+0678	92,5%		
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	52	14+0000	53+0678	100%	47	14+0000	52+0000	90,4%		
545	Limpieza manual del lecho del rio	u										
547	Limpieza manual cursos de agua	u										
548	Limpieza y pintura de barandas	m										
625	Despeje de derrumbes	m3										
630	Limpieza de la calzada	m2										
636	Roceria y desmonte manual	ha	16	18+0000	52+0000	100%	2,6	14+0000	52+0000	16,3%		
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u										
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u										
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u										
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u										
673	Reposición de mojones de referencia	u										
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u										
678	Limpieza de señales y mojones	u		14+0000	52+0000	100%	629	14+0000	30+0000	100,0%		
679	Arreglo de señales y despeje	u										
686	Limpieza de defensas metalicas	m		14+0000	52+0000	100%	869	14+0000	53+0758	100,0%		
694	vigilancia	km	39	14+0000	53+0678	100%	39	14+0000	53+0758	100,0%		
695	Emergencias	gl		14+0000	53+0678	100%						
700	pintura de cabezotes	u										
701	pintura de muros	u										
702	pintura resaltos	u										
703	pintura bordillos	m										
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km										
707	Pintura de marca viales	u										
708	Erradicacion de basureros	m3		14+0000	52+0000	100%	4	14+0000	52+0000	100,0%		
710	Retiro de avisos	GL										
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u										

OBSERVACIONES: Todas las actividades programadas se realizaron al 100%

Miguel Antonio Sanabria Botello

MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
R. Legal " MICROCOLMA"
C.C. 13.306.070 de Puerto Santander (N de S)



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

ANEXO 3

		CORRESPONDENCIA ENVIADA - CONSORCIO VIAS 2024 NIT. 901.838.214-5						MES : ENERO 2025					
Consecutivo	Fecha de Envío	Ciudad	Dirigido A (Razón Social)	Destinatario	Cargo Destinatario	Remitente	Asunto	Responsable de Envío	Comprimio Cuentas	Anexo s	Copias Para	Número de radicado	Observaciones
AV2- C1999-001-25	2/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Embelecimiento y ornato vías a cargo de AMV2	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-000324	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-002-25	2/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Respuesta a derecho de petición instaurado por el señor Jorge Luis Rueda sobre solicitud de reductores de velocidad	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-000358	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-003-25	3/01/2025	Cúcuta	Consorcio NSA 2024	Diego Fernando Corredor Avala	Director de Obra	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-004-25	3/01/2025	Cúcuta	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta MECUC	Jose Daniel Ortiz Soto	Mayor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-005-25	3/01/2025	Cúcuta	Instituto de Transito de Transporte-ITTLP	Javier Eduardo Porras Manrique	Director	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-006-25	3/01/2025	Cúcuta	Transito y Transporte de villa del Rosario	Lilbeth Andreina Ventura Perez	Directora	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-007-25	3/01/2025	Cúcuta	Corregimiento San Faustino	Jose Gabriel Lizcano Suarez	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-008-25	3/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de programación mensual de actividades de servicio de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-000613	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-009-25	3/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe rendimientos actividades diciembre cooperativas	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-000672	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-010-25	7/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 26	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-001112	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-011-25	8/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-012-25	8/01/2025	Cúcuta	Corregimiento Agua Clara	Federico Patiño	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-013-25	8/01/2025	Cúcuta	Corregimiento san Faustino	Jose Gabriel Lizcano Suarez	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-014-25	8/01/2025	Cúcuta	Corregimiento Buena Esperanza	Carlos David Rolon Rosas	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-015-25	8/01/2025	Cúcuta	Cooperativa de trabajo asociado y servicios multiples La Samaria	Gregorio Florez Velasco	Representante Legal Cooperativa	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-016-25	8/01/2025	Cúcuta	Cooperativa de trabajo asociado Microcolma Botelo	Miguel Antonio Sanabria Botelo	Representante Legal Cooperativa	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-017-25	8/01/2025	Cúcuta	Cooperativa de trabajo asociado Tonchala	Jairo Guerrero	Representante Legal Cooperativa	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-018-25	8/01/2025	Cúcuta	Alcaldia de Puerto Santander.	Carmen Teresa Gómez Cáceres	Alcaldesa	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-019-25	8/01/2025	Cúcuta	Alcaldia Municipio de Los Patios	Alexi Allende Valencia Lizcano	Alcalde	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-020-25	8/01/2025	Cúcuta	Alcaldia Municipio de Villa del Rosario.	Juan Camilo Suárez	Alcalde	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de plegables alusivos a la ley 1228 de 2008 normatividad sobre la zona de reserva o zona de retiro obligatorio en vías nacionales	Andrea Mendoza	Si	No	Leonel Valero Escalante		Se radico en fisico en la entidad.
AV2- C1999-021-25	13/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 27	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-003215	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-022-25	14/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Programación capacitación al personal de las microempresas del servicio de mantenimiento vial	Andrea Mendoza	Si	No	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-003401	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-023-25	15/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega informe trimestral periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, contrato 1999/2024 Consorcio vias 2024, Norte de Santander	Andrea Mendoza	Si	Si	Fabio Mojica		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-024-25	16/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Presupuestos necesidades demarcación horizontal vías 5507, 55NS09 y 70NS06-1	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-004424	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-025-25	17/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe de accidentalidad diciembre de 2024	Andrea Mendoza	Si	Si	Claudia Acero	2025E-VUVRAZ-005111	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-026-25	17/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe de instalación de marcadores de obstáculos vertical en la vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-005249	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-027-25	20/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Capacitación No.7 Cooperativas de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-005557	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-028-25	20/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 28	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-005856	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-029-25	21/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte de novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y cargue en el aplicativo SIG PAV	Andrea Mendoza	Si	No	Fredy Devinson Sierra Lopez	2025E-VUVRAZ-006013	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-030-25	23/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Ingreso trabajador de reemplazo temporal por incapacidad médica de un asociado para la ejecución del contrato 1540/2024 informe para dar respuesta a la solicitud mediante el oficio ALPUS 1066-24 de la secretaria de planeación del municipio de Puerto Santander, radicado en of. 2024/EVUVRZ-7-115662 del 18/11/2024.	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-007253	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-031-25	24/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe para dar respuesta a la solicitud mediante el oficio ALPUS 1066-24 de la secretaria de planeación del municipio de Puerto Santander, radicado en of. 2024/EVUVRZ-7-115662 del 18/11/2024.	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-007487	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-032-25	27/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Revisión cumplimiento logista contractual Tonchala y Microcolma	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-008259	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-033-25	27/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 29	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-008526	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-034-25	28/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte Avance Sigpav	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-009109	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-035-25	30/01/2025	Cúcuta	Corregimiento Buena Esperanza	Carlos David Rolon Rosas	Corregidor Buena Esperanza	Antonio Jose Herrera Rugeles	Intervención y afectación de infraestructura vial nacional en el PRA+0005 de la vía 5507	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-036-25	30/01/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe del estado de la red vial con criterio técnico	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-010133	Se radico por correo electronico.
