



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

INFORME MENSUAL No. 4

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1995 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

CONTRATO 1416 DE 2024

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ – LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000”. LOTE 1.

CONTRATO 1417 DE 2024

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200”, LOTE 2.

PERIODO:

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	6
2.1.	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	6
2.2.	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	7
2.3.	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.....	14
3.	INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS No. 1416 Y 1417 DE 2024.	17
3.1.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.	19
3.2.	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.	41
3.3.	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	41
4.	REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.	41
4.1.	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	42
4.2.	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	42
4.3.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.	42
4.4.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.	42
4.5.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.	42
4.6.	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	42
4.7.	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA.	42
4.8.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA.	43
4.9.	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL.....	43
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-ADMINISTRACIÓN VIAL No. 1995 DE 2024.	44
5.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	44
5.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ..	45
5.3.	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	97
5.4.	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	97
5.5.	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.	98
6.	REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	98
6.1.	EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	98



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

6.2.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	98
6.3.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	98
6.4.	SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	99
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	99
8.	OTROS ANEXOS.....	101
8.1.	SITIOS CRITICOS Y NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.	101
8.2.	INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL ITEM DE INSUMOS.	
8.3.	RELACIÓN DE ACCIDENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	101
8.4.	TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.	101
8.5.	TRAZABILIDAD DE DERECHOS DE PETICIÓN.....	102



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Anexos

- Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2 Resumen mensual del estado general del proyecto.
- Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.
- Anexo 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control de Aportes y Seguridad Social Contrato de Obra.
- Anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.
- Anexo 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado General del Tiempo.
- Anexo 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.
- Anexo 7. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Actas de Reunión
- Anexo 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo Contrato de Interventoría.
- Anexo 9. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control de Aportes y Seguridad Social Contrato de Interventoría
- Anexo 10. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.
- Anexo 11. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría.
- Anexo 12. Relación de Sitios Críticos y Necesidades de las Vías a Cargo.
- Anexo 13. Informes Actividades de Insumos.
- Anexo 14. Relación de accidentes.
- Anexo 15. Trazabilidad de Correspondencia Enviada y Recibida.
- Anexo 16. Trazabilidad de Derechos de Petición Generados.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las políticas fundamentales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se encuentra la conservación y mantenimiento de las carreteras de orden principal, secundario y terciario en todo el territorio colombiano. Dado lo anterior mediante el proyecto denominado **CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL** se pretende adelantar un conjunto de actividades de forma permanente a lo largo de las vías, las cuales tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos que conforman la infraestructura vial y su entorno en los corredores a cargo, manteniendo con la mínima cantidad de alteraciones o de daños los diferentes tramos que conforman la red.

Dichas actividades de mantenimiento rutinario contribuyen sin duda alguna a la preservación del patrimonio de la Nación; disminuyendo los deterioros prematuros sobre la infraestructura vial, ofreciendo atenciones oportunas con tiempos de respuestas inmediatas en eventos tipo accidentes, inundaciones, remociones en masa de menor volumen entre otras. Lo anterior garantiza la conservación de los tiempos de desplazamiento aumentando la seguridad vial para los diferentes usuarios de la vía, los cuales se benefician de una infraestructura adecuada para su libre locomoción.

Por otra parte, las labores de mantenimiento rutinario se ejecutarán mediante el empleo de mano de obra no calificada de la región generando con ello oportunidades laborales encaminadas al mejoramiento de vida de la población.

Para alcanzar el objetivo el instituto adelanto los correspondientes procesos de licitación pública generando los contratos 1416 de 2024 y 1417 de 2024 en marcados en programa de SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 AL 2. Los cuales se ejecutan por medio de las cooperativas de trabajo asociados Coopmavial y los Robles.

Por último, a través del proceso de contratación CMA-DEO-SGI-142-2013, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS realizo el proceso de selección de la Administración Vial designada como Interventora, del cual se genera el contrato 1995 de 2024, adjudicado al CONSORCIO INGEVIAM, quienes ejercen las labores de control, seguimiento y supervisión de las cooperativas de trabajo asociado.

El instituto Nacional de vías mediante el funcionario designado ejercerá la supervisión general de los contratos descritos anteriormente.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

RUTA 2901B ARMENIA- ALCALA PR 0 +0000 A PR 23 +0325

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 2901B, PR 23+0325 Armenia- Alcalá, entre los Departamentos del Quindío y Valle del Cauca.

La ruta 2109B Armenia- Alcalá tiene 23,43 km en pavimento flexible, en este corredor vial, se presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió el periodo de diseño hace varios años atrás, Actualmente, se presenta daños, como fisuras longitudinales, piel de cocodrilo y baches.

ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 2901B:

Código Vía	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
2901B	0+000	1+0000	RUTA 2901B ARMENIA -ALCALA	1,000	P-1	Regular
	1+0000	2+0000		1,000	P-1	Regular
	2+0000	3+0000		1,000	P-1	Regular
	3+0000	4+0000		1,000	P-1	Bueno
	4+0000	5+0000		1,000	P-1	Bueno
	5+0000	6+0000		1,000	P-1	Bueno
	6+0000	7+0000		1,000	P-1	Bueno
	7+0000	8+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	8+0000	9+0000		1,000	P-1	Regular
	9+0000	10+0000		1,000	P-1	Bueno
	10+0000	11+0000		1,000	P-1	Bueno
	11+0000	12+0000		1,000	P-1	Regular
	12+0000	13+0000		1,000	P-1	Bueno
	13+0000	14+0000		1,000	P-1	Regular



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

2901B	14+0000	15+0000		1,000	P-1	Bueno
	15+0000	16+0000		1,000	P-1	Regular
	16+0000	17+0000		1,000	P-1	Regular
	17+0000	18+0000		1,000	P-1	Regular
	18+0000	19+0000		1,000	P-1	Bueno
	19+0000	20+0000		1,000	P-1	Bueno
	20+0000	21+0000		1,000	P-1	Regular
	21+0000	22+0000		1,000	P-1	Regular
	22+0000	23+0000		1,000	P-1	Bueno
	23+0000	23+0325		0,325	P-1	Bueno

Tabla 1. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 2901B

Actualmente, se ejecuta el contrato de obra No. 1904-2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES MODULO 2 el cual se está ejecutando actualmente entre los PR 0+0000 y PR 23 +0325 de la Ruta 2901B.

RUTA 25VL07 CARTAGO - ALCALA PR 0 +0000 A PR 20 +0100

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 25VL07 PR 0 +0000 (Cartago) al PR 20+0100 (Alcalá) en el Departamento del Valle Del Cauca.

La ruta 25VL07 Cartago-Alcalá, Tiene 20.14 km en pavimento flexible, en este corredor vial se presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió con el periodo de diseño.

Actualmente, se está ejecutando el contrato 2028-2024 mediante el suministro de mezcla para la atención de algunos sectores de la vía que presentan deterioro grave con baches y piel de cocodrilo, generando riesgos para los usuarios de la vía.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Sin embargo, el mantenimiento realizado no es suficiente y se mantiene la mayoría de los aspectos de deterioro de la vía, requiriendo la construcción y reconstrucción de obras de drenaje, obras de contención de taludes, obras para atención de sitios críticos y obras para cambio de carpeta de rodadura.

Respecto a la señalización, actualmente se dio inicio al contrato No. 2047-2024 para la instalación de señalización vertical y demarcación horizontal de la vía, con la cual se realizara la instalación de señalización vertical, la cual ha sido hurtada constantemente, generando riesgos para el usuario de la vía, que no cuenta con señales preventivas ni reglamentarias en muchos tramos de la vía, lo que hace desconocer las velocidades de tránsito en los sitios, la localización de curvas y sectores de tránsito de peatones entre otros.

No obstante, debido a la topografía de la vía y a las altas velocidades por las que circulan los vehículos en esta vía, se requieren de más recursos para complementar con más obras de señalización que incrementen la seguridad de los peatones.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios de la vía.

Código vía	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
25VL07	+	1+0000	CARTAGO- ALCALA PR 0 +000 A PR 20 +0100	1,000	P-1	Regular
	1+0000	2+0000		1,000	P-1	Regular
	2+0000	3+0000		1,000	P-1	Regular
	3+0000	4+0000		1,000	P-1	Regular
	4+0000	5+0000		1,000	P-1	Regular
	5+0000	6+0000		1,000	P-1	Bueno
	6+0000	7+0000		1,000	P-1	Regular
	7+0000	8+0000		1,000	P-1	Bueno
	8+0000	9+0000		1,000	P-1	Regular
	9+0000	10+0000		1,000	P-1	Regular
	10+0000	11+0000		1,000	P-1	Regular



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

	11+0000	12+0000		1,000	P-1	Regular
	12+0000	13+0000		1,000	P-1	Regular
	13+0000	14+0000		1,000	P-1	Regular
	14+0000	15+0000		1,000	P-1	Regular
	15+0000	16+0000		1,000	P-1	Regular
	16+0000	17+0000		1,000	P-1	Regular
	17+0000	18+0000		1,000	P-1	Regular
	18+0000	19+0000		1,000	P-1	Regular
	19+0000	20+0000		1,000	P-1	Regular
	20+0000	20+0100		0,100	P-1	Bueno

Tabla 2. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 25VL07

RUTA 40QN05 VARIANTE CALARCA –LA CABAÑA PR 0 +000 A PR 7 +0260

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 40QN05 PR 0 +0000 (Calarcá) al PR 7+0260 (salida a autopista del café) entre los municipios de Calarcá, Salento y Armenia en el Departamento del Quindío.

La ruta 40QN05 Variante Calarcá –la Cabaña, Tiene 7.26 km en pavimento flexible, en este corredor vial se presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió con el periodo de diseño, por lo que se evidencian baches, piel de cocodrilo, fisuras, cabezas duras y en la mayoría del tramo se requiere rehabilitación completa de la calzada, además de que se presentan socavaciones en algunos sitios que requieren de obras preventivas.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios de la vía.

Código Vía	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
40QN05	0+0000	1+0000		1,000	P-1	Bueno
	1+0000	2+0000		1,000	P-1	Bueno



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

	2+0000	3+0000	RUTA 40QN05 VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA	1,000	P-1	Bueno
	3+0000	4+0000		1,000	P-1	Bueno
	4+0000	5+0000		1,000	P-1	Bueno
	5+0000	6+0000		1,000	P-1	Bueno
	6+0000	7+0000		1,000	P-1	Bueno
	7+0000	7+0260		0,260	P-1	Bueno

Tabla 3. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 40QN05

RUTA 4002 LA PAILA ARMENIA- PR 41+0760 SECTOR CLUB CAMPESTRE – ARMENIA PR 41+0760 A PR 50+0250

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 4002 PR 41 +0970 (Glorieta club campestre) al PR 50+0250 (Armenia) en los municipios de la Tebaida y Armenia en el Departamento del Quindío

El sector Club campestre- Armenia de la ruta 4002 Variante Calarcá –la Cabaña, Tiene 8.52km de doble calzada en pavimento flexible, en este corredor vial, la superficie de rodadura se encuentra en condiciones adecuadas para la transitabilidad, y los elementos de señalización e iluminación son suficientes, debido a que la estructura del pavimento ha recibido rehabilitación en la mayoría de sus tramos.

Sin embargo, se presentan constantes accidentes en el sitio a causa de las altas velocidades que pueden alcanzar los vehículos debido a que la vía en su mayoría es recta y con pendientes inferiores al 5%.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mantengan la adecuada funcionalidad de la vía y la seguridad para los usuarios de la vía.

Código Vía	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
4002	41+0760	42+0000	RUTA 4002 LA PAILA- ARMENIA PR 41+0760 A PR 50+0250 SECTOR CLUB CAMPESTRE- ARMENIA	0,240	P-1	Bueno
	42+0000	43+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	43+0000	44+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	44+0000	45+0000		1,000	P-1	Muy Bueno



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

	45+0000	46+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	46+0000	47+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	47+0000	48+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	48+0000	49+0000		1,000	P-1	Muy Bueno
	49+0000	50+0000		1,000	P-1	Bueno
	50+0000	50+0250		0,250	P-1	Bueno

Tabla 4. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 4002

RUTA 4003 VIA ARMENIA –IBAGUE SECTOR ARMENIA –CALARCA PR 0+0000 A PR 3 +0828

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 4003 PR 0 +0000 (Armenia) al PR 3+0828 (Calarcá) en los municipios de la Armenia y Calarcá en el Departamento del Quindío

El sector Armenia –Calarcá de la ruta 4003, Tiene 3.8 km de pavimento flexible, vial se presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió con el periodo de diseño, por lo que se evidencian baches, piel de cocodrilo, fisuras, cabezas duras y en la mayoría del tramo se requiere rehabilitación completa de la calzada.

Actualmente se ejecuta el contrato de obra no. 1904-2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES MODULO 2 el cual se está ejecutando actualmente entre los PR 0+0000 y PR 0 +0350 de la Ruta 4003.

Mediante dicho contrato se está realizando la construcción de obras para la doble calzada en este sector, por lo que la vía en este sector se encuentra con deterioro a causa de las obras, por lo que solo se pueden realizar labores de limpieza en el sector izquierdo de la vía en temas de rocería y limpieza de cunetas.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios de la vía.

Codigo Vía	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
4003	0+0000	1+0000	ARMENIA-IBAGUE SECTOR ARMENIA- CALARCA PR 0+0000 A PR 3 +828	1,000	P-1	Regular
	1+0000	2+0000		1,000	P-1	Bueno
	2+0000	3+0000		1,000	P-1	Bueno
	3+0000	3+0828		0,828	P-1	Regular

Tabla 5. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 4003

RUTA 40QN04 LA ESPAÑOLA- ARMENIA PR 2 +0300 A PR 4+0000

El sector se encuentra localizado sobre la ruta 40QN04 PR 2 +0300 (glorieta salida al camino) al PR 4+0000 (Armenia) en el municipio de Armenia en el Departamento del Quindío

La ruta 40QN04 La española- Armenia, Tiene 1.7 km en pavimento Rígido, en este corredor vial se encuentra deterioradas las losas de concreto en la mayoría del tramo, se requiere intervención mediante el sello de las juntas entre losas de concreto, dado que se están desgastando por el constante tráfico vehicular sobre dichas juntas.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios de la vía.

CODIGO VIA	PR inicial	PR final	CARRETERA	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
40QN04	2+0300	3+0000	LA ESPAÑOLA - ARMENIA	0,700	P-6	Bueno
	3+0000	4+0000		1,000	P-6	Bueno

Tabla 6. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 40QN04



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 29VLA VARIANTE ALCALA Y ACCESOS PR 0+0000 A PR 1+0200

El sector se encuentra localizado sobre la Ruta 29VLA PR 0 +0000 al PR 1+200 en el municipio de Alcalá en el Departamento del Valle del Cauca

El sector Variante Alcalá y accesos, Tiene 1.2 km de pavimento flexible, vial se presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió con el periodo de diseño, por lo que se evidencian baches, piel de cocodrilo, fisuras, cabezas duras.

Código	PR inicial	PR final	Carretera	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Estado
29VLA	0+0000	1+0000	Variante Alcalá y accesos	1,000	P-1	Bueno
	1+0000	1+0200		0,200	P-1	Bueno

Tabla 7. Estado Visual de la Red Vial – Ruta 29VLA

2.3.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

A continuación, se detallan las actividades que están dentro del alcance de los contratos de Mantenimiento Rutinario:

- Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado con mano de obra directa: Reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por medio de reconstrucción de las capas inferiores con material granular compactado, sin incluir la capa de rodadura.
- Parcheo (en la berma pavimentada) realizado con mano de obra directa: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) incluyendo la compactación.
- Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de emulsión y arena.
- Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsión asfáltica.
- Limpieza de bermas pavimentadas realizado con mano de obra directa: eliminación de tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que pueden restringir su utilización. Debe incluir el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción).



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

-
- Bacheo (en la berma afirmada) realizado con mano de obra directa. Relleno de los huecos de la berma, con material de igual o superior calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación.
 - Limpieza de bermas realizado con mano de obra directa. Eliminación de tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que puedan restringir su utilización. Debe incluirse el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción).
 - Limpieza manual de las cunetas revestidas y en Tierra.
 - Limpieza manual de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.
 - Limpieza manual de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.
 - Limpieza manual de obras de más de 0.60 m2 de sección (de 24", 36" y box coulverts).
 - Limpieza manual de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras).
 - Mantenimiento rutinario de puentes realizado con mano de obra directa, incluye obras de limpieza
(trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado).
 - Limpieza manual del lecho del río (si las condiciones del caudal del río lo permiten) limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado).
 - Limpieza manual de cursos de agua. Limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado).
 - Limpieza manual y pintura de barandas.
 - Despeje de derrumbes (No incluye maquinaria ni señalización temporal).
 - Limpieza de la calzada. (No se incluye maquinaria).
 - Rocería y desmonte manual.
 - Poda, corte y/o retiro de árboles.
 - Empradización con semillas.
 - Empradización con cespiones.
 - Jardinería (De acuerdo con las instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial).



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

-
- Reposición de la lámina de las señales (No incluye suministro).
 - Reposición del poste de la señal (No incluye suministro).
 - Reposición de la señal completa (No incluye suministro).
 - Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro).
 - Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro).
 - Limpieza manual de señales.
 - Instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).
 - Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro).
 - Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica (No incluye suministro).
 - Limpieza manual de defensas metálicas.
 - Vigilancia
 - Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, coordinadas por el administrador vial, previa aprobación de la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles
 - Emergencias. Tareas necesarias para intervenciones que aseguren un restablecimiento rápido del tránsito (No incluye maquinaria ni señalización temporal).



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS No. 1416 Y 1417 DE 2024.

CONTRATO No. 1416 DE 2024	
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ – LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA – COOPMAVIAL
LOCALIZACIÓN:	Departamento del Quindío – Municipios de Calarcá, Armenia, Salento y Montenegro.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PADRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
ACTA REALIZADAS HASTA LA FECHA:	TRES (3)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.850.348.849 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESES MCTE (INCLUIDO IVA)
INTERVENTORIA:	Administración Vial - CONSORCIO INGEVIAM
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
LICITACIÓN PUBLICA No.:	LP-DEO-SGI-077-2023



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CONTRATO No. 1417 DE 2024	
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES
LOCALIZACIÓN:	Departamento del Quindío – Municipios de Montenegro y Quimbaya. Departamento del Valle del Cauca - Municipios de Alcalá y Cartago.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PADRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
ACTA REALIZADAS HASTA LA FECHA:	TRES (3)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.701.517.999 (MIL SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (INCLUIDO IVA).
INTERVENTORIA:	Administración Vial - CONSORCIO INGEVIAM
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
LICITACIÓN PUBLICA No.:	LP-DEO-SGI-077-2023



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

3.1.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA COOPMAVIAL

RUTA 2901B PR0+0000 AL PR8+0000				
TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 4+0600	LIMPIEZA MATERIAL DE DERRUMBE			
PR 5+0900	LIMPIEZA MATERIAL DE DERRUMBE			
PR 4+0950	LIMPIEZA BOX CULVERT			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

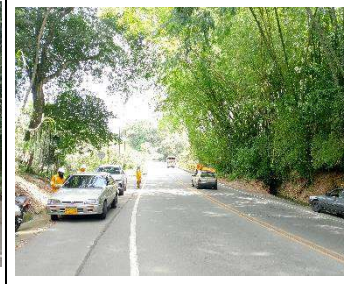PR 3+0250	TALA DE GUADUAS EN RIESGO			
PR 2+0600 A PR 6+0000	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 2+0600 A PR 6+0000	ROCERÍA MECANICA			
PR 0+0000 A PR 2+0600	ROCERÍA MECANICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 0+0000 A PR 2+0600	LIMPIEZA CUNETAS			
--------------------------	---------------------	---	--	---

RUTA 40QN05 - PR 0+0000 AL PR 7+0260

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 0+0000 A PR 2+0000	ROCEÍA MECANICA			
PR 0+0000 A PR 2+0000	LIMPIEZA CUNETA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 0+0400	TALA DE GUADUAS			
PR 0+0000	INSTALACIÓN PASACALLE			
PR 4+0000 A PR 4+0600	TALA DE ARBOLES			
PR 0+0000 A PR 0+0600	ROCERÍA MECANICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 0+0600 A PR 2+0000	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 0+0600 A PR 2+0000	ROCERÍA MECANICA			
PR 4+0700	LIMPIEZA MATERIAL VEGETAL DE TALA DE ARBOLES			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INSUMOS

1. Se Realizó la instalación de vallas informativas en los PR 0+0050 y 19 +900 de la RUTA 25VL07 y en el PR 3+0900 de la Ruta 4003 y entrega de Volantes a los conductores en el marco de la resolución 1336 del 24 de abril de 2024 para la restricción de vehículos de peso mayor a 15 toneladas en el puente Piedras de Moler sobre el Rio la Vieja PR 9+0640 de la Ruta 25VL07.



Imagen 1 y 2 Instalacion de vallas informativas PR 3+0900 RUTA 4003 y PR 0+000 RUTA 25VL07

2. Se entregaron insumos de pintura y disolvente para labores de Abscisado de las vías a cargo de la cooperativa los Robles.



Imagen 3,4 y 5 PR 0+0100 Demarcación del Abscisado RUTA 25VL07



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imagen 6,7 y 8 PR 9+0400 Demarcación de Abscisado RUTA 2901B

RUTA 4002 - PR 41+0760 AL PR 50+0250

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 41+0760 A PR 46+0000	ROCERIA MECANICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 41+0760 A PR 46+0000	LIMPIEZA CICLOVIA			
PR 45+0200	ROCERÍA MECANICA			
PR 45+0200	LIMPIEZA ROTONDA			
ROCERÍA MECANICA	PR 46+0000 A PR 48+0000			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ROCERÍA MECANICA	PR 48+0000 A PR 50+0250			
LIMPIEZA CUNETA	PR 48+0000 A PR 50+0250			
ROCERÍA MECANICA	PR 49+0300			
LIMPIEZA ROTONDA	PR 49+0300			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ROCERÍA MECANICA	PR 41+0760 A PR 49+0000			
LIMPIEZA MANI FORRAGERO	PR 41+0760 A PR 49+0000			

ruta 4003 - PR 0+0000 AL PR 3+0828 -

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 1+0300	TALA DE GUADUAS			
PR 0+0000 A PR 2+0400	LIMPIEZA CUNETAS			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 0+0000 A PR 3+0700	ROCERÍA MECANICA			
PR 0+0000 A PR 2+0000	LIMPIEZA OBRAS			
PR 2+0000 A PR 3+0820	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 3+0820	ROCERÍA MECANICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 40QN04 - PR 2+0300 AL PR 4+0000

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

RUTA 2901B PR8+0000 AL PR23+0325

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 17+0000 A PR 19+0000	DESPEJE SEÑALES			
PR 22 +0000 A PR 23+0325	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 14+0900	TALA GUADUAS EN RIESGO			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 12+0000 A PR 13+0000	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 15+0000 A PR 16+0500	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 16+0500 A PR 18+0000	LIMPIEZA CUNETAS			
PR 10+0600	LIMPIEZA BOXCULVERT			
PR 11+0150	LIMPIEZA BOXCULVERT			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ATENCION OPORTUNA A EMERGENCIAS

El día 30 de octubre del 2024 se presentó emergencia en el PR 5 +0780 de la vía 2901B por caída de un árbol, provocado por una fuerte lluvia presentada ese día. La cooperativa los Robles atendió inmediatamente la emergencia cortando y despejando el árbol caído, removiendo el material que estaba sobre la calzada y limpiando la carpeta de rodadura.



Imágenes. 1 y 2 RUTA 2901B PR 5 +0780 labores de corte y remoción de árboles sobre la vía



Imágenes. 3 y 4 RUTA 2901B PR 5 +0780 labores de corte y remoción de árboles sobre la vía



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 25VL07 - PR 0+0000 AL PR 20+0100

TRAMO ATENDIDO	LABORES EJECUTADAS	FOTOGRAFÍA		
		ANTES	DURANTE	DESPUES
PR 0+0000 A PR 2+0000	DESPEJE SEÑALES			
PR 1+0700 A PR 9+0200	TAPA HUECOS			
PR 13+0500	LIMPIEZA OBRAS			
PR 0+0000 A PR 2+0000	ROCERÍA MECÁNICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 4+0000 A PR 5+0000	DESTAPE Y LIMPIEZA SEÑALES			
PR 4+0000 A PR 6+0000	ROCERÍA MECANICA			
PR 6+0000 A PR 7+0000	ROCERÍA MECANICA			
PR 9+0000 A PR 10+0000	ROCERÍA MECANICA			



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

PR 9+0000 A PR 10+0000	ROCERÍA MECANICA			
PR 0+0000 A PR 4+0000	ABSCISADO			

ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS



Imágenes. 1 y 2 RUTA 25VL07 PR 17 +0900 labores de corte y remoción de árboles sobre la vía



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imágenes. RUTA 25VL07 PR 17 +0900 labores de corte y remoción de árboles sobre la vía

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO NO: 2028-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA VIA CARTAGO-ALCALA CODIGO 25VL07, DEL PR 00+000 AL PR 20+100, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: RYR INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE INICIO: 16 DE JULIO DEL 2024

PLAZO: UN (1) MESES

Se culminaron las labores de demolición, remoción de carpeta existente, suministro, riego y compactación de mezcla asfáltica en los PR 0+0760, 1+0015, 1+0025, 2+0320, 2+0970, 3+0233, 3+0175, 3+0260, 3+0270, 3+0300, 3+0815, 8+0110, 8+0135

Se dio trámite al acta parcial no. 1 y final de obra, correspondiente al mes de julio del 2023, y el contrato se encuentra en trámite de liquidación.

CONTRATO NO: 2047-2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA CARTAGO - ALCALÁ CÓDIGO 25VL07. DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO DEL INVIAS

CONTRATISTA: INGEVIAL PYM S.A.S.

ORDEN DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2024

PLAZO: DOS (2) MESES

Durante el presente mes, el contratista realizo las actividades de instalación de la señalización vertical en los siguientes sitios:



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

No.	SEÑAL	CODIGO SEÑAL	PR	COSTADO O CARRIL (EN EL SENTIDO DEL ABCISADO)
1	señal velocidad máxima 60 km/h	SR-30	0+0590	Derecho
2	señal velocidad máxima 60 km/h	SR-30	0+0820	Izquierdo
3	señal curva cerrada a la derecha	SP-02	0+0750	Derecho
4	señal velocidad máxima 30 km/h	SR-30	0+0700	Derecho
5	señal velocidad máxima 30 km/h	SR-30	1+0000	Izquierdo
6	señal curva cerrada la izquierda	SP-01	1+0020	Izquierdo
7	señal zona de curvas sucesivas primera a la izquierda	SP-07	1+0010	Derecho
8	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	1+0050	Derecho
9	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	1+0240	Izquierdo
10	señal zona de curvas sucesivas primera a la izquierda	SP-07	1+0300	Izquierdo
11	señal curva pronunciada a la izquierda	SP-03	1+0400	Derecho
12	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	1+0440	Derecho
13	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-31	1+0550	Izquierdo
14	señal curva pronunciada a la derecha	SP-04	1+0570	Izquierdo
15	señal curva pronunciada a la izquierda	SP-03	1+0890	Derecho



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

16	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	1+0930	Derecho
17	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0210	Izquierdo
18	señal curva pronunciada a la Derecha	SP-04	2+0240	Izquierdo
19	señal curva pronunciada a la izquierda	SP-03	2+0280	Derecho
20	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0340	Derecho
21	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-31	2+0480	Izquierdo
22	señal curva pronunciada a la Derecha	SP-04	2+0510	Izquierdo
23	señal curva pronunciada a la derecha	SP-04	2+0510	Derecho
24	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0550	Derecho
25	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0740	Izquierdo
26	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0810	Derecho
27	señal velocidad máxima 40 km/h	SR-30	2+0960	Izquierdo
28	señal velocidad máxima 60 km/h	SR-30	3+0360	Derecho
29	señal velocidad máxima 60 km/h	SR-30	3+0670	Izquierdo
30	Señal vía lateral derecha	SP-13	4+0820	Derecho
31	señal curva cerrada a la izquierda	SP-01	7+0830	Derecho
32	señal velocidad máxima 30 km/h	SR-30	7+0860	Derecho
33	señal velocidad máxima 30 km/h	SR-30	7+0990	Izquierdo



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

34	señal curva cerrada a la Derecha	SP-02	8+0020	Izquierdo
35	señal curva cerrada la derecha	SP-02	8+0200	Derecho
36	señal velocidad máxima 30 km/h	SR-30	8+0390	Izquierdo
37	señal curva cerrada la izquierda	SP-01	8+0410	Izquierdo

Además, el contratista realizo la demarcación horizontal entre los PR 0+000 Y PR 10+0150 de la ruta 25VL07



Imagen 5 y 6. Actividades de demarcación horizontal PR 0+000 a PR 10+0150 RUTA 25VL07



Imagen 7 y 8. Actividades de demarcación horizontal PR 0+000 a PR 10+0150 RUTA 25VL07



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Al finalizar el periodo del informe, el contrato ha presentado las siguientes suspensiones y reinicios:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		18/09/2024	18/09/2024	2/10/2024	3/10/2024
	1	3/10/2024	3/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
	2	17/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	25/10/2024

Se autorizó un adicional por valor de \$ 32.924.771 y la Prorroga no. 1 hasta el día 09 de noviembre del 2024.

CONTRATO NO: 2428-2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

ORDEN DE INICIO: 16 DE AGOSTO DEL 2024

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre del 2024

En visita realizada con la participación del contratista y la Administración Vial, la Dirección Territorial del INVIAS, autorizó intervenir el sitio critico ubicado en el PR 5+0450 de la vía Variante Calarcá - La Cabaña (Ruta 40QN05), donde se presenta perdida parcial de banca con la construcción de un muro en gaviones.



Imagen 1 y 2 PR 5+0450 RUTA 40QN05 Construcción de Muro en gaviones



Imagen 3 y 4 PR 5+0450 RUTA 40QN05 Construcción de Muro en gaviones

Se consideró necesario solicitar recursos adicionales, con el propósito de atender las emergencias que puedan presentarse, en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías, como remoción de derrumbes por temporada de lluvias, las cuales el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha anunciado llegarían en el segundo semestre del año y se incrementaría en el trimestre final, producto del fenómeno de La Niña; situación que se ha evidenciado en las últimas semanas.

Actualmente, está en trámite el proceso de adición de recursos por un valor de \$9.434.252.

3.2.SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

El presente contrato por su naturaleza no cuenta con ítems no previstos en la ejecución de actividades.

3.3.ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Contrato No.	Valor del contrato	Valor ejecutado	Porcentaje de avance
1416-2024	\$ 1.850.348.849,00	\$ 329.837.268,15	17.83%
1417-2024	\$ 1.701.517.999,00	\$ 303.348.111,71	17.83 %

Permanentemente se verifica el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario y se coordinan las actividades a realizar.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

4.1.RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2, “Resumen mensual del estado general de los contratos”, se relacionan las actividades realizadas en este periodo. **Ver ANEXO No. 1.**

4.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se presenta la relación del equipo utilizado por las Cooperativas de mantenimiento rutinario, durante periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024. **Ver ANEXO No. 2.**

4.3.PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se presenta la relación del personal del contratista de mantenimiento rutinario, durante periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre de 2024. **Ver ANEXO No. 3.**

4.4.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se presenta la relación de las actas parciales de obra causadas a la fecha. **Ver ANEXO No. 4.**

4.5.ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el presente periodo predomina el tiempo seco en la región, en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se registra la tendencia del clima. **Ver ANEXO No. 5.**

4.6.RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

No aplica para los contratos de mantenimiento rutinario.

4.7.SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA.

El contratista presentó las pólizas, las cuales fueron aprobadas por la Dirección Territorial Quindío del Invias y se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. **Ver ANEXO No. 6.**



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

4.8.SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Las Cooperativas de trabajo asociado Los Robles y Coopmavial desarrollan los trabajos acordes a lo estipulado en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y la Administración Vial realiza seguimiento constante a:

- Revisión del personal presente en la vía.
- Registro del estado del tiempo.
- Se lleva trazabilidad de la correspondencia.
- Se verifica el diligenciamiento de la bitácora.
- Se verifica el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario.
- Comités técnicos de obra (actas de reunión generadas en cada una de ellas).
- Recorrido permanente a los corredores viales a cargo.
- Verificación de la implementación del SG-SST.
- Verificación de afiliación y aportes al SGSSS.
- Verificación de herramienta y equipos.
- Verificación de dotación.

4.9.OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

Informe de inversión y buen manejo de anticipo.

En los Contratos objeto del presente mantenimiento rutinario no se otorgó anticipo por parte de la entidad contratante.

Seguimiento al programa de obra.

Dada la naturaleza del contrato este no cuenta con un programa de obra estricto donde se pueda dar un seguimiento a un plan de obra ya que las actividades son múltiples y se desarrollan de forma constante, igualmente varían acorde a la atención de emergencias presentadas en las vías cargo.

Seguimiento al programa de inversión.

Dada la naturaleza del contrato este no cuenta con un programa de inversión, se cuenta con un valor mensual de ejecución de trabajos acorde a los kilómetros de mantenimiento establecidos.

Actas de comité técnico de seguimiento al programa de obra.

Durante el presente mes se han realizado comités técnicos de obra, los cuales se desarrollan con una frecuencia semanal; dichos comités se registran mediante actas según formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. **Ver ANEXO No. 7.**

- Acta No. 8 (04-10-2024)



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- Acta No. 9 (11-10-2024)
- Acta No. 10 (18-10-2024)
- Acta No. 11 (25-10-2024)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-ADMINISTRACIÓN VIAL No. 1995 DE 2024.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1995 DE 2024	
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.
CONSULTOR:	CONSORCIO INGEVIAM
LOCALIZACIÓN:	Departamento del Quindío – Municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya, Departamento del Valle del Cauca - Municipios de Alcalá y Cartago.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PADRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE INICIACIÓN:	2 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.984.929.795 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO).
INTERVENTORIA:	Administración Vial - CONSORCIO INGEVIAM
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. Diana Carolina Galvez Cifuentes
CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No.:	CMA-DEO-SGI-142-2023

5.2.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

- El día 01 de Octubre de 2024, Reunión virtual con el SIGP-SIPUCOL para inspección e inventario puentes Territorial Quindío.

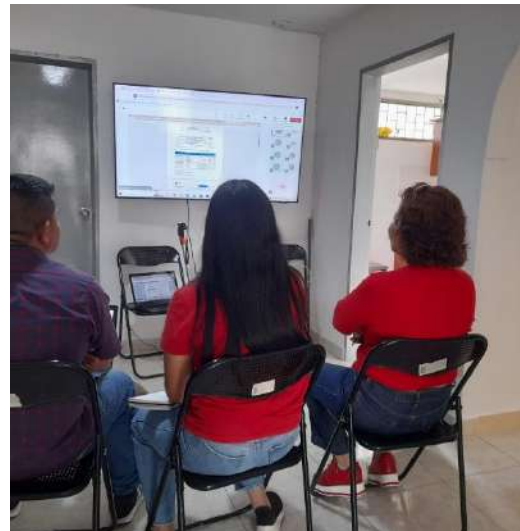


Imagen 9 y 10 Reunión virtual

- El día 1 de Octubre de 2024, Reunión virtual SIGPAV, sobre manejo del aplicativo el cual permite la recopilación de información semestral por parte de los Administradores Viales o quien haga sus veces, para la condición de estado de pavimentos flexibles.



Imagen 11, 12, 13 y 14 Lote INVIAS salida al Caimo



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 02 de Octubre de 2024, Reunión virtual INVICOSTOS con el fin de explicar la herramienta de cotización de insumos para la creación de APU, destacando su importancia y la necesidad de contar con un listado actualizado de precios.



Imagen 15 y 16 Inspección y verificación invasión RUTA 4002 PR 47+0760

- El día 02 de Octubre de 2024 Se realiza Inspección labores de limpieza puente de piedras de moler PR 9 + 960 Ruta 25VL07.



Imagen 17, 18, 19 y 20 Inspección y verificación permiso Uso zona de vía RUTA 4002

- La Administración vial, el día 02 de Octubre de 2024 realiza Verificación e inspección cumplimiento indicadores de mantenimiento rutinario Cooperativa los Robles



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imagen 21, 22, 23 y 24 Recorrido y reunión Cooperativa Coopmavial RUTA 4003

- La Administración vial, el día 02 de Octubre de 2024 realiza Inspección y verificación Necesidades Carpeta Asfáltica en la RUTA 25VL07, para dar respuesta al oficio 2024S-VQUI-068850 del 25-09-2024



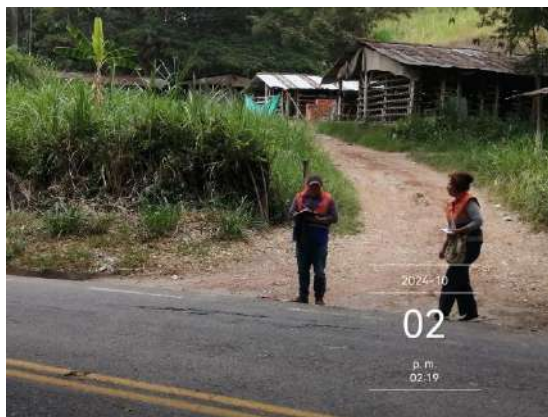


Imagen 25 y 26 Ruta 2901B Inspección Inspección actividades Cooperativa los Robles

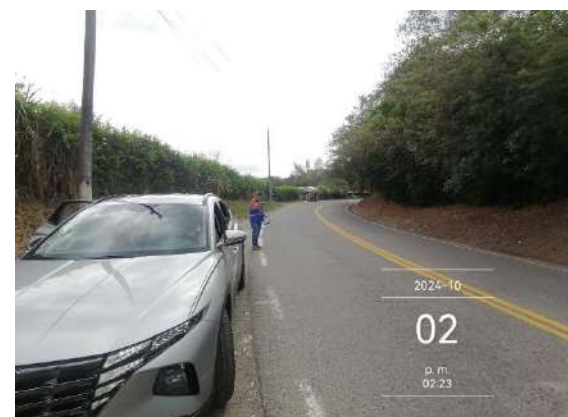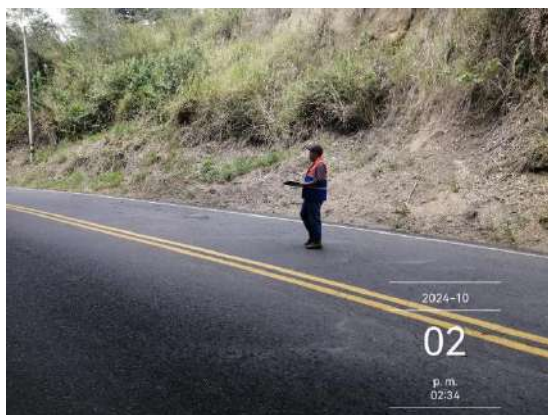

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 03 de Octubre de 2024 la Administración Vial realiza Inspección y verificación Necesidades Carpeta Asfáltica en la RUTA 2901B, para dar respuesta al oficio 2024S-VQUI-068850 del 25-09-2024



Imagen 27 y 28 Inspección Invasión Zona reserva carretera RUTA 25VL07 PR 19+0800.

- El día 03 de Octubre de 2024 la Administración Vial realiza, entrega de insumos para actividades de colocación de pasacalles informativos de paso restringido de vehículos pesados en puente piedras de moler RUTA 25VL07.



Imagen 29, 30, 31 y 32 Inspección Invasión Zona reserva carretera RUTA 29VLA PR 0+0900

- El día 03 de Octubre de 2024 la Administración Vial, realiza identificación de daños en el pavimento rígido RUTA 40QN04.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imagen 33, 34 y 35 Reunión Oficinas Invias – recorrido vías a cargo

- El día 04 de Octubre de 2024, se realiza inspección y verificación Inspección de juntas de dilatación del puente de la duquesa con ejecutor del contrato 2428-2024 monto agotable Ruta 40QN05 PR 3+ 600



Imagen 36 y 37 Inspección y verificación instalación señalización RUTA 25VL07

- El día 04 de Octubre de 2024, se realiza Inspección y supervisión actividades de tala preventiva de guaduas con riesgo de caída sobre la vía Ruta 4003 PR 1 +300



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imagen 38 y 39 Inspección actividades de mantenimiento rutinario RUTAS 2901B Y 25VL07

- El día 04 de Octubre de 2024 se realizó visita de inspección preliminar con ejecutor del contrato 2428-2024 monto agotable para atención de sitio crítico con construcción de muro en gaviones Ruta 40QN05 PR 5+0450.



Imagen 40, 41, 42 y 43 Inspección e Inventario defensas RUTAS 4003 y 40QN05

•



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 04 de Octubre de 2024 se realizó visita de inspección para información ANSV - hallazgos auditorias inspecciones de seguridad vial y revisión de límites de velocidad RUTA 4002



Imagen 44, 45, 46 y 47 Supervisión tala preventiva de guadua RUTA 40QN05 PR 0+0350

- El día 09 de Octubre de 2024 se realiza articulación con las entidades de riesgo del municipio de Calarcá y Armenia para la atención de emergencias.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



Imagen 40, 41, 42 y 43 Inspección e Inventario defensas RUTAS 4003 y 40QN05

- El día 09 de octubre de 2024 se realiza inspección y verificación de necesidades de la carpeta en pavimento rígido en la Ruta 40QN04.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 10 de Octubre de 2024 Inspección necesidades de demarcación y señalización para presupuesto RUTA 40QN05



- El día 10 de Octubre de 2024 se realiza Inspección y acompañamiento en la actividad de tala de guadua en el PR3+250 y PR 4+0000 de la vía 2901B.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 11 de Octubre de 2024 Asistencia en representación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a entregas sociales de las OPC salón comunal Cecilia etapa I.



- El día 11 de Octubre de 2024 Se sigue con la actividad de Inspección necesidades de demarcación y señalización para presupuesto RUTA 40QN05





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 16 de Octubre de 2024 Capacitación microempresas con Abogado David Ricardo Bernal O. Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y ley 1952 de 2019.



- El día 17 de Octubre de 2024 se realiza Inventario de Señalización y obras de drenaje Ruta 4002 para respuesta 2024S-VQUI-074373 del 11-10-2024.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 18 de Octubre de 2024 Asistencia en representación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a entregas sociales de las OPC- ICBF salón comunal Cecilia etapa I.



- El día 21 de Octubre de 2024 se realiza Inventario de Señalización y obras de drenaje Ruta 4002 para respuesta 2024S-VQUI-074373 del 11-10-2024.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 21 de Octubre de 2024 se realiza Inventario de Señalización y obras de drenaje Ruta 25VL05 para respuesta 2024S-VQUI-074373 del 11-10-2024.



- El día 22 de Octubre de 2024 se realiza Inventario de Señalización y obras de drenaje Ruta 25VL05 para respuesta 2024S-VQUI-074373 del 11-10-2024.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 23 de Octubre de 2024 se realiza Inspección y verificación tala de Árboles en Riesgo Ruta 40QN05.



- El día 23 de Octubre de 2024 se realiza visita de inspección técnica Ruta 40QN05 PR 5+0450 trabajos contrato Monto Agotable.



- El día 23 de Octubre de 2024 Reunión con el Ingeniero Lenin Tito Mendoza Director Territorial y la Ingeniera de apoyo a supervisión Anamaria Madroñero en las Instalaciones del Instituto Nacional de vías



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 24 de Octubre de 2024 se realiza visita de inspección técnica Ruta 40QN05 PR 5+0450 trabajos contrato Monto Agotable.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 25 de Octubre de 2024 Inspección de recolección material vegetal de la tala de Individuos Arbóreos realizada el día miércoles 23-10-2024 Ruta 40QN05



- El día 28 de Octubre de 2024 se realiza Visita de inspección técnica Ruta 40QN05 PR 5+0450 trabajos contrato Monto Agotable.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 28 de Octubre de 2024 se realiza Visita de inspección técnica en compañía de la Ingeniera Anamaria Madroñero de apoyo supervisión Invias a la Ruta 40QN05 PR 5+0450 trabajos contrato Monto Agotable



- El día 30 de Octubre de 2024 Se asiste a reunión de Gestión del Riesgo en el municipio de Alcalá.



- El día 31 de Octubre de 2024 se realiza Inspección y verificación tala de Árboles en Riesgo y limpieza de material vegetal del mismo Ruta 40QN05 PR 4+0655



ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA ZONA DE VÍA:

Durante el presente periodo se realizaron los siguientes requerimientos:

- CQUI-DP-003-Derecho de petición, invasión faja de vía Nacional, PR 19+0800 en la carretera Cartago – Alcalá, ruta 25VL07 y PR 0+0900 en la carretera Variante Alcalá y Accesos, ruta 29VLA mediante el cual se solicita a restituir la zona de reserva de vía en la RUTA 29VLA ocupada por viviendas y comerciantes en el sector.

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL COMPONENTE SST

- El día 01 de octubre de 2024 se realiza informe mensual técnico de accidentalidad del mes de septiembre.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CODIGO 2901B

VIA: Armenia - Alcalá

SECTOR: Armenia - Alcalá

PR	DESCRIPCIÓN	AFECTACIONES			AUTORIDAD QUE LEVANTO EL ACCIDENTE O ELABORÓ EL INFORME	POSIBLES CAUSAS	INFORME PRESENTADO D.T.	OBSERVACIONES
		Nº DE HERIDOS	Nº DE FALLECIDOS	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA				
1+0500	Volcamiento de un furgón porque pierde el control del mismo.	0	0	NO	Policia de Tránsito y Transporte.	Exceso de velocidad. Impericia en el manejo.	Quindio	Este accidente fue reportado por la Policia Nacional de Tránsito y Transporte del Quindio.
4+0400	Choque de dos vehículos.	2	0	NO	Cooperativa Coopmavial	Exceso de velocidad. Adelantar en curva o en pendiente.	Quindio	Este accidente fue reportado por la cooperativa de trabajo asociado Coopmavial.
	Choque de							

CODIGO 25VL07

VIA: Cartago – Alcalá

SECTOR: Cartago – Alcalá

PR	DESCRIPCIÓN	AFECTACIONES			AUTORIDAD QUE LEVANTO EL ACCIDENTE O ELABORÓ EL INFORME	POSIBLES CAUSAS	INFORME PRESENTADO D.T.	OBSERVACIONES
		Nº DE HERIDOS	Nº DE FALLECIDOS	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA				
5+0080	Choque de un automóvil con un sardinel y un árbol	1	0	NO	cooperativa de trabajo asociado Los Robles.	Exceso de velocidad. Salirse de la calzada. Desobedecer las señales o normas de tránsito.	Quindio	Este accidente fue reportado por la cooperativa de trabajo asociado Los Robles.

- El día 01 de octubre de 2024 se realiza notificación de realización de examen de egreso (retiro) al señor Francisco Antonio García Castaño, quien desempeñaba el cargo de conductor para la AMV.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

	NOTIFICACIÓN REALIZACIÓN EXAMEN MEDICO DE EGRESO	CÓDIGO: SST-F-51
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Septiembre de 2024

Calarcá Quindío, 30 de Septiembre de 2024


Señor: Francisco Antonio García Castaño
C.C: 4.525.896
Cargo: Conductor

Asunto: Notificación de realización de Examen Médico de Egreso

Respetado Señor:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2346 de 2007, Artículo 6 *Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso*, solicitamos por favor sirvase asistir a un examen médico ocupacional de retiro en las instalaciones de la IPS Ceinssa, ubicada en la Cra 13 No 17-27 de la ciudad de Armenia, teniendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización de dicho examen, contados a partir de la fecha de la presente notificación.

De no presentarse a la práctica del examen médico ocupacional de egreso, se exonera a la empresa Consorcio Ingeviam identificada con Nit 901838771-6 de toda responsabilidad en cuanto a posibles enfermedades laborales, lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en su estado de salud.



Maryury Osorio Tabares
Profesional SST
Licencia: Resolución No 0924. 31/10/2014



Francisco Antonio García Castaño
C.C: 4.525.896

- El día 01 de octubre de 2024 se realiza la entrega de dotación a los conductores de la AMV.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 02 de octubre de 2024 se envía a la supervisión de la administración vial el reporte de los accidentes de tránsito ocurrido el día 29 de septiembre en el PR5+0080 de la vía 25VL07.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-177 ENTREGA DEL REPORTE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL PR5+0080 DE LA RUTA 25VL07, OCURRIDO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024




CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, Esteban, Anamaria ▼

2 oct 2024, 9:27 a.m. (hace 5 días) ☆ 😊 ↩

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-177 Entrega del reporte del accidente de tránsito en el PR5+0080 de la ruta 25VL07, ocurrido el día 29 de septiembre de 2024

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



- El día 02 de octubre de 2024 se diligencia el formato ACC-01 del accidente de tránsito ocurrido el día 29 de septiembre en el PR5+0080 de la vía 25VL07.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS		REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01		PAGINA: 1 DE 1	
ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL		TERRITORIAL: 20	QUINDIO	CODIGO: DT-AMV. 20-08-1	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CONCESION: ☐	MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐	A.M.V.: 1	
SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1		FECHA DE ELABORACIÓN: 02-10-24			
NOMBRE DEL SECTOR: CARTAGO - ALCALA		CODIGO DE VIA: 25VL07	ELEMENTO: ☐	CALZADA: ☒	
DATOS CRONOLOGICOS:		LOCALIZACIÓN:	DAÑOS PERSONALES:		
FECHA: D 29 M 09 A 24		P.R.: 5 + 0080	VICTIMAS 01		
HORA: H 06 00		LADO: LI ☐ LD ☒	HERIDOS GRAVES 01		
DIA SEMANA: DOMINGO		HERIDOS LEVES 00	MUERTOS 00		
PROCEDENCIA DE LOS DATOS:		TOMA DE DATOS:	CONDICIONES METEOROLOGICAS:		
01 ☒ EL LUGAR DEL ACCIDENTE:		REALIZADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	01 ☐ LLUVIA		
02 ☐ DOCUMENTACION POLICIAL:		REVISADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	02 ☒ NIEBLA		
03 ☐ TESTIGOS:			03 ☐ SOL		
04 ☐ OTROS:			04 ☐ OTROS: SECO		
TERRENO:		SECCION TIPICA:	GEOMETRIA:		
01 ☐ PLANO		01 ☐ TERRAPLEN	ESTADO SUPERFICIE:		
			01 ☐ SECA Y LIMPIA		
			05 ☐ GRAVA SUELTA		

- El día 02 de octubre de 2024 se realiza la supervisión y coordinación de las actividades SST en campo con la cooperativa de trabajo asociado los Robles y se solicita suspender actividad de trabajo en alturas en el puente Piedras de Moler ya que no se contaba con la documentación requerida y los equipos de protección para trabajo en alturas completos.



- El día 03 de octubre de 2024 se envía comunicado a las entidades de tránsito y transporte, solicitando el informe de la accidentalidad del mes de septiembre de 2024.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-183 SOLICITUD COPIA DE INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOBRE LAS VÍAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS TERRITORIAL QUINDÍO.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para inspeccion

jue, 3 oct, 2:56 p.m. (hace 6 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Señor Gilson, se remite documento N° CQUI-183 Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septiembre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-182 SOLICITUD COPIA DE INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOBRE LA VÍA NACIONAL A CARGO DEL INVIAS.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para transito

jue, 3 oct, 2:53 p.m. (hace 6 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Señor José Ariel Palacio, se remite documento N° CQUI-182 Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septiembre de 2024 sobre la vía nacional a cargo del INVIAS.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



- El día 03 de octubre de 2024 se revisa planillas de pago de la seguridad social del periodo de cotización de septiembre de las cooperativas Coopmavial y Los Robles.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CONTRATO DE OBRA No: 115-2024		CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA																																								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024		PROYECTO: "Servicio de Mantenimiento Rutinario Dirección Territorial Guandío. Sectores: 4002 Club Campeste - Armenia, PR4+0700 - PR5+0250 / 4003 Armenia - 400405 Variante Salcedo - La Cabaña, PR2+0000 - PR7+0250 / 4004 La Espefela - Armenia, PR2+0320 - PR4+0000 / 2306 Armenia - Alcala, PR2+0000 - PR4+0000"																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 115-2024		INTERVENTOR CONSORCIO INGEVIAM																																								
NOMBRE ARL: SURIA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN Compañías Cundio																																								
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																										
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indicador Base de Cotización (BIC)	1. SEGURIDAD SOCIAL				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS
1	Edgar Yobany Ace	8415702	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	S.O.S	3872906	\$ 60,000	COPE	
2	Ramon Escobar Gallego	4466671	Asociado	1500,000																														Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	NUVEA EPS	3872906	\$ 60,000	COPE	
3	Luis Alfonso Gomez Correa	84171571	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	NUVEA EPS	3872906	\$ 60,000	COPE	
4	Jonathan Guzman Feiles	84171585	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	NUVEA EPS	3872906	\$ 60,000	COPE	
5	Giovany Miranda	10410135	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	NUVEA EPS	3872906	\$ 60,000	COPE	
6	Geraldina Montoya Aguine	1054145450	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmaval	1500,000	\$ 104,400	V	SANTAS	3872906	\$ 60,000	COPE	

CONTRATO DE OBRA No: 117-2024		CONTRATISTA Cooperativas de Trabajo Asociado Los Robles																																								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024		PROYECTO: "Servicio de mantenimiento rutinario Dirección Territorial Guandío. Sectores: 2301B Armenia - Alcala PR4+0000 - PR23+0325 / 25VL07 C Ariaga - Alcala, PR2+0000 - PR4+0000 - PR4+0000 - PR4+0000 LOTE 2"																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 115-2024		INTERVENTOR CONSORCIO INGEVIAM																																								
NOMBRE ARL: SURIA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN Compañías Cundio																																								
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																										
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indicador Base de Cotización (BIC)	1. SEGURIDAD SOCIAL				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS
1	Oliver Bonilla Lozada	1622663	Trabajador	1500,000																														Los Robles	1500,000	\$ 26,800	V	S.O.S	38169057	\$ 60,000	COPE	
2	Javier Barrios	1622663	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Los Robles	1500,000	\$ 104,400	V	S.O.S	38169057	\$ 60,000	COPE		
3	José Libardo Osorio Cortez	1031643825	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Los Robles	1500,000	\$ 104,400	V	ASMET SALUD	38169057	\$ 60,000	COPE		
4	José Rumberto David Prieto	1644712	Asociado	1500,000																														Los Robles	1500,000	\$ -	V	NUVEA EPS	38169057	\$ 60,000	COPE	
5	Andrés Díaz Ceper	18028846	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Los Robles	1500,000	\$ 104,400	V	COOALUD	38169057	\$ 60,000	COPE		
6	David Leonardo Piedras	1622663	Asociado	1500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Los Robles	1500,000	\$ 104,400	V	S.O.S	38169057	\$ 60,000	COPE		

- El día 03 de octubre de 2024 se diligencia el formato ACC-01 del accidente ocurrido en el PR5+0080 de la vía 25VL07.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS		REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01		PAGINA: 1 DE 1	
ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL		TERRITORIAL: 2 0 -- QUINDIO		CODIGO: DT-AMV- 2 0 - 0 1 -	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CONCESION: MANTENIMIENTO INTEGRAL: A.M.V.: 1		FECHA DE ELABORACIÓN 0 2 - 1 0 - 2 4	
SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1		NOMBRE DEL SECTOR: CARTAGO - ALCALA		CODIGO DE VIA: 2 5 V L 0 7	
ELEMENTO: CALZADA: X		DATOS CRONOLÓGICOS:		LOCALIZACIÓN:	
FECHA: D 2 9 M 0 9 A 2 4		P.R.: 5 - 0 0 8 0		DAÑOS PERSONALES:	
HORA: H 0 6 0 0		VICTIMAS 0 1		HERIDOS GRAVES 0 1	
DIA SEMANA: D O M I N G O		LADO: LI LD X		HERIDOS LEVES 0 0	
MUERTOS 0 0		PROCEDENCIA DE LOS DATOS:		TOMA DE DATOS:	
REALIZADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		CONDICIONES METEOROLÓGICAS:		REVISADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	
01 X EL LUGAR DEL ACCIDENTE:		01 LLUVIA		02 X NIEBLA	
02 DOCUMENTACION POLICIAL:		03 SOL		04 OTROS: SECO	
03 TESTIGOS:		TERRENO:		SECCION TIPICA:	
04 OTROS:		01 PLANO		01 TERRAPLEN	
02 ONDULADO		02 MEDIA LADERA IZQUIERDA		02 CURVA IZQUIERDA	
03 MONTAÑOSO		03 MEDIA LADERA DERECHA		03 CURVA DERECHA	
04 ESCARPADO		04 CAJON		03 RECTA	
ESTADO SUPERFICIE:		01 SECA Y LIMPIA		05 GRAYA SUELTA	
02 MOJADA		06 ACEITE		07 OTROS	
03 HELADA		04 BARRO			
CLASE DE ACCIDENTE (CA):					

- El día 04 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a la cooperativa Coopmavial para la actividad de tala de guadua en el PR1+0300, igualmente se verifica inspección preoperacional de motosierra, uso de los EPP e implementación de PARE-SIGA, para el control de vehículos en la vía.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 04 de octubre de 2024 se realiza el reporte del accidente de tránsito ocurrido en el PR1+0580 de la vía 4003.
- El día 07 de octubre de 2024 se envía a la supervisión de la administración vial el reporte del accidente en el PR1+0580 de la vía 4003.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-189 ENTREGA DEL REPORTE DEL ACCIDENTE VIAL EN EL PR1+0580 DE LA RUTA 4003, OCURRIDO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, Esteban, Anamaria

lun, 7 oct. 5:13 p.m. (hace 2 días) ☆ 😊 ↩ ⋮

Ing. Lenin, se remite el documento N° CQUI-189 Entrega del reporte del accidente vial en el PR1+0580 de la ruta 4003, ocurrido el día 04 de octubre de 2024.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

3 archivos adjuntos - Analizado por Gmail





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 07 de octubre de 2024 se lleva a cabo reunión con el representante legal de la cooperativa Coopmavial para definir la contratación de la profesional SST para la implementación del SG-SST de acuerdo con la normatividad nacional vigente.



- El día 07 de octubre de 2024 se lleva a cabo reunión con Jessica Callejas para definir su contratación con la cooperativa Coopmavial para la implementación del SG-SST de acuerdo con la normatividad nacional vigente.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 08 de octubre de 2024 se envía a la supervisión de la administración vial el reporte del accidente de tránsito ocurrido en el PR14+0570 de la vía 2901B.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-192 ENTREGA DEL REPORTE DEL ACCIDENTE VIAL EN EL PR14+0570 DE LA RUTA 2901B, OCURRIDO EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, Esteban, Anamaria

mar, 8 oct. 4:25 p.m. (hace 1 día) ☆ 😊 ↩ ⋮

Ing. Lenin, se remite el documento N° CQUI-192 Entrega del reporte del accidente vial en el PR14+0570 de la ruta 2901B, ocurrido el día 08 de octubre de 2024.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

3 archivos adjuntos · Analizado por Gmail ⓘ



- El día 08 de octubre de 2024 se envía comunicado al ingeniero Carlos Alberto Torres, contratista del contrato de obra de Monto Agotable No 2428 de 2024, solicitando las afiliaciones a la seguridad social de todo el personal, documentación de la maquinaria e implementación de señalización preventiva en las áreas de trabajo.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-190 SOLICITUD DOCUMENTOS DE AFILIACIÓN A SGSSS Y SEÑALIZACIÓN PARA EL CONTRATO NO. 2428 DE 2024



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para cefe26, atencionciudadano, Esteban, Anamaria

mar, 8 oct. 11:46 a.m. (hace 1 día) ☆ 😊 ↩ ⋮

Ing. Carlos A. Torres, se remite el documento N° CQUI-190 Solicitud documentos de Afiliación a SGSSS y Señalización para el Contrato No. 2428 de 2024

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail ⓘ





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 10 de octubre de 2024 se diligencia el formato ACC-01 del accidente ocurrido el día 08 de octubre de 2024, en el PR14+0570 de la vía 2901B.

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS		REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01		PAGINA: 1 DE 1	
ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL		TERRITORIAL: 2 0 -- QUINDIO		CODIGO: DT-AMV- 2 0 - 0 1 -	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CONCESION: MANTENIMIENTO INTEGRAL: A.M.V.: 1		FECHA DE ELABORACIÓN: 1 0 1 0 - 2 4	
SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1		NOMBRE DEL SECTOR: ARMENIA - ALCALA		CODIGO DE VIA: 2 9 0 1 B	
ELEMENTO: CALZADA: X		DATOS CRONOLÓGICOS:		LOCALIZACIÓN:	
FECHA: D 0 8 M 1 0 A 2 4		P.R.: 1 4 + 0 5 7 0		DAÑOS PERSONALES:	
HORA: 0 5 4 0		LADO: LI X LD		VICTIMAS 0 0	
DIA SEMANA: M A R T E S		HERIDOS LEVES 0 0		HERIDOS GRAVES 0 0	
M U E R T O S 0 0		PROCEDENCIA DE LOS DATOS:		TOMA DE DATOS:	
01 X EL LUGAR DEL ACCIDENTE:		REALIZADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		CONDICIONES METEOROLÓGICAS:	
02 DOCUMENTACION POLICIAL:		REVISADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		01 LLUVIA	
03 TESTIGOS:				02 NIEBLA	
04 OTROS:				03 SOL	
				04 X OTROS: AMANECE	
TERRENO:		SECCION TIPICA:		GEOMETRIA:	
01 X PLANO		01 TERRAPLEN		ESTADO SUPERFICIE:	
				01 X SECA Y LIMPIA	
				05 GRAVA SUELTA	



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 10 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a la cooperativa Coopmavial para la actividad de tala de guadua en el PR3+0250 y el PR4+0000 de la vía 2901B, igualmente se verifica inspección preoperacional de motosierra, uso de los EPP e implementación de PARE-SIGA, para el control de vehículos en la vía.



- El día 11 y 15 de octubre de 2024 se organiza informes técnicos de accidentalidad ocurridos en el mes de septiembre.
- El día 15 de octubre de 2024 se realiza la notificación de las recomendaciones médicas a la ingeniera auxiliar I, Soley Tafur de la AMV, quien se encuentra realizando un reemplazo temporal.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MEDICAS DEL EXAMEN DE PREINGRESO		CÓDIGO: SST-F-61
		VERSIÓN: 02
		FECHA: Abril de 2024

Fecha: 15-octubre-2024
Nombre del trabajador: Soley Tafur Vera
C.C 41.923.824
Cargo: Auxiliar de ingeniera I

De acuerdo con el examen médico de preingreso realizado por el médico especialista Laura Viviana Patiño Bultrago de la IPS CEIINSSA, se evidencian las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones relacionadas con el diagnóstico:

- Control anual optometría.
- Usar lentes permanentes durante la jornada laboral.
- Uso de medias de compresión venosa gradiente medio.
- Estilo de vida saludable.
- Actividad física regular de 3 a 4 veces por semana.

Recomendaciones relacionadas con el trabajo:


- Uso de EPP.
- Silla ergonómica.
- Reposapiés y apoya muñecas a necesidad.
- Audiometría y/o espirometría si se expone a ruido o químicos volátiles.
- Higiene Postural.
- Pausas activas.

Restricciones:

- Ninguna

De conformidad con las recomendaciones recibidas por parte del médico laboral del consorcio, se le informa que las mismas serán de obligatorio cumplimiento para el desempeño de su cargo.

Agradecemos notifique al CONSORCIO INGEVIAM, los respectivos seguimientos con su EPS y la actualización de su condición de salud.


Maryury Dsorio Tabares
Profesional SST


Firma recibido por trabajador

- El día 16 de octubre de 2024 se realiza la capacitación mensual por parte de la AMV a las cooperativas de trabajo asociado Coopmavial y Los Robles en el tema de las obligaciones contractuales de los contratos 1416 y 1417 de Mantenimiento Rutinario, al igual que las obligaciones de la interventoría y la Ley 1952 Código disciplinario único.



- El día 16 de octubre de 2024 se lleva a cabo reunión con Yeraldin Saldarriaga y el representante legal de la cooperativa Coopmavial para definir la contratación del cargo de profesional SST y llevar a cabo la implementación del SG-SST de acuerdo con la normatividad nacional vigente.




CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 17 de octubre de 2024 se proyectan los siguientes oficios: Solicitud de vehículo seguro para traslado de herramientas y personal para cada una de las cooperativas. Presentación de apoyo por parte de la AMV a las unidades de riesgo de los municipios de Montenegro, Quimbaya, Alcalá y Cartago. Solicitud a la Dirección Territorial Quindío sobre lineamientos para la contratación del personal temporal por parte de las cooperativas de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las obligaciones contractuales.
- El día 18 de octubre de 2024 se explica a la profesional SST, al representante legal y a la coordinadora de alturas de la cooperativa Coopmavial como se diligencian los formatos de inspección, ATS y permiso para trabajo en alturas, al igual que las hojas de vida de cada uno de los equipos utilizados, con el fin de iniciar con la implementación de cada uno de estos formatos.

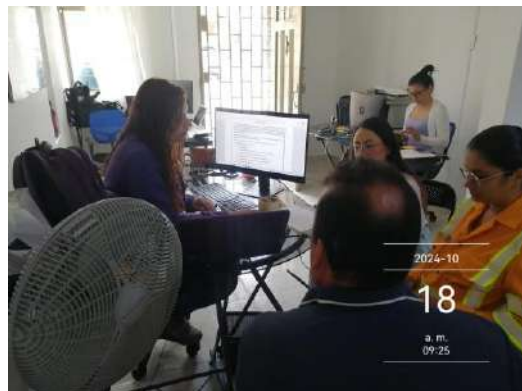



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 21 de octubre de 2024 se lleva a cabo reunión con Camila Arboleda González y el representante legal de la cooperativa Los Robles para a definir la contratación de cargo de Profesional SST y llevar a cabo la implementación del SG-SST de acuerdo con la normatividad nacional vigente.






CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 22 de octubre de 2024 se verifica el personal del contratista Carlos Alberto Torres Montero y la implementación de la señalización preventiva para el contrato de Monto Agotable en la vía 40QN05 K5+0450.

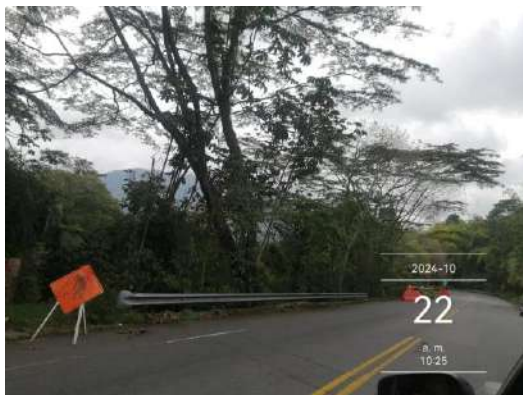

- El día 22 de octubre de 2024 se envía correo electrónico al contratista Carlos Alberto Torres Montero reiterando la solicitud de la documentación de afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, FP) y examen médico de preingreso, al igual que la documentación de la maquinaria a utilizar para el contrato de Monto Agotable en la vía 40QN05 K5+0450.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Reiteración de solicitud Afiliaciones a Seguridad Social



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>

para Carlos, micivil1992@gmail.com

11:18 a.m. (hace 4 horas)



Buen día Ingeniero Carlos Torres

Se reitera que sea enviada la documentación de afiliación a seguridad social (ARL, EPS, FP) al igual que el examen médico de preingreso de todo el personal suministrado para el contrato de Monto agotable con la territorial Quindío de INVÍAS.

También se solicita la documentación de la máquina retroexcavadora a utilizar.

Lo anterior de carácter urgente, para su verificación y aprobación, teniendo en cuenta que ya hay personal en la obra.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

- El día 22 de octubre de 2024 se envía comunicado CQUI-201 Presentación de apoyo por parte de la AMV a la Unidad de Riesgo del municipio de Armenia, para la atención de emergencias en las vías a cargo de la Territorial Quindío.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-201 OFERTA DE APOYO COMO ADMINISTRADORES VIALES.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>

para omgerd, atencionciudadano, Esteban, Anamaria

3:01 p.m. (hace 49 minutos)



Señor, Javier Velez Gomez se remite el documento N° CQUI-201 Oferta de apoyo como Administradores Viales.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



- El día 23 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a la cooperativa Coopmavial para la actividad de tala de árboles en la vía 40QN05 desde el PR4+0008 hasta el PR4+0640, igualmente se verifica permiso de Trabajo en Alturas, ATS e inspección preoperacional de motosierra, uso de los EPP e implementación de reguladores viales (PARE-SIGA), para el control de vehículos y peatones en la vía.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 23 de octubre de 2024 se verifica las afiliaciones a la seguridad social del personal del contrato de Monto Agotable No 2428-2024 de la ruta 40QN05 PR5+0450 y se notifica verbalmente al ingeniero residente José Miguel Cabrera que no se autoriza el ingreso del personal a la obra por no tener las afiliaciones vigentes e igualmente no se autoriza la operación de la máquina retroexcavadora por la falta de personal para la



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

regulación del tránsito vehicular y peatonal (PARE-SIGA), así como la ausencia de señalización temporal de obra y dispositivos de seguridad y comunicación.



- El día 23 de octubre de 2024 se notifica mediante comunicado CQUI-204 al contratista Carlos Alberto Torres Montero la suspensión de ingreso del personal a obra del contrato de Monto Agotable No 2428-2024 de la ruta 40QN05 PR5+0450 por no contar con las afiliaciones a la seguridad social vigente, al igual que la operación de la máquina retroexcavadora por la falta de personal para la regulación del tránsito vehicular y peatonal (PARE-SIGA), así como la ausencia de señalización temporal de obra y dispositivos de seguridad y comunicación.

COPIA RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-204 SUSPENSIÓN INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA, PR5+0450, RUTA 40QN05- CONTRATO DE MONTO AGOTABLE NO. 2428-2024.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para Carlos, micivil1992 ▾

4:31 p.m. (hace 19 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮

Ing. Carlos Torres Montero, se remite el documento N° CQUI-204 Suspensión ingreso del personal a la obra, PR5+0450, Ruta 40QN05- Contrato de Monto Agotable No. 2428-2024.

—
ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

- El día 23 de octubre de 2024 se da respuesta mediante correo electrónico sobre la documentación entregada por parte del ingeniero Residente José Miguel Cabrera Montero del contrato de Monto Agotable No 2428-2024, en el cual se solicita la planilla de pago de la seguridad social del periodo de cotización de septiembre del operador de la retroexcavadora Cristian Díaz.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



CONSORCIO INGEVIAM

4:50 p.m. (hace 0 minutos)



para Jose ▾

Buenas tardes Ingeniero Jose Miguel

De acuerdo a la revisión de los documentos antes adjuntos, se evidencia que la planilla de pago de la seguridad social se encuentra vencida, ya que el día de ayer 22 de octubre de 2024 se debía realizar el pago del periodo de cotización del mes de septiembre; por lo tanto se solicita la respectiva planilla de pago de la seguridad social vigente con el desprendible de pago de la misma, con el fin de dar aprobación de ingreso a la obra al señor Cristian Diaz operador de la máquina Retroexcavadora.

Gracias por la atención prestada, quedamos atentos.

--

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.

Residente Administración Vial Quindío.

CONSORCIO INGEVIAM

← Responder

↩ Reenviar



- El día 24 de octubre de 2024 se revisa documentación de afiliación a seguridad social del personal del contrato de Monto Agotable No 2428-2024 y se solicita el soporte de radicación de las afiliaciones a la EPS.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>

10:02 a.m. (hace 40 minutos)



para Carlos, Jose ▾

Buen día ingenieros

Se solicita enviar el soporte de radicación de las afiliaciones a la EPS de cada uno de los 3 colaboradores, tal cual se solicitó y explico el día de ayer 23 de octubre al ingeniero Jose Miguel.

Lo anterior de carácter inmediato.

Gracias por la atención prestada, quedamos atentos.

← Responder

↩ Responder a todos

↩ Reenviar



- El día 24 de octubre de 2024 se realiza supervisión del uso de EPP y señalización en obra del contrato de Monto Agotable No 2428-2024, y se solicita de manera verbal al residente de obra, mejorar la señalización existente de acuerdo con el Manual de Señalización versión 2024 y realizar la limpieza de la vía ya que había presencia de material de excavación.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 25 de octubre de 2024 se envía a la supervisión de la administración vial el reporte del accidente de tránsito ocurrido en el PR13+0730 de la vía 25VL07.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-207 ENTREGA DEL REPORTE DEL ACCIDENTE VIAL EN EL PR13+0730 DE LA RUTA 25VL07, OCURRIDO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, Anamaria, dgalvez

vle, 25 oct, 4:45 p.m. (hace 3 días)

Ing. Lenin, se remite el documento N° CQUI-207 Entrega del reporte del accidente vial en el PR13+0730 de la ruta 25VL07, ocurrido el día 25 de octubre de 2024.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

- 185. (25-10-2024)...
- ACC-01 PR13+073...
- Reporte ACC PR1...

- El día 25 de octubre de 2024 se envía a la supervisión de la administración vial y a la Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales el informe de accidentalidad de tránsito del mes de septiembre de 2024 con sus correspondientes anexos.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-209 ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, dybustos, Anamaria, dgalvez, cacerio ▾

vie, 25 oct, 5:37 p.m. (hace 3 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Accidentalidad septiembre 2024.rar

Ing. Lenin, se remite el documento N° CQUI-209 Entrega informe de accidentalidad del mes de septiembre de 2024, a cargo de la Administración Vial de la Dirección Territorial Quindío.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío
CONSORCIO INGEVIAM

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail ⓘ



- El día 28 de octubre de 2024 se realiza supervisión del uso de EPP y señalización en obra del contrato de Monto Agotable No 2428-2024, y se solicita de manera verbal al residente de obra, mejorar la señalización existente de acuerdo con el Manual de Señalización versión 2024 y entregar guantes a los colaboradores para el armado de las canastas para los gaviones, al igual que el uso de botas de seguridad.



- El día 28 de octubre de 2024 se proyecta Comunicado para la solicitud de la implementación de la señalización vial para la obra del contrato de Monto Agotable No 2428-2024.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El día 28 de octubre de 2024 se envían comunicados CQUI-210 y CQUI-211 a las cooperativas de trabajo asociado Coopmavial y Los Robles, solicitando el suministro de transporte seguro para el transporte de herramientas y personal.

RADICACIÓN DOCUMENTO No. CQUI-210 SOLICITUD, SUMINISTRAR TRANSPORTE SEGURO ASOCIADOS -COOPMAVIAL.



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para coopmavial, atencionciudadano, Anamaria, dgalvez ▼

lun, 28 oct, 11:45 a.m. (hace 22 horas) ☆ ☺ ↶

Señor Edgar Yobany Arce, se remite documento N° CQUI-210 SOLICITUD, SUMINISTRAR TRANSPORTE SEGURO ASOCIADOS -COOPMAVIAL.
--
ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



RADICACIÓN DOCUMENTO No. CQUI-211 SOLICITUD, SUMINISTRAR TRANSPORTE SEGURO ASOCIADOS – COOPERATIVA LOS ROBLES



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para LOS, atencionciudadano, Anamaria, dgalvez ▼

lun, 28 oct, 11:47 a.m. (hace 22 horas) ☆ ☺ ↶

Señor David Londoño Piedrahita, se remite documento N° CQUI-211 SOLICITUD, SUMINISTRAR TRANSPORTE SEGURO ASOCIADOS – COOPERATIVA LOS ROBLES
--
ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



- El día 29 de octubre de 2024 se envía comunicado CQUI-215 al contratista Carlos Alberto Torres Montero, representante legal del contrato de Monto Agotable No 2428-



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

2024, en el cual se reitera la solicitud de la implementación de la señalización vial para la obra, de acuerdo con el manual de señalización versión 2024.

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-215 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL FRENTE DE TRABAJO, PR5+0450, RUTA 40QN05- CONTRATO DE MONTO AGOTABLE NO. 2428-2024



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para stencionciudadano, dgálvez, Anamaria, contactenos ▼

9:42 a.m. (hace 15 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

Ing. Lenin, se remite el documento N° CQUI-215 Solicitud Implementación de Señalización Vial en el Frente de Trabajo, PR5+0450, Ruta 40QN05- Contrato de Monto Agotable No. 2428-2024

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



- El día 29 de octubre de 2024 se diligencian los formatos complemento de accidentalidad, ACC-01 y el OAJ y del accidente ocurrido en el PR13+0730 de la vía 25VL05.

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS		REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01		PAGINA: 1 DE 1	
ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL		TERRITORIAL: 2 0 --	QUINDIO	CODIGO: DT-AMV- 2 0 - 0 1 -	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CONCESION:	MANTENIMIENTO INTEGRAL:	A.M.V.: 1	
		SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1		FECHA DE ELABORACIÓN: 2 9 - 1 0 - 2 4	
NOMBRE DEL SECTOR: CARTAGO - ALCALA		CODIGO DE VIA: 2 5 V L 0 7		ELEMENTO:	CALZADA: X
DATOS CRONOLOGICOS:		LOCALIZACIÓN:		DAÑOS PERSONALES:	
FECHA: D 2 5 M 1 0 A 2 4		P.R.: 1 3 + 0 7 3 0		VICTIMAS 0 0	
HORA: H 2 4 3 0				HERIDOS GRAVES 0 0	
DIA SEMANA: V I E R N E S		LADO: LI X LD		HERIDOS LEVES 0 0	
				MUERTOS 0 0	
PROCEDENCIA DE LOS DATOS:		TOMA DE DATOS:		CONDICIONES METEOROLOGICAS:	
01 X EL LUGAR DEL ACCIDENTE:		REALIZADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		01 LLUVIA	
02 DOCUMENTACION POLICIAL:				02 X NIEBLA	
03 TESTIGOS:		REVISADO POR: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		03 SOL	
04 OTROS:				04 OTROS: SECO	
TERRENO:		SECCION TIPICA:		GEOMETRIA:	
01 X PLANO		01 TERRAPLEN		01 X SECA Y LIMPIA	
				05 GRAVA SUELTA	



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo	PR	Distancia	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA	FECHA ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS	CLASE VEHI
			Via		PR (m)		LONG Y LATITUD						
3	21 - Quindío	1	25VL07	13	730	Izquierdo	4°42'0.18950" N 75°49'48.89370" W	25/10/2024	24:30:00	-	03 - Volcamiento	1	CAMION

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PR13+0730, RUTA 25VL07

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA	.	X	
CROQUIS-TRANSITO		X	
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros			

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES			X
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO			X
FOTOS	X		
ACTAS DE VECINDAD		X	
TESTIMONIOS		X	

- El día 29 de octubre de 2024 se diligencia el formato de informe de accidentalidad de los accidentes ocurridos en las siguientes vías: 4003 PR1+0580, 2901B PR14+0570, 25VL07 PR13+0730.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: OCTUBRE 2024										ADMINISTRADOR VIAL:					
ADMINISTRADOR VIAL			SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.												
ID	Territorial	Grupo AMV	Via	Sector	PR	Distancia a PR (m) (contorno)	Calzada	Lado	Fecha del accidente (dd/mm/aaaa)	Hora	Zona	Condición meteorológica	Estado de la superficie	Terreno	Sec
1	20 - Quindío	1	4003	ARMENIA - CALARCÁ	1	580	01 - Única	Derecho	4/10/2024	8:00	02 - Rural	07 - Normal	01 - Seca y limpia	01 - Plano	01 - Med
2	20 - Quindío	1	2901B	ARMENIA - ALCALÁ	14	570	01 - Única	Izquierdo	8/10/2024	5:40	02 - Rural		01 - Seca y limpia	01 - Plano	02 - Med
3	20 - Quindío	1	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	13	730	01 - Única	Izquierdo	25/10/2024	12:30AM	02 - Rural	02 - Niebla	01 - Seca y limpia	01 - Plano	03 - M

- El día 30 de octubre de 2024 se entrega comunicado CQUI-217 a la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Montenegro Quindío, para informar el apoyo por parte de la Administración Vial para la atención de emergencias en las carreteras a cargo del Invias.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RADICACIÓN COPIA DOCUMENTO N° CQUI-217 OFERTA DE APOYO COMO ADMINISTRADORES VIALES



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, dgalvez, Anamaria ▼

jue, 31 oct, 4:09 p.m. (hace 19 horas)



se remite copia el documento N° CQUI-217 Oferta de apoyo como administradores viales

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



- El día 30 de octubre de 2024 se asiste a reunión con la Unidad de Gestión del Riesgo en el municipio de Alcalá Valle y se entrega comunicado CQUI-219, para informar el apoyo por parte de la Administración Vial para la atención de emergencias en las carreteras a cargo del Invias.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RADICACIÓN COPIA DOCUMENTO N° CQUI-219 OFERTA DE APOYO COMO ADMINISTRADORES VIALES



CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com>
para atencionciudadano, dgalvez, Anamaria ▾

31 oct 2024, 4:01 p.m. (hace 19 horas)



se remite copia el documento N° CQUI-219 Oferta de apoyo como Administradores Viales

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente Administración Vial Quindío.
CONSORCIO INGEVIAM

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ




- El día 30 de octubre de 2024 se proyecta comunicado para la Edeq Calarcá, solicitando acompañamiento para la suspensión de líneas eléctricas para realizar la tala y poda de árboles en la vía 4003.
- El día 31 de octubre de 2024 se entrega comunicado CQUI-224 para la Edeq Calarcá, solicitando acompañamiento para la suspensión de líneas eléctricas para realizar la tala y poda de árboles en la vía 4003.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

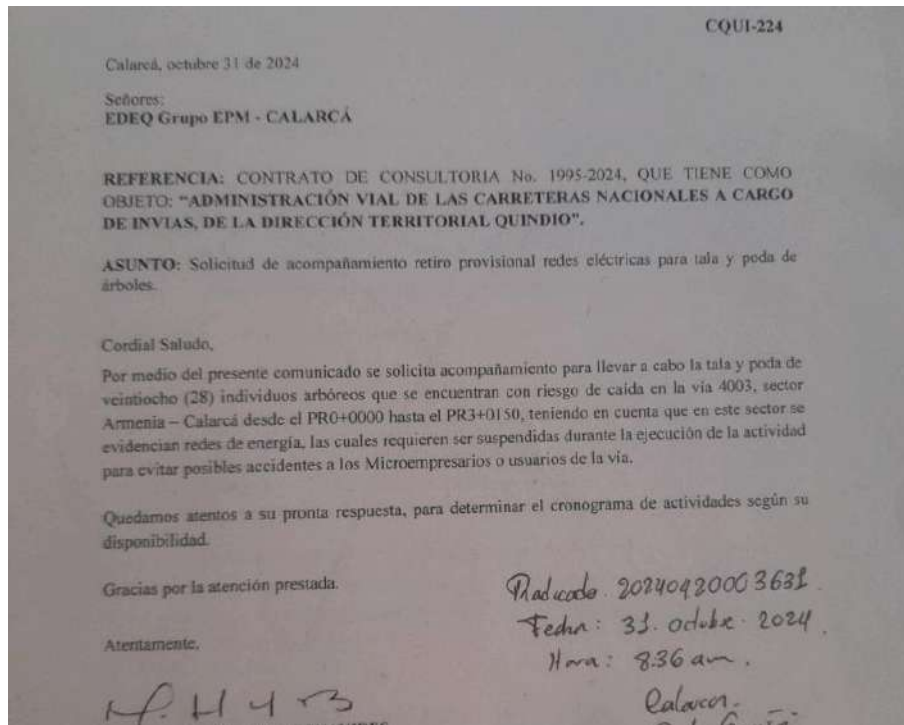

- El día 31 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a la cooperativa Coopmavial para la actividad de tala de árboles en la vía 40QN05 desde el PR4+0655 hasta el PR4+0750, igualmente se verifica permiso de Trabajo en Alturas, ATS e inspección preoperacional de motosierra, uso de los EPP e implementación de reguladores viales (PARE-SIGA), para el control de vehículos y peatones en la vía.





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



- El día 31 de octubre de 2024 se realiza supervisión del uso de EPP, personal contratado y señalización en obra del contrato de Monto Agotable No 2428-2024. Se evidencia la presencia de los señores Miguel Ángel Rodríguez Pérez y Diego Fernando Manzano Palacio de los cuales no se había presentado documentación de afiliación a la seguridad social (ARL, EPS, FP) y tampoco los exámenes médicos de preingreso, por tal razón se suspendió las actividades de dicho personal. Por otra parte, se solicitó el uso del casco de seguridad para todo el personal de la obra y el retiro de piedras que se encontraban a bordo del talud, para evitar un accidente al personal que se encuentra armando los gaviones.



- El día 31 de octubre de 2024 se envía comunicado CQUI-226 al contratista Carlos Alberto Torres Montero, notificando la suspensión del personal que no se encuentra afiliado a la seguridad social y realiza la solicitud formal del retiro de piedra a bordo del talud, el uso obligatorio de los EPP y la implementación de la señalización de obra.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RADICACIÓN DOCUMENTO N° CQUI-226 SUSPENSIÓN DE PERSONAL EN LA OBRA, PR5+0450, RUTA 40QN05- CONTRATO DE MONTO AGOTABLE NO. 2428-2024.

CONSORCIO INGEVIAM 31 oct 2024, 9:43 p.m. (hace 17 horas)
Ing. Carlos A. Torres, se remite el documento N° CQUI-226 Suspensión de personal en la obra, PR5+0450, Ruta 40QN05- Contrato de Monto Agotable No. 2428-2...

CONSORCIO INGEVIAM <consorcio.ingeviam@gmail.com> 11:40 a.m. (hace 3 horas)
para Jose

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

COMPONENTE SOCIAL

No aplica para el presente contrato por sus características.

COMPONENTE AMBIENTAL

Previo análisis y revisión de lo establecido en el decreto único reglamentario 1076-2015, se evidencia que los contratos 1416 de 2024 y 1417 de 2024, corresponde a un proyecto de mínimo impacto y teniendo claro que está concebido como obras de mínima intervención, por lo cual no requiere de la elaboración del programa de adaptación de la guía ambiental - PAGA, dado que no tienen aplicabilidad a ninguna de las fichas de manejo ambiental de acuerdo al memorando circular SMA6141-1 además de no desarrollarse en zonas sensibles, zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales, en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por entes nacionales, regionales o territoriales o áreas de protección ecológica.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.984.929.795,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 254.248.921,64
SALDO	\$ 3.730.680.873,36



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.

Aplicativo HERMES

En el aplicativo HERMES se registra de forma periódica, reporte de accidentes en los corredores viales a cargo, reporte del estado actual de sitios críticos, reporte de emergencias.

Aplicativo SUKUBUN

En el aplicativo SUKUBUN se registra digitalmente el atropellamiento de fauna silvestre en la longitud de la red vial a cargo; dicha información se ingresa de manera directa y real mediante el desarrollador ArcGIS.

Aplicativo SIGP

En el aplicativo SIGP se registra el Inventario e inspección de los puentes pertenecientes a los corredores a cargo de la AMV.

Aplicativo INVICOSTOS

En el aplicativo INVICOSTOS se registra todo lo relacionado a cotizaciones para alimentar a planta central en lo relativo a los APUS y precios de referencia de equipos, transporte, materiales.

NOTA: Por el momento no se tienen las claves para el ingreso a las aplicaciones.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1.EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se presenta la relación del equipo utilizado por la Administración Vial, durante periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024. **Ver ANEXO No. 8.**

6.2.PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta la relación del personal de la Administración Vial, durante periodo comprendido entre 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. **Ver ANEXO No. 9.**

6.3.INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Información financiera del contrato de interventoría se presenta el estado financiero del contrato, periodo comprendido entre 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. **Ver ANEXO No. 10.**

6.4.SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Administración Vial presentó las pólizas, las cuales fueron aprobadas por la Dirección Territorial Quindío del Invias y se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. **Ver ANEXO No. 11.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La Administración vial realiza recorridos diarios en las vías a cargo, verificando las labores e indicadores de mantenimiento rutinario realizado por las cooperativas los Robles y Coopmavial, realiza atención oportuna de las emergencias presentadas en la vía, y atendiendo los requerimientos realizados por el INVIAS, entidades y la ciudadanía en general, entre otras.
- La Ruta 25VL07 CARTAGO –ALCALA requiere de obras para la atención de sitios críticos donde se tiene asentamientos e inestabilidad de taludes. La administración vial realizó un informe técnico de las necesidades críticas incluyendo presupuesto, el cual fue radicado ante INVIAS con el fin de que sean atendidos por el contratista CONSORCIO MEGAVIAS QUINDIO.
- La Ruta 25VL07 CARTAGO –ALCALA, requiere de intervención periódica con maquinaria tipo retro cargador y volquetas para realizar la remoción de derrumbes sobre cunetas y carriles, especialmente entre los PR 6 +000 y EL PR 12+0000, teniendo en cuenta que los propietarios de los predios aledaños a la vía no permiten el bote de material de manera manual por las cooperativas. El CONSORCIO VÍAS DEL CAFÉ quien ejecuta el contrato 1904-2020 removió parcialmente los derrumbes el día 20 de septiembre de 2024.
- La Ruta 25VL07 CARTAGO –ALCALA requiere de rehabilitación de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta que el alto grado de deterioro que tiene en la mayoría de los tramos. En el mes de julio de 2024 se atendieron algunos sectores con el contrato de suministro de mezcla No. 2028-2024. La AMV coordinara con la cooperativa los Robles, las labores necesarias para garantizar que no existan baches en la vía que pongan en riesgo la integridad de los usuarios de la vía.
- La Ruta 25VL07 CARTAGO –ALCALA tiene problemática de hurto de señales de tránsito, rejas metálicas de alcantarillas, defensas metálicas por lo que actualmente requiere de señalización vertical. Actualmente, está en ejecución el contrato No. 2047-2024 a través del cual se instalarán señales verticales y demarcación horizontal. La AMV coordinara con la cooperativa los Robles, las labores necesarias para adelantas actividades que mejoren la señalización en el sector.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- El 13 de septiembre la AMV solicitó autorización para elaborar 3 pasacalles y 1000 volantes con el fin de dar cumplimiento a la resolución 01336 del 24 de abril del 2024 del INVIAS, para la restricción del paso de vehículos de carga superior a 15 ton por el puente sobre el río la vieja PR 9+0620, RUTA 25VL07, sector de piedras de Moler, sin embargo, se requiere del apoyo de las entidades de tránsito para hacer control vehicular. La dirección territorial aprobó la elaboración de estos elementos el 17 de septiembre de 2024, y se tiene programado instalar el pasacalle y distribuir los volantes el 4 y 11 de octubre de 2024.
- En las franjas de vía de las RUTAS 2901B ARMENIA –ALCALA Y 25VL07 CARTAGO-ALCALA, se cuenta con un inventario de más de 400 árboles que pueden tener riesgo de caer sobre la vía. La AMV realizó gestión ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y la corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), así como con las unidades de gestión del riesgo locales para la tala de dichos árboles. Una vez realizada la visita técnica con el acompañamiento de funcionarios de dichas entidades, estas emitieron el concepto y el permiso para la tala de los árboles, así:

Calarcá.	23 árboles para tala.
Salento	27 árboles para tala
Montenegro	No han respondido.
Alcalá	No dieron permiso. Se debe cumplir con el procedimiento indicado por la corporación.
Cartago	No dieron permiso. Se debe cumplir con el procedimiento indicado por la corporación.
Quimbaya	No ha dado respuesta.

- La Ruta 2901B ARMENIA-ALCALA requiere de rehabilitación de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta el alto grado de deterioro que tiene en la mayoría de los tramos. La AMV coordina con las cooperativas los Robles y Coopmavial, las labores necesarias para garantizar que no existan baches en la vía que pongan en riesgo la integridad de los usuarios de la vía.
- La Ruta 2901B ARMENIA-ALCALA, está siendo intervenida hasta el PR 2+0500 con obras de doble calzada en el marco del contrato 1904-2020, la AMV realizara seguimiento a las labores realizadas y apoyara en las actividades que se requieran para la mitigación de afectaciones a los usuarios durante la ejecución de las obras.
- La Ruta 2901B ARMENIA –ALCALA requiere de intervención periódica con maquinaria tipo retro cargador y volquetas para realizar la remoción de derrumbes sobre cunetas y carriles, teniendo en cuenta que los propietarios de los predios aledaños a la vía no permiten el bote de material de manera manual por las cooperativas.
- La Ruta 40QN05 VARIANTE CALARCA-LA CABAÑA requiere de rehabilitación de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta que el alto grado de deterioro que tiene en la mayoría de los tramos. La AMV coordinara con la cooperativa Coopmavial, las labores necesarias para garantizar que no existan baches en la vía que pongan en riesgo la integridad de los usuarios de la vía.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

- La Ruta 40QN05 VARIANTE CALARCA-LA CABAÑA requiere de obras de demarcación horizontal, debido al deterioro de la demarcación existente, que no garantiza la visibilidad de los conductores y genera riesgo a los usuarios de la vía.
- La Ruta 4003 Armenia –Ibagué sector Armenia –Calarcá, está siendo intervenida con obras de doble calzada en el marco del contrato 1904-2020. La AMV realizara seguimiento a las labores realizadas y apoyara en las actividades que se requieran para la mitigación de afectaciones a los usuarios durante la ejecución de las obras.
- La Ruta 4003 Armenia –Ibagué sector Armenia –Calarcá y la Ruta 40QN05, presenta problemática de hurto de defensas metálicas. La administración vial con el fin de mitigar este problema solicitó autorización para llevar a cabo un mantenimiento que consistirá en colocar tornillos que hacen falta en las defensas y realizar de un punto de soldadura en aquellas áreas que lo requieran para evitar el robo de las mismas.
- La Ruta 40QN04 LA ESPAÑOLA- ARMENIA presenta un alto deterioro en las losas de concreto, debido al alto tráfico que transita por este sector suburbano. La AMV coordinara con la cooperativa Coopmavial actividades para evitar la aparición fisuras graves en el pavimento y baches, así como el mantenimiento de las juntas entre losas que presentan más deterioro.

8. OTROS ANEXOS.

8.1. SITIOS CRITICOS Y NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

Se adjunta relación de sitios críticos y necesidades de las vías. **Ver anexo No. 12**

8.2. INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL ITEM DE INSUMOS.

Durante este periodo se realizó instalación de pasacalles y distribución de volantes para dar a conocer la restricción que tiene la vía Cartago – Alcalá, ver **anexo No. 13** y se inició la demarcación del abscisado una vez se termine se presentará el informe correspondiente.

8.3.RELACIÓN DE ACCIDENTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Se adjunta relación de los accidentes de tránsito ocurridos en el mes de septiembre de 2024. **Ver anexo No. 14.**

8.4.TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Se adjunta la trazabilidad de la correspondencia enviada y recibido durante el mes de septiembre de 2024. **Ver anexo No. 15**



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

8.5. TRAZABILIDAD DE DERECHOS DE PETICIÓN.

Se adjunta la trazabilidad de los derechos de petición enviados con corte al 31 de octubre de 2024. *Ver anexo No. 16*

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 1

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

					FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	-------	--------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	QUINDIO	PERIODO MES:	OCTUBRE 2024	
-------------------	---	------------------------	---------	--------------	--------------	--

CONTRATO DE OBRA No.:	1416-2024	PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$	1.850.348.849,00
OBJETO: "Servicio de Mantenimiento Rutinario Dirección Territorial Quindío. Sectores 4002 Club Campestre - Armenia, PR41+0760 - PR50+0250 / 4003 Armenia - Calarcá, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN05 Variante Calarcá - La Cabaña, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN04 La Española - Armenia, PR2+0300 - PR4+0000 / 2901B Armenia - Alcalá, PR0+0000 - PR8+0000". LOTE 1.		FECHA DE INICIO:	15/05/2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$	-
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	-
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$	-
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$	-
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMEINTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA	PLAZO ACUMULADO:	31/07/2026			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1995 - 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEVIAM	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. ESTEBAN ARIAS OSPINA	
----------------------------	-------------	--------------	--------------------	---	---------------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>km</td><td>29,31</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento		km	29,31	Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>km</td><td>29,31</td><td>29,31</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento		km	29,31	29,31	Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento		km	29,31																																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																																																	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento		km	29,31	29,31																																																																													
Otros (Especificar cuales)																																																																																	

AVANCE FINANCIERO								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$ 1.818.930.950,00	\$ 31.417.899,00	\$ 1.850.348.849,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	\$ 329.837.268,15
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.818.930.950,00	\$ 31.417.899,00	\$ 1.850.348.849,00	VALOR EJECUTADO				\$ 329.837.268,15

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 1.850.348.849,00	MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 329.837.268,15	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	17,83%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	
			FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Tala de Guadua PR3+0250 - Ruta 2901B			Tala de Arboles PR4+0000 al PR4+0600 - Ruta 40QN05	
Limpieza de cunetas PR2+0600 al PR6+0000 - Ruta 2901B			Roceria mecanica PR41+0760 al PR46+0000 - Ruta 4002	
Roceria mecanica PR0+0000 al PR2+0000 - Ruta 40QN05			limpieza obras de drenaje PR0+0000 al PR2+0000 - Ruta 4003	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
N.A				
<div>Firma </div> <div>Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES</div> <div>Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	
			FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Limpieza de box coulvert PR11+0150 Ruta 2901B			Roceria mecanica PR9+0000 al PR10+0000 - Ruta 25VL07	
Tala de guaduas PR14+0900 - Ruta 2901B			Limpieza de obras de drenaje PR13+0500 Ruta 25VL07	
Limpieza de cunetas PR16+0500 al PR18+0000 - Ruta 2901B			Atención de emergencia PR5+0780 - Ruta 2901B	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
N.A				
<div><div></div><div>Firma Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES Director de Interventoría - Ingeniera Residente AMV QUINDIO Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU</div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>				



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 2

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

2/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024

PROYECTO: "Servicio de Mantenimiento Rutinario Dirección Territorial Quindío. Sectores 4002 Club Campestre - Armenia, PR41+0760 - PR50+0250 / 4003 Armenia - Calarcá, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN05 Variante Calarcá - La Cabaña, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN04 La Española - Armenia, PR2+0300 - PR4+0000 / 2901B Armenia - Alcalá, PR0+0000 - PR8+0000". LOTE 1.

CONTRATO No. 1416 - 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMEINTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1995 - 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGEVIAM

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑAS	HUSQVARNA 143r			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GUADAÑA	MARUYAMA 420			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOTOSIERRA	STHIL 385			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOTOSIERRA	STHIL 275			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESTACIONARIA	SUKIYAMA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AUTOMOVIL	MAZDA 323 / 1992			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
TOTAL ACTIVO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES

No.

%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

279

100%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

279

100%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

0

0%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

0

0%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: EDGAR YOBANI ARCE

Residente de Obra - Representante Legal

Matrícula Profesional No.: N.A

Firma

Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

Residente de Interventoría - AMV QUINDIO

Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA										

FECHA																				2/11/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO											

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024				PROYECTO: Servicio de mantenimiento rutinario Dirección Territorial uindío. Sectores 2901B Armenia - Alcalá PR8+0000 - PR23+0325 /25VL07 Cartago - Alcalá , PR0+0000 - PR20+0100 /29VLA Variante Alcalá y Accesos, PR0+0000 - PR1+0200 - LOTE 2																											
CONTRATO No. 1417-2024				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES																											
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1995 - 2024				INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGEVIAM																											

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOSIERRA	STHIL 360			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
MOTOSIERRA	STHIL 250			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GUADAÑA	MARUYAMA 420			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
GUADAÑA	HUSQVARNA 143r			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	248	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	248	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Se encuentra inactiva por ser fin de semana, por lo tanto no se usa.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

David Londoño P.

Nombre: DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA

Residente de Obra - Representante Legal

Matrícula Profesional No.: N.A

Firma

M. H. V. B.

Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

Residente de Interventoría - AMV QUINDIO

Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 3

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																
																			CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6																													
																			VERSION	1																													
																			PÁGINA																														
																			FECHA	3/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																			DIRECCIÓN TERRITORIAL: Quindío																														
CONTRATO DE OBRA No: 1416-2024																			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMEINTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024																			PROYECTO: "Servicio de Mantenimiento Rutinario Dirección Territorial Quindío. Sectores 4002 Club Campestre - Armenia, PR41+0760 - PR50+0250 / 4003 Armenia - Calarcá, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN05 Variante Calarcá - La Cabaña, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN04 La Española - Armenia, PR2+0300 - PR4+0000 / 2901B Armenia - Alcalá, PR0+0000 - PR8+0000". LOTE 1.																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1995-2024																			INTERVENITOR: CONSORCIO INGEVIAM																														
NOMBRE ARL: SURA																			NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comfenalco Quindío																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Edgar Yobany Arce	18415702	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	S.O.S	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
2	Ramon Escobar Gallego	4466671	Asociado	1,500,000																													Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
3	Luis Alfonso Gomez Correa	18417677	Asociado	1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
4	Jhon Jairo Guzman Ferias	18417585	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
5	Giovany Miranda	18418135	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
6	Geraldine Montoya Aguirre	1094945450	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	SANITAS	31417491	\$ 60.000	COLFONDOS	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
7	Jose Reinel Ramirez	18413508	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
8	Roosevelt Rengifo Bedoya	9806777	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	S.O.S	31417491	\$ 60.000	COLPENSIONES	31417491	\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	-			
9	Jhonatan Estiven Rengifo Gaviria	1097730344	Asociado	1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coopmavial	1,500,000	\$ 104.400	V	NUEVA EPS												



VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Firma: 
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Gestión del INVIAS.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 4

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA			

FECHA

05112024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO														
CONTRATO DE OBRA No: 1416 DE 2024															CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA														
MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 Octubre 2024															PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1995 DE 2024															INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM														

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2024	408124	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 599.704.124,00
TOTAL						\$ 599.704.124,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 599.704.124,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									408124 DE 10/05/2024	\$ 599.704.124,00	\$ 1.850.348.849,00				
1	Parcial	15 al 31 mayo 2024	\$ 29.476.074,01	\$ 509.132,19	\$ 29.985.206,20	N/A	N/A			\$ 569.718.917,80	\$ 1.820.363.642,80				Acta Mantenimiento Rutinario No. 01, afecta el R.P. No. 408124
2	Parcial	1 al 30 junio 2024	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	N/A	N/A			\$ 509.748.505,41	\$ 1.760.393.230,41				Acta Mantenimiento Rutinario No. 02, afecta el R.P. No. 408124
3	Parcial	1 al 31 Julio 2024	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	N/A	N/A			\$ 449.778.093,02	\$ 1.700.422.818,02				Acta Mantenimiento Rutinario No. 03, afecta el R.P. No. 408124
4	Parcial	1 al 30 Agosto 2024	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	N/A	N/A			\$ 389.807.680,63	\$ 1.640.452.405,63				Acta Mantenimiento Rutinario No. 04, afecta el R.P. No. 408124
5	Parcial	1 al 30 Septiembre 2024	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	N/A	N/A			\$ 329.837.268,24	\$ 1.580.481.993,24				Acta Mantenimiento Rutinario No. 05, afecta el R.P. No. 408124
6	Parcial	1 al 31 Octubre 2024	\$ 58.952.148,00	\$ 1.018.264,39	\$ 59.970.412,39	N/A	N/A			\$ 269.866.855,85	\$ 1.520.511.580,85				Acta Mantenimiento Rutinario No. 06, afecta el R.P. No. 408124
TOTALES			\$ 324.236.814,01	\$ 5.600.454,14	\$ 329.837.268,15					\$ 269.866.855,85	\$ 1.520.511.580,85				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO	\$ 324.236.814,01	\$ 5.600.454,14	\$ 329.837.268,15
VALOR TOTAL	\$ 324.236.814,01	\$ 5.600.454,14	\$ 329.837.268,15

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: EDGAR YOBANI ARCE
Representante Legal
C.C. No. 18.415.702 de Montenegro Quindío

Firma

Nombre: ING.MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Ingeniera Residente AMV
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		

FECHA

5/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No:

1417 DE 2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

MES INFORME MENSUAL:

1 al 31 OCT 2024

PROYECTO:

CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1995 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGEVIAM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2024	411724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 551.467.564,00
TOTAL						\$ 551.467.564,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 551.467.564,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									411724 del 10/05/2024	\$ 551.467.564,00	\$ 1.701.517.999,00				
1	Parcial	15 al 31 MAY 2024	\$ 27.105.197,52	\$ 509.132,19	\$ 27.614.329,71	N/A	N/A			\$ 523.853.234,29	\$ 1.673.903.669,29				Acta Mantenimiento Rutinario No. 01, afecta el R.P. No. 411724
2	Parcial	1 al 30 JUN 2024	\$ 54.210.395,03	\$ 936.361,37	\$ 55.146.756,40	N/A	N/A			\$ 468.706.477,89	\$ 1.618.756.912,89				Acta Mantenimiento Rutinario No. 02, afecta el R.P. No. 411724
3	Parcial	1 al 31 JUL 2024	\$ 54.210.395,03	\$ 936.361,37	\$ 55.146.756,40	N/A	N/A			\$ 413.559.721,49	\$ 1.563.610.156,49				Acta Mantenimiento Rutinario No. 03, afecta el R.P. No. 411724
4	Parcial	1 al 30 AGO 2024	\$ 54.210.395,03	\$ 936.361,37	\$ 55.146.756,40	N/A	N/A			\$ 358.412.965,09	\$ 1.508.463.400,09				Acta Mantenimiento Rutinario No. 04, afecta el R.P. No. 411724
5	Parcial	1 al 30 SEP 2024	\$ 54.210.395,03	\$ 936.361,37	\$ 55.146.756,40	N/A	N/A			\$ 303.266.208,69	\$ 1.453.316.643,69				Acta Mantenimiento Rutinario No. 05, afecta el R.P. No. 411724
6	Parcial	1 al 31 OCT 2024	\$ 54.210.395,03	\$ 936.361,37	\$ 55.146.756,40	N/A	N/A			\$ 248.119.452,29	\$ 1.398.169.887,29				Acta Mantenimiento Rutinario No. 06, afecta el R.P. No. 411724
TOTALES			\$ 298.157.172,67	\$ 5.190.939,04	\$ 303.348.111,71					\$ 248.119.452,29	\$ 1.398.169.887,29				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO	\$ 298.157.172,67	\$ 5.190.939,04	\$ 303.348.111,71
VALOR TOTAL	\$ 298.157.172,67	\$ 5.190.939,04	\$ 303.348.111,71

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

David Londono P.

Nombre: DAVID LONDONO PIEDRAHITA

Representante Legal

C.C. No. 16.228.988 de Cartago, Valle del Cauca

Firma

M. H. V. B.

Nombre: ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

Ingeniera Residente AMV

Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 5

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA											
																				FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO												
CONTRATO DE OBRA No: 1416 - 2024																				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMEINTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA "Servicio de Mantenimiento Rutinario Dirección Territorial Quindío. Sectores 4002 Club Campestre - Armenia, PR41+0760 - PR50+0250 / 4003 Armenia - Calarcá, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN05 Variante Calarcá - La Cabaña, PR0+0000 - PR7+0260 / 40QN04 La Española - Armenia, PR2+0300 - PR4+0000 / 2901B Armenia -												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024																				PROYECTO: Alcalá, PR0+0000 - PR8+0000". LOTE 1.												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1995 - 2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	23	24	21	23	22	23	22	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	22	23	22	24	24	23	22	24	24	22	22	715
Lluvias moderadas	1	1		2	1	2	1	1	1	1									2	2	2	1	2			1	2			1	2	26
Lluvias intensas				1				1																						1		3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Se toman los datos de la estación Aeropuerto El Eden.																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: EDGAR YOBANI ARCE Residente de Obra - Representante Legal Matrícula Profesional No.: N.A</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES Residente de Interventoría - AMV QUINDIO Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

CódigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/10/2024 0:00	0.4	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/10/2024 0:00	3.2	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/10/2024 0:00	75.3	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2024 0:00	2	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2024 0:00	46.7	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2024 0:00	3	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2024 0:00	51.1	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2024 0:00	0.4	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 0:00	1.8	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 0:00	12.2	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 0:00	13.4	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 0:00	23.3	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 0:00	4.5	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 0:00	15.7	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 0:00	0.8	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 0:00	10.9	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 0:00	0	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2024 0:00	22.7	50		900
26125061	AEROPUERTO EL EDEN - - AUT [26125061]	44.547.222.220	-7.576.638.889	1229	SinÁ³ptica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	QuindÁ-o	Armenia	15/07/2016 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2024 0:00	16.1	50		900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA											
																				FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO												
CONTRATO DE OBRA No: 1417-2024																				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES Servicio de mantenimiento rutinario Dirección Territorial uindío. Sectores 2901B Armenia - Alcalá PR8+0000 -												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE - 2024																				PROYECTO: PR23+0325 /25VL07 Cartago - Alcalá , PR0+0000 - PR20+0100 /29VLA Variante Alcalá y Accesos, PR0+0000												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1995 - 2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	22	24	22	23	23	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	23	23	23	24	24	22	22	24	24	21	22	722
Lluvias moderadas				2		2	1	1		1										2	1	1	1			2	2			2	2	20
Lluvias intensas																				1										1		2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Se toman los datos de la estación ubicada en Alcalá																																
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA Residente de Obra - Representante Legal Matrícula Profesional No.: N.A</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES Residente de Interventoría - AMV QUINDIO Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU</div></div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom�@trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	1/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	2/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	3/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	4/10/2024 0:00	21	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	5/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	6/10/2024 0:00	27	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	7/10/2024 0:00	11	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	8/10/2024 0:00	10	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	9/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 0:00	12	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 0:00	38	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 0:00	15	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 0:00	12	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 0:00	19	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 0:00	20	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 0:00	28	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 0:00	0	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	30/10/2024 0:00	51	50		900
26120150	ALCALA [26120150]	46.764.722.220	-7.578.630.556	1261	Pluviom��trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	Valle Del Cauca	Alcal��	15/03/1972 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	D��a pluviom��trico (convencional)	Diaria	31/10/2024 0:00	24	50		900



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 6

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Seguimiento de Garantías y Seguros Contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

		FECHA		2	8	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	QUINDIO
-------------------	--	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1416-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO
----------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	

FECHA DE INICIO:	15/05/2024		
PLAZO INICIAL:	31/07/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 1.850.348.849,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 1.850.348.849,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1995-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde		Hasta			
Cumplimiento	10%	\$ 185.034.385,00	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 370.059.770,00	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 555.104.655,00	2	5	2024	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		60-44-101012139
Certificado de modificación o anexo No.:		0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde		Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14%	\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	60-40-101005697	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA				2	8	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 185.034.385,00	15	5	2024	13	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 370.059.770,00	15	5	2024	13	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 555.104.655,00	15	5	2024	13	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

60-44-101012139

Certificado de modificación o anexo No.

2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14%	\$ 260.000.000,00	15	5	2024	13	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

60-40-101005697

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO

Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

		FECHA		2	8	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	QUINDIO
-------------------	--	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1417-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES
----------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
Servicio de mantenimiento rutinario Dirección Territorial uindío. Sectores 2901B Armenia - Alcalá PR8+0000 - PR23+0325 /25VL07 Cartago - Alcalá , PR0+0000 - PR20+0100 /29VLA Variante Alcalá y Accesos, PR0+0000 - PR1+0200 - LOTE 2	

FECHA DE INICIO:	15/05/2024		
PLAZO INICIAL:	31/06/2026		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/06/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 1.701.517.999,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 1.701.517.999,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1995-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	\$ 170.151.800,00	2	5	2024	31	1	2027	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 340.303.600,00	2	5	2024	31	7	2029	
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 510.455.399,70	2	5	2024	31	1	2027	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	60-44-101012140
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	15%	\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	60-40-101005698	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		2	8	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 170.151.800,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 340.303.600,00
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 510.455.400,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	5	2024	31	1	2027
2	5	2024	31	7	2029
2	5	2024	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 60-44-101012140

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	15%	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	5	2024	31	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 60-40-101005698

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 170.151.800,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 340.303.600,00
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 510.455.400,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	5	2024	13	2	2027
2	5	2024	13	8	2029
2	5	2024	13	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 60-44-101012140

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		2	8	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	15%	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	5	2024	13	8	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 60-40-101005698 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

MAR

Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 7

Registro MEPI-MN-IN-14-FR-2

Actas de Reuniones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

4/10/2024
(Día / Mes / Año)

(ACTA DE REUNION TECNICA)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1416-2024
1417-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1995-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar cumplimiento de indicadores y programar actividades de la siguiente semana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificar el cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario.
2. Definir actividades a realizar en la semana del 7 al 13 de octubre de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúnen el Representante Legal de la cooperativa Coopmavial y el de Los Robles con los ingenieros de la Administración Vial para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en la semana y programar las actividades de la semana del 7 al 13 de octubre de 2024.

La AMV indica que durante el recorrido a la vía se verificó el cumplimiento de las actividades programadas para la semana .

Se realiza la programación de las actividades a realizar en la semana del 7 al 13 de octubre de 2024:

La cooperativa de trabajo asociado de mantenimiento vial de Coopmavial, realizará:

- Ruta 40QN05: Poda de árboles.
- Ruta 4002: Rocería y/o desmonte manual.
- Ruta 2901B: Limpieza de encoles y descoles.
- Ruta 4003: Limpieza de cunetas

La cooperativa de trabajo asociado Los Robles, realizará:


- Ruta 25VL07: Limpieza de alcantarillas, limpieza de señales de tránsito y defensas metálicas.
- Ruta 29VLA: Limpieza de cunetas
- Ruta 2901B. Poda de árboles y limpieza de señales de tránsito y defensas metálicas.

NOTA: Se anexa programación de actividades de mantenimiento rutinario.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																												
		VERSIÓN	1																												
		PÁGINA																													
		FECHA	3/10/2024 (Día / Mes / Año)																												
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)</th><th colspan="2">RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.</td><td>viernes, 11 de octubre de 2024</td><td colspan="2">Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles</td></tr><tr><td>Verificar cumplimeinto de las actividades</td><td>viernes, 11 de octubre de 2024</td><td colspan="2">Administración Vial</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES		Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 11 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles		Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 11 de octubre de 2024	Administración Vial																	
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																													
Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 11 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles																													
Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 11 de octubre de 2024	Administración Vial																													
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/10/2024 (Día / Mes / Año)																															
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																															
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																															
<table><thead><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edgar Yobany Arce</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Coopmavial</td><td></td></tr><tr><td>David Londoño Piedrahita</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Los Robles</td><td></td></tr><tr><td>Martha Lucia Vega Benavides</td><td>Ingeniera Residente</td><td>Consortio Ingeviam</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial		David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles		Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam													
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																												
Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial																													
David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles																													
Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam																													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																															

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA COOPMAVIAL							
SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 07/10/2024	MARTES 08/10/2024	MIÉRCOLES 09/10/2024	JUEVES: 10/10/2024	VIERNES 11/10/2024	SABADO: 12/10/2024	DOMINGO: 13/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA Y SEPARADORES							
LIMPIEZA DE CUNETAS		4003 PR 0+0000 A PR 3+0800 4 TRABAJADORES					
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)	2901B PR 4+0950 A PR 5+0300 12 TRABAJADORES						
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL		4002 PR 45+0500 8 TRABAJADORES	4002 PR 46+0000 A PR 49+0200 12 TRABAJADORES		4002 PR 49+0000 A PR 50+0200 12 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES				40QN05 PR 4+0008 A PR 7+0130 12 TRABAJADORES			
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA							
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)						DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS VIAS ASIGNADAS	DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS VIAS ASIGNADAS
OBSERVACIONES:							


EDGAR YOBANI ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA COOPMAVIAL


ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE -CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LOS ROBLES							
SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 07/10/2024	MARTES 08/10/2024	MIÉRCOLES 09/10/2024	JUEVES: 10/10/2024	VIERNES 11/10/2024	SABADO: 12/10/2024	DOMINGO: 13/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA							
LIMPIEZA DE CUNETAS					25VL07 PR 9+0000 A PR 11+0000 6 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)		25VL07 PR 4 +0600 A PR10 +050 6 TRABAJADORES					
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)		2901b PR 20 +900 7 TRABAJADORES					
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL							
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	2901B PR 14 +930 7 TRABAJADORES						
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA	25VL07 PR 2+ 000 A PR 4 +000 6 TRABAJADORES		25VL07 PR 4+ 000 A PR 7 +000 6 TRABAJADORES 2901B PR 20 +000 A PR 22 +000 7 TRABAJADORES	25VL07 PR 7+ 000 A PR 9 +000 29VLA PR 0+000 A PR 1+0200 6 TRABAJADORES 2901B PR 22 +000 A PR 23 +0325 7 TRABAJADORES	25VL07 PR 9+ 000 A PR 11 +000 6 TRABAJADORES		
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)							
OBSERVACIONES:							

David Londoño P

DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA LOS ROBLES

M H 4 B

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE -CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

11/10/2024
(Día / Mes / Año)

(ACTA DE REUNION TECNICA)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1416-2024
1417-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1995-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar cumplimiento de indicadores y programar actividades de la siguiente semana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificar el cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario.
2. Definir actividades a realizar en la semana del 14 al 20 de octubre de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reunen el Representante Legal de la cooperativa Coopmavial y el de Los Robles con los ingenieros de la Administración Vial para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en la semana y programar las actividades de la semana del 14 al 20 de octubre de 2024.

La AMV indica que durante el recorrido a la vía se verifico el cumplimeinto de las actividades programadas para la semana .

Se realiza la programación de las actividades a realizar en la semana del 14 al 20 de octubre de 2024:

La cooperativa de trabajo asociado de mantenimiento vial de Coopmavial, realizara:

- Ruta 4002: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual
- Ruta 2901B: Poda de arboles.

La cooperativa de trabajo asociado Los Robles, realizara:

- Ruta 25VL07: Limpieza de señales de transito y defensas metalicas y roceria y/o desmonte manual.
- Ruta 2901B. Limpieza de cunetas y roceria y/o desmonte manual.


NOTA: Se anexa programación de actividades de mantenimiento rutinario.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA																																																				
		FECHA	11/10/2024 (Día / Mes / Año)																																																			
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.</td><td>viernes, 18 de octubre de 2024</td><td>Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles</td></tr><tr><td>Verificar cumplimeinto de las actividades</td><td>viernes, 18 de octubre de 2024</td><td>Administración Vial</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><tr><td>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN</td><td>18/10/2024 (Día / Mes / Año)</td></tr></table> <p>NOTAS:</p> <p>1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.</p> <p>2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.</p> <p>LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:</p> <table><thead><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edgar Yobany Arce</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Coopmavial</td><td></td></tr><tr><td>David Londoño Piedrahita</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Los Robles</td><td></td></tr><tr><td>Martha Lucia Vega Benavides</td><td>Ingeniera Residente</td><td>Consortio Ingeviam</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial</p>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 18 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles	Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 18 de octubre de 2024	Administración Vial													FECHA PRÓXIMA REUNIÓN	18/10/2024 (Día / Mes / Año)	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial		David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles		Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam													
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES																																																				
Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 18 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles																																																				
Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 18 de octubre de 2024	Administración Vial																																																				
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN	18/10/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																																																			
Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial																																																				
David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles																																																				
Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam																																																				

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA COOPMAVIAL							
SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 14/10/2024	MARTES 15/10/2024	MIERCOLES 16/10/2024	JUEVES: 17/10/2024	VIERNES 18/10/2024	SABADO: 19/10/2024	DOMINGO: 20/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA Y SEPARADORES							
LIMPIEZA DE CUNETAS					RUTA 4002 PR 45+0500 5 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL		RUTA 4002 PR 46+0000 A PR 49+0000 12 TRABAJADORES		RUTA 4002 PR 49+0000 A PR 50+0250 12 TRABAJADORES	RUTA 4002 PR 45+0500 7 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES			RUTA 2901B PR 2+0800 A PR 4+0000 12 TRABAJADORES				
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA							
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)			CAPACITACIÓN AMV EN HORAS DE LA MAÑANA				
OBSERVACIONES:							




EDGAR YOBANI ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA COOPMAVIAL




ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE -CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LOS ROBLES							
SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 14/10/2024	MARTES 15/10/2024	MIERCOLES 16/10/2024	JUEVES: 17/10/2024	VIERNES 18/10/2024	SABADO: 19/10/2024	DOMINGO: 20/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA							
LIMPIEZA DE CUNETAS		RUTA 2901B PR 8+0000 A PR 09 +000 2 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 09+0000 A PR 10+0000 2 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 10+0000 A PR 11+0000 2 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 11+0000 A PR 12+0000 2 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL		RUTA 2901B PR 8+0000 A PR 10 +000 4 TRABAJADORES RUTA 25VL07 PR 0+0000 A PR 2+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 10+0000 A PR 12+0000 4 TRABAJADORES RUTA 25VL07 PR 2+ 0000 A PR 4 +0000 3 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 12+0000 A PR 14+0000 4 TRABAJADORES RUTA 25VL07 PR 4+ 0000 A PR 6+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 14+0000 A PR 16+0000 4 TRABAJADORES RUTA 25VL07 PR 6+ 0000 A PR 8+0000 3 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES							
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA		RUTA 25VL07 PR 4+0000 A PR 5+0000 4 TRABAJADORES		RUTA 25VL07 PR 6+0000 A PR 7+0000 4 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 7+0000 A PR 8+0000 4 TRABAJADORES		
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)							
OBSERVACIONES:							



DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA LOS ROBLES



ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE - CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

(ACTA DE REUNION TECNICA)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1416-2024
1417-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1995-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar cumplimiento de indicadores y programar actividades de la siguiente semana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificar el cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario.
2. Definir actividades a realizar en la semana del 21 al 27 de octubre de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reunen el Representante Legal de la cooperativa Coopmavial y el de Los Robles con los ingenieros de la Administración Vial para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en la semana y programar las actividades de la semana del 21 al 27 de octubre de 2024.

La AMV indica que durante el recorrido a la vía se verifico el cumplimiento de las actividades programadas para la semana .

Se realiza la programación de las actividades a realizar en la semana del 21 al 27 de octubre de 2024:

La cooperativa de trabajo asociado de mantenimiento vial de Coopmavial, realizara:

- Ruta 4002: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual
- Ruta 4003: Limpieza de cunetas, poda de arboles.
- Ruta 2901B: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual.


La cooperativa de trabajo asociado Los Robles, realizara:

- Ruta 25VL07: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual y limpieza de señales de transito y defensas metalicas.
- Ruta 2901B. Limpieza de cunetas y roceria y/o desmonte manual.


NOTA: Se anexa programación de actividades de mantenimiento rutinario.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																												
		VERSIÓN	1																												
		PÁGINA																													
		FECHA	18/10/2024 (Día / Mes / Año)																												
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.</td><td>viernes, 25 de octubre de 2024</td><td>Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles</td></tr><tr><td>Verificar cumplimeinto de las actividades</td><td>viernes, 25 de octubre de 2024</td><td>Administración Vial</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES	Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 25 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles	Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 25 de octubre de 2024	Administración Vial																			
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																													
Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 25 de octubre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles																													
Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 25 de octubre de 2024	Administración Vial																													
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 25/10/2024 (Día / Mes / Año)																															
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																															
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																															
<table><thead><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edgar Yobany Arce</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Coopmavial</td><td></td></tr><tr><td>David Londoño Piedrahita</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Los Robles</td><td></td></tr><tr><td>Martha Lucia Vega Benavides</td><td>Ingeniera Residente</td><td>Consortio Ingeviam</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial		David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles		Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam													
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																												
Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial																													
David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles																													
Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam																													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																															

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA COOPMAVIAL							
SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 21/10/2024	MARTES 22/10/2024	MIERCOLES 23/10/2024	JUEVES: 24/10/2024	VIERNES 25/10/2024	SABADO: 26/10/2024	DOMINGO: 27/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA Y SEPARADORES		RUTA 4002 PR41+0760 A PR 49+0100 12 TRABAJADORES					
LIMPIEZA DE CUNETAS				RUTA 4003 PR 0+0890 A PR 2+0000 4 TRABAJADORES 40QN04	RUTA 2901B PR 0+0000 A PR 2+0700 7 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL	RUTA 4002 PR41+0760 A PR 49+0100 12 TRABAJADORES			RUTA 4002 PR 49+0350 4 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 0+0000 A PR 2+0700 7 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES			RUTA 4003 PR 0+0890 A PR 2+0000 12 TRABAJADORES				
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA							
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)							
OBSERVACIONES:							



EDGAR YOBANI ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA COOPMAVIAL



ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE -CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LOS ROBLES							
SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 21/10/2024	MARTES 22/10/2024	MIÉRCOLES 23/10/2024	JUEVES: 24/10/2024	VIERNES 25/10/2024	SABADO: 26/10/2024	DOMINGO: 27/10/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA							
LIMPIEZA DE CUNETAS	RUTA 2901B PR 12+0000 A PR 13+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 13+0000 A PR 14+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 14+0000 A PR 15+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 0+ 0000 A PR 2 +0000 4 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 15+0000 A PR 16+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 2+ 0000 A PR 4+0000 4 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 16+0000 A PR 17+0000 3 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL	RUTA 25VL07 PR 8+0000 A PR 9+0000 3 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 13+0000 A PR 14+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 9+ 0000 A PR 10 +0000 3 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 14+0000 A PR 16+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 10+ 0000 A PR 11 +0000 3 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 16+0000 A PR 18+0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 11+ 0000 A PR 12 +0000 3 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 18+0000 A PR 19+0000 4 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 12+ 0000 A PR 13 +0000 3 TRABAJADORES RUTA 2901B PR 19+0000 A PR 20+0000 3 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES							
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA	RUTA 25VL07 PR 5+0000 A PR 5+0500 4 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 5+0500 A PR 6+0000 4 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 6+0000 A PR 6+0500 4 TRABAJADORES				
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)							
OBSERVACIONES:							

David Londoño P.

DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA LOS ROBLES

M. H. V. B.

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE -CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

25/10/2024
(Día / Mes / Año)

(ACTA DE REUNION TECNICA)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1416-2024
1417-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1995-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar cumplimiento de indicadores y programar actividades de la siguiente semana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificar el cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario.
2. Definir actividades a realizar en la semana del 28 de octubre al 3 noviembre de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reunen el Representante Legal de la cooperativa Coopmavial y el de Los Robles con los ingenieros de la Administración Vial para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en la semana y programar las actividades de la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024.

La AMV indica que durante el recorrido a la vía se verifico el cumplimiento de las actividades programadas para la semana .

Se realiza la programación de las actividades a realizar en la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024:

La cooperativa de trabajo asociado de mantenimiento vial de Coopmavial, realizara:

- Ruta 4003: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual, poda de arboles.
- Ruta 2901B: Limpieza de cunetas.
- Ruta 40QN05: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual

La cooperativa de trabajo asociado Los Robles, realizara:


- Ruta 25VL07: Limpieza de cunetas, roceria y/o desmonte manual, realizar abcisado.
- Ruta 2901B. Limpieza de cunetas y roceria y/o desmonte manual, realizar abcisado.
- Ruta 29VLA: Realizar abcisado.

NOTA: Se anexa programación de actividades de mantenimiento rutinario.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																												
		VERSIÓN	1																												
		PÁGINA																													
		FECHA	25/10/2024 (Día / Mes / Año)																												
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.</td><td>viernes, 1 de noviembre de 2024</td><td>Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles</td></tr><tr><td>Verificar cumplimeinto de las actividades</td><td>viernes, 1 de noviembre de 2024</td><td>Administración Vial</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES	Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 1 de noviembre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles	Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 1 de noviembre de 2024	Administración Vial																			
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																													
Realizar las actividades para cumplir con los indicadores.	viernes, 1 de noviembre de 2024	Cooperativa Coopmavial Cooperativa Los Robles																													
Verificar cumplimeinto de las actividades	viernes, 1 de noviembre de 2024	Administración Vial																													
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 1/11/2024 (Día / Mes / Año)																															
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																															
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																															
<table><thead><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edgar Yobany Arce</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Coopmavial</td><td></td></tr><tr><td>David Londoño Piedrahita</td><td>Representante Legal</td><td>Cooperativa Los Robles</td><td></td></tr><tr><td>Martha Lucia Vega Benavides</td><td>Ingeniera Residente</td><td>Consortio Ingeviam</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial		David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles		Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam													
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																												
Edgar Yobany Arce	Representante Legal	Cooperativa Coopmavial																													
David Londoño Piedrahita	Representante Legal	Cooperativa Los Robles																													
Martha Lucia Vega Benavides	Ingeniera Residente	Consortio Ingeviam																													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																															

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA COOPMAVIAL							
SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 28/10/2024	MARTES 29/10/2024	MIÉRCOLES 30/10/2024	JUEVES: 31/10/2024	VIERNES 01/10/2024	SABADO: 02/11/2024	DOMINGO: 03/11/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA Y SEPARADORES							
LIMPIEZA DE CUNETAS	RUTA 4003 PR 0+0000 A PR 02+0000 5 TRABAJADORES	RUTA 4003 PR 2+0000 A PR 03+0828 4 TRABAJADORES	RUTA 40QN05 PR 0+0000 A PR 02+0500 4 TRABAJADORES		RUTA 2901B PR 2+0500 A PR 6+0500 12 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES, DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)							
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL	RUTA 4003 PR 0+0000 A PR 03+0828 7 TRABAJADORES	RUTA 40QN05 PR 0+0000 A PR 01+0200 8 TRABAJADORES	RUTA 40QN05 PR 1+0200 A PR 02+0500 8 TRABAJADORES				
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES				RUTA 4003 PR 4+0580 A PR 5+0000 12 TRABAJADORES			
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO, DEFENSAS METALICAS Y POSTES DE REFERENCIA							
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)							
OBSERVACIONES:							


 EDGAR YOBANI ARCE
 REPRESENTANTE LEGAL
 COOPERATIVA COOPMAVIAL


 ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
 RESIDENTE - CONSORCIO INGEVIAL
 ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LOS ROBLES							
SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024							
ACTIVIDAD	LUNES: 28/10/2024	MARTES 29/10/2024	MIÉRCOLES 30/10/2024	JUEVES: 31/10/2024	VIERNES 01/10/2024	SABADO: 02/11/2024	DOMINGO: 03/11/2024
	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES	RUTA, PR, NO. TRABAJADORES
BACHEO							
PARCHEO							
LIMPIEZA DE CALZADA							
LIMPIEZA DE CUNETAS					RUTA 25VL07 PR 6+ 0500 A PR 7 +0000 4 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE OBRAS MENORES COMO CANALES , DISIPADORES, ZANJAS DE CORONACION)							
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE TUBERIA)	RUTA 2901B PR 08+0000 A PR 10+0700 4 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 10+0700 A PR 10+0800 4 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 10+0800 A PR 11+0300 4 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 11+0300 A PR 11+0600 4 TRABAJADORES	RUTA 2901B PR 11+0600 A PR 12+0150 6 TRABAJADORES		
LIMPIEZA DE PUENTES Y/O LECHO DE RIO (SIN MAQUINARIA)							
LIMPIEZA MANUAL Y/O PINTURA DE BARANDAS							
DESPEJE MANUAL DE DERRUMBES (SIN MAQUINARIA)							
ROCERIA Y/O DESMONTE MANUAL	RUTA 25VL07 PR 12+ 0000 A PR 13 +0500 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 13+ 0500 A PR 15 +0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 15+ 0500 A PR 16 +0500 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 16+ 0500 A PR 18 +0000 3 TRABAJADORES	RUTA 25VL07 PR 18+ 0000 A PR 20 +0100 3 TRABAJADORES		
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES							
EMPRADIZACION CON SEMILLAS							
JARDINERIA							
LIMPIEZA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO , DEFENSAS METALICA Y POSTES DE REFERENCIA							
OTRAS (DESCRIBIR ACTIVIDAD)	ABCISADO RUTA 2901B PR 08+0000 A PR 12+0000 3 TRABAJADORES ABCISADO RUTA 15VL07 PR 0+0000 A PR 5+0000 3 TRABAJADORES	ABCISADO RUTA 2901B PR 12+0000 A PR 16+0000 3 TRABAJADORES ABCISADO RUTA 15VL07 PR 5+0000 A PR 10+0000 3 TRABAJADORES	ABCISADO RUTA 2901B PR 16+0000 A PR 22+0000 3 TRABAJADORES ABCISADO RUTA 15VL07 PR 10+0000 A PR 15+0000 3 TRABAJADORES	ABCISADO RUTA 2901B PR 22+0000 A PR 23+0325 RUTA 29VL4 PR 0+0000 A PR 1+0200 3 TRABAJADORES ABCISADO RUTA 15VL07 PR 15+0000 A PR 20+0100 3 TRABAJADORES			
OBSERVACIONES:							

David Londoño P.

DAVID LONDOÑO PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA LOS ROBLES

M. H. V. B.

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE - CONSORCIO INGEVIAM
ADMINISTRACIÓN VIAL QUINDIO



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 8

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA			2/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL QUINDIO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

QUINDIO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

OCTUBRE 2024

PROYECTO:

SERVICIO DE MANTENIMEINTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

1995-2024
1416-2024

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INGEVIAM
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMEINTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA

CONTRATO DE OBRA No.

1417-2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA HYUNDAI	NUS912/1999CC/2025	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA DONGFENG	FLQ543/161HP/2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACIÓN OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Firma
Nombre: DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 63202-158343 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 9

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7

**Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de
Interventoría**



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 10

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

4/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1995 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGEVIAM

MES INFORME MENSUAL:

OCTUBRE DE 2024

PROYECTO:

VIA 4002 LA PAILA -ARMENIA- SECTOR CLUB CAMPESTRE- ARMENIA, VIA 4003 ARMENIA -IBAGUE SECTOR ARMENIA- CALARCÁ , VIA 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA , VIA 2901B ARMENIA - ALCALÁ ,VIA 25VL07 CARTAGO- ALCALÁ, VIA 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, VIA 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA

CONTRATO DE OBRA No:

N.A.

CONTRATISTA:

N.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	566024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.383.754.610	
TOTAL						\$ 1.383.754.610	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 1.383.754.610

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								566024 del 25/06/2024	\$ 1.383.754.610,00	\$ 3.984.929.795,00		
1	02 al 31 de Julio de 2024	\$ 71.111.106,00	\$ 13.511.110,14	\$ 84.622.216,14	N/A	N/A	N/A		\$ 1.299.132.393,86	\$ 3.900.307.578,86		
2	01 al 31 de Agosto de 2024	\$ 68.439.450,00	\$ 13.003.495,50	\$ 81.442.945,50	N/A	N/A	N/A		\$ 1.217.689.448,36	\$ 3.818.864.633,36		
3	01 al 30 de Septiembre de 2024	\$ 71.604.000,00	\$ 13.604.760,00	\$ 85.208.760,00	N/A	N/A	N/A		\$ 1.132.480.688,36	\$ 3.733.655.873,36		
4	01 al 31 de Octubre de 2024	\$ 71.155.850,00	\$ 13.519.611,50	\$ 84.675.461,50	N/A	N/A	N/A		\$ 1.047.805.226,86	\$ 3.648.980.411,86		
TOTALES		\$ 282.310.406,00	\$ 53.638.977,14	\$ 335.949.383,14					\$ 1.047.805.226,86	\$ 3.648.980.411,86		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total acumulado	\$ 282.310.406,00	\$ 53.638.977,14	\$ 335.949.383,14
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 282.310.406,00	\$ 53.638.977,14	\$ 335.949.383,14

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: DANIELA FIGUEROA VEGA

Representante Legal o su Apoderado

CONSORCIO INGEVIAM

Matrícula Profesional No.: A41342024-1006552461

Firma

Nombre: DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matricula Profesional No.:63202-158343 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 11

Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Seguimiento a las garantías contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
			VERSIÓN	1																																																				
			PÁGINA																																																					
			FECHA	2/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1995-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAM																																																					
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO																																																								
FECHA DE INICIO: 2/07/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/07/2026																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 3.984.929.795,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ESTEBAN ARIAS OSPINA																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 398.492.980,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 796.985.960,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1.195.478.940,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 398.492.980,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 796.985.960,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.478.940,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			13	6	2024	31	1	2027							13	6	2024	31	7	2029	13	6	2024	31	7	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 398.492.980,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 796.985.960,00																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.478.940,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
13	6	2024	31	1	2027																																																			
13	6	2024	31	7	2029																																																			
13	6	2024	31	7	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 161710																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2/07/2024																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 398.492.980,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 796.985.960,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1.195.478.940,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 398.492.980,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 796.985.960,00	Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.478.940,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>13</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			13	6	2024	31	1	2027							13	6	2024	31	7	2029	13	6	2024	31	7	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 398.492.980,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 796.985.960,00																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.478.940,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
13	6	2024	31	1	2027																																																			
13	6	2024	31	7	2029																																																			
13	6	2024	31	7	2029																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 161710

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/07/2024


OBSERVACIONES:

El anexo 1 corresponde a la modificación de la póliza según orden de inicio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma _____
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Firma _____
Nombre: DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-158343 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 12

Necesidades de la Vía y Sitios Críticos



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ruta 2901B ARMENIA - ALCALÁ

NECESIDADES PREVENTIVAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Armenia Calarcá	4003	0+0352	0+0378	1. Retiro de óxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR0+0352 al PR 0+0378 (incluye baranda peatonal)(Puente La María).	<u>\$80.174.540,00</u>	Puente la María: Mantenimiento mediante retiro de óxido y pintura, reposición de estructura baranda, juntas del puente
Armenia Calarcá	4003	3+0270	3+0285	2. Retiro de óxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR2+246 al PR 2+256 (Puente El Pescador)	<u>\$21.412.812,00</u>	Puente El Pescador: Mantenimiento mediante retiro de óxido y pintura, incluye Pintura muros y reposición aleta.
Armenia Calarcá	4003	3+0270	3+0285	3. Retiro de óxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR3+0270 al PR 3+0285 (incluye baranda peatonal)(Puente La Variante)	<u>\$17.779.488,00</u>	Puente La Variante: Mantenimiento mediante retiro de óxido y pintura, incluye reposición de baranda afectada por accidente vial.
Armenia-Alcalá	2901B	4+0016	4+0107,85	7. Reposición carpeta asfáltica, Remplazo juntas Vía 2901B PR4+0016 al PR 4+0107,85 (Puente Rio Espejo)	<u>\$17.269.097,00</u>	Mantenimiento mediante reposición de carpeta asfáltica, incluye juntas del puente
Armenia-Alcalá	2901B	15+0374	15+0393	8. Retiro y construcción Barandas, construcción paso peatonal, Retiro de óxido y Pintura Barandas, Remplazo juntas, Reparación junta aleta. Vía 2901B PR15+0374 al PR15+0393 (Puente Quebrada Buenavista)	<u>\$132.727.684,00</u>	Retiro Baranda e instalación nuevas, adicional paso peatonal metálico por costado derecho en estructura metálica y apoyos en cto reforzado.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Armenia-Alcalá	2901B	6+0200	6+0207	10. Resane entre estribo y aleta Derecha. Vía 2901B PR6+0200 al PR6+0207 (Pontón)	<u>\$4.019.997,00</u>	Resane en estribo y aleta en la salida del pontón margen derecha
Armenia-Alcalá	2901B	0+0000	23+0325	17.- Reconstrucción de carpeta asfáltica VIA 2901B PR 0+0000 AL PR23+0325	<u>\$2.864.613.763,00</u>	Reconstrucción de la carpeta asfáltica en varios sectores de la vía, incluye líneas de demarcación, longitud de 3,6km.
Armenia-Alcalá	2901B	0+0000	23+0325	18.- Líneas de demarcación con pintura en frio VIA 2901B PR0+0000 a PR 23+0325	<u>\$216.036.635,00</u>	Líneas de demarcación con pintura en frio a lo largo de la vía Incluye tachas reflectivas, no incluye los tramos de reconstrucción de carpeta.
Armenia - Alcalá	2901B	6+560	6+680	21.- Fresado e instalación sobre carpeta. VIA 2901B PR6+0560 AL PR6+0580	<u>\$22.661.769,00</u>	Fresada adecuación terreno con base granular e instalación carpeta.

NECESIDADES DE PUENTES QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN:

NOMBRE DEL PUENTE	CARR ETERA	PR inicial	PR final	TIPO DAÑO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	COSTO APROXIMADO		OBSERVACIONES
						\$		
						ESTUDIOS	OBRA	
Rio Espejo	Armenia-Alcalá	4+0016	4+0108	oxido baranda, Carpeta asfáltica, juntas deterioradas	Fresado carpeta asfáltica e instalación MDC-19, Retiro juntas e instalación nueva junta en Angulo.		\$ 17.269.097,00	
Quebrada Buenavista	Armenia-Alcalá	15+0374	15+0393	Aleta reconstruir, Juntas deterioradas, baranda no cumple normativa, afectada por perdida de parte	, sello con concreto aleta, Retiro e instalación junta nueva en Angulo, instalación nueva baranda.		\$ 132.727.684,00	



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

NECESIDADES EN PONTONES:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Armenia - Alcalá	2901B	6+0200	6+0207	23. Resane entre estribo y aleta Derecha. Vía 2901B PR6+0200	<u>\$2.230.274,00</u>	Resane del estribo a la salida del pontón margen derecha

IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en la Ruta 2901B - Armenia – Alcalá.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ

NECESIDADES PREVENTIVAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Cartago-Alcalá	25VL07	9+0595	9+0646,2	9.Reforzamiento y cambio piezas, Retiro de óxido y Pintura Estructura, Remplazo juntas. Vía 25VL07 PR9+0595 al PR9+0646,2 (Puente Piedras de Moler)	<u>\$293.610.311,00</u>	Mantenimiento mediante retiro de óxido y pintura, Fresado y construcción Carpeta asfáltica, incluye juntas del puente
Cartago-Alcala	25VL07	0+0000	20+0100	11.- Reconstrucción de carpeta asfáltica, Cunetas y líneas demarcación VIA 25VL07 PR 0+0000 AL PR20+0100	<u>\$6.562.549.875,00</u>	Reconstrucción de la carpeta en varios sectores que suman una longitud de 8,0 kms
Cartago-Alcalá	25VL07	0+0000	20+0100	12.- Líneas de demarcación con pintura en frio, Tachas Reflectivas. VIA 25VL07 PR0+0000 a PR 20+0100	<u>\$133.199.659,00</u>	Líneas de demarcación con pintura en frio a lo largo de la vía, no incluye los tramos de reconstrucción de carpeta aprox 12,1 Km
Cartago - Alcalá	25VL07	10+960	10+970	20. Muro contención y dissipador de aguas escorrentías VIA 25VL07 PR 10+0960 C.D	<u>\$21.461.155,00</u>	Construcción de muro y dissipador de 70 ml sobre la ladera de la vía.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

NECESIDADES CRITICAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Cartago- Alcalá	25VL07	1+0210	1+0280	1.A- Estabilización del talud mediante construcción de terrazas VIA 25VL07 PR 1+0200 a PR 1+0280	\$ 58.226.474,00	Estabilización de talud superior
Cartago- Alcalá	25VL07	1+0510	1+0560	2.B- Estabilización del talud mediante construcción de terrazas VIA 25VL07 PR 1+0510 a PR 1+0560	\$ 86.107.532,00	Estabilización de la zona mediante construcción de terrazas
Cartago- Alcalá	25VL07	7+0320	7+0360	3. C- Estabilización del talud mediante construcción de terrazas. VIA 25VL07 PR7+0320 a PR 7+0360	\$ 57.811.640,00	Estabilización de la zona mediante construcción de terrazas
Cartago- Alcalá	25VL07	8+0650	8+0690	4.D- Construcción de muro de contención cimentado en pilotes y reconstrucción de carpeta asfáltica VIA 25VL07 PR8+0650 a PR 8+0690	\$ 284.272.558,00	Estabilización de la zona mediante construcción de muro en concreto reforzada y reconstrucción de carpeta asfáltica incluye líneas de demarcación.
Cartago- Alcalá	25VL07	8+0468	8+0475	5. E- Construcción de muro de contención para estabilización vía. Ladera PR8+0468 a PR8+0475 vía 25VL07	\$ 27.286.325,00	Estabilización de la zona mediante construcción de muro en concreto reforzada y reconstrucción de cuneta.
Cartago- Alcalá	25VL07	5+0340	5+0350	6. F- Construcción de muro de contención para estabilización vía. Ladera PR5+0340 a PR5+0352 vía 25VL07	\$ 58.613.437,00	Estabilización de la zona mediante construcción de muro en concreto reforzada y reconstrucción de cuneta y ejecución descole.
Cartago- Alcalá	25VL07	12+0930	12+0935	13.L- Estabilizar parte lateral del corredor vial, porque presenta hundimiento y desprendimiento de carpeta asfáltica	\$ 71.059.235,00	Estabilización de la vía mediante la construcción de muro de contención, cimentado en pilotes.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Cartago- Alcalá	25VL07	16+020 0	16+0205	14. M- Estabilizar parte lateral del corredor vial, porque presenta hundimiento y desprendimiento de carpeta asfáltica.	\$ 71.520.901,00	Estabilización de la vía mediante la construcción de muro de contención, cimentado en pilotes.
Cartago- Alcalá	25VL07	14+430	14+480	Estabilización del talud mediante construcción de terrazas.	\$ 737.354.733,00	Estabilización del talud mediante construcción de terrazas.
Cartago- Alcalá	25VL07	7+800	7+900	Construcción de muro de contención cimentado en pilotes y reconstrucción de carpeta asfáltica	\$ 214.902.433,00	Estabilización de la zona mediante construcción de muro en concreto reforzada y reconstrucción de carpeta asfáltica incluye líneas de demarcación.

NECESIDADES DE PUENTES QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN.

NOMBRE DEL PUENTE	LONG. (m)	CARRETERA	PR inicial	PR final	TIPO DAÑO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	COSTO APROXIMADO		OBSERVACIONES
							ESTUDIOS	OBRA	
Piedras de Moler	51	Cartago- Alcalá	9+0595	9+0646	Reforzamiento nudos, Corrosión estructura, Juntas deterioradas	Retiro oxido de la estructura, Aplicación base y pintura estructura, Reposición y refuerzo piezas estructura, Retiro e instalación nueva juntas.		\$ 293.610.311,00	Solo conservación, Se requiere puente nuevo. El existente es metálico y presenta vía para un solo vehículo, lo que ocasiona represamiento vehicular constante



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS

RELACION SITIOS CRITICOS RUTA 25VL07					
PR	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBRA DE MITIGACION REALIZADA	ESTADO DE SEÑALIZACION	SEGUIMIENTO
7+0800	Asentamiento, fallo generalizado de taludes, se presenta hundimiento en la vía que afecta el carril izquierdo en una longitud de 44 m, causado por la falta de obras de drenaje que evacuen el constante flujo de agua que escurre por el talud. Se requieren estudios geotécnicos e hidráulicos para determinar la solución definitiva.		Se han realizado renivelacion con mezcla asfaltiva para la nivelación de la vía y mitigar el impacto de los vehículos durante el Transito por el sitio	No se cuenta con señalización de asentamiento en la vía.	Se tiene programado una nueva renivelacion con mezcla asfáltica para el carril izquierdo suministrado por el contrato 2028-2024 y la señalización vertical con el contrato 2047-2024
8+0600	Talud inestable con constantes derrumbes de material de arrastre por las lluvias, causado por un contante flujo de agua que viene desde la corona del talud. Se requieren estudios geotécnicos e hidráulicas para obras de mitigación y estabilización.		No se cuenta con obras de mitigacion.	No se cuenta con señalización que alerte de posible caída de material en la vía	Se está realizando constante limpieza de material caído en las cunetas y en la vía con la cooperativa los Robles
9+0250	Talud inestable con constante caída de material sobre la vía. Se requieren obras de contención.		No se cuentan con obras de mitigacion.	No se cuenta con señalización que alerte de posible caída de material en la vía	Se está realizando constante limpieza de material caído en las cunetas y en la vía con la cooperativa los Robles
10+0030	Talud inestable con constante caída de material sobre la vía. Se requieren obras de contención.		No se cuentan con obras de mitigacion.	No se cuenta con señalización que alerte de posible caída de material en la vía	Se está realizando constante limpieza de material caído en las cunetas y en la vía con la cooperativa los Robles



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

10+0600	Talud inestable con constante caída de material sobre la vía. Se requieren obras de contención.		No se cuentan con obras de mitigación.	No se cuenta con señalización que alerte de posible caída de material en la vía	Se está realizando constante limpieza de material caído en las cunetas y en la vía con la cooperativa los Robles
11+0200	Talud inestable con constante caída de material sobre la vía. se requiere reparación de muro en gaviones existente.		Se cuenta con muros en gaviones que se encuentran en malas condiciones.	No se cuenta con señalización que alerte de posible caída de material en la vía	Se está realizando constante limpieza de material caído en las cunetas y en la vía con la cooperativa los Robles



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RELACION SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD RUTA 25VL07 CARTAGO -ALCALA

PR	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	DIAGNOSTICO	REGISTRO FOTOGRAFICO	ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
1+0220 A 1+0270	El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen izquierdo de la calzada y taponan la alcantarilla del PR 1+0230.	Las aguas de escorrentía afectan la cohesión del suelo, (rocas sedimentarias) y provocan constantemente deslizamientos de material sobre la calzada durante la temporada de lluvias.	  	Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen izquierdo.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>1+0640 A 1+0665</p>	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen izquierdo de la calzada.</p>	<p>Las aguas de escorrentía afectan la cohesión del suelo, (rocas sedimentarias) y provocan constantemente deslizamientos de material sobre la calzada durante la temporada de lluvias.</p>		<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen izquierdo.</p>
--	--	---	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

1+0690 A 1+0705	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen izquierdo de la calzada.</p>	<p>Las aguas de escorrentía afectan la cohesión del suelo, (rocas sedimentarias) y provocan constantemente deslizamientos de material sobre la calzada durante la temporada de lluvias.</p>	  	<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen izquierdo.</p>
--------------------	--	---	--	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

5+0970	<p>Se observa hundimiento de la estructura del pavimento con fisuras longitudinales en el carril derecho de la calzada y daños en las cunetas y en el muro de gavión existente.</p>	<p>Daños causados por deficiencias en el proceso constructivo.</p>		<p>Construcción de un muro de contención de concreto reforzado, junto con la reconstrucción de la estructura del pavimento y las cunetas.</p>
--------	---	--	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>7+0160</p>	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen izquierdo de la calzada</p>	<p>Se presenta erosión del talud, por las aguas de escorrentía y la falta de capa vegetal en la parte superior del talud.</p>		<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen izquierdo.</p>
----------------------	---	---	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

7+0280	Pérdida parcial de la banca por socavación.	<p>Se presenta socavación de la banca, porque la cuneta no dirige adecuadamente las aguas de escorrentía a la alcantarilla existente.</p> 	<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para recuperar la banca y reconstruir la cuneta para captar y conducir las aguas de escorrentía hasta la alcantarilla existente.</p>
--------	---	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

7+0840	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento, que provoca un desnivel superior a 40 cm en la calzada.</p>	<p>Se observa reptación del terreno debido al afloramiento de agua en el talud superior.</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras necesarias de estabilización y manejo de aguas subterráneas, con el fin de ofrecer una solución definitiva.</p>
--------	--	--	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

8+0500	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen derecho de la calzada.</p>	<p>Las aguas de escorrentía afectan la cohesión del suelo, (rocas sedimentarias) y provocan constantemente deslizamientos de material sobre la calzada durante la temporada de lluvias.</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras necesarias de estabilización y manejo de aguas de escorrentía, con el fin de ofrecer una solución definitiva.</p>
--------	--	---	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>8+0660</p>	<p>En época de lluvias se observa constantemente arrastre de material, además de fisuras longitudinales y transversales y hundimiento en el carril izquierdo de la calzada, en el margen izquierdo existe un muro en concreto reforzado con volcamiento y desplazamiento.</p>	<p>En el talud superior margen derecha se evidencia la falta de obras de drenaje para conducir y manejar las aguas de escorrentía. En el margen izquierdo se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terreno, (reptación).</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras necesarias de estabilización y manejo de aguas de escorrentía, con el fin de ofrecer una solución definitiva.</p>
---------------	---	---	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

9+0970	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento en el carril derecho, con fisuras transversales que se reflejan en la carpeta asfáltica.</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terreno, (reptación).</p>	 	<p>Estudios y diseños para identificar las obras de estabilización requeridas para proporcionar una solución definitiva.</p>
--------	--	--	--	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>10+0090</p>	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen derecho de la calzada.</p>	<p>Se presenta erosión del talud, por las aguas de escorrentía y la falta de capa vegetal en la parte superior del talud.</p>	<div data-bbox="655 386 1201 821"> </div> <div data-bbox="1222 386 1768 821"> </div> <div data-bbox="932 854 1495 1302"> </div>	<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen derecho.</p>
-----------------------	--	---	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

10+0090	<p>El talud superior es inestable, con constantes derrumbes que afectan el margen izquierdo de la calzada.</p>	<p>Se presenta erosión del talud, por las aguas de escorrentía y la falta de capa vegetal en la parte superior del talud.</p>		<p>Construcción de muro de contención en concreto reforzado, para estabilizar el talud superior margen izquierdo.</p>
---------	--	---	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

11+0180	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento, que provoca un desnivel superior a 10 cm en la calzada, acompañado de fisuras transversales.</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terreno, (Reptación).</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras de estabilización requeridas para proporcionar una solución definitiva.</p>
---------	---	--	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>11+0750 A 11+0870</p>	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento, que provoca un desnivel superior a 20 cm en la calzada, acompañado de fisuras transversales, que están bajo control.</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terreno, (Reptación).</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras de estabilización requeridas para proporcionar una solución definitiva.</p>
-------------------------------------	---	--	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>16+0200</p>	<p>Pérdida parcial de banca, en el carril derecho. Sitio que ha sido intervenido con un trincho en madera, relleno con material de recebo y con mezcla asfáltica, como medida provisional.</p>	<p>Considerando las características geométricas de la vía en esta zona, es imprescindible construir una obra de drenaje en este punto para prevenir que las aguas de escorrentía socaven la banca.</p>	<div data-bbox="659 318 1199 727"> </div> <div data-bbox="1234 318 1770 727"> </div> <div data-bbox="968 751 1528 1180"> </div>	<p>Construir una obra de drenaje que incluya una pantalla de concreto reforzado y un dissipador en el descole, y un cabezal con aletas en el encole. Además, se debe reconstruir la estructura del pavimento.</p>
----------------	--	--	---	---



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>17+0890</p>	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento en un carril, con fisuras longitudinales en forma de medialuna que se reflejan en la carpeta asfáltica.</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terreno (Reptación), evidenciado por las fisuras longitudinales en forma de medialuna y la inclinación que presentan los árboles y el poste de la red eléctrica.</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras de estabilización requeridas para proporcionar una solución definitiva.</p>
----------------	---	---	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>18+0950</p>	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento en un carril, con fisuras longitudinales en forma de medialuna que se reflejan en la carpeta asfáltica</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terraplén, (Reptación).</p>		<p>Estudios y diseños para identificar las obras necesarias de estabilización y manejo de aguas de escorrentía, con el fin de ofrecer una solución definitiva.</p>
----------------	--	--	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

<p>19+0270</p>	<p>Hundimiento de la estructura del pavimento en ambos carriles, con fisuras longitudinales en forma de medialuna que se reflejan en la carpeta asfáltica.</p>	<p>Se observa un movimiento lento y gradual de la capa superficial del terraplén, (Reptación).</p>	<div data-bbox="676 321 1220 760"> </div> <div data-bbox="1226 321 1766 760"> </div> <div data-bbox="970 794 1512 1232"> </div>	<p>Estudios y diseños para identificar las obras necesarias de estabilización y manejo de aguas de escorrentía, con el fin de ofrecer una solución definitiva.</p>
----------------	--	--	---	--



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

NECESIDADES DE LA VIA 40QN05 CALARCA – LA CABAÑA

NECESIDADES PREVENTIVAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Variante Calarcá La Cabaña	40QN05	3+0454	3+0491,25	4. Retiro de oxido y Pintura Barandas Vía 40QN05 PR3+0454 al PR 3+0491,25 (Puente La Duquesa)	<u>\$25.128.073,00</u>	Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, incluye juntas del puente
Variante Calarcá La Cabaña	40QN05	3+0880	3+0959	5. Retiro de oxido y Pintura Barandas, Reparación socavación protección estribo Vía 40QN05 PR3+0880 al PR 3+0959 (Puente Rio Quindío)	<u>\$43.371.849,00</u>	Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, incluye juntas del puente
Variante Calarcá La Cabaña	40QN05	6+0478	6+0553	6. Retiro de oxido y Pintura Barandas, Remplazo juntas Vía 40QN05 PR6+0478 al PR 6+0553 (Puente La Florida)	<u>\$37.843.196,00</u>	Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, incluye juntas del puente

NECESIDADES CRITICAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Variante Calarcá - La Cabaña	40QN05	3+0000	3+0080	8. G- Estabilización del talud PR 3+0000 al PR3+0080 costado Derecho. vía 40QN05	<u>\$ 107.632.577,00</u>	Estabilización de la zona mediante Retiro de material, perfilada, césped, Gaviones
Variante Calarcá - La Cabaña	40QN05	3+0030	3+0060	9. H- Estabilización del talud PR 3+0030 al PR3+0060 costado Izquierdo. vía 40QN05	<u>\$ 36.602.420,00</u>	Estabilización de la zona mediante Retiro de material, perfilada, césped.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

Variante Calarcá - La Cabaña	40QN05	4+0120	4+0180	10. I- Estabilización del talud PR 4+0120 al PR4+0180 costado Izquierdo. vía 40QN05	<u>\$ 256.546.308,00</u>	Estabilización de la zona mediante Retiro de material, perfilada, gaviones y césped.
Variante Calarcá - La Cabaña	40QN05	5+0500	5+0525	11. J- Estabilización del talud PR 5+0500 al PR5+0525 costado Izquierdo. vía 40QN05	<u>\$ 71.311.074,00</u>	Estabilización de la zona mediante Retiro de material, perfilada, césped, Gaviones
Variante Calarcá - La Cabaña	40QN05	6+0600	6+0620	12. K- Estabilización del talud PR 6+0600 al PR6+0620 costado Derecho. vía 40QN05	<u>\$ 38.447.949,00</u>	Estabilización de la zona mediante Retiro de material, perfilada, césped, Gaviones

IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en el sector Variante Calarcá – La Cabaña Ruta 40QN05.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 4002 SECTOR CLUB CAMPESTRE-ARMENIA

NECESIDADES PREVENTIVAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Club Campestre - Armenia	4002	49+570	50+250	19. Muro separador new jersey. Vía 4002 PR49+570 al PR50+250 680 ml.	<u>\$551.927.154,00</u>	Construcción de muro separador en remplazo de hitos plásticos instalados y vandalizados por usuarios viales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en el sector Club Campestre- Armenia de la Ruta 4002



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 4003 SECTOR ARMENIA -CALARCÁ

NECESIDADES PREVENTIVAS:

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
Armenia Calarcá	4003	0+0352	0+0378	1. Retiro de oxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR0+0352 al PR 0+0378 (incluye baranda peatonal)(Puente La María).	<u>\$80.174.540,00</u>	Puente la María: Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, reposición de estructura baranda, juntas del puente
Armenia Calarcá	4003	3+0270	3+0285	2. Retiro de oxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR2+246 al PR 2+256 (Puente El Pescador)	<u>\$21.412.812,00</u>	Puente El Pescador: Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, incluye Pintura muros y reposición aleta.
Armenia Calarcá	4003	3+0270	3+0285	3. Retiro de oxido y Pintura Barandas Vía 4003 PR3+0270 al PR 3+0285 (incluye baranda peatonal)(Puente La Variante)	<u>\$17.779.488,00</u>	Puente La Variante: Mantenimiento mediante retiro de oxido y pintura, incluye reposición de baranda afectada por accidente vial.
Armenia Calarcá	4003	0+0890	0+0910	22.- Fresado e instalación sobre carpeta. VIA 4003 PR0+0890 AL PR0+0910	<u>\$22.583.070,00</u>	Fresada adecuación terreno con base granular e instalación carpeta.

IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en el sector Armenia –Calarcá de la Ruta 4003



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ruta 40QN04 LA ESPAÑOLA –ARMENIA

NECESIDADES DE LA VIA

CARRETERA	CODIGO	PR inicial	PR final	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	COSTO ESTIMADO (\$)	OBSERVACIONES
La Española-Armenia	40QN04	2+0300	4+0000	15.- Reparación losas de concreto VIA 40QN04 PR2+0300 a PR 4+0000	<u>\$1.121.750.977,00</u>	Reconstrucción de las losas de concreto aprox 433 ml, vía incluye líneas de demarcación
La Española-Armenia	40QN04	2+0300	4+0000	16.- Líneas de demarcación con pintura en frío VIA 40QN04 PR2+0300 a PR 4+0000	<u>\$12.846.612,00</u>	Líneas de demarcación con pintura en frío a lo largo de la vía, no incluye los tramos de reconstrucción de losas

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en la ruta 40QN04 LA ESPAÑOLA –ARMENIA



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

RUTA 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS

NECESIDADES DE LA VIA

No se tiene necesidades en la vía actualmente.

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA

No existen sitios críticos en la vía actualmente.

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 13

Informes de Actividades Realizadas con el Ítem de Insumos



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CQUI-194

Calarcá, Octubre 17 de 2024

Ingeniero:

LENIN TITO MENDOZA PEÑA

Director Territorial Quindío (E).

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO”.

ASUNTO: Informe actividades con mano de obra de las cooperativas, y con recursos del contrato de consultoría No. 1995 de 2024. Suministro e instalación de pasacalles y repartición de volantes.

Cordial Saludo,

En respuesta al documento con radicado No. 2024S-VQUI-066304 del 17 de septiembre de 2024, con el cual aprueban el uso de los recursos del ítem “*Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario*”, del contrato de consultoría No. 1995-2024, para el suministro e instalación de pasacalles y repartición de volantes, nos permitimos enviar la evidencia de la instalación de los tres (3) pasacalles, dos de ellos fueron instalados el día viernes 04 de octubre de 2024, uno en la Ruta 25VL07 en el PR 0+0050, el otro en la Ruta 29VLA en el PR 1+0200 y el tercero se ubicó el día 11 de Octubre de 2024 en la Ruta 40QN05 en el PR 0+0000, y la actividad de repartición de los volantes se realizó el lunes 7 de octubre de 2024 en las Rutas 25VL07 y 2901B.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

La actividad de instalación de pasacalles y repartición de volantes fue exitosa y contribuyó a informar a los usuarios sobre la restricción de peso en la vía. Consideramos que esta estrategia de comunicación se debe realizar periódicamente para asegurar el cumplimiento de la restricción de paso de vehículos con peso bruto superior a 15Ton, en la Ruta 25VL07 - Cartago – Alcalá, hasta que se realicen las obras que permitan la circulación de todo tipo de vehículos.

Cabe denotar que, el día 11 de octubre en el recorrido de la mañana se evidenció que el pasacalle de la Ruta 25VL07 PR 0+0050 fue robado.

Anexo: Registro fotográfico

Atentamente,

ING. MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo

Ing. Esteban Arias Ospina – Supervisor contrato 1995-2024.

Ing. Anamaría Madroñero Melo – Apoyo técnico.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

REGISTRO FOTOGRAFICO



04-10-2024 Ruta 25VL07 PR 0+0050 Instalación Pasacalle



11-10-2024 Ruta 25VL07 PR 0+0050 Evidencia robo Pasacalle



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



04-10-2024 Ruta 29VLA PR 1+0200 Instalación Pasacalle



07-10-2024 Rutas 25vl07 y 2901B Entrega Volantes



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



07-10-2024 Rutas 25vl07 y 2901B Entrega Volantes





CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6



11-10-2024 Ruta 40QN05 PR 0+0000 Instalación Pasacalle



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 14

Relación de accidentes ocurridos en el mes

CODIGO 2901B**VIA:** Armenia - Alcalá**SECTOR:** Armenia - Alcalá

PR	DESCRIPCIÓN	AFECTACIONES			AUTORIDAD QUE LEVANTO EL ACCIDENTE O ELABORÓ EL INFORME	POSIBLES CAUSAS	INFORME PRESENTADO D.T.	OBSERVACIONES
		Nº DE HERIDOS	Nº DE FALLECIDOS	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA				
1+0500	Volcamiento de un furgón porque pierde el control del mismo.	0	0	NO	Policía de Tránsito y Transporte.	Exceso de velocidad. Impericia en el manejo.	Quindío	Este accidente fue reportado por la Policía Nacional de Tránsito y Transporte del Quindío.
4+0400	Choque de dos vehículos.	2	0	NO	Cooperativa Coopmavial	Exceso de velocidad. Adelantar en curva o en pendiente.	Quindío	Este accidente fue reportado por la cooperativa de trabajo asociado Coopmavial.
9+0670	Choque de dos motocicletas con una buseta por la parte trasera de esta última.	1	0	NO	Policía de Tránsito y Transporte.	No mantener distancia de seguridad.	Quindío	Este accidente fue reportado por la Policía Nacional de Tránsito y Transporte del Quindío.

CODIGO 40QN05**VIA:** Variante Calarcá – La Cabaña**SECTOR:** Calarcá – La Cabaña

PR	DESCRIPCIÓN	AFECTACIONES			AUTORIDAD QUE LEVANTO EL ACCIDENTE O ELABORÓ EL INFORME	POSIBLES CAUSAS	INFORME PRESENTADO D.T.	OBSERVACIONES
		N° DE HERIDOS	N° DE FALLECIDOS	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA				
3+0600	Dos vehículos tipo automóvil chocan de frente.	1	0	NO	Cooperativa Coopmavial	Adelantar invadiendo carril en sentido contrario. Exceso de velocidad.	Quindío	Este accidente fue reportado por la cooperativa de trabajo asociado Coopmavial.

CODIGO 25VL07

VIA: Cartago – Alcalá

SECTOR: Cartago – Alcalá

PR	DESCRIPCIÓN	AFECTACIONES			AUTORIDAD QUE LEVANTO EL ACCIDENTE O ELABORÓ EL INFORME	POSIBLES CAUSAS	INFORME PRESENTADO D.T.	OBSERVACIONES
		N° DE HERIDOS	N° DE FALLECIDOS	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA				
5+0080	Choque de un automóvil con un sardinel y un árbol	1	0	NO	cooperativa de trabajo asociado Los Robles.	Exceso de velocidad. Salirse de la calzada. Desobedecer las señales o normas de tránsito.	Quindío	Este accidente fue reportado por la cooperativa de trabajo asociado Los Robles.



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 15

Trazabilidad de correspondencia generada entre contratista, interventor y demás entidades

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1995-2024			CODIGO:	OFP-FR-001			
				VERSIÓN:	3			
				PAGINA:		DE		
TIPO DE CONTRATO:		CONSULTORIA						
NÚMERO DE CONTRATO:		1995-2024						
OBJETO:		ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.						
CONTRATISTA:		CONSORCIO INGEVIAM						
SUPERVISOR:		ING. ESTEBAN ARIAS OSPINA						
OCTUBRE 2024								
FECHA		REFERENCIA / RADICADO		ASUNTO		ENVÍA		RECIBE
01/10/2024		CQUI-174 / 2024E-VUVRAZ-096097		Respuesta al comunicado con radicado No. 2024S-VQUI-069789 del 27 de septiembre de 2024 con relación a la solicitud del conjunto Residencial Altos del Río.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
01/10/2024		CQUI-175 / 2024E-VUVRAZ-096364		Aviso visita técnica Contrato.2428 de 2024, PR5+0450, ruta 40QN05.		CONSORCIO INGEVIAM		MONTO AGOTABLE
01/10/2024		CONTRATISTA 2047-2024		Solicitud de ampliación de suspensión contrato de obra No 2047-2024, el cual tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA CARTAGO - ALCALÁ CÓDIGO 25VL07. DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO DEL INVIAS”.		CONSORCIO INGEVIAM		INGEVIAL PYM S.A.S.
01/10/2024		CQUI-176 / 2024E-VUVRAZ-096282		Concepto de viabilidad de ampliación suspensión del contrato No. 2047-2024.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
01/10/2024		2024S-VQUI-071117		Solicitud URGENTE - Cargue Información - Administración Vial.		INVIAS		CONSORCIO INGEVIAM
02/10/2024		CQUI-177 / 2024E-VUVRAZ-096756		Entrega del reporte del accidente de tránsito en el PR5+0080 de la ruta 25VL07, ocurrido el día 29 de septiembre de 2024.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
02/10/2024		NQ-E-1748-2024		RESPUESTA SOLICITUD CON RADICADO NQ-1465-2024 Solicitud recolección de residuos sólidos Ruta 40QN05.		NEPSA		CONSORCIO INGEVIAM
3/10/2024		CQUI-178 /2024RE11549.		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL CALARCÁ
3/10/2024		CQUI-179		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		POLICIA CARRETRERAS
3/10/2024		CQUI-180		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		SECRETARÍA TRANSITO Y TRANSPORTE ARMENIA
3/10/2024		CQUI-181		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		SECRETARÍA DE CONVIVENCIA TRANSITO Y TRANSPORTE SALENTO Q.
3/10/2024		CQUI-182		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		SECRETARIA DE MOVILIDAD CARTAGO VALLE
3/10/2024		CQUI-183		Solicitud copia de informe mensual de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de septimbre de 2024 sobre las vías nacionales a cargo del INVIAS Territorial Quindío.		CONSORCIO INGEVIAM		INSPECCIÓN POLICIA ALCALÁ VALLE
3/10/2024		CQUI-184 / 2024E-VUVRAZ-097516		Entrega Directorio Telefonico de emergencias		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS TERRITORIAL QUINDÍO- SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
3/10/2024		CQUI-185 / 2024E-VUVRAZ-097512		Respuesta comunicado No. 224S-VQUI-061649 del 03 de septiembre de 2024- Solicitud de Cambio de uno de los vehículos del Contrato de Consultoría N° 1995 de 2024.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
4/10/2024		CQUI-186 / 2024E-VUVRAZ-098287		Respuesta documento No. 2024S-VQUI-071117, cargue información ANSV.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
4/10/2024		E-POT-FOE-481		Respuesta D.P Radicado 2024RE2356		Sub-Secretaria de Infraestructura Montenegro		CONSORCIO INGEVIAM
5/10/2024		CQUI-187 / 2024E-VUVRAZ-098434		Entrega Informe mensual y acta de costos No. 3, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024.		CONSORCIO INGEVIAM		INVIAS
5/10/2024		2024S-VQUI-072588		Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-095593. Alcance al oficio CQUI-158 de Respuesta al oficio con radicado 2024S-VQUI-059046 Respuesta a la aprobación de recursos del contrato de consultoría 1995 de 2024. Institución Educativa Arturo Gómez sede Atanasio Girardot y colegio Nuevo Gimnasio		INVIAS		CONSORCIO INGEVIAM

5/10/2024	2024S-VQUI-072590	Solicitud de viabilidad y presupuesto para atender la PQRS No. 2024E-VUVR-096160 del 1 de octubre de 2024.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
7/10/2024	CQUI-188 / 2024E-VUVRAZ-098832	Alcance al documento CQUI-149 de fecha 13-09-2024, a través del cual se da respuesta al comunicado con N° 2024S-VQUI-063225 del 06-09-2024 Requerimientos de logística del contrato de consultoría N ° 1995 de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
7/10/2024	CQUI-189 / 2024E-VUVRAZ-099020	Entrega del reporte del accidente vial en el PR1+0580 de la ruta 4003, ocurrido el día 04 de octubre de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
8/10/2024	CQUI-190 / 2024E-VUVRAZ-099366	Solicitud documentos de Afiliación a SGSSS y Señalización para el Contrato No. 2428 de 2024	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE
8/10/2024	CQUI-191 /2024E-VUVRAZ-099560	Solicitud presentación APU no previsto - Contrato No. 2428 de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE
8/10/2024	CQUI-192	Entrega del reporte del accidente vial en el PR14+0570 de la ruta 2901B, ocurrido el día 08 de octubre de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
9/10/2024	2024S-VQUI-072890	Solicitud de apoyo para actualizar el presupuesto de los daños del accidente ocurrido el 22 de diciembre de 2023 en la vía Armenia-Club Campestre PR 46+250, Ruta Nacional 4002	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
11/10/2024	2024S-VQUI-074369	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-094066 Solicitud aprobación recursos para demarcación de Postes de referencia y abscisado en la superficie de rodadura de vías a cargo.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
11/10/2024	2024S-VQUI-074368	Invitación a la entrega social de las OPC salón comunal Cecilia etapa I y Jardín Color Esperanza ICBF.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
11/10/2024	2024S-VQUI-074373	Solicitud de inventarios de señalización y obras de drenaje de las vías nacionales a cargo de la Dirección Territorial Quindío.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
11/10/2024	RS2580	Respuesta CQUI-183 Solic inf ACC Sept 2024-Alcala	TRANSITO ALCALÁ	CONSORCIO INGEVIAM
15/10/2024	GS-2024-85599-DEQUI	Respuesta solicitud copia matriz de la información contenida en los informes de Policía de accidente de tránsito IPAT, de ref. CQUI-179	POLICIA CARRETERAS	CONSORCIO INGEVIAM
16/10/2024	INGEVIAL	Solicitud de ampliación de suspensión contrato de obra No 2047-2024, el cual tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA CARTAGO - ALCALÁ CÓDIGO 25VL07. DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO DEL INVIAS	INGEVIAL	CONSORCIO INGEVIAM
16/10/2024	2024I-VBOG-076895	MEMOC AMVYRUT SOL INFORMACIÓN EVENTO MICROEMPRESARIOS	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
16/10/2024	2024S-VQUI-075907	Memorandos 2024I-VBOG-076702, 2024I-VBOG-076895 y 2024I-VBOG-077031.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
16/10/2024	CQUI-193 / 2024E-VUVRAZ-102802	Concepto de viabilidad de ampliación suspensión del contrato No. 2047-2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
17/10/2024	N°- 242801	Adición recursos CTO. 2428-2024 Monto Agotable	MONTO AGOTABLE	CONSORCIO INGEVIAM
17/10/2024	E-G-FOE-549	Respuesta concepto técnico Intervención Arboles Montenegro	ALCALDÍA MONTENEGRO	CONSORCIO INGEVIAM
17/10/2024	DOGERD-2024-636	Respuesta dando autorización a solicitud acompañamiento tala de Árboles en la ruta 4003 Armenia - Calarcá	ALCALDÍA CALARCÁ	CONSORCIO INGEVIAM
17/10/2024	CQUI-194 / 2024E-VUVRAZ-103189	Informe actividades con mano de obra de las cooperativas, y con recursos del contrato de consultoría No. 1995 de 2024. Suministro e instalación de pasacalles y repartición de volantes.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
17/10/2024	DPC-963-2024	Respuesta a solicitud recolección de residuos sólidos ruta 25VL07	CLEAN ATMOSPHERE	CONSORCIO INGEVIAM
18/10/2024	CQUI-195 / 2024E-VUVRAZ-103705	Informe actividades con mano de obra de las cooperativas, y con recursos del contrato de consultoría No. 1995 de 2024. Suministro e instalación de pasacalles y repartición de volantes.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
18/10/2024	CQUI-196/ 2024E-VUVRAZ-103971	Respuesta documento No. 2024-VQUI-072890, actualización presupuesta de los daños ocasionados a la infraestructura vial, PR 46+250, Ruta Nacional 4002, por el accidente ocurrido el 22 de diciembre de 2023.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
18/10/2024	2024I-VBOG-077031	MEMO CIRCULAR AMVRUT DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FACTURACIÓN MTO RUT Y SUM. DE MEZCLA O AFIRMADO	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
18/10/2024	SSMSV-1231	Solic inf ACC Sept 2024 Calarca	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL CALARCÁ	CONSORCIO INGEVIAM
21/10/2024	CQUI-197/ 2024E-VUVRAZ-104550	Informe problema social- Puente Peatonal, PR3+0825, ruta 4003.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
21/10/2024	CQUI-198 / 2024E-VUVRAZ-104605	Respuesta al documento No. 2024S-VQUI-068850, determinación necesidades de parcheo-bacheo, entre otras, en las rutas a cargo de la administración vial.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
21/10/2024	CQUI-199 / 2024E-VUVRAZ-104915	Concepto de viabilidad adición de recursos al contrato de monto agotable No. 2428-2024 y aprobación de modificación de valor y cantidad a adicionar.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS

22/10/2024	CQUI-200 / 2024E-VUVRAZ-105000	Informe de la entrega social de las OPC por parte del Consorcio Vías y Equipos	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
22/10/2024	CQUI-201 / 2024E-VUVRAZ-105167	Oferta de apoyo como Administradores Viales.	CONSORCIO INGEVIAM	UNIDAD GESTION DEL RIESGO ARMENIA
23/10/2024	CQUI-202/ 2024E-VUVRAZ-105627	Viabilidad de prorroga y adición el contrato No. 2047-2024 y aprobación de modificación de valor y cantidad a adicionar.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
23/10/2024	CQUI-203 / 2024E-VUVRAZ-105604	Solicitud de apoyo para gestión de claves de acceso de aplicativos SIGPAV	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
23/10/2024	CQUI-204 / 2024E-VUVRAZ-105700	m	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE
22/10/2024	correo electronico	Correo electronico Puentes con Observaciones T. Quindío	CONSORCIO INGEVIAM	Cesar Mauricio Wilches - Contratista Invias
23/10/2024	DP-POT-10394	Contestación Petición . rad INT-3068 ruta 40QN04 cerca viva uña de gato	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE
23/10/2024	INGEVIAL	Solicitud Adicion Prorroga 2047-2024	INGEVIAL	CONSORCIO INGEVIAM
23/10/2024	CQUI-205 / 2024E-VUVRAZ-105974	Viabilidad de prorroga y adición el contrato No. 2047-2024 y aprobación de modificación de valor y cantidad a adicionar.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
24/10/2024	CQUI-206 / 2024E-VUVRAZ-106170	Presentación presupuesto ajustado necesidades de pavimento flexible Ruta 40QN05 para contrato mínima cuantía.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
25/10/2024	CQUI-207 / 2024E-VUVRAZ-107067	Entrega del reporte del accidente vial en el PR13+0730 de la ruta 25VL07, ocurrido el día 25 de octubre de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
25/10/2024	CQUI-208 / 2024E-VUVRAZ-107097	Entrega Informe Trimestral No. 1 del periodo Julio-septiembre del año 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
25/10/2024	CQUI-209 / 2024E-VUVRAZ-107123	Entrega informe de accidentalidad del mes de septiembre de 2024, a cargo de la Administración Vial de la Dirección Territorial Quindío.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
27/10/2024	Correo Electronico	Respuesta CQUI-160 Sol. Permiso Tala de arboles	CVC	CONSORCIO INGEVIAM
28/10/2024	CQUI-210 / 2024E-VUVRAZ-107531	Solicitud, suministrar transporte seguro asociados -COOPMAVIAL.	CONSORCIO INGEVIAM	COOPMAVIAL
28/10/2024	CQUI-211 / 2024E-VUVRAZ-107539	Solicitud, suministrar transporte seguro asociados – COOPERATIVA LOS ROBLES.	CONSORCIO INGEVIAM	ROBLES
28/10/2024	CQUI-212 / 2024E-VUVRAZ-107845	Respuesta documento No. 2024-VQUI-072590 del 5 de octubre 2024. Solicitud viabilidad y presupuesto para atender la PQRSD No. 2024E- VUVR-096160 del 1 de octubre de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
28/10/2024	2024S-VQUI-079441	Solicitud de apoyo para dar respuesta al memorando circular No. 2024IVBOG-080356.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
28/10/2024	2024S-VQUI-079479	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-105974.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
29/10/2024	CQUI-213 / 2024E-VUVRAZ-108007	Solicitud recursos para atención necesidades de señalización vial, ruta 40QN05	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
29/10/2024	CQUI-214 / 2024E-VUVRAZ-108015	Solicitud recursos para atención necesidades de mantenimiento superficie de rodadura- ruta 40QN05	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
29/10/2024	CQUI-215 / 2024E-VUVRAZ-108035	Solicitud Implementación de Señalización Vial en el Frente de Trabajo, PR5+0450, Ruta 40QN05- Contrato de Monto Agotable No. 2428-2024.	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE
29/10/2024	2024S-VQUI-079853	Citación a comités de seguimiento al contrato de consultoría No. 1995 de 2024.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
29/10/2024	CQUI-216 /2024E-VUVRAZ-108395	Radicación de Acta de liquidación y documentos anexos contrato 2028-2024	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
29/10/2024	2024S-VQUI-080276	Respuesta a los oficios de entrada No. 2024E-VUVRAZ-067408 y No. 2024EVUVRAZ-089635.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
29/10/2024	2024S-VQUI-080275	Solicitud de acta de liquidación del contrato No. 2028 de 2024.	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
30/10/2024	CQUI-217 / 2024E-VUVRAZ-109397	Oferta de apoyo como administradores viales	CONSORCIO INGEVIAM	UNIDAD GESTION DEL RIESGO MONTENEGRO
30/10/2024	CQUI-218	Oferta de apoyo como administradores viales	CONSORCIO INGEVIAM	UNIDAD GESTION DEL RIESGO QUIMBAYA
30/10/2024	CQUI-219 / 2024E-VUVRAZ-109384	Oferta de apoyo como administradores viales	CONSORCIO INGEVIAM	UNIDAD GESTION DEL RIESGO ALCALÁ
30/10/2024	CQUI-220	Oferta de apoyo como administradores viales	CONSORCIO INGEVIAM	UNIDAD GESTION DEL RIESGO CARTAGO
30/10/2024	CQUI-221 / 2024E-VUVRAZ-108543	Respuesta ha comunicado 2024S-VQUI-079853 sobre citación a comités de contrato de consultoría No. 1995 de 2024 y líneas telefónicas de profesionales de la Administración vial.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
30/10/2024	2024S-VQUI-080346	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-098832	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
30/10/2024	CQUI-222 / 2024E-VUVRAZ-108645	Respuesta a comunicado con radicado 2024S-VQUI-080275 solicitud de acta de liquidación del contrato No. 2028 de 2024.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS

30/10/2024	CQUI-223 / 2024E-VUVRAZ-108656	Repuesta al comunicado No. 2024S-VQUI-074373 de fecha 11-10-2024, Solicitud inventarios de señalización y obras de drenaje de las vías nacionales a cargo de Dirección Territorial Quindío.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
30/10/2024	CQUI-224 / 2024E-VUVRAZ-109385	Solicitud de acompañamiento retiro provisional redes eléctricas para tala y poda de árboles.	CONSORCIO INGEVIAM	EDEQ
30/10/2024	CQUI-225 / 2024E-VUVRAZ-109015	Respuesta al documento 2024-VQUI-079441, registro fotográfico sitios críticos.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
31/10/2024	2024S-VQUI-081004	Actas de obra del contrato No. 2047 de 2024	INVIAS	CONSORCIO INGEVIAM
31/10/2024	CQUI-226	Suspensión de personal en la obra, PR5+0450, Ruta 40QN05- Contrato de Monto Agotable No. 2428-2024	CONSORCIO INGEVIAM	MONTO AGOTABLE



CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

ANEXO 16

Trazabilidad de derechos de petición realizados

		TRAZABILIDAD DERECHOS DE PETICIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA VIAL No. 1995 de 2024		CODIGO:	OFP-FR-032
				VERSIÓN:	2
				PAGINA:	1 DE 1
ING. RESIDENTE: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES				SEPTIEMBRE DE 2024	
Nº	SOLICITUDES REDICADAS EN ALCALDIA Y/O ENTE COMPETENTE	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DETECTADA	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES TOMADAS ANTE LA SITUACIÓN DETECTADA	ESTADO / OBSERVACIONES	
1	Alcaldía Municipal de Armenia- JAMES PADILLA GARCIA Alcalde Municipal Documento N° CQUI-DP-001 enviado el 23 de Julio de 2024 rad: 2024RE33200.	* En la carretera 40QN04, entre el PR2+0900 al PR3+0370, en la margen derecha, se ha instalado una cerca viva que actualmente invade la zona de reserva para carreteras, Esta situación representa un peligro inminente para los usuarios de la vía * La carretera La Española – Armenia, es de Primer Orden, por lo tanto, la faja de retiro obligatorio es de 60 m; pertenece al Estado para uso público, nadie debe obstaculizarla con construcciones, cercos, cultivos, vallas, basuras, escombros, etc	Se radico derecho de petición a la Alcaldía municipal de Armenia, para que intervenga de manera inmediata y se sirva dentro de su competencia y dentro del término de ley proceder a ordenar la correspondiente restitución de la Zona de Reserva de Carreteras.	Mediante Documento SI-POI-1930 INT3068 con fecha 25-07-2024 de la Secretaría de Infraestructura de Armenia - Informa que el Derecho de petición fue trasladado al Departamento Administrativo de Planeación, para que allí sea tramitado de acuerdo a su competencia. * El derecho de petición tiene como fecha limite de respuesta el martes 15 de agosto	
2	Alcaldía Municipal de Armenia- JAMES PADILLA GARCIA Alcalde Municipal Documento N° CQUI-DP-002 enviado el 03 de Septiembre de 2024 rad: 2024RE39359.	* En la carretera 40QN04, entre el PR2+0900 al PR3+0370, en la margen derecha, se ha instalado una cerca viva que actualmente invade la zona de reserva para carreteras, Esta situación representa un peligro inminente para los usuarios de la vía * La carretera La Española – Armenia, es de Primer Orden, por lo tanto, la faja de retiro obligatorio es de 60 m; pertenece al Estado para uso público, nadie debe obstaculizarla con construcciones, cercos, cultivos, vallas, basuras, escombros, etc	Se radico reiteración a derecho de petición a la Alcaldía municipal de Armenia, para que intervenga de manera inmediata y se sirva dentro de su competencia y dentro del término de ley proceder a ordenar la correspondiente restitución de la Zona de Reserva de Carreteras.	Mediante Documento SI-POI-1930 INT3068 con fecha 25-07-2024 de la Secretaría de Infraestructura de Armenia - Informa que el Derecho de petición fue trasladado al Departamento Administrativo de Planeación, para que allí sea tramitado de acuerdo a su competencia. * El día 03 de Septiembre de 2024 la Administración vial reitera el derecho de petición N° CQUI-DP-001 enviado el 23 de Julio de 2024 con un nuevo documento N° CQUI-DP-002 enviado el 03 de Septiembre de 2024 ya que a la fecha no se ha recibido una respuesta concreta sobre las acciones tomadas por parte de la Alcaldía municipal de Armeia o en su efecto la Secretaria de Planeación. * La reiteración del derecho de petición tiene como fecha limite de respuesta el martes 23 de agosto * El día 03 de Septiembre se recibe correo por parte de la Alcaldía de Armenia donde indican que el PQR con número 2024PQR5878 fue asignado al departamento de Planeación con 15 días de plazo para su respuesta El día 13 de Septiembre se recibe oficio de la Secretaria de Infraestructura I POI 2384 INT. 3661 donde manifiestan que dan traslado por competencia al Departamento de bienes y suministro. *El día 27/0972024 se recibe respuesta DB-PGA-3087 por parte la Oficina de Bienes y Suministros de la Ciudad de Armenia donde expresan que realizan la visita técnica y que en está se evidencia que el predio es privado por lo cual, es competencia de la secretaria de Gobierno quien es la encargada de velar por lo bienes de uso público, tambien indican que la Administación vial debe hacer una querella con respecto al tema y radicarla a la Secretaria de Gobierno	
3	Alcaldía Municipal de Alcalá- Javier Andrés Herrera Hurtado Alcalde Municipal Documento N° CQUI-DP-003 enviado el 04 de Septiembre de 2024	* En la carretera Cartago - Alcalá, ruta 25VL07, PR 19+0800, en el sector de ingreso a la glorieta, se encuentra ubicado un puesto informal de venta de jugos naturales el cual invade la zona de carretera y aparentemente opera sin los permisos correspondientes. * En la carretera Variante Alcalá y Accesos, ruta 29VLA, PR 0+0900 a lado y lado de la vía se han construido viviendas y locales comerciales dedicados a la venta de comida. Estos establecimientos invaden la zona de carretera y aparentemente operan sin los permisos correspondientes. * Las Carreteras Cartago – Alcalá, ruta 25VL07 y Variante Alcalá y Accesos, ruta 29VLA , pertenecen al Estado para uso público, nadie debe obstaculizarlas con construcciones, cercos, cultivos, vallas, basuras, escombros, etc.; la zona de carreteras debe estar desalojada con el fin de permitir el libre tránsito, el disfrute visual del paisaje y la seguridad de los usuarios.	Se radico derecho de petición a la Alcaldía municipal de Alcalá, para que intervenga de manera inmediata y se sirva dentro de su competencia y dentro del término de ley proceder a ordenar la correspondiente restitución de la Zona de Reserva de Carreteras.	El día 18 de Septiembre de 2024 se recibe ofico 2024RS2352 Respuesta radicación CQUI-DP-003 donde indican que, por parte de la Inspectora Rural de Policía Valentina Castañeda Tapasco donde se nos informa que se han realizado las respectivas visitas y que dichas invaciones llevan un tiempo considerabled en el sitio, por lo cual debe existir por parte de la Alcadia una reubicación de los vendedores para así poder recuperar el espacio.	
