

**FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA****INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS****Contratista:** HYD S.A.S**Interventoría:** CONSORCIO INVIMA - JMS**CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 791-2024****OBJETO:**

ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.

CONTRATO DE OBRA No: 768-2024**OBJETO:**

ADELANTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.

**INFORME MENSUAL No. 4**
DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 -28 - **Administrativo:** Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 242 5000 - Bogotá

www.invima.gov.co@Invimacolombia   

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	
	Contratista:	HYD S.A.S
	Interventoría:	CONSORCIO INVIMA -JMS
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025	
1. INFORMACION GENERAL		
CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA No:	768-2024	
ADELANTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.		
CONTRATISTA:	HYD S.A.S.	
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA LUISA DERCH MASSANET y/o CARLOS HERNANDEZ LEAL	
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	
ACTA DE INICIO:	miércoles, septiembre 11, 2024	
VALOR INICIAL:	\$ 1.455.275.298,00	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	martes, marzo 11, 2025	
1.1. TRAZABILIDAD ACTOS ADMINISTRATIVOS		
Constructor	HYD S.A.S.	
Representante Legal.	MARIA LUISA DERCH MASSANET y/o CARLOS HERNANDEZ LEAL	
Contrato No.	768-2024	
Objeto	ADELANTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.	
Valor inicial:	\$ 1.455.275.298,00	
Valor total:	\$ 1.455.275.298,00	
Plazo inicial:	SEIS MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	
Fecha de inicio:	miércoles, septiembre 11, 2024	
Fecha de terminación inicial:	martes, marzo 11, 2025	
Fecha de Suspensión:	viernes, diciembre 20, 2024	
Fecha de Reinicio:	lunes, enero 20, 2025	
Fecha de terminación:	miércoles, abril 09, 2025	
Ver Anexo 1. Contratos de Obra y de Interventoría, y Anexo 1.1 Acta de Suspensión y de reinicio		

	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	
	Contratista:	HYD S.A.S
	Interventoria:	CONSORCIO INVIMA -JMS
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025	
1. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 791-2024		
ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.		
Interventoría	CONSORCIO INVIMA -JMS	
R.L. del Consorcio	JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA	
Contrato No.	791 DE 2024	
Objeto	ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL.	
Valor inicial:	\$ 113.752.100,00	
Adición No. 1:	N/A	
Valor total:	\$ 113.752.100,00	
Plazo inicial:	SEIS (6) MESES	
Fecha de inicio:	miércoles, septiembre 11, 2024	
Fecha de Suspensión:	N/A	
Fecha de Reinicio:	N/A	
Fecha de terminación del contrato:	martes, diciembre 31, 2024	
Ver Anexo 1. Contratos de Obra y de Interventoría.		

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos						FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA					
						INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					
						Contratista:	HYD S.A.S				
						Interventoría:	CONSORCIO INVIMA -JMS				
INFORME MENSUAL No. 4						DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025					
2. CONTROL DE GARANTIAS											
2.1 CONTRATO DE OBRA						2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 260.000.000,00	BCH-100007762 ANEXO 4	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	28/8/2024	1/5/2025						
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES											
PATRONAL											
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS											
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS											
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	\$ 291.055.069,64	BCH-100037330 ANEXO 4	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	11/09/2024	30/10/2025						
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 72.763.764,91			11/09/2024	30/04/2028						
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 291.055.069,64			11/09/2024	30/10/2025						
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 436.582.689,47			31/03/2025	31/03/2030						

Ver anexo 2. Garantias

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA					
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					
	Contratista:		HYD S.A.S			
	Interventoría:		CONSORCIO INVIMA - JMS			
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025					
3. CONTROL FINANCIERO						
3.1. CONTRATO DE OBRA						
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar	Saldo por ejecutar y facturar
Acta No. 1	31/10/2024	\$192.359.953,08	13,22%	N/A	\$192.359.953,08	N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.455.276.298,22	\$0,00	0,00%	\$0	\$0,00	\$1.262.916.345,14
		\$0	\$ 1.455.276.298			
OBSERVACIONES: A la fecha no se presenta Acta parcial de obra						

**FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA**

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Contratista: **HYD S.A.S**Interventoría: **CONSORCIO INVIMA -JMS**

INFORME MENSUAL No. 4

DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025**C. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS**

CODIGO	COD INSUMO	DESCRIPCION	Tipo	UND	Cantidad	VALOR UNITARIO	FECHA APU	VALOR TOTAL	AU	VALOR TOTAL INCLUIDO AU

NO SE APRUEBA NINGÚN APU NUEVO EN ESTE PERIODO



FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Contratista: **HYD S.A.S**

Interventoría: **CONSORCIO INVIMA -JMS**

INFORME MENSUAL No. 4

DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025

D. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS CUANDO SE PRESENTE

OBSERVACIONES: N/A



FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Contratista: HYD S.A.S


Interventoría: CONSORCIO INVIMA -JMS

INFORME MENSUAL No. 4

DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025

4. CONTROL DE EJECUCION

Porcentaje de Ejecución

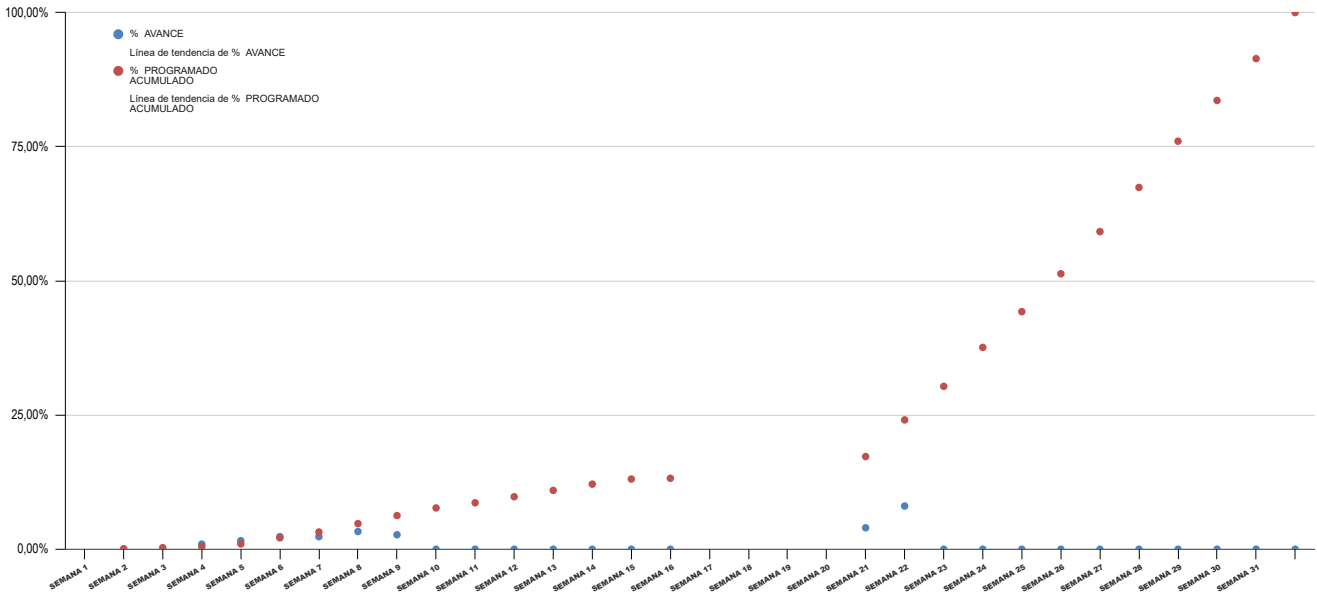

SEMANA	FECHA INICIO DE SEMANA	FECHA FIN DE SEMANA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO	% PROGRAMADO	FLUJO DE CAJA ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO (\$)	% EJECUCION	%AVANCE	% ATRASO
SEMANA 1	11-sept-24	17-sept-24	\$ 1.316.000,00	0,09%	\$ 1.316.000,00	0,09%		0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA 2	18-sept-24	24-sept-24	\$ 2.879.000,00	0,20%	\$ 4.195.000,00	0,29%		0,00%	0,00%	-0,29%
SEMANA 3	25-sept-24	1-oct-24	\$ 2.879.000,00	0,20%	\$ 7.074.000,00	0,49%	\$ 13.881.965,00	0,95%	0,95%	0,47%
SEMANA 4	2-oct-24	8-oct-24	\$ 7.245.000,00	0,50%	\$ 14.319.000,00	0,98%	\$ 23.182.115,00	1,59%	2,55%	1,57%
SEMANA 5	9-oct-24	15-oct-24	\$ 16.530.000,00	1,14%	\$ 30.849.000,00	2,12%	\$ 34.067.158,00	2,34%	4,89%	2,77%
SEMANA 6	16-oct-24	22-oct-24	\$ 15.950.000,00	1,10%	\$ 46.799.000,00	3,22%	\$ 33.948.732,00	2,33%	7,22%	4,01%
SEMANA 7	23-oct-24	29-oct-24	\$ 22.680.000,00	1,56%	\$ 69.479.000,00	4,77%	\$ 48.003.990,69	3,30%	10,52%	5,75%
SEMANA 8	30-oct-24	5-nov-24	\$ 21.760.000,00	1,50%	\$ 91.239.000,00	6,27%	\$ 39.275.992,39	2,70%	13,22%	6,95%
SEMANA 9	6-nov-24	12-nov-24	\$ 20.710.000,00	1,42%	\$ 111.949.000,00	7,69%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	5,53%
SEMANA 10	13-nov-24	19-nov-24	\$ 13.970.000,00	0,96%	\$ 125.919.000,00	8,65%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	4,57%
SEMANA 11	20-nov-24	26-nov-24	\$ 16.390.000,00	1,13%	\$ 142.309.000,00	9,78%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	3,44%
SEMANA 12	27-nov-24	3-dic-24	\$ 17.190.000,00	1,18%	\$ 159.499.000,00	10,96%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	2,26%
SEMANA 13	4-dic-24	10-dic-24	\$ 17.030.000,00	1,17%	\$ 176.529.000,00	12,13%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	1,09%
SEMANA 14	11-dic-24	17-dic-24	\$ 13.820.953,00	0,95%	\$ 190.349.953,00	13,08%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	0,14%
SEMANA 15	18-dic-24	24-dic-24	\$ 2.010.000,08	0,14%	\$ 192.359.953,08	13,22%	\$ 0,00	0,00%	13,22%	-0,01%
SEMANA 16	25-dic-24	31-dic-24								
SEMANA 17	1-ene-25	7-ene-25								
SEMANA 18	8-ene-25	14-ene-25								
SEMANA 19	15-ene-25	21-ene-25								
SEMANA 20	20-ene-25	26-ene-25	\$ 58.950.000,00	4,05%	\$ 251.309.953,08	17,27%	\$ 58.193.102,02	4,00%	17,22%	-0,05%
SEMANA 21	27-ene-25	2-feb-25	\$ 99.400.000,00	6,83%	\$ 350.709.953,08	24,10%	\$ 117.154.106,40	8,05%	25,27%	1,16%
SEMANA 22	3-feb-25	9-feb-25	\$ 90.990.000,00	6,25%	\$ 441.699.953,08	30,35%		0,00%	25,27%	-5,08%
SEMANA 23	10-feb-25	16-feb-25	\$ 105.600.000,00	7,26%	\$ 547.299.953,08	37,61%		0,00%	25,27%	-12,34%
SEMANA 24	17-feb-25	23-feb-25	\$ 96.950.000,00	6,66%	\$ 644.249.953,08	44,27%		0,00%	25,27%	-19,00%
SEMANA 25	24-feb-25	2-mar-25	\$ 102.800.000,00	7,06%	\$ 747.049.953,08	51,33%		0,00%	25,27%	-26,06%
SEMANA 26	3-mar-25	9-mar-25	\$ 114.300.000,00	7,85%	\$ 861.349.953,08	59,19%		0,00%	25,27%	-33,92%
SEMANA 27	10-mar-25	16-mar-25	\$ 119.700.000,00	8,23%	\$ 981.049.953,08	67,41%		0,00%	25,27%	-42,14%
SEMANA 28	17-mar-25	23-mar-25	\$ 125.500.000,00	8,62%	\$ 1.106.549.953,08	76,04%		0,00%	25,27%	-50,76%
SEMANA 29	24-mar-25	30-mar-25	\$ 110.500.000,00	7,59%	\$ 1.217.049.953,08	83,63%		0,00%	25,27%	-58,36%
SEMANA 30	31-mar-25	6-abr-25	\$ 113.400.000,00	7,79%	\$ 1.330.449.953,08	91,42%		0,00%	25,27%	-66,15%
SEMANA 31	7-abr-25	13-abr-25	\$ 124.825.345,14	8,58%	\$ 1.455.275.298,22	100,00%		0,00%	25,27%	-74,73%
			\$1.455.275.298,22	100,00%						

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (DIC 20 DE 2024 A ENERO 19 DE 2025)

AVANCE FINANCIERO		
ACTAS	% ACUM	VALOR
ACTA 1	13,22%	\$ 192.359.953,08
TOTAL	13,22%	\$ 192.359.953,08
Nota: Programación (Ver conclusiones)		

Nota: Ver anexo 3



FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Contratista: **HYD S.A.S**
Interventoría: **CONSORCIO INVIMA -JMS**

INFORME MENSUAL No. 4

DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025

5. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA HyD

OPERATIVOS

CC (sin puntos)	APELLIDOS Y NOMBRES	ARL	AFP	EPS	CURSO ALTURAS	EXAMEN
1051473629	PRECIADO VELANDIA FABER EMEL	SURA	PROTECCION	SALUD TOTAL	19/11/2023	SI
91042685	LEON PLATA OSCAR	SURA	PORVENIR	FAMISANAR	25/01/2025	SI
1012381453	PELAEZ LOPEZ YULY MALLERLY	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	10/02/2025	SI
19396437	SILVA BELTRAN CARLOS JULIO	POSITIVA	N/A POR EDAD	SALUD TOTAL	N/A	SI
1000251211	GARCIA MORENO BRAYAN DAVID	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	28/6/2023	SI
1047477164	MADERA CAMARGO LUIS ALFREDO	BOLIVAR	PORVENIR	SALUD TOTAL	22/11/2023	SI
1012465923	DELGADO ORJUELA YAMID	BOLIVAR	PROTECCION	FAMISANAR	6/3/2024	SI
1080933605	MORALES OME JHON FREDY	POSITIVA	PORVENIR	CAPITAL SALUD	8/11/2024	SI
1.004.209.498	CAPADOR OME JOSE ALEJANDRO	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	7/11/2024	SI
80.728.666	CUCAITA VERASTEGUI ARNULFO	POSITIVA	PROTECCION	NUEVA EPS	9/11/2024	SI
1.031.139.165	CAICEDO FIGUEROLO JAIEN GONZALO	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	8/11/2024	SI
1.030.680.464	MACIAS BLANCO CRISTIAN CAMILO	POSITIVA	PROTECCION	NUEVA EPS	9/11/2024	SI
1.087.122.008	ANGULO MONTAÑO MENER	POSITIVA	PORVENIR	COMPENSAR	18/1/2025	SI
1.087.122.008	CORTES ANGULO KEVIN ANDRES	POSITIVA	PORVENIR	SALUD TOTAL	18/1/2025	SI
PPT 6476728	VILLALBA VALDES GORMAN ALEXANDER	POSITIVA	COLPENSIONES	FAMISANAR	28/1/2025	SI
1.024.476.165	REINA OSORIO LUIS EDUARDO	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	N/A	SI
1.030.600.041	REYES RIOS JULIAN ANDRES	POSITIVA	PORVENIR	FAMISANAR	N/A	SI
1.024.595.983	ENTENA LONDOÑO DAIRÓ ESTEBAN	POSITIVA	PORVENIR	COMPENSAR	N/A	SI

PROFESIONALES

CC (sin puntos)	APELLIDOS Y NOMBRES	ARL	AFP	EPS	CURSO ALTURAS	EXAMEN
79486033	HERNANDEZ LEAL CARLOS A.	POSITIVA	PORVENIR	SANITAS	N/A	SI
52045943	DERCH MASSANET MARIA LUISA	POSITIVA	PORVENIR	SANITAS	N/A	SI
1067846210	STANFORD MANJARRES CARLOS ALBERTO	POSITIVA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	N/A	SI
1118841625	TORO CORSOBA YETSEN JOSE	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	14/01/2025	SI
1072748610	PAVA SANCHEZ SNEYDER ALEXIS	POSITIVA	COLPENSIONES	FAMISANAR	30/05/2024	SI
7185013	SUAREZ MAYORGA CARLOS AUGUSTO	POSITIVA	PORVENIR	COMPENSAR	N/A	SI
7109661	RODRIGUEZ AMARILLO CARLOS ALFONSO	POSITIVA	PORVENIR	COMPENSAR	N/A	SI
1014286397	RODRIGUEZ POLANIA DIEGO ALEJANDRO	COLMENA	COLPENSIONES	COMPENSAR	N/A	SI

Anexo 5. CARPETAS DE SEGURIDAD SOCIAL y PLANILLAS DE APORTES.

5.1.SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA CONSORCIO

NOTA:



7. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	

	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	
	Contratista:	HYD S.A.S
	Interventoría:	CONSORCIO INVIMA -JMS

INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025
-----------------------	----------------------------

ANEXO 6.1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO				
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN ALUMINIO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, LIMPIEZA INICIAL Y FINAL, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y/O RESIDUOS.	M2	1080,00	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS COMPONENTES ACORDE CON LOS CÁLCULOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES ELABORADOS POR EL CONTRATISTA Y AVALADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LAS AREAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO. NOTA: LA MANO DE OBRA SE ENCUENTRA PROYECTADA SOBRE UN NÚMERO APROXIMADO DE 400 LUMINARIAS EN 420 M2, LAS CUALES SERÁN REPLAZADAS POR PANELES LED JUNTO CON LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN.	M2	576,21	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-007	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO 8mm COLOR CRISTAL, PARA PASILLOS MONTEVIDEO. INCLUYE ANDAMIOS, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CUBIERTA DESMONTADA.	M2	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y/O ESCALERA PARA TRABAJO EN ALTURA, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LUMINARIAS DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE LA RIGEN.	M2	610,00	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-010	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO - EDIFICIO CONCILIACION	M2	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA SENCILLA CAL. 26, COLOR BLANCO	M2	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TRASLUCIDA, COMPLEMENTO DE LA TEJA METALICA	M2	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-020	CORTAVIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN VARILLA DE 1/2" CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	ML	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-021	DESOXIDACION, LIMPIEZA Y PINTURA DE CORREAS DE ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA FONTIBON	M2	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
NC-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE	UND	N/A	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS PARA MUROS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA MUEBLES Y/O EQUIPOS CERCANOS, MOVIMIENTO DE ELEMENTOS QUE OBSTRUYAN LA CORRECTA APLICACIÓN, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y/O RESIDUOS.	M2	6904,00	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS PARA CIERORRASO Y/O TECHOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA MUEBLES Y/O EQUIPOS CERCANOS, MOVIMIENTO DE ELEMENTOS QUE OBSTRUYAN U OBSTACULICEN LA CORRECTA APLICACIÓN, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y/O RESIDUOS.	M2	2351,00	SE RELACIONARAN EN ACTA DE CORTE 2

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA, CONTROL BITACORA)
--


CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA DE ENVIO y/o RECIBIDO	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	REMITENTE	DESTINATARIO
20/01/2025	N/A	RE: Programacion Corregida	<mcasasa@invima.gov.co>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Solicitud de ingreso por sedes	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-097 Solicitud de ingreso Villavicencio	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	RE: CON768.2024-097 Solicitud de ingreso Villavicencio	<gestionadministrativa@invima.gov.co>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Envío metodología	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	COMUNICADO #171	Aval a la solicitud del contratista HYD referencia CON 768.2024-087 del 16 de enero de 2025 del tema "solicitud reinicio de labores "	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	RV: Solicitud de ingreso por sedes	<jlopezr@invima.gov.co>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	CON 768.2024-099 Solicitud de ingreso Montevideo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	COMUNICADO #173	Atención a comunicado Ref. CON 768.2024-095 de 19 de	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-100 Solicitud de ingreso Fontibón	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	COMUNICADO #171	"Corrección osunto" Atención a comunicado CON 768.2024-096 Solicitud de ingreso por sedes.	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Re: CON 768.2024-099 Solicitud de ingreso Montevideo	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-101 Solicitud de ingreso Presidencial	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-102 Solicitud de ingreso Conciliacion	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-103 Solicitud de ingreso CAN	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	CON768.2024-104 Solicitud de ingreso Aeropuerto	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON 768.2024-099 Solicitud de ingreso Montevideo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-100 Solicitud de ingreso Fontibón	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-100 Solicitud de ingreso Fontibón	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-101 Solicitud de ingreso Presidencial	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-102 Solicitud de ingreso Conciliacion	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-103 Solicitud de ingreso CAN	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-101 Solicitud de ingreso Presidencial	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-102 Solicitud de ingreso Conciliacion	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-103 Solicitud de ingreso CAN	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-104 Solicitud de ingreso Aeropuerto	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
20/01/2025	N/A	Solicitud de ingreso para REVISION Y COTIZACION	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
21/01/2025	N/A	Fwd: DOCUMENTACIÓN SST ACTUALIZADA	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
21/01/2025	N/A	Solicitud de ingreso para REVISION Y COTIZACION	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
21/01/2025	N/A	RV: DOCUMENTOS PARA FIRMA	<mgarzonp@invima.gov.co>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
22/01/2025	N/A	CON768.2024-107 Aclaración IVA del contrato	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
22/01/2025	N/A	CON768.2024-108 Solicitud permiso para trabajar en Fontibón	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
22/01/2025	N/A	respuesta comunicado	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
22/01/2025	N/A	Comunicado 110	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
22/01/2025	COMUNICADO #176	Respuesta a correo del 19 de enero de 2025 de las 9 y 14 pm. No aceptación a programa de trabajo aportado y falta de atención integral a nuestro comunicado CEGG-INT-791-56-164-2025.	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>

22/01/2025	COMUNICADO #177	Respuesta a su comunicado del 20 de enero de 2024 de Ref. CON768.2024-098 Metodología de trabajo para Fontibón. Necesidad de precisión	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
22/01/2025	COMUNICADO #178	Instrucciones respecto a ingreso Sede Villavicencio	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
22/01/2025	N/A	RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES GENERALES DE CONDUCTO REGULAR CONTRATO 768-2024	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
22/01/2025	COMUNICADO #181	Respuesta y análisis a su comunicado de enero 22 de 2025 de Ref. CON 768.2024-108 del tema "Solicitud permiso para trabajar en Fontibón"	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
23/01/2025		CON768.2024-113 Pólizas actualizadas y solicitudes administrativas	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
23/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-111 Reiteración solicitud permiso para trabajar en Fontibón	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
23/01/2025		CON768.2024-111 Reiteración solicitud permiso para trabajar en Fontibón	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
23/01/2025		Horarios de entrada Villavicencio	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
23/01/2025	N/A	LIBRO DE OBRA	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
23/01/2025		CON768.2024-114 Respuesta a correo RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES GENERALES DE CONDUCTO REGULAR	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
23/01/2025	N/A	Fwd: Horarios de entrada Villavicencio	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
23/01/2025		CON768.2024-115 Solicitud discriminación técnica del AIU	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
23/01/2025	COMUNICADO #182	Atención a comunicado Ref. CON 768.2024-111. Reiteración solicitud permiso para trabajar en Fontibón	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
23/01/2025	N/A	Programación	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
24/01/2025	N/A	CON768.2024-106 APU's CUBIERTA MONTEVIDEO	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
24/01/2025	N/A	INFORME MENSUAL # 2- DE NOV 01 AL 30 de 2024	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
25/01/2025		Solicitud de ingreso	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
24/01/2025	N/A	INFORME MENSUAL # 3 DEL 01 DIC AL 20 2024	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025		Planillas de aportes Nov y Dic 2024	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	COMUNICADO #185	Urgente necesidad de aclaración sobre Dirección de obra y Residente de obra	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Envío programación	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	COMUNICADO #186	Asunto: Atención a comunicado Ref. CON 768.2024-106. Nuevos APU's cubierta Montevideo. No aprobación	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Re: Solicitud de ingreso	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	N/A	Re: Solicitud de ingreso	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Solicitud de ingreso Montevideo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	N/A	Re: Solicitud de ingreso	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Solicitud de Bitacoras en obras	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	COMUNICADO #187	Aprobación de soldador calificado para obra cubierta. Sede Fontibón	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Solicitud de ingreso	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	COMUNICADO #188	Instrucción Perentoria de INVIMA del 27 de enero de 2025, inicio de dos sedes NEIVA y LETICIA. Anticipos de programación	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025		Solicitud de ingreso	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	COMUNICADO #189	Aprobación Programa de Plan de Contingencia y Flujo de	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025	N/A	Re: Solicitud de ingreso Montevideo	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
27/01/2025	N/A	Solicitud de ingreso	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
27/01/2025	N/A	SOLICITUD URGENTE DE SUBCONTRATOS	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-120 Nueva solicitud de Entrega del GTT Montevideo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-121 Entrega subcontratos de obra	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-122 Solicitud de ingreso Sede El Dorado	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-123 Respuesta a comunicación #168 Discapacidad	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-125 Solicitud de Ingreso Fontibon	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-124 Matriz de EPP Montevideo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
28/01/2025	N/A	CON768.2024-128 Notificación Terminación contrato laboral con Carlos Stanford	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
29/01/2025	N/A	CON768.2024-129 Solicitud de Retiro de Equipos	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
29/01/2025	COMUNICADO #191	Atención a comunicado CON 768.2024-121. Entrega subcontratos de obra	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
29/01/2025	N/A	CON768.2024-130 Solicitud de Retiro de Escritorios	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
29/01/2025	N/A	COMITE SEMANAL 3 FEBRERO DE 2025	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
29/01/2025	N/A	sin asunto	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
29/01/2025	N/A	RE: COMITE SEMANAL 3 FEBRERO DE 2025	<mcasasa@invima.gov.co>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
30/01/2025	N/A	CON768.2024-132 Solicitud movimiento enseres Fontibón	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
30/01/2025	N/A	CON768.2024-127 Respuesta a comunicación #105 Gestor de Residuos	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
30/01/2025	N/A	Re: CON768.2024-127 Respuesta a comunicación #105 Gestor de Residuos	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
30/01/2025	N/A	CON768.2024-126 Respuesta a comunicación #130 Metodología de Trabajo	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
30/01/2025	N/A	CON768.2024-133 Solicitud Retiros de Camaras y Alarmas	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
30/01/2025	N/A	CON768.2024-134 Verificación Puntos de Anclajes	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
31/01/2025	COMUNICADO #194	Atención a comunicado Ref. CON 768.2024-133 Solicitud de Retiro de Cámaras y Alarmas zona GTT, baños primer piso y baños segundo piso sede Montevideo	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
31/01/2025	COMUNICADO #195	Atención a comunicado Ref. CON 768.2024-132 Solicitud movimiento enseres Fontibón del 7 a 9 de febrero de 2025 Nave 2.	<consorcioinvimajms@gmail.com>	<proyecto-invima@hyd.net.co>
31/01/2025	N/A	CON768.2024-135 Solicitud Salida de Material	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
31/01/2025	N/A	CON768.2024-136 Solicitud de Ingreso Cuarto de Cableado	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
31/01/2025	N/A	CON768.2024-136 Solicitud de Permiso Extralaboral Presidencial	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
31/01/2025	N/A	Bitacora Villavicencio.pdf	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>
31/01/2025	N/A	Acta Villavicencio.pdf	<proyecto-invima@hyd.net.co>	<consorcioinvimajms@gmail.com>

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.		FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA					
		INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					
		Contratista:		HYD S.A.S			
		Interventoría:		CONSORCIO INVIMA -JMS			
INFORME MENSUAL No. 4		DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025					
ANEXO 6.2 CONTROL DE CALIDAD							
PRUEBAS Y ENSAYOS							
FECHA:		N/A					
MATERIAL:		N/A					
CANTIDAD PARA PRUEBA:		N/A					
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:		N/A					
LOCALIZACION:		N/A					
LABORATORIO:		N/A					
NORMA - ESPECIFICACION:		N/A					
No. De muestra	ENSAYO REALIZADO	RESISTENCIA DISEÑO (MPa)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	CUMPLE S/N		EDAD	OBSERVACIONES
1							
2							
Observaciones: EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RESULTO FAVORABLE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA INTERVENTORIA							
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.		FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA					
		INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS					
		Contratista:		HYD S.A.S			
		Interventoría:		CONSORCIO INVIMA -JMS			
ANEXO 6.2 CONTROL DE CALIDAD							
FICHAS TECNICAS							
FICHA TECNICA MANTO ASFÁLTICO		METALEX-SE ADJUNTA COMO ANEXO 6.1					
FICHA TECNICA DE REMOVEDOR		REMOVEDOR					
FICHA TECNICA PINTURA		ESMALTE TRES EN UNO					
Observaciones:							
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima Oficina Principal: Cra 10 N° 64 -28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60 (60)(1) 242 5000 - Bogotá www.invima.gov.co @Invimacolombia   							

NOTA: VER Anexo. Fichas técnicas

 invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	
	Contratista:	HYD S.A.S
	Interventoría:	CONSORCIO INVIMA -JMS
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025	
ANEXO 6.3 - ASPECTOS AMBIENTALES		
I. LICENCIAS AMBIENTALES		
ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
1	CERTIFICACIONES AMBIENTALES	N/A
2	CERTIFICADO DE REGISTRO PERMISOS FORESTALES	N/A
3	CERTIFICADO DE CANTERAS	N/A
4	MANEJO DE MATERIALES Y ESCOMBROS.	Se realiza acopio por tipo de residuo en zonas de trabajo, se acuerda con interventoría la revisión y aprobación del gestor de residuos D3A Distribuidores Ambientales SAS.
5	CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL	N/A
6	CERTIFICADOS DE MADERA Y TEJA ONDULINE	N/A
7	ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	  
8	BAÑOS PORTATILES	N/A
II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS		
No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	N/A
2	FUENTE RECEPTORA:	N/A
3	PTAR:	N/A
4	ESTADO:	N/A
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	N/A
III. CONCESION DE AGUAS		
No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	N/A
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:	N/A
3	PTAP:	N/A
4	ESTADO:	N/A
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	N/A



 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA		
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		
	Contratista:	HYD S.A.S	
	Interventoría:	CONSORCIO INVIMA -JMS	
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025		
ANEXO 6.5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS			
I. PREDIOS			
ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
	N/A	N/A	N/A
II. SERVIDUMBRES			
No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
	N/A	N/A	N/A
III. PERMISOS			
No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
	N/A	N/A	N/A

**FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA****INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS**Contratista: **HYD S.A.S**Interventoría: **CONSORCIO INVIMA -JMS**

INFORME MENSUAL No. 4

DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025**ANEXO 6.6 - RECURSO HUMANO****I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA DE OBRA****PROFESIONALES**

CC (sin puntos)	APELLIDOS Y NOMBRES	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
79486033	HERNANDEZ LEAL CARLOS A.	ARQUITECTO	RPTE LEGAL / RESIDENTE DE OBRA	ADM/TIVO Y OPERATIVO
52045943	DERCH MASSANET MARIA LUISA	ARQUITECTO	RPTE. LEGAL	ADMINISTRATIVO
1067846210	CARLOS ALBERTO STANFORD MANJARREÉS	ARQUITECTO	DIRECTOR DE OBRA	ADM/TIVO Y OPERATIVO
7185013	SUAREZ MAYORGA CARLOS AUGUSTO	ESP. HIDRAULICO	PROF. SOPORTE HIDRAULICO	ADM/TIVO Y OPERATIVO
7109661	RODRIGUEZ AMARILLO CARLOS ALFONSO	ING. ELECTRICO	PROF. SOPORTE ELECTRICO	ADM/TIVO Y OPERATIVO
1014286397	RODRIGUEZ POLANIA DIEGO ALEJANDRO	ING. ELECTRICO	PROF. SOPORTE ELECTRICO	ADM/TIVO Y OPERATIVO
1118841625	TORO CORDOBA YETSEN JOSÉ	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	ADM/TIVO Y OPERATIVO
1072748610	PAVA SANCHEZ SNEYDER ALEXIS	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	ADM/TIVO Y OPERATIVO

II. RECURSO HUMANO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

III. RECURSOS HUMANOS**OPERATIVOS**

CC (sin puntos)	APELLIDOS Y NOMBRES	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1051473629	PRECIADO VELANDIA FABER EMEL	BACHILLER	CONTRATISTA	IMPERMEABILIZACION
91042685	LEON PLATA OSCAR	BACHILLER	CONTRATISTA	IMPERMEABILIZACION
1012381453	PELAEZ LOPEZ YULY MALLERLY	BACHILLER	CONTRATISTA	PINTURA
79802841	GONZALEZ MERCHAN FREDY OSWALDO	BACHILLER	CONTRATISTA	PINTURA
19396437	SILVA BELTRAN CARLOS JULIO	BACHILLER	CONTRATISTA	PINTURA
1000251211	GARCIA MORENO BRAYAN DAVID	BACHILLER	CONTRATISTA	PUNTOS DE ANCLAJE
1047477164	MADERA CAMARGO LUIS ALFREDO	BACHILLER	CONTRATISTA	PUNTOS DE ANCLAJE
1012465923	DELGADO ORJUELA YAMID	BACHILLER	CONTRATISTA	PUNTOS DE ANCLAJE
1080933605	MORALES OME JHON FREDY	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTAS POLICARB.
1.004.209.498	CAPADOR OME JOSE ALEJANDRO	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTAS POLICARB.
80.728.666	CUCAITA VERASTEGUI ARNULFO	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTAS POLICARB.
1.031.139.165	CAICEDO FIGUEREDO JAIDEN GONZALO	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTAS POLICARB.
1.030.680.464	MACIAS BLANCO CRISTIAN CAMILO	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTAS POLICARB.
1.087.122.008	ANGULO MONTAÑO MENER	TECNICO SOLDAD.	CONTRATISTA	CUBIERTA
1.087.122.008	CORTES ANGULO KEVIN ANDRES	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTA
PPT 6476728	VILLALBA VALDES GIORMAN ALEXANDER	BACHILLER	CONTRATISTA	CUBIERTA
1.024.476.165	REINA OSORIO LUIS EDUARDO	BACHILLER	CONTRATISTA	ELECTRICIDAD
1.030.600.041	REYES RIOS JULIAN ANDRES	BACHILLER	CONTRATISTA	ELECTRICIDAD
1.024.595.983	ENTENA LONDOÑO DAIRO ESTEBAN	TECNICO ELECT.	CONTRATISTA	ELECTRICIDAD

NOTA:

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA										
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS										
	Contratista:			HYD S.A.S							
	Interventoría:			CONSORCIO INVIMA -JMS							
INFORME MENSUAL No. 4						DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025					
ANEXO 6.7 - MAQUINARIA/EQUIPOS											
7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO											
EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACION				
1	HERRAMIENTA MANUAL		X		CUBIERTA	IMPERMEABILIZACION	PALUSTRE, PALIN, GARFIO.				
2	EQUIPO		X		CUBIERTA	IMPERMEABILIZACION	SOPLETE.				
3	HERRAMIENTA MANUAL		X		OFICINAS	PINTURA	RODILLOS - BROCHAS				
4	HERRAMIENTA MANUAL		X		CUBIERTA	ESTRUCTURA	BROCHAS-CEPILLO HIDRO LAVADORA				
7.2 EQUIPOS DE MEDICION											
ITEM	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA					EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR				
		Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID
1											
2											
3											
4											
5	NOTA:										


ANEXO 6.8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Edificio Montevideo cambio de iluminarias




Edificio Montevideo

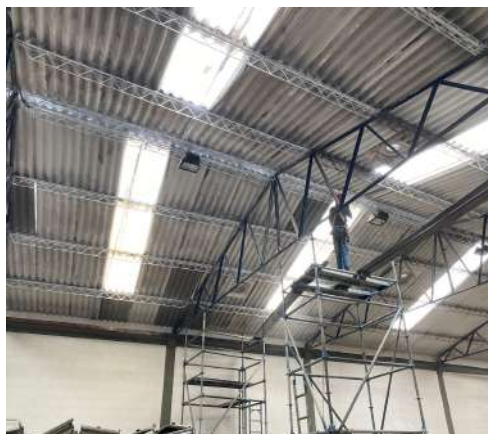

Fontibon cubierta estructura




villavicencio



 in^{vi}ma Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.	FORMATO CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES INVIMA	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	
	Contratista: Interventoría:	HYD S.A.S CONSORCIO INVIMA -JMS
INFORME MENSUAL No. 4	DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025	

ANEXO 6.8 - REGISTRO FOTOGRAFICO SST

Adecuación de zonas, señalización y actividades en obra.

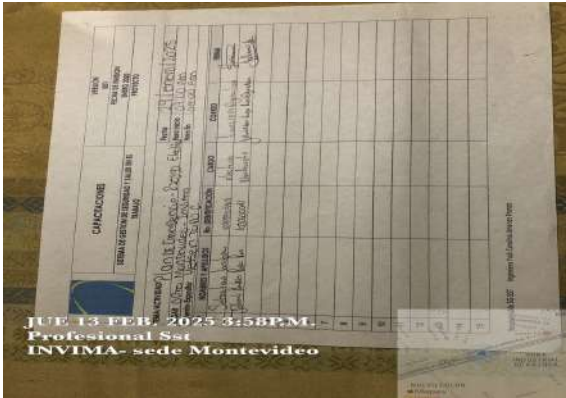

Charlas de seguridad y capacitaciones.





Orden y aseo de zonas de trabajo y campamentos.

Para este mes no se realizo cargue de elementos escombros

Cargue de elementos tales como escombros y madera





MAR 04 FEB. 2025 10:51A.M.
Profesional Sst
INVIMA- sede Fontibon
