


ACTA DE REUNIÓN No.				
INTERNA		EXTERNA	X	
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN				Página 1 de 3
Subdirección Técnica Operativa				

FECHA			Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.									
DD	MM	AAAA										
14	07	2025	Secretario: Catalina Camacho									
			Lugar: Virtual									
Hora de Inicio: 9:00			a.m.	X	p.m.		Hora de Cierre: 10:00		a.m.	X	p.m.	
Tema de reunión:			Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.									
Grupo que se reúne:			Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP/Jardín Botánico de Bogotá - JBB									
ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA												
NOMBRE			CARGO				FIRMA					
Yira Bolaños Enriquez (e)			Subdirectora de disposición final UAESP (e)									
Liseth Paola Piñeros Urrego			Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO									
Catalina Camacho Fandino			Coordinadora Convenios JBB - STO									
NOTA: Para los asistentes que no tienen compromisos en la presenta acta se adjunta lista de asistencia												
ORDEN DEL DÍA (Describe brevemente los temas a tratar)												
<ol style="list-style-type: none"> Revisión cronograma de actividades. Varios. 												
DESARROLLO DE LA REUNIÓN												
<ol style="list-style-type: none"> Revisión cronograma de actividades. <p>De acuerdo al cronograma presentado en el primer comité del convenio, las actividades de plantación se iniciarían durante el tercer mes de inicio de las actividades, sin embargo durante esta semana de trabajo, los ingenieros a cargo de la intervención decidieron en campo iniciar las actividades de ahoyado y plantación para lograr la ejecución de la totalidad de estas actividades durante los primeros tres meses del convenio y lograr los mantenimientos durante las siete semanas restantes, ya que al iniciar el tercer mes, no sería posible que la cuadrilla de campo finalizara las actividades posteriores de mantenimiento para la fecha de finalización del convenio (esto por el cambio del tiempo de ejecución del convenio, que en un inicio estaba proyectado para seis meses)</p> <p>Las labores de preparación, trazado y estacado, ahoyado y plantación se realizarán simultáneamente, lo que garantizaría también evitar que especies como el pasto Kikuyo y el Cardo se propaguen tan rápido sobre las áreas que fueran despejando, ya que las intensas lluvias de los últimos meses han favorecido el crecimiento y dispersión de estas especies en el predio.</p>												


ACTA DE REUNIÓN No.			
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Subdirección Técnica Operativa			Página 2 de 3

Además, de acuerdo con las predicciones climáticas del IDEAM, es posible que para el mes de agosto haya disminución en las precipitaciones, por lo que el equipo operativo quiere aprovechar las condiciones de tiempo que se están presentando actualmente y evitar, en la medida de lo posible, realizar plantaciones durante temporadas de sequía.

En cuanto al cerramiento, en la propuesta técnica se supedita la plantación al cerramiento del predio, sin embargo, por la premura para lograr ejecutar la plantación dentro de los tiempos del convenio, proponemos que estas actividades se realicen al mismo tiempo que la plantación.

El señor guardabosques Felix nos instaló postes y dos líneas de alambre para evitar la entrada de ganado a los polígonos 1, 2, 3, 4 y 5 para que nosotros podamos continuar con la plantación en estas áreas (Anexo Estrategias), lo que les da tiempo a la UAESP para contratar el proceso de cerramiento y ejecutarlo.

Para este mes el equipo operativo tiene planeado terminar la plantación en los polígonos 1, 2 y 3.

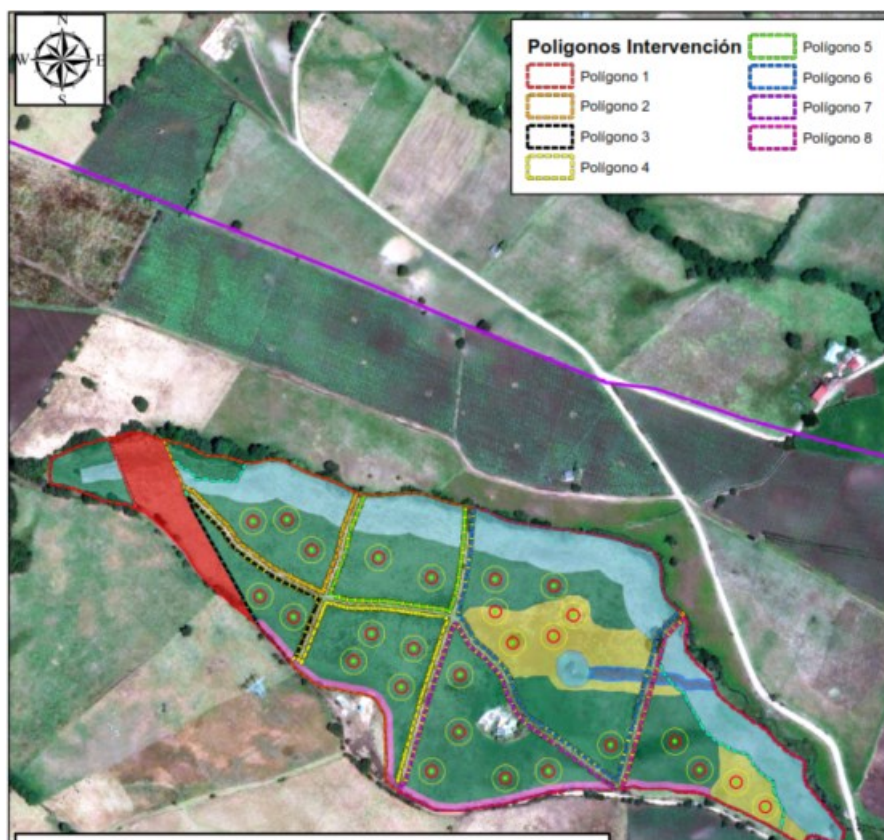


2. Varios.

ACTA DE REUNIÓN No.			
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Subdirección Técnica Operativa			Página 3 de 3

Se vienen adelantando acciones de acompañamiento de gestión social con la Comunidad con la profesional Adriana Tusa, la idea es articular las acciones entre las diferentes subdirecciones y la UAESP para la gestión social y apoyar la actividad planteada para el 22 de julio.

Evidencias de la reunión:

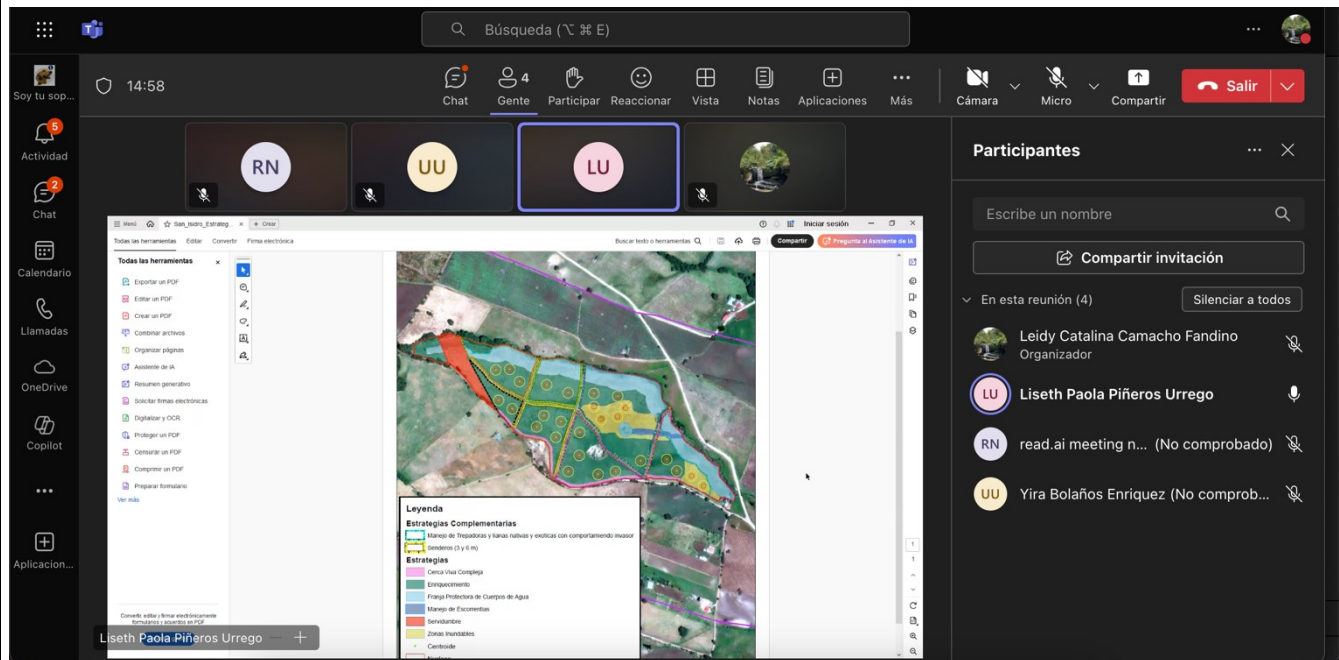

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Ajustar y radicar el plan de trabajo y cronograma	JBB	15-07-2025
Realizar el cerramiento del predio	UAESP	Septiembre 2025

ELABORÓ: Catalina Camacho
