

Bogotá D.C., 04 de junio de 2025

BEL-SDM-ADM-044-25

Señores,

CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Interventoría al Contrato No. 2025 - 2780

Atn. Valentín Barajas

Director de Interventoría

Calle 74 N° 20C -04 Barrio San Felipe

Ciudad

Referencia: Contrato No 2025 – 2780 Cuyo Objeto es: “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1”

Asunto: Informe mensual de obra mes mayo de 2025 v0

Cordial Saludo,

Remitimos a ustedes Informe mensual de obra del mes de mayo de 2025 V0 que abarca desde el 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025, con el fin de que pueda ser revisado, aprobado y devolverlo con las firmas correspondientes.

Agradecemos la atención prestada.



ARQ. ESP. NATALIA PATIÑO CHACÓN

Directora de obra Consorcio Belzcon Movilidad

CC. ING. ADRIANA RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN CONTRATO SDM 2025-2780 - LOTE1

CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD

NIT. 901.933.921 – 0

CONTRATO 2025-2780

MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE OBRA #02 - 00



CONSORCIO Belzcon
MOVILIDAD

VERSIÓN 02

INFORME MENSUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE
DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

LOTE 1 - ZONA NORTE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	




**INFORME MENSUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE DESDE EL 01
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE
BOGOTÁ, D.C.**



MAYO de 2025

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

V.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
0	Ing. Willy Patrick Belzner Salazar	Representante Legal Cto. 2025-2780		05/05/2025	DOCUMENTO V0
1	Ing. Willy Patrick Belzner Salazar	Representante Legal Cto. 2025-2780		26/05/2025	DOCUMENTO V1 – se retira del control de cambios la firma de la supervisión a solicitud de la interventoría
2	Arq. Natalia Patiño	Directora del Contrato Cto. 2025-2780		02/06/2025	Se estandariza el encabezado del documento. Se retira el cuadro de distribución de documentos. Se estandariza la tabla de contenido.

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

TABLA DE CONTENIDO	4
INTRODUCCIÓN	6
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	8
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	12
2.1. LABOR A EJECUTAR	12
2.2. LABORES A EJECUTAR	15
3. ASPECTO ADMINISTRATIVO	16
3.1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	16
3.1.1. ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES	16
3.1.2. MANEJO DE COMUNICACIONES	16
3.1.3. APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA	18
4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE	20
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS	20
4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	20
5. ASPECTO TÉCNICO	21
5.1. BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS	21
5.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN INTERSECCIONES NUEVAS	22
5.2.1. P1314 – AVENIDA BOYACÁ CON CALLE 152	22
5.2.2. P1869 – KR 70G CON CL 72	24
5.2.3. P2148 – Av. NQS CON KR 33	25
5.2.4. P199 – KR 100 CON CL 18	26
5.2.5. P1564 – AV. CIUDAD DE CALI CON CL 135ª	27
5.5. DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	28
5.6. CONTROL DE LLUVIAS.	29
5.7. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA	29

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

6. SEGUIMIENTO SUMINISTROS ENTREGADO A SDM	30
7. CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE CONTRATACIÓN	31
7.1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	31
7.2. DECRETO 332	31
7.3. RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	31
8. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	33
9. RELACIÓN DE ANEXOS	34
➤ ANEXO 1. ACTA DE INICIO	34
➤ ANEXO 2. PÓLIZAS CONTRACTUALES	34
➤ ANEXO 3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA	34
➤ ANEXO 4. CONTROL DE LLUVIAS	34

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad presentar para su revisión y aprobación el informe detallado de actividades de obra desarrolladas durante el mes de mayo de 2025 de intersecciones semaforizadas, complementos y mantenimientos del sistema de semaforización de Bogotá, contrato adjudicado al Consorcio BELZCON – MOVILIDAD bajo número 2025 – 2780 específicamente para el lote 1 (Zona Norte). Para ejecutar obras civiles de semaforización en un horizonte de diez (10) meses a partir de la firma del Acta de Inicio la cual tiene fecha de 29/04/2025.

Por otro lado, y como propósito del presente documento, se tiene que como parte de los requisitos contenidos dentro del ANEXO TÉCNICO 1E- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN – Numeral 6.7.3 – el cual establece que el contratista deberá entregar de forma mensual dentro de los primeros siete (7) días calendario siguientes al mes finalizado del cual se reportan las actividades. Como se menciona en el anexo técnico 1E, el informe deberá contener:

- Obras civiles para construcción de nuevas intersecciones, complementos en intersecciones existentes (reconstrucción) y actividades de mantenimiento rutinario, la descripción de los ítems, y los costos en que se incurren para cada uno de ellos, clasificado por intersección.
- Estadísticas del avance físico de los trabajos.
- Relación de cantidades de obra ejecutadas en el mes por intersecciones nuevas, existentes (reconstrucción) y mantenimientos.
- Inventarios de bienes fabricados del mes y acumulado.
- Registro fotográfico georreferenciado.
- Seguimiento del plan de calidad y controles de calidad.
- Planes de contingencia elaborados por el contratista.
- Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.
- Recursos utilizados por el contratista.
- Cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada.
- Personal del contratista.
- Relación de maquinaria, herramientas y equipos.
- Estado y avance presupuestal del contrato.
- Balance financiero del contrato.
- Resumen y estado de garantías del contrato.
- Pagos y aportes a seguridad social y parafiscal.
- Relación de correspondencia enviada y recibida relacionada en el contrato.
- Recomendaciones, observaciones y conclusiones.

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzcoq MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

- Detalle correspondiente a la Gestión y Actividades en SST (Sistema y Seguridad en el Trabajo) y Manejo Ambiental.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD -SDM- NÚMERO DE CONTRATO: 2025-2780 SUPERVISOR DEL CONTRATO SDM: ING. ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ FONSECA CORREO: adrodriquez@movilidadbogota.gov.co
INTERVENTORÍA CTO. 2025 – 2769
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL DIRECCIÓN: CL 74 # 20 C – 04 BARRIO SAN FELIPE, BOGOTÁ NIT.: 901.935.290-0 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. VALENTIN BARAJAS SANTOS CORREO: sem-director@redtic.com.co CEL: 311 6387026 RESIDENTE DE OBRA: ING. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA CORREO: sem-ing-res-obrasciviles-1@redtic.com.co CEL: 310 3352509
CONTRATISTA CTO. 2025 – 2780
CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD DIRECCIÓN: CL 105 # 46 – 26 PISO 2, BOGOTÁ NIT.: 901.933.921 – 0 DIRECTORA DE OBRA: ARQ. NATALIA PATIÑO CHACÓN CORREO: sdm2780.bzc@gmail.com CEL.: 3007572357 RESIDENTE DE OBRA: ING. SERGIO ANDRÉS TORRES TOLOZA CORREO: storres.bzc@gmail.com CEL: 315 2548090 <ul style="list-style-type: none">• CON COPIA AL CORREO: correo.bzc@gmail.com
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/FEBRERO/2026

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzon MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dentro de los objetivos estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad de -Bogotá D.C., se estructura el proceso de contratación SDM – LP – 001 – 2025 adjudicado al CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD formalizado mediante contrato No. 2025 – 2780 cuyo objeto es “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.” – Lote 1, cuyo alcance y obligaciones se encuentra establecido en la propuesta y las correspondientes bases de contratación.

En consecuencia, la información contractual se formalizó en el Anexo 5 “MINUTA DEL CONTRATO 2023 – 2780” Licitación de obra pública de infraestructura de transporte (Versión 3) y se resume a continuación:

Tabla 1. Datos generales del contrato¹

NÚMERO DEL CONTRATO	2025 - 2780
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo dispuesto para la ejecución del contrato 2025 – 2780 corresponde a diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo que primero suceda, una vez firmada el acta de inicio
FECHA DE INICIO	29 de abril de 2025. Ver ANEXO 1. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2026
VALOR DEL CONTRATO	El valor del contrato es por la suma de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$5.141.951.324). Suma que incluye: IVA, impuestos, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 3.612,18 SMLMV para el año de suscripción del 2025.
FORMA DE PAGO	La Secretaría Distrital de Movilidad pagará, el valor de los servicios efectivamente prestados mediante pagos mensuales vencidos, acorde a los valores unitarios descritos en la propuesta, con base en cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para periodo facturado.

¹ Clausulado anexo 5 – Minuta del contrato Licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

	<p>El primer y último pago se realizará de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> El primer pago se hará por los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día contable de ese mismo mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. El último pago será igualmente por los servicios efectivamente prestados, quedando sujeto a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. La SDM efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. <p>La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo con los precios unitarios presentados en la oferta.</p> <p>En interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte, los valores realmente ejecutados en el componente del lote o grupo 1, indicados en el Anexo 1 – Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE literal “a. Ítems de pago” del anexo mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada periodo a pagar, los soportes que conducen a dichos valores por cada componente, haciendo referencia a los ítems de la oferta.</p> <p>Sobre el valor total del corte mensual facturado, se</p>

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

	realizará una retención del cinco (5%) por ciento como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación de este.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 106 del 2 de enero de 2025 por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$38.800.000.000) M/CTE.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2448 del 21 de abril de 2025 por CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$5.141.951.324).
LIQUIDACIÓN	<p>El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.</p> <p>Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.</p>
PÓLIZAS (Ver ANEXO 2. PÓLIZAS CONTRACTUALES)	<p>Amparo: CUMPLIMIENTO Vigencia: De 14/04/2025 hasta 14/02/2031 Valor: \$7.198.731.853,60 No.: 400063638 Aseguradora: Nacional de Seguros Aprobación: 28/04/2025</p> <p>ACTUALIZACIÓN 1. "SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO.2025-2780, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON FECHA DE TERMINACION 28 DE FEBRERO DE 2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES."</p> <p>Nueva vigencia: de 29/04/2025 hasta 28/02/2031</p>
	<p>Amparo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</p>

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

	Vigencia: De 14/04/2025 hasta 14/02/2026 Valor: \$569.400.000,00 No.: 400063639 Aseguradora: Nacional de Seguros Aprobación: 28/04/2025
	<p>ACTUALIZACIÓN 1. “SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO.2025-2780, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON FECHA DE TERMINACION 28 DE FEBRERO DE 2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.”</p> <p>Nueva vigencia: de 29/04/2025 hasta 28/02/2026</p>

Fuente: Grupo consultor




INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

2.1. LABOR A EJECUTAR

La obra comprende el mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. de la Zona Norte en función de los requerimientos y necesidades que defina la Entidad (SDM); para lo cual se requiere la construcción de cinco (5) intersecciones semaforizadas nuevas de la ciudad de Bogotá D.C., dichas intersecciones se presentan a continuación:

Ilustración 1. Localización y distribución de intersecciones nuevas.

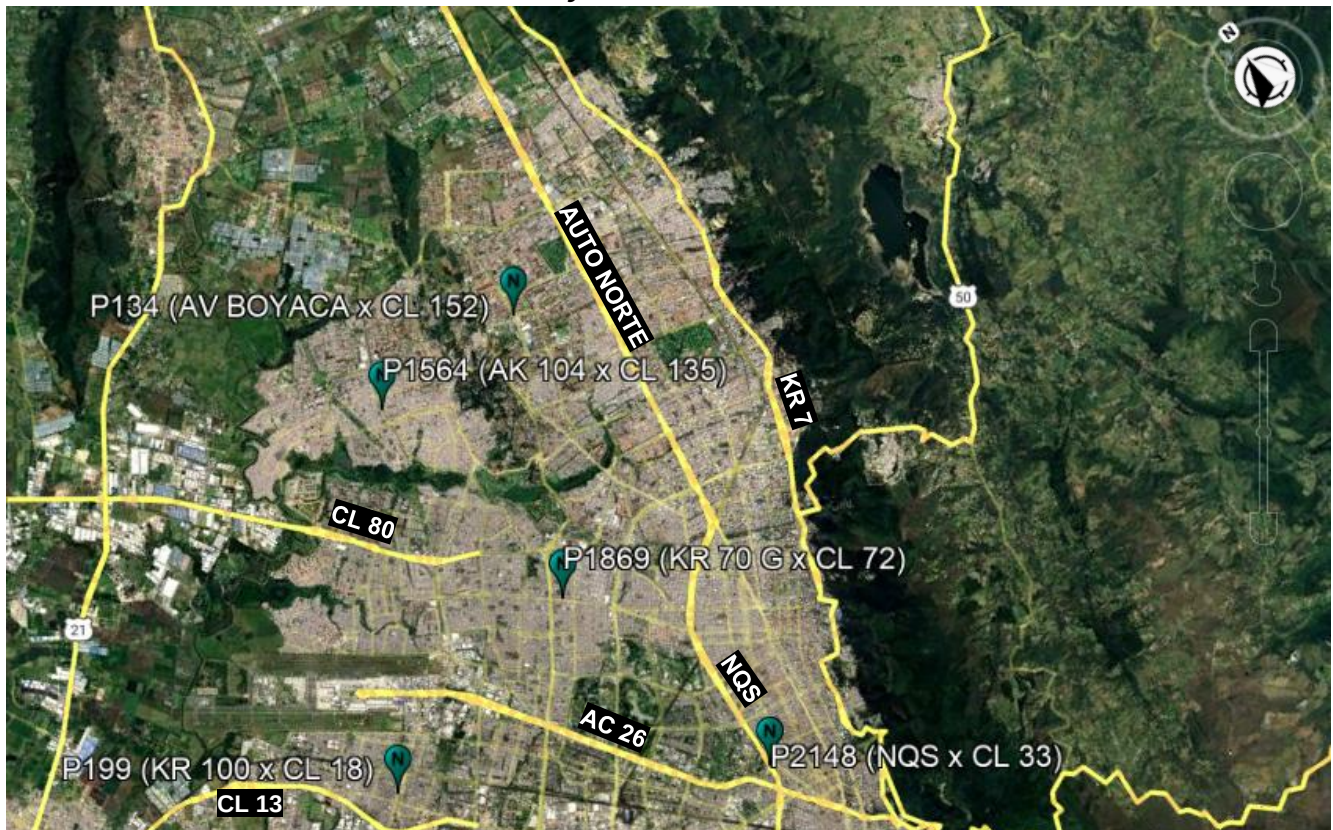

Fuente: Grupo consultor

Se presenta en la siguiente tabla el listado oficial de las intersecciones nuevas para el Lote 1:

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	


Tabla 2. Listado de intersecciones nuevas.

INTERSECCIONES NUEVAS			
#	PRIORITARIO	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD
1	P1314	AV BOYACÁ X CL 152	SUBA
2	P1869	KR 70G X CL 72	ENGATIVÁ
3	P2148	NQS X CL 33	TEUSAQUILLO
4	P199	KR 100 X CL 18	FONTIBÓN
5	P1564	AV CIUDAD DE CALI (AK 104) X CL 135A	SUBA

Fuente: Comunicado SEM-CMC-CBM-006-25 de interventoría

En cuanto a complementos, se requiere el mejoramiento de treinta y ocho (40) intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D.C. para la zona norte de los cuales se envió información al contratista en dos grupos. El primer grupo de 20 complementos recibidos el 06 de mayo de 2025 y el segundo grupo recibido el 16 de mayo de 2025. Se presenta a continuación la localización de los complementos:

Ilustración 2. Localización y distribución de los complementos.

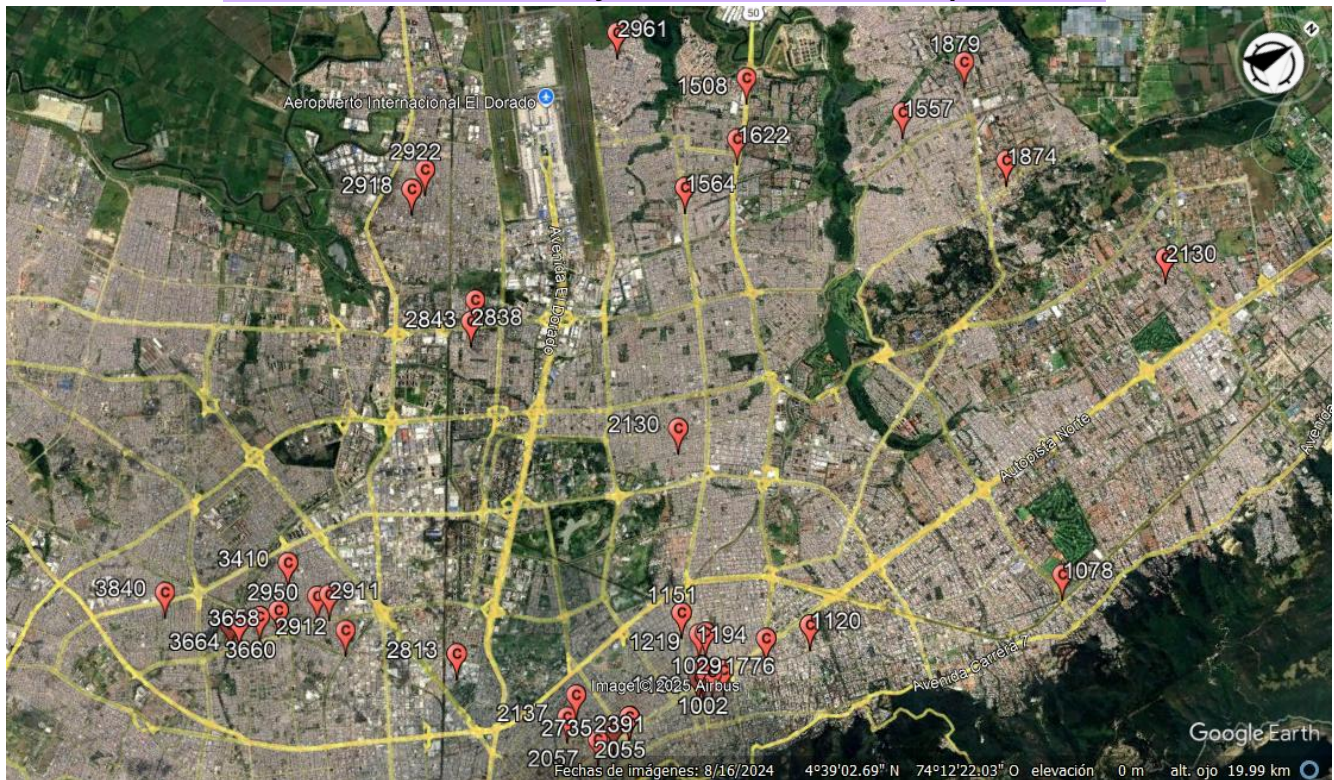

Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Se presenta en la siguiente tabla el listado oficial de las intersecciones nuevas para el Lote 1:

Tabla 3. Listado de complementos.

COMPLEMENTOS				
#	EXT	ID	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD
1	3659	770	AK 50 X DG 16 S	PUENTE ARANDA
2	3664	767	AK 50 X AC 8 S	PUENTE ARANDA
3	3660	759	AK 50 X CL 1G	PUENTE ARANDA
4	3658	1316	AK 50 X CL 2C	PUENTE ARANDA
5	2950	742	AK 50 X CL 4F	PUENTE ARANDA
6	2911	736	AK 50 X CL 5A	PUENTE ARANDA
7	2912	708	TV 42 X AC 6	PUENTE ARANDA
8	1078	1692	AK 9 X CL 127	USAQUEN
9	2735	447	TV 21 X DG 45 D Y CL 45CBIS	TEUSAQUILLO
10	2813	607	KR 37 X AC 24	TEUSAQUILLO
11	2056	274	KR 13 X CL 50	CHAPINERO
12	1564	760	KR 101 X AC 72	ENGATIVÁ
13	1002	203	AK 11 X CL 69	CHAPINERO
14	1002	213	AK 11 X CL 67	CHAPINERO
15	1160	235	KR 13 X CL 67	CHAPINERO
16	1001	1172	AK 11 X CL 66	CHAPINERO
17	3410	772	KR 56 X AC 3	PUENTE ARANDA
18	2137	407	KR 19 X AC 45	TEUSAQUILLO
19	1151	384	AK 24 X CL 66	BARRIOS UNIDOS
20	2843	797	AK 86 X CL 23	FONTIBÓN
21	1557	1467	KR 106 X CL 132	SUBA
22	1874	564	KR 92 X CL 147B BIS	SUBA
23	1879	673	KR 111 X AC 145	SUBA
24	2055	267	KR 13 X AC 53	CHAPINERO
25	2057	286	KR 13 X CL 47	CHAPINERO
26	2391	1284	KR 52 X AC 13	PUENTE ARANDA
27	2838	792	KR 82 X CL 23	FONTIBÓN
28	2918	857	KR 103A X CL 17	FONTIBÓN
29	2922	862	AK 106 X CL 18	FONTIBÓN
30	2961	1167	KR 121 X CL 64	ENGATIVÁ
31	3840	801	KR 52C X CL 37 S	PUENTE ARANDA
32	2130	1770	KR 69 X CL 68	ENGATIVÁ

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzon MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

COMPLEMENTOS				
#	EXT	ID	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD
33	2130	160	KR 55A X CL 167	SUBA
34	1029	282	KR 19 X CL 69	BARRIOS UNIDOS
35	1120	159	AK 15 X CL 82	CHAPINERO
36	1194	177	AK 15 X CL 77	CHAPINERO
37	1219	294	KR 19 X AC 68	BARRIOS UNIDOS
38	1508	783	KR 115 X AC 80	ENGATIVÁ
39	1622	757	KR 107 X AC 80	ENGATIVÁ
40	1776	193	AK 11 X CL 70	CHAPINERO

Fuente: Comunicado SEM-CMC-CBM-006-25 de interventoría

2.2. LABORES A EJECUTAR

Dentro de los objetivos estratégicos de la Secretaria Distrital de Movilidad de -Bogotá D.C., se estructura el proceso de contratación SDM – LP – 001 – 2025 adjudicado al CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD formalizado mediante contrato No. 2025 – 2780 cuyo objeto es “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.” – Lote 1, las actividades a desarrollar se enmarcan en el Formulario 1 – Presupuesto oficial Lote 1 los cuales contemplan ochenta y dos (82) actividades las cuales se distribuyen en los siguientes capítulos:

- I. ÍTEMS POR DISPONIBILIDAD MENSUAL
- II. DEMOLICIONES
- III. EXCAVACIONES
- IV. TRANSPORTE DE ESCOMBROS
- V. SUMINISTRO PARA REDES
- VI. RELLENOS
- VII. CONSTRUCCIONES
- VIII. ENSAYOS DE LABORATORIO
- IX. TRANSPORTES
- X. PERSONAL

Dichas actividades enmarcan intersecciones de mantenimiento, emergencias, complementos e intersecciones nuevas para la zona norte de la ciudad de Bogotá D.C.

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzcoq MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO

3.1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

3.1.1. ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES²

Acta de inicio del contrato No. 2025 – 2780, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Belzcon – Movilidad en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, se reunieron PEDRO ANTONIO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.479.479 de Bogotá, representante legal de la Interventoría CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, por una parte, y por la otra, WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79.249.755 de Suba, en su calidad de representante legal del contratista CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD con Nit No. 901.933.921-0, con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual. (Ver ANEXO 1. ACTA DE INICIO)

3.1.2. MANEJO DE COMUNICACIONES

Dentro del desarrollo del contrato se adelantaron las comunicaciones en el ANEXO 3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA, para lo cual se habilitó el correo electrónico sdm2780.bzc@gmail.com con el fin de manejar adecuada comunicación entre la Interventoría, Supervisión del contrato 2780 por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Belzcon – Movilidad (Así como actores asociados a la adecuada ejecución del contrato), a continuación, se relacionan las comunicaciones originadas tanto para correspondencia enviada, como recibida:

➤ Correspondencia enviada

Se presenta en la siguiente tabla la correspondencia enviada para el mes de mayo de 2025:

Tabla 4. Correspondencia enviada mes de mayo de 2025.

CE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RECIBIDO INTERVENTOR IA	N° ORFEO
BEL-SDM-ADM-004-25	5-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Solicitud de no aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)	CMC-SEM-033	2025612015123 52
BEL-SDM-ADM-005-25	6-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Planes de Manejo de tráfico (Típicos)	CMC-SEM-036	2025612015299 92
BEL-SDM-ADM-006-25	6-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Análisis de Precios Unitarios	CMC-SEM-037	2025612015317 42
BEL-SDM-ADM-007-25	7-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Especialista de Transito - Javier Andres Meza	CMC-SEM-041	2025612015357 22
BEL-SDM-ADM-008-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Bodega	CMC-SEM-054	2025612015553 32

² Acta de inicio del contrato de obra No. 2025 – 2780, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE APROBACIÓN:
02 de junio de 2025

VERSIÓN: 02



C E	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RECIBIDO INTERVENTOR IA	N° ORFEO
BEL-SDM-ADM-009-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Programa de obra_Intersecciones Nuevas	CMC-SEM-056	2025612015669 52
BEL-SDM-ADM-0010-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Desglose del A	CMC-SEM-059	2025612015673 12
BEL-SDM-ADM-0011-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Grúa	CMC-SEM-057	2025612015676 12
BEL-SDM-ADM-0012-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hojas de vida personal administrativo	CMC-SEM-058	2025612015680 32
BEL-SDM-ADM-0013-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Vehículo para Personal Administrativo	CMC-SEM-069	2025612015725 12
BEL-SDM-ADM-0014-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Relación equipo mínimo, maquinaria, herramienta y equipos	CMC-SEM-071	2025612015731 62
BEL-SDM-ADM-0015-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance de presentación de Grúa y Conductor	CMC-SEM-072	2025612015751 52
BEL-SDM-ADM-0016-25	13-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Auxiliar de Ingeniería - Miguel Chavarro	CMC-SEM-094	2025612016140 82
BEL-SDM-ADM-0017-25	13-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Conductor Vehículo administrativo - Carlos Andres Chavarro	CMC-SEM-081	2025612016165 82
BEL-SDM-ADM-0018-25	14-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atn. Obs. Interventoría Planes de manejo de tráfico (Típicos) V1	CMC-SEM-083	2025612016337 72
BEL-SDM-ADM-0019-25	14-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Informe mensual de obra mes abril de 2025 V0	CMC-SEM-084	2025612016341 92
BEL-SDM-ADM-0020-25	15-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - SPMT	Planes de Manejo de tráfico (Típicos) - Cto. 2025-2780 Lote 1	CMC-SEM-095	2025612016663 52
BEL-SDM-ADM-0021-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Acreditación Cumplimiento Decreto 332 de 2020 01-15 Mayo	CMC-SEM-102	2025000010634 62
BEL-SDM-ADM-0022-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance oficio 202561201567612 presentación grúa	CMC-SEM-096	2025612016816 12
BEL-SDM-ADM-0023-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Toma de información #1 intersecciones nuevas	CMC-SEM-103	2025612016801 62
BEL-SDM-ADM-0024-25	21-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Proveedor - Perforación Horizontal	CMC-SEM-111	2025612017394 22
BEL-SDM-ADM-0025-25	21-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Proveedor - Ensayos	CMC-SEM-112	2025612017404 02
BEL-SDM-ADM-0026-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Plan de Manejo Ambiental_v0	CMC-SEM-128	2025612017722 62
BEL-SDM-ADM-0027-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Plan de Gestión de RCD_v0	CMC-SEM-127	2025612017727 12
BEL-SDM-ADM-0028-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Relación de Dotación y Emblemas	CMC-SEM-125	2025612017678 12
BEL-SDM-ADM-0029-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Análisis de Precios Unitarios V1	CMC-SEM-126	2025612017684 62
BEL-SDM-ADM-0030-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Personal Administrativo y Técnico V1	CMC-SEM-137	2025612017693 02
BEL-SDM-ADM-0031-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención a radicado SEM-CMC-CBM-009-25, Corrección de garantía de cumplimiento	CMC-SEM-143	2025612017979 22
BEL-SDM-ADM-0032-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Bodega V2	CMC-SEM-136	2025612017886 42
BEL-SDM-ADM-0033-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance oficio 202561201634192 informe mensual de obra mes abril de 2025 V1	CMC-SEM-138	2025612017891 72
BEL-SDM-ADM-0034-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención a radicado SEM-CMC-CBM-003-25, aprobación del vehículo de transporte de personal	CMC-SEM-139	2025612017909 62
BEL-SDM-ADM-0035-25	27-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Hv. Inspector de Obra, Cristian Camilo Maldonado	CMC-SEM-147	2025612018145 22
BEL-SDM-ADM-0036-25	27-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance a Hoja de Vida Maestro de Obra	CMC-SEM-148	2025612018168 02
BEL-SDM-ADM-0037-25	28-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención de observaciones SDM V1 - PMT Típicos	CMC-SEM-153	2025612016663 52
BEL-SDM-ADM-0038-25	28-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance a relación equipo mínimo, maquinaria, herramienta y equipos	CMC-SEM-151	2025612018264 82
BEL-SDM-ADM-0039-25	30-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención de observaciones, Programa de obra V1		2025612018690 92

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Fuente: Grupo consultor

➤ Correspondencia recibida

Se presenta en la siguiente tabla la correspondencia recibida para el mes de mayo de 2025:

Tabla 5. Correspondencia recibida mes de mayo de 2025.

No	CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	COMPONENTE
1	SEM-CMC-CBM-001-25	7/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud de desagregación del componente de Administración (A) Contrato No. 2025-2780.	Jurídico
2	SEM-CMC-CBM-002-25	12/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Aprobación H.V DIRECTOR Y ESPECIALISTA EN TRANSITO	Administrativo
3	SEM-CMC-CBM-003-25	20/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Presentación vehículo para personal administrativo Contrato 2025-2780	Administrativo
4	SEM-CMC-CBM-004-25	20/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Presentación Bodega - Contrato 2025-2780.	Administrativo
5	SEM-CMC-CBM-005-25	20/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Remisión Hoja de Vida Conductor vehículo administrativo	Administrativo
6	SEM-CMC-CBM-006-25	20/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Intersecciones Semaforizadas y Complementos	Administrativo
7	SEM-CMC-CBM-007-25	21/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Hojas de vida del personal profesional	Administrativo
8	SEM-CMC-CBM-008-25	22/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud del Plan Estrategico de Seguridad Vial	SST
9	SEM-CMC-CBM-009-25	23/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud de ajuste de pólizas con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio - Contrato No. 2025-2780.	Juridico
10	SEM-CMC-CBM-010-25	23/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Actualizacion medios de comunicación Consorcio Movilidad Capital	Administrativo
11	SEM-CMC-CBM-011-25	27/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicados BEL-SDM-ADM-011-25, BEL-SDM-ADM-015-25 y BEL-SDM-ADM-022-25 -Presentación de Grúa y conductor	Administrativo
12	SEM-CMC-CBM-012-25	27/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicado BEL-SDM-ADM-014-25 Relación equipo mínimo, maquinaria y herramienta CTO 2025-2780.	Administrativo
13	SEM-CMC-CBM-013-25	30/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicados BEL-SDM-ADM-019-25 y BEL-SDM-ADM-033-25 Informe mensual de obra mes abril de 2025 v1 Contrato No. 2025-2780 (Lote 1).	Administrativo
14	SEM-CMC-CBM-014-25	30/5/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicado BEL-SDM-ADM-009-25 Remisión Programa de obra - Intersecciones nuevas -Contrato 2025-2780	Técnico

Fuente: Grupo consultor

3.1.3. APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Durante el periodo del presente informe mensual se realizó el radicado y la aprobación de las hojas de vida del siguiente personal:

- ✓ **DIRECTORA DE OBRA:** radicada el 30 de abril mediante comunicado BEL-SDM-ADM-003-25. Aprobada el 12 de mayo mediante comunicado SEM-CMC-CBM-002-25
- ✓ **ESPECIALISTA EN TRÁNSITO:** radicada el 07 de mayo mediante comunicado BEL-SDM-ADM-007-25. Aprobada el 12 de mayo mediante comunicado SEM-CMC-CBM-002-25

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

- ✓ **PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL:** radicada el 08 de mayo mediante comunicado BEL-SDM-ADM-0012-25. Aprobada el 21 de mayo mediante radicado SEM-CMC-CBM-007-25
- ✓ **RESIDENTE DE OBRA:** radicada el 08 de mayo mediante comunicado BEL-SDM-ADM-0012-25. Aprobada el 21 de mayo mediante radicado SEM-CMC-CBM-007-25
- ✓ **TECNOLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA:** radicada el 08 de mayo mediante comunicado BEL-SDM-ADM-0012-25. Aprobada el 21 de mayo mediante radicado SEM-CMC-CBM-007-25
- ✓ **AUXILIAR DE INGENIERÍA:** radicada el 08 de mayo mediante comunicado BEL-SDM-ADM-0012-25. Aprobada el 21 de mayo mediante radicado SEM-CMC-CBM-007-25

3.1.4. PRESENTACIÓN DE BODEGA

Se hizo la visita en acompañamiento con la interventoría para la presentación de la bodega destinada al almacenamiento de materiales y equipos durante la ejecución del contrato. Se radicó documento oficial el día 26 de mayo de 2025 posterior a la verificación del cumplimiento de las especificaciones en sitio.



Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2025, no se realizaron actividades de obra relacionadas a los ítems contractuales; sin embargo, se ejecutaron las siguientes actividades preliminares para el inicio de las obras:

- ❖ **TOMA DE INFORMACIÓN PARA DISEÑO DE PMT:** Se realizó la instalación de cámaras de video para toma de información vehicular, peatonal y bicicletas para elaboración de los PMT's específicos en los siguientes prioritarios:
 - **P1314:** Av. Boyacá con CL 152 – Suba
 - **P2148:** Av. NQS con CL 33 – Teusaquillo
- ❖ **RADICACIÓN DE PMT TÍPICOS PARA EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS:** Se radicaron los planes de manejo de tránsito típicos ante la secretaría de movilidad para atención de emergencias y mantenimientos con la atención de observaciones emitidas por interventoría.

4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para abordar el aspecto financiero del contrato se presenta el balance general conforme a los cortes mensuales revisados y avalados por la interventoría y los que se presentan dentro del mismo periodo del informe del contrato tanto para intersecciones nuevas, complementos y mantenimientos del sistema de semaforización de la Ciudad de Bogotá D.C., así como los ítems administrativos que se encuentren relacionados en los ítems contractuales como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Balance general de ejecución del contrato 2025 – 2780.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.141.951.324,00
CORTE 1 (MAYO DE 2025) – pendiente por aprobación	\$ 14.426.842,00
TOTAL EJECUTADO A 31 DE MAYO DE 2025	\$ 14.426.842,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 5.127.524.482,00
PROMEDIO DE EJECUCIÓN	\$ 14.426.842,00

Fuente: Grupo consultor

El proyecto cuenta con una ejecución del contrato de 0.28% del valor total del contrato.

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

5. ASPECTO TÉCNICO

De acuerdo al anexo técnico 1E, en el presente capítulo se abarcan los siguientes aspectos:

- Actividades en intersecciones nuevas
- Actividades en complementos
- Actividades en mantenimientos
- Daños a la infraestructura existente
- Control de lluvias
- Registro fotográfico georreferenciado
- Resultados y análisis de laboratorio y en campo
- Relación de maquinaria, herramienta y equipos
- Porcentaje de avance de obra
- Cantidades de obra
- Recursos utilizados por el contratista

5.1. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el balance general de avance en tiempo del proyecto desde la fecha de firma del acta de inicio del contrato a la fecha de corte del presente informe mensual.

Tabla 7. Balance general desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2025.

BALANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
GENERAL	Fecha de suscripción del contrato 2025 – 2780	29/04/2025
	Fecha de finalización del contrato 2025 – 2780	28/02/2026
	Tiempo de ejecución del contrato (días)	305
	Fecha de corte (mayo de 2025)	31/05/2025
	Tiempo transcurrido de ejecución (días)	32
	% avance del contrato de obras civiles de semaforización Lote 1	10,49%

Fuente: Grupo consultor

A la fecha se lleva un 10.49% de avance general en tiempo del contrato de obras civiles de semaforización del lote 1 a fecha de corte de 31 de mayo de 2025, iniciando actividades desde el día 29/04/2025 (fecha de suscripción del contrato 2025 – 2780). En el apartado siguiente se detallan las actividades de campo realizadas a la fecha y el avance porcentual de cada punto y general respecto al total del contrato.

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

5.2. ACIVIDADES REALIZADAS EN INTERSECCIONES NUEVAS

Se presenta a continuación, el balance general de las intersecciones nuevas con base en el avance de las obras desarrolladas hasta el mes de corte del presente informe:

5.2.1. P1314 – AVENIDA BOYACÁ CON CALLE 152

La intersección a implementar se encuentra ubicada en la Av. Boyacá con Calle 152 en la localidad de Suba la cual se solicita para brindar paso peatonal y de bici usuarios del sector. A continuación, se muestra la ubicación de dicha intersección y una referencia del diseño entregado por parte de SDM.


Ilustración 3. Localización intersección Av. Boyacá con CL 152



Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Ilustración 4. Plano prioridad P1314 – Av. Boyacá x CL 152, Localidad de Suba.

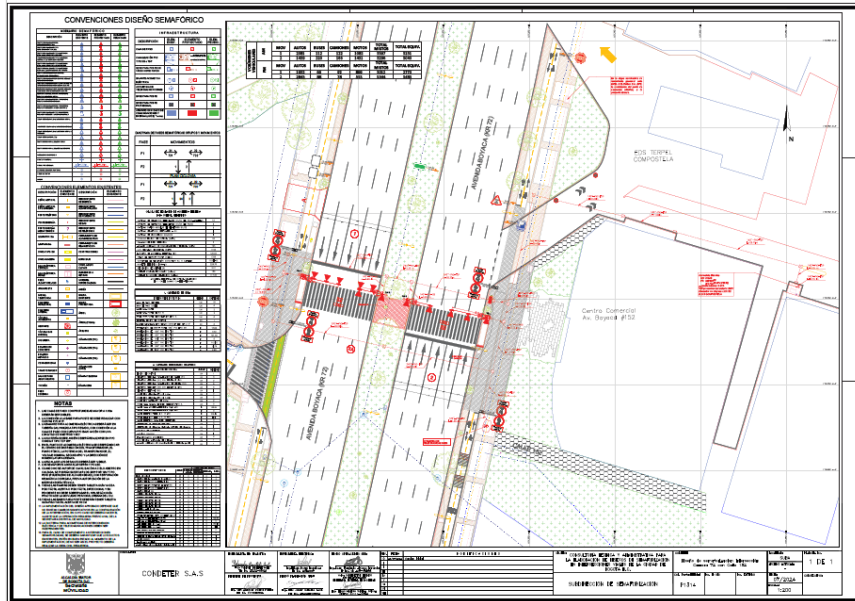

Fuente: Comunicado de Secretaría de Movilidad, radicado **202432209757221**

Durante el mes de mayo del 2025 en este punto se realizó la instalación de cámaras y toma de información para el desarrollo del PMT específico que permita dar inicio a las actividades teniendo en cuenta los actores viales que allí confluyen. Se presenta un breve resumen fotográfico de avance de la intersección:

Tabla 8. Registro fotográfico de la intersección P1314 – Av. Boyacá con Calle 152.



Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

5.2.2. P1869 – KR 70G CON CL 72


La intersección a implementar se encuentra ubicada en la KR 70G con CL 72 en la localidad de Engativá la cual se solicita para dar solución al flujo en la intersección. A continuación, se muestra la ubicación de dicha intersección y una referencia del diseño entregado por parte de SDM.

Ilustración 5. Localización intersección nueva KR 70G con CL 72



Fuente: Grupo consultor

Ilustración 6. Plano prioridad 1869 – KR 70G con CL 72, localidad de Engativá

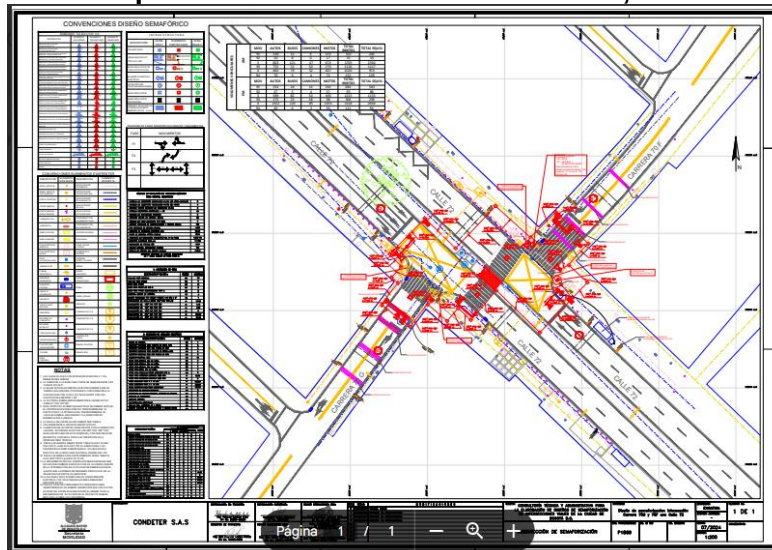

Fuente: Comunicado de Secretaría de Movilidad, radicado 202432208201451

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

5.2.3. P2148 – Av. NQS CON KR 33

La intersección a implementar se encuentra ubicada en la Av. NQS con CL 33 en la localidad de Teusaquillo la cual se solicita para cambiar la red semafórica temporal existente a fija. A continuación, se muestra la ubicación de dicha intersección. A la fecha no se ha recibido diseño para esta intersección.

Ilustración 7. Localización intersección nueva Av. NQS con KR 33



Fuente: Grupo consultor

Durante el mes de mayo del 2025 en este punto se realizó la instalación de cámaras y toma de información para el desarrollo del PMT específico que permita dar inicio a las actividades teniendo en cuenta los actores viales que allí confluyen. Se presenta un breve resumen fotográfico de avance de la intersección:

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belzcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Tabla 9. Registro fotográfico de la intersección P2148 – Av. NQS con KR 33.



Fuente: Grupo consultor

5.2.4. P199 – KR 100 CON CL 18

La intersección a implementar se encuentra ubicada en la KR 100 con CL 18 en la localidad de Fontibón la cual se solicita para dar solución al flujo en la intersección. A continuación, se muestra la ubicación de dicha intersección y una referencia del diseño entregado por parte de SDM.


Ilustración 8. Localización Intersección nueva KR 100 con CL 18



Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Ilustración 9. Plano prioridad 199 – KR 100 con CL 18, localidad de Fontibón.

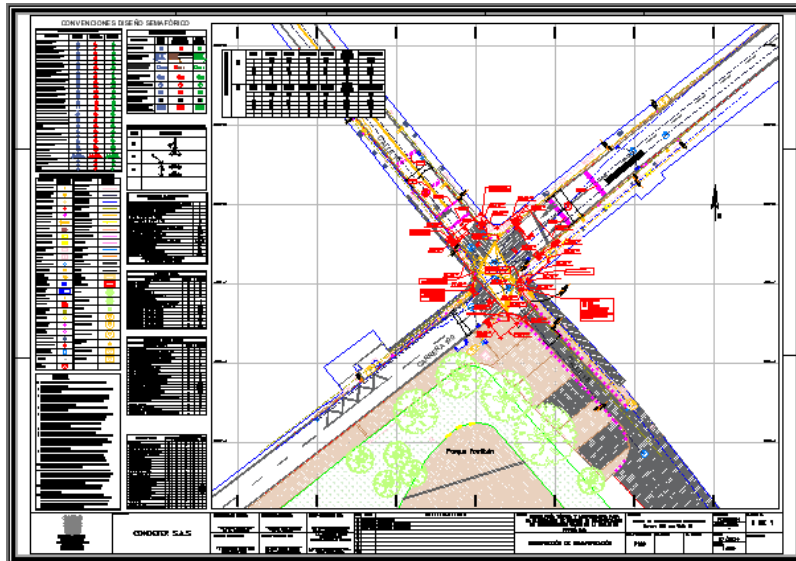

Fuente: Comunicado de Secretaría de Movilidad, radicado

5.2.5. P1564 – AV. CIUDAD DE CALI CON CL 135^a

La intersección a implementar se encuentra ubicada en la Av. Ciudad de Cali con CI 135^a en la localidad de Suba la cual se solicita para brindar paso peatonal y de bici usuarios del sector. A continuación, se muestra la ubicación de dicha intersección y una referencia del diseño entregado por parte de SDM.


Ilustración 10. Localización intersección nueva en Av. Ciudad de Cali con CI 135a



Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

Ilustración 11. Plano prioridad 1564 – Av. Ciudad de Cali con CL 135ª, Localidad de Suba.

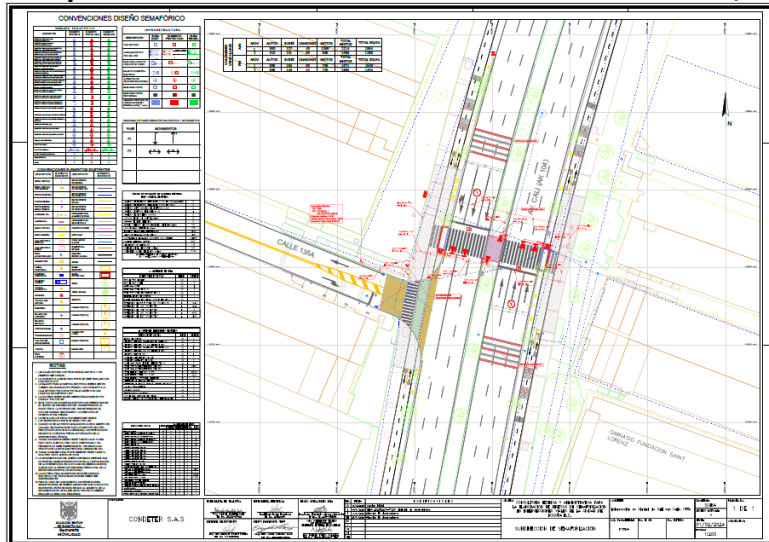

Fuente: Comunicado de Secretaría de Movilidad, radicado **202432201252891**

5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN INTERSECCIONES DE COMPLEMENTOS.

En el mes de mayo se recibió por parte de la interventoría las ubicaciones de los primeros 40 complementos a realizar en el transcurso del contrato y los conceptos con los requerimientos de complemento por parte de la secretaría de movilidad de 20 de ellos. Con la información suministrada se realizó una preinspección de los requerimientos identificando las necesidades de cada uno de ellos y mediante una reunión virtual se establecieron los parámetros para las inspecciones en campo. Esta reunión virtual tuvo lugar el día 30 de mayo y en ella participaron especialistas de diseño y supervisión del contrato por parte de la SDM, interventoría y contratista.

5.4. ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS.

No se han recibido solicitudes de mantenimiento y/o emergencias a la fecha de corte del presente informe.

5.5. DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

No se presentaron daños a la infraestructura durante el periodo del mayo del 2025.

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

5.6. CONTROL DE LLUVIAS.

Se presentan en el ANEXO 4. CONTROL DE LLUVIAS, el formato para control de lluvias por frente de obra en cada mes. Durante el periodo del informe mensual de mayo de 2025 no se registraron datos teniendo en cuenta que las actividades de campo aún no han iniciado.

5.7. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Durante el mes de mayo de 2025 se usaron recursos de personal y equipos para realizar las actividades administrativas y de planeación que se desarrollaron en el marco del presente contrato. Estos recursos se muestran a continuación:

Tabla 10. Recurso humano durante el periodo

RECURSO HUMANO		
ÁREA	FUNCIÓN / CARGO	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	ING ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	1
ADMINISTRATIVA	DIRECTORA DE OBRA	1
ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	RESIDENTE DE OBRA	1
ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL	1
ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	TÉCNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	1

Fuente: Grupo consultor

Nota: Se presentan las planillas de seguridad social y documentos del personal en el *Informe mensual del 1 al 31 de mayo de 2025 Seguridad y Salud en Trabajo y Ambiental*

Tabla 11. Maquinaria y equipos utilizados durante el periodo

MAQUINARIA Y EQUIPOS		
ÁREA	ELEMENTO	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	EQUIPOS DE COMPUTO	2
ADMINISTRATIVA	IMPRESORA	1
ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA	1

Fuente: Grupo consultor

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

6. SEGUIMIENTO SUMINISTROS ENTREGADO A SDM

De acuerdo a los requerimientos de la entidad e interventoría, en el presente capítulo se abarcan las cantidades de suministros requeridos para el mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá, los ítems a considerar en el presente capítulo son:

- Suministro de Gabinete Integrado de Comunicación (GIC)
- Suministro de Tapas Sencillas y Antivandálicas
- Suministro de Marcos para caja de paso sencilla y dobles (Normales y Antivandálicos)

A la fecha se han recibido 2 órdenes de fabricación en las cuales se incluyen 3 solicitudes que se relacionan a continuación:

Tabla 12. Seguimiento entregas a SDM.

FECHA	OFC. INTERVENTORÍA	SOLICITUD	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTADO
21-may-25	SEM-TEC-M05-F02	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso	50	45 días	FABRICACIÓN
21-may-25	SEM-TEC-M05-F02	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular antivandálica para caja de paso	50	45 días	FABRICACIÓN
21-may-25	SEM-TEC-M05-F02	Suministro de Armario Unificado de comunicaciones y Energía (AUCE) o gabinete Integrado de Comunicaciones- GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	4	90 días	FABRICACIÓN

Fuente: *Grupo consultor*

Estos elementos están aún en proceso de fabricación y serán entregados dentro de los tiempos establecidos para cada ítem.

INFORME MENSUAL DE OBRA		 CONSORCIO Belcoo MOVILIDAD
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

7. CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE CONTRATACIÓN

De acuerdo a los requerimientos de la entidad e interventoría, en el presente capítulo se abarcan los siguientes aspectos:

- Mano de obra no calificada
- Decreto 332
- Relación personal de obra

7.1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

A la fecha de cierre del presente informe no se han iniciado actividades de obra por tanto no se cuenta con personal de mano de obra no calificada.

7.2. DECRETO 332

Durante el mes de mayo de 2025 participaron en el contrato 5 personas en total de las cuales 3 son mujeres

MES	AÑO	TOTAL PERSONAL	TOTAL MUJERES	PORCENTAJE DE MUJERES	% EXIGIDO POR DECRETO 332
MAYO	2025	5	3	60%	13.80%

Tabla 13. Personal de mujeres (Decreto 332) cto. 2025-2780.

MES	AÑO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	OFICIO DE APROBACIÓN	ESTADO
MAYO	2025	NATALIA PATIÑO CHACÓN	1.018.466.251	DIRECTORA DE OBRA	SEM-CMC-CBM-002-25	ACTIVO
MAYO	2025	LUZ DARY LOZADA DELGADO	52.480.993	PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL	SEM-CMC-CBM-007-25	ACTIVO
MAYO	2025	ANGÉLICA MARÍA CUERVO GIL	52.901.081	TÉCNOLOGA EN ÁREAS DE INGENIERÍA SST	SEM-CMC-CBM-007-25	ACTIVO

Fuente: Grupo consultor

7.3. RELACIÓN PERSONAL DE OBRA

A la fecha de corte del 31 de mayo de 2025 no se ejecutaron actividades de campo, por lo tanto, no se relaciona personal por frente de obra.

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

8. SEGUIMIENTO A PLAN DE CALIDAD

A la fecha de corte del mes de mayo de 2025 el plan de calidad se encuentra en estudio y aprobación interna por parte de los profesionales encargados de su redacción, divulgación e implementación. Por tanto, no se relacionan aún los documentos o proceso de seguimiento al plan de calidad.



INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

9. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

1. Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizaron las actividades administrativas generales necesarias para el inicio de trabajos de campo tales como la contratación de personal, búsqueda de maquinaria y equipos, búsqueda y presentación de bodega, compra de materiales e insumos entre otros. Asimismo, se asistió a las capacitaciones y reuniones coordinadas por la secretaría de movilidad e interventoría en las cuales se impartieron pautas y lineamientos para el manejo y presentación de información para los componentes de SST, ambiental y MANTUM.
2. Se recibieron los diseños para las intersecciones nuevas y los conceptos para el primer grupo de complementos a ejecutar durante el contrato. Con esta información, se procedió a realizar las actividades preliminares requeridas a nivel técnico como la toma de información base y la gestión de planes de manejo de tránsito generales y específicos, la identificación de los puntos pertenecientes a zona controlada por el IDPC y el acercamiento con la entidad, la revisión de las actividades a ejecutar según los requerimientos en cada punto y la cuantificación de primer nivel según los resultados.
3. Dentro del presente informe se referencia el informe mensual SST y ambiental del periodo en el cual se complementa la información con relación a las actividades ejecutadas durante el mes para estas áreas e igual la documentación del personal y pagos de planillas de seguridad social del personal aprobado a la fecha.

INFORME MENSUAL DE OBRA		
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de junio de 2025	VERSIÓN: 02	

10. RELACIÓN DE ANEXOS

De acuerdo a los requerimientos de la entidad e interventoría, en el presente capítulo se abarcan los siguientes aspectos:

- ANEXO 1. ACTA DE INICIO
- ANEXO 2. PÓLIZAS CONTRACTUALES
- ANEXO 3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA
- ANEXO 4. CONTROL DE LLUVIAS

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2025-2780, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **PEDRO ANTONIO LOPEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.479.479 de Bogotá, representante legal de la Interventoría **CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL**, por una parte, y por la otra, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.249.755 de Suba, en su calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD** con Nit No. 901.933.921-0, con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

OBJETO	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO SUCEDA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$5.141.951.324)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 106 DEL 2 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$38.800.000.000) M/CTE.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2448 DEL 21 DE ABRIL DE 2025 POR CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$5.141.951.324)
GARANTIAS	Amparo: CUMPLIMIENTO De 14/04/2025 hasta 14/02/2031 por valor de \$7.198.731.853,60.
	Número de póliza: 400063638
	Aseguradora: Nacional de Seguros
	Fecha de aprobación: 28/04/2025
	Amparo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL De 14/04/2025 hasta 14/02/2026 por valor de \$ 569.400.000,00.
	Número de póliza: 400063639





SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2025-2780, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.**

	Aseguradora: Nacional de Seguros
	Fecha de aprobación: 28/04/2025

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2025.

PEDRO ANTONIO LOPEZ
C.C. No. 19.479.479
Representante Legal
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Interventor

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
C.C. No. 79.249.755
Representante Legal
CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD
Contratista





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
189328	BOGOTÁ	11		30	400063638	1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
26 / 5 / 2025	29 / 4 / 2025	00:00	28 / 2 / 2031	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.				NIT	901.933.921 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 105 NO. 46-26, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO	6017689259
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.				NIT	901.933.921 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 105 NO. 46-26, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO	6017689259
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD			NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO 3241000
BENEFICIARIO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD			NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO 3241000
OBJETO DEL SEGURO						
SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO.2025-2780, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON FECHA DE TERMINACION 28 DE FEBRERO DE 2026.						
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.						
OBJETO DE LA POLIZA:						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONST. IN

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	29/08/2026	1.542.585.397.20	0.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	28/02/2029	514.195.132.40	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/05/2026	28/05/2031	1.542.585.397.20	0.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	29/04/2026	28/08/2026	2.056.780.529.60	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2025	28/08/2026	1.542.585.397.20	0.00

ACLARACIONES					

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Día - Mes - Año 25/06/2025	901933921

VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS			
\$ 7.198.731.853,60		SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESE!			

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	2149	100,00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400063638	1	BOGOTA	26 /5 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 29 /4 /2025	00:00 Horas del 28 /2 /2031	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO 7463219

TOMADOR	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.	NIT	901.933.921 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 105 NO. 46-26, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017689259
ASEGURADO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AV CALLE 13 No. 37 - 35, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AV CALLE 13 No. 37 - 35, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO No. 2025-2780 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., PARA EL LOTE No.1.

ASEGURADO BENEFICIARIO: DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD NIT 899.999.061-9

- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS SERÁ DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.

EL CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD NIT. 901.933.921-0 SE ENCUENTRA INTEGRADO POR:

- BELZCON SAS NIT.901.252.860-7 PART.90%
- INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS NIT.891.200.711-1 PART.10%

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/06/2025	\$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 26 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400063638, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.

NIT : 901.933.921 - 0

Asegurado : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT : 899.999.061 - 9

Se expide la presente certificación a los 26 días del mes de Mayo de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
189329	BOGOTÁ	11		15	400063639	1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
26 / 5 / 2025	29 / 4 / 2025	00:00	28 / 2 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.	NIT	901.933.921 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 105 NO. 46-26, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.	NIT	901.933.921 - 0	TELÉFONO	6017689259
BENEFICIARIO	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.	NIT	901.933.921 - 0	TELÉFONO	6017689259

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	569,400,000.00	569,400,000.00	569,400,000.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569,400,000.00	569,400,000.00	569,400,000.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	569,400,000.00	569,400,000.00	569,400,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	569,400,000.00	569,400,000.00	569,400,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569,400,000.00	569,400,000.00	569,400,000.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Día - Mes - Año 07/06/2025	901933921

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 569.400.000,00	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	2149	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA		ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD		CIUDAD DE EXPEDICIÓN	
400063639		1		BOGOTA		Día - Mes - Año 26 5 2025		BOGOTÁ, D.C.	
VIGENCIA DESDE		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		TIPO DE MOVIMIENTO	
Día - Mes - Año		Horas		Día - Mes - Año		Horas		MODIFICACIÓN	
29 4 2025		00:00		28 2 2026		00:00			
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO									
NOMBRE		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.						NIT 901.933.921 - 0	
DIRECCIÓN		CALLE 105 NO. 46-26, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL						TELÉFONO 6017689259	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.				NIT 901.933.921 - 0		TELÉFONO 6017689259	
BENEFICIARIO		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.				NIT 901.933.921 - 0		TELÉFONO 6017689259	

ANEXO 1:

SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO.2025-2780, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON FECHA DE TERMINACION 28 DE FEBRERO DE 2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CONTRATO No.2025-2780 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., PARA EL LOTE No.1.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD NIT 899.999.061-9

*SE INCLUYE LA COBERTURA ADICIONAL DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. *

EL CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD NIT. 901.933.921-0 SE ENCUENTRA INTEGRADO POR:

-BELZCON SAS NIT.901.252.860-7 PART.90%

-INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS NIT.891.200.711-1 PART.10%

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400063639

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
07/06/2025	\$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 26 DE 2,025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CONTRATO		SDM - 2025 - 2780								
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD								
C E	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ	Entregado a ORFEO	RECIBIDO INTERVENTORIA	N°ORFEO	
BEL-SDM-ADM-001-25	29-abr-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Información medios de comunicación CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	E	GPC	SI	CMC-SEM-028	202561201470222	
BEL-SDM-ADM-002-25	30-abr-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Solicitud aplicación de la Excepción contemplada en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 20	E	GPC	SI	CMC-SEM-029	202561201472472	
BEL-SDM-ADM-003-25	30-abr-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Directora de Obra – Natalia Patiño	E	GPC	SI	CMC-SEM-030	202561201474042	
BEL-SDM-ADM-004-25	5-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Solicitud de no aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)	E	GPC	SI	CMC-SEM-033	202561201512352	
BEL-SDM-ADM-005-25	6-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Planes de Manejo de trafico (Típicos)	E	NPC	SI	CMC-SEM-036	202561201529992	
BEL-SDM-ADM-006-25	6-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Análisis de Precios Unitarios	E	NPC	SI	CMC-SEM-037	202561201531742	
BEL-SDM-ADM-007-25	7-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Especialista de Transito - Javier Andres Meza	E	GPC	SI	CMC-SEM-041	202561201535722	
BEL-SDM-ADM-008-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentacion de Bodega	E	NPC	SI	CMC-SEM-054	202561201555332	
BEL-SDM-ADM-009-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Programa de obra_Intersecciones Nuevas	E	NPC	SI	CMC-SEM-056	202561201566952	
BEL-SDM-ADM-0010-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Desglose del A	E	NPC	SI	CMC-SEM-059	202561201567312	
BEL-SDM-ADM-0011-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Grúa	E	NPC	SI	CMC-SEM-057	202561201567612	
BEL-SDM-ADM-0012-25	8-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hojas de vida personal administrativo	E	NPC	SI	CMC-SEM-058	202561201568032	
BEL-SDM-ADM-0013-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentacion de Vehiculo para Personal Administrativo	E	NPC	SI	CMC-SEM-069	202561201572512	
BEL-SDM-ADM-0014-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Relación equipo mínimo, maquinaria, herramienta y equipos	E	NPC	SI	CMC-SEM-071	202561201573162	
BEL-SDM-ADM-0015-25	9-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance de presentación de Grúa y Conductor	E	NPC	SI	CMC-SEM-072	202561201575152	
BEL-SDM-ADM-0016-25	13-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Auxiliar de Ingeniería - Miguel Chavarro	E	NPC	SI	CMC-SEM-094	202561201614082	
BEL-SDM-ADM-0017-25	13-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Conductor Vehiculo administrativo - Carlos Andres Chavarro	E	NPC	SI	CMC-SEM-081	202561201616582	
BEL-SDM-ADM-0018-25	14-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atn. Obs. Interventoría Planes de manejo de trafico (Típicos) V1	E	NPC	SI	CMC-SEM-083	202561201633772	
BEL-SDM-ADM-0019-25	14-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Informe mensual de obra mes abril de 2025 V0	E	NPC	SI	CMC-SEM-084	202561201634192	
BEL-SDM-ADM-0020-25	15-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - SPMT	Planes de Manejo de trafico (Típicos) - Cto. 2025-2780 Lote 1	E	NPC	SI	CMC-SEM-095	202561201666352	
BEL-SDM-ADM-0021-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Acreditación Cumplimiento Decreto 332 de 2020 01-15 Mayo	E	NPC	SI	CMC-SEM-102	202500001063462	
BEL-SDM-ADM-0022-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance oficio 202561201567612 presentación grúa	E	NPC	SI	CMC-SEM-096	202561201681612	
BEL-SDM-ADM-0023-25	16-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Toma de información #1 intersecciones nuevas	E	NPC	SI	CMC-SEM-103	202561201680162	
BEL-SDM-ADM-0024-25	21-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Proveedor - Perforacion Horizontal	E	NPC	SI	CMC-SEM-111	202561201739422	
BEL-SDM-ADM-0025-25	21-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Proveedor - Ensayos	E	NPC	SI	CMC-SEM-112	202561201740402	
BEL-SDM-ADM-0026-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Plan de Manejo Ambiental_v0	E	NPC	SI	CMC-SEM-128	202561201772262	
BEL-SDM-ADM-0027-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Plan de Gestion de RCD_v0	E	NPC	SI	CMC-SEM-127	202561201772712	
BEL-SDM-ADM-0028-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Entrega Relación de Dotación y Emblemas	E	NPC	SI	CMC-SEM-125	202561201767812	
BEL-SDM-ADM-0029-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Análisis de Precios Unitarios V1	E	NPC	SI	CMC-SEM-126	202561201768462	
BEL-SDM-ADM-0030-25	23-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Remisión Hoja de Vida Personal Administrativo y Tecnico V1	E	NPC	SI	CMC-SEM-137	202561201769302	
BEL-SDM-ADM-0031-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención a radicado SEM-CMC-CBM-009-25, Corrección de garantía de cumplimiento	E	NPC	SI	CMC-SEM-143	202561201797922	
BEL-SDM-ADM-0032-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentacion de Bodega V2	E	NPC	SI	CMC-SEM-136	202561201788642	
BEL-SDM-ADM-0033-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance oficio 202561201634192 informe mensual de obra mes abril de 2025 V1	E	NPC	SI	CMC-SEM-138	202561201789172	
BEL-SDM-ADM-0034-25	26-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención a radicado SEM-CMC-CBM-003-25, aprobación del vehiculo de transporte de personal	E	NPC	SI	CMC-SEM-139	202561201790962	
BEL-SDM-ADM-0035-25	27-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Presentación de Hv. Inspector de Obra, Cristian Camilo Maldonado	E	NPC	SI	CMC-SEM-147	202561201814522	
BEL-SDM-ADM-0036-25	27-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance a Hoja de Vida Maestro de Obra	E	NPC	SI	CMC-SEM-148	202561201816802	
BEL-SDM-ADM-0037-25	28-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atención de observaciones SDM V1 - PMT Típicos	E	NPC	SI	CMC-SEM-153	202561201666352	
BEL-SDM-ADM-0038-25	28-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Alcance a relación equipo mínimo, maquinaria, herramienta y equipos	E	NPC	SI	CMC-SEM-151	202561201826482	
BEL-SDM-ADM-0039-25	30-may-25	C BELZCON MOVILIDAD	SDM - CONSORCIO CAPITAL	Atencion de observaciones, Programa de obra V1	E	NPC	SI	CMC-SEM-160	202561201869092	

CONTRATO CONTRATISTA	SDM - 2025 - 2780
	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

No	CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO RECIBIDO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	E	COMPONENTE
1	SEM-CMC-CBM-001-25	7/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud de desagregación del componente de Administración (A) Contrato No. 2025-2780.	R	Juridico
2	SEM-CMC-CBM-002-25	12/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Aprobación H.V DIRECTOR Y ESPECIALISTA EN TRANSITO	R	Administrativo
3	SEM-CMC-CBM-003-25	20/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Presentación vehículo para personal administrativo Contrato 2025-2780	R	Administrativo
4	SEM-CMC-CBM-004-25	20/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Presentación Bodega - Contrato 2025-2780.	R	Administrativo
5	SEM-CMC-CBM-005-25	20/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Remisión Hoja de Vida Conductor vehículo administrativo	R	Administrativo
6	SEM-CMC-CBM-006-25	20/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Intersecciones Semaforizadas y Complementos	R	Administrativo
7	SEM-CMC-CBM-007-25	21/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Hojas de vida del personal profesional	R	Administrativo
8	SEM-CMC-CBM-008-25	22/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud del Plan Estrategico de Seguridad Vial	R	SST
9	SEM-CMC-CBM-009-25	23/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Solicitud de ajuste de pólizas con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio - Contrato No. 2025-2780.	R	Juridico
10	SEM-CMC-CBM-010-25	23/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Actualizacion medios de comunicación Consorcio Movilidad Capital	R	Administrativo
11	SEM-CMC-CBM-011-25	27/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicados BEL-SDM-ADM-011-25, BEL-SDM-ADM-015-25 y BEL-SDM-ADM-022-25 - Presentación de Grúa y conductor	R	Administrativo
12	SEM-CMC-CBM-012-25	27/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicado BEL-SDM-ADM-014-25 ?Relación equipo mínimo, maquinaria y herramienta CTO 2025-2780.	R	Administrativo
13	SEM-CMC-CBM-013-25	30/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicados BEL-SDM-ADM-019-25 y BEL-SDM-ADM-033-25 Informe mensual de obra mes abril de 2025 v1 Contrato No. 2025-2780 (Lote 1).	R	Administrativo
14	SEM-CMC-CBM-014-25	30/5/2025	CE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	Respuesta a comunicado BEL-SDM-ADM-009-25 Remisión Programa de obra - Intersecciones nuevas -Contrato 2025-2780	R	Técnico

CONTROL DE LLUVIAS

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE APROBACIÓN: 2 de mayo de 2025

VERSIÓN: 01

IDENTIFICACION DEL FRENTE DE OBRA: _____

MES: _____

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<div>LLUVIA</div> <div>HORA</div>	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	
	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	Llovizna	Lluvia fuerte	
6 - 7 AM																															
7 - 8																															
8 - 9																															
9 - 10																															
10 - 11																															
11 - 12																															
12 - 1 PM																															
1 - 2																															
2 - 3																															
3 - 4																															
4 - 5																															
5 - 6																															
6-7																															
7-8																															
8-9																															
9-10																															
10-11																															
11-12																															

NOTA: En las casillas correspondientes marque una "X", cruzando la fecha y el tipo de lluvia con la(s) hora(s) que duró.
