




Fw: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA DE REUNIÓN MINVIVIENDA 31 DE JULIO DE 2025

Desde Camilo Andres Jimenez Carrascal <CJimenez@minvivienda.gov.co>
Fecha Mar 12/08/2025 11:17
Para Adriana Rodriguez Correa <ARodriguezC@minvivienda.gov.co>; Justo Mauricio Cepeda Arenas <JMCepeda@minvivienda.gov.co>
CC Aura Janneth Santana Adames <AJSantana@minvivienda.gov.co>

 10 archivos adjuntos (3 MB)
APORTES CAROLINA GOMEZ.pdf; APORTES DAVID MARTINEZ.pdf; APORTES JEISSON ESPINOSA.pdf; Licencia JORGE GROSSO.pdf; Parafiscales ISMAEL ENRRIQUE GROSSO 11250509_ 0825.pdf; parafiscales JORGE ENRIQUE GROSSO 80253268 08_25.pdf; Parafiscales JOHN JAIRO MUNOZ RODRIGUEZ_ 80252811 08_25.pdf; Parafiscales Rómulo Suarez.pdf; Tarjeta de propieda.pdf; WHO381 SOAT 24-25.pdf;

Buenos dias estimada Adriana.

Agradezco autorizar el ingreso del personal y vehículo de la Empresa Metro de Bogotá relacionados en correo que antecede el
Día 13 de agosto desde las 8 am, para realizar la limpieza de tuberías y cajas con equipo vactor en la sede Fragua.

El acompañamiento de la actividad será realizado por el arquitecto Mauricio Cepeda.

Cordialmente,

De: Romulo Suarez Fiesco (BUILDING SECTION) <romulo.s@metro1.com.co>
Enviado: martes, agosto 12, 2025 10:58 a.m.
Para: Camilo Andres Jimenez Carrascal <CJimenez@minvivienda.gov.co>
CC: Juan Carlos Montañez (BUILDING SECTION) <juanc.m@metro1.com.co>; Andres Felipe Forero (BUILDING SECTION) <andres.f@metro1.com.co>; Leidy Carolina Gomez (BUILDING SECTION) <leidycarolina.g@metro1.com.co>; Nicolas David Garcia (BUILDING SECTION) <nicolasd.g@metro1.com.co>; David Leonardo Martinez (BUILDING SECTION) <davidleonardo.m@metro1.com.co>
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA DE REUNIÓN MINVIVIENDA 31 DE JULIO DE 2025


Buen día,

Se informa que se ha programado el vehículo vactor para el día 13 de agosto de 2025, en la jornada de la mañana. Cabe señalar que no fue posible su desplazamiento el pasado 8 de agosto de 2025 debido a asuntos administrativos. A continuación, se detalla el personal asignado.

NOMBRE	CEDULA
ISMAEL ENRRIQUE GROSSO	11250509

JORGE ENRIQUE GROSSO	80253268
JOHN JAIRO MUNOZ RODRIGUEZ	80252811
CAROLINA GOMEZ	1031154399
JEISSON ANDRES ESPINOSA	1016087207
DAVID LEONARDO MARTINEZ	1018474628
RÓMULO SUAREZ FIESCO	1018431119

Cordialmente,

Rómulo Suarez Fiesco
Building Section | Network Senior Engineer
METRO LÍNEA 1 SAS
AV 1ª de mayo No. 68i - 12
Bogotá, Colombia
Mail: romulo.s@metro1.com.co


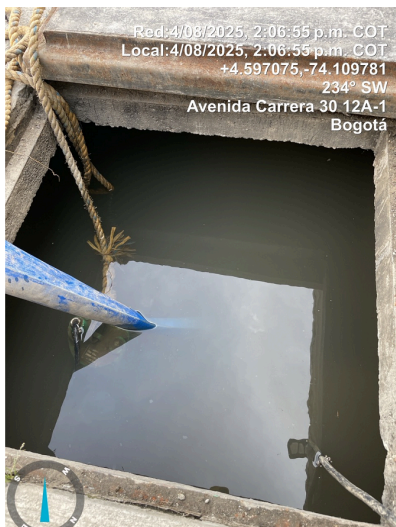
From: Romulo Suarez Fiesco (BUILDING SECTION)
Sent: Monday, August 4, 2025 7:13 PM
To: Camilo Andres Jimenez Carrascal <cjimenez@minvivienda.gov.co>
Cc: Juan Carlos Montañez (BUILDING SECTION) <juanc.m@metro1.com.co>; Andres Felipe Forero (BUILDING SECTION) <andres.f@metro1.com.co>; Leidy Carolina Gomez (BUILDING SECTION) <leidycarolina.g@metro1.com.co>
Subject: RE: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA DE REUNIÓN MINVIVIENDA 31 DE JULIO DE 2025

Buena tarde.

De acuerdo con los compromisos establecidos durante la reunión del pasado 31 de julio de 2025, se informa lo siguiente:

1. El PMAS fue enviado el 1 de agosto de 2025.
2. La llegada del equipo Vactor está programada para el 8 de agosto de 2025. No obstante, existe la posibilidad de que se adelante su arribo, situación que será informada oportunamente.
3. El 31 de julio de 2025 se instaló un tanque para el almacenamiento del polímero extraído de la caja de aguas lluvias. Sin embargo, el 1 de agosto se continuó con la extracción, trasladando el material a un segundo tanque ubicado dentro del lote donde se ejecuta la construcción del edificio ascendente 2 de la Estación 9 del Proyecto PLMB.
Adicionalmente, el día de hoy se llevó a cabo la limpieza al interior de las bodegas, así como la extracción del agua lluvia acumulada en la caja interna. En este sentido, a partir de este momento, todo lo que ingrese a dicha caja corresponderá únicamente a aguas lluvias, por lo cual su manejo y disposición será responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).





4. El concepto patológico será entregado por ML1 a la interventoría el día 8 de agosto de 2025. Una vez sea revisado, se procederá con su socialización al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

Cordialmente,

Rómulo Suarez Fiesco

Building Section | Network Senior Engineer

METRO LÍNEA 1 SAS

AV 1ª de mayo No. 68i - 12

Bogotá, Colombia

Mail: romulo.s@metro1.com.co

 **METRO LÍNEA 1**

From: Camilo Andres Jimenez Carrascal <CJimenez@minvivienda.gov.co>

Sent: Friday, August 1, 2025 1:14 PM

To: adriana.ocampo@metrodebogota.gov.co; JAVIER MAURICIO GUARNIZO RODRIGUEZ

<javier.guarnizo@metrodebogota.gov.co>; NATALIA ESCOBAR CARREÑO

<natalia.escobar@metrodebogota.gov.co>; Romulo Suarez Fiesco (BUILDING SECTION)

<romulo.s@metro1.com.co>; Leidy Nayibe Segura Galicia <socialmetro9@inacar.com>; Leidy Carolina Gomez

(BUILDING SECTION) <leidycarolina.g@metro1.com.co>

Cc: Aura Janneth Santana Adames <AJSantana@minvivienda.gov.co>; Luz Nelly Ortiz Moya <LNOrtiz@minvivienda.gov.co>; Martha Liliana Vergara Ramirez <MLVergara@minvivienda.gov.co>; Andrea Catalina Benrey Reyes <ABenrey@minvivienda.gov.co>; Julian Giovanni Morales Calderon <JMorales@minvivienda.gov.co>; Diana Cristina Ruiz Melo <DRuiz@minvivienda.gov.co>; Tania Karina Garcia Martin <TKGarcia@minvivienda.gov.co>; Lenny Farley Diaz Suarez <LFDiaz@minvivienda.gov.co>
Subject: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA DE REUNIÓN MINVIVIENDA 31 DE JULIO DE 2025

Buenas tardes.

Acorde a la reunión llevada a cabo el 31 de julio de 2025 en las instalaciones de la sede fragua del Ministerio de Vivienda, y con base en los compromisos establecidos en el acta adjunta y acordados con La Empresa Metro de Bogotá, Metro línea 1 e interventoría y contratista de obra, se presenta balance de cumplimiento de acuerdos siendo las 1:00 pm del 1 de agosto de 2025, de las gestiones que se han realizado y las que están pendientes para mitigar los riesgos expuestos, por las obras alentadas por la EMB.

1. Envío del plan de manejo ambiental: Pendiente, el compromiso es enviarlo el 1 de agosto.
2. Informar la fecha en que llega el equipo vector: Pendiente, se informará el 4 de agosto la fecha de ingreso a la sede del ministerio del equipo vector.
3. Instalación de Isotank: Parcialmente ejecutado, la capacidad del mismo es insuficiente y se encuentra totalmente lleno. La caja continúa llenándose, no es una solución definitiva a los vertimientos generados por la EMB. Se requiere garantizar la evacuación continua de la caja acorde al plan de manejo ambiental. De igual forma realizar la limpieza continua del lodo de perforación al interior de las bodegas toda vez que no se evidencia personal del metro realizando la limpieza el día de hoy.



4. Entrega concepto de patología e informe de afectación acorde a acta de vecindad del año 2023: Pendiente, se informará el 4 de agosto, la fecha d entrega definitiva.
5. Monitoreo de la empresa metro en el fin de semana de los vertimientos: Pendiente informar el personal que estará haciendo el monitoreo para autorización de ingreso

durante el fin de semana.

6. Monitoreo par parte de ML1 de trabajos realizados durante el pilotaje: En proceso. Se hace presencia periódica por parte de la interventoría y contratista de obra.
7. Reforzamiento estantes críticos pasillos 10 y 11: En proceso. Por criterio del concesionario únicamente se realizó refuerzo mediante la instalación de nuevos parales y arriostramiento de las filas 10 y 11.



Con base en lo anterior se solicita el cumplimiento estricto de los compromisos, e informar oportunamente del avance en la gestión

Cordialmente,



Contratista

Andrés Camilo Jiménez Carrascal

Grupo de Recursos Físicos

cjimenez@minvivienda.gov.co

+60 (1) 3323434 Ext: 4329

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

AVISO LEGAL:

El contenido de este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial y/o datos personales. Se encuentra dirigido exclusivamente al destinatario, sin la intención de que sea conocida por terceros.

Su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes con la protección de datos personales.

Si usted no es el destinatario correcto, le agradecemos que nos informe de este incidente al correo correspondencia@minvivienda.gov.co y por favor elimine la información de su sistema.

Recuerde que cualquier revisión, divulgación, reproducción, distribución o uso no autorizado de la misma está estrictamente prohibido y acarreará responsabilidades legales.

AVISO LEGAL:

El contenido de este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial y/o datos personales. Se encuentra dirigido exclusivamente al destinatario, sin la intención de que sea conocida por terceros.

Su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes con la protección de datos personales.

Si usted no es el destinatario correcto, le agradecemos que nos informe de este incidente al correo correspondencia@minvivienda.gov.co y por favor elimine la información de su sistema.

Recuerde que cualquier revisión, divulgación, reproducción, distribución o uso no autorizado de la misma está estrictamente prohibido y acarreará responsabilidades legales.
