

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.2704-2024

OAC

LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

Contrato de Interventoría No.3565-2024

Interventoría: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

Objeto Convenio Solidario:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.1

MES O PERIODO: nov-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		3
2.1	Localización		3
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		3
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		3
2.4	Características técnicas del proyecto		3
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		4
3.1	Información general del contrato		4
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		4
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		4
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		4
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios		
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio		
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso		
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS		
	Actas de Comité Operativo		
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		5
5.1	Información general del contrato		5
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
5.3	Informes especialistas y profesionales		5
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		5
5.5	Informe matriz de riesgos.		5
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	N/A	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		6
8	Anexos		6
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		7
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		5 Y 6
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4674 de fecha 4/10/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

		INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA	3/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
1. INTRODUCCION							
PROYECTO:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL		
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	META	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	1	nov-24	NO ☐		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	NUMERO DEL PROCESO:	ID DEL SECO:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
3565-2024	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024	CO1.SLCNTR.13459802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI			
CONVENIO No.:	ID DEL SECO:	OBJETO CONVENIO	ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDIGENA:				
2704-2024	SPSC-CD-CS-489-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE				
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO							
2.1 LOCALIZACION:							
DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA / COMUNIDAD O RESGUARDO INDIGENA	TRAMO DE LA VIA A INTERVENIR:	LONGITUD DEL TRAMO	ACTIVIDAD ECONOMICA:		
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	Corredor vial comprendido "entre el anillo Agua Bonita - Vieja Oriental - Santa Rosa", que tiene una longitud de atención de 3,84 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 "Trocha Ganadera" y el punto final de referencia es PR03+840 "Yamid"	3,84 KM	Agrícola		
IMAGENES DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO							
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Localización vía a intervenir-Arcgis - FiledMaps FUENTE: Anexo técnico INVIAS			DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Localización de la vía existente FUENTE: Propia				
2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA							
MUNICIPIOS DE INFLUENCIA		BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:					
SAN JOSE DEL GUAVIARE		Construcción de un (1) Box Culvert, obras de drenaje transversal (ODT) tipo alcantarilla, destinadas a optimizar la capacidad hidráulica de la infraestructura vial, mediante el control y canalización eficiente de los flujos de agua en el área adyacente vehicular y 35 metros de placa huella, mejorando la durabilidad de la infraestructura vial en sectores rurales o de difícil acceso.					
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA							
FOTO INICIAL			FOTO AVANCE				
LOCALIZACION:	Municipios de San José del Guaviare Juntas de Acción Comunal de San José PR 0+490		LOCALIZACION:	Municipios de San José del Guaviare Juntas de Acción Comunal de San José Socialización			
DESCRIPCION:	Vias destapadas y alcantarilla sin estructura		DESCRIPCION:	Levantamiento topografico de interventoria			
2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (parámetros de diseño, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores)							
TIPO DE OBRA	ESTRUCTURA HIDRAULICA	DESCRIPCION TECNICA:	Estructura hidráulica destinada a garantizar el flujo adecuado de agua.				
UBICACIÓN	PR0+490	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) BOX CULVERT	UBICACIÓN	PR3+104 AL PR3+139	CONSTRUCCIÓN DE 35 METROS DE PLACA HUELLA		
ESQUEMA							

INFORME MENSUAL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA

3/12/2024
(Día / Mes / Año)

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

NUMERO DEL PROCESO:

CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024

ID DEL SECOP:

CO1.SLCNTR.13459802

CONTRATO No:

3565-2024

FECHA SUSCRIPCIÓN

11-sep-24

CONTRATISTA

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

INTEGRANTES

% PARTICIPACION

INTEGRANTES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE

N.A

OBJETO CONTRATO:

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -- LOTE 4.

NT

830.509.427-9

REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ

NUMERO DE CONTACTO

3176446297

VALOR INICIAL

\$ 2.014.395.039,00

ADICION

\$ -

VALOR ACTUALIZADO

\$ 2.014.395.039,00

ORDEN DE INICIO

17-oct-24

FECHA ORDEN DE INICIO

17/10/2024

PLAZO INICIAL

2 MESES Y 13 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31/12/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA

31/12/2024

PRORROGAS

SUSPENSIONES

ESTADO DEL CONVENIO

EJECUCION

No	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN
N.A	N.A	N.A

No	AMPLIACION DE SUSPENSION	PLAZO	FECHA REANUDACION	FECHA TERMINACIÓN
N.A	N.A			

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

1. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO SUMINISTRADA POR INVIAS
2. VISITA DE INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA ZONA DEL PROYECTO
3. REVISIÓN Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES A VINCULAR AL PROYECTO
4. ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL No.1
5. ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES CITADAS POR LA REGIONAL META
6. RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE EQUIPO DE INTERVENTORIA PARA APROBACIÓN DE INVIAS
7. RADICACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE FIRMAS, CUENTA BANCARIA CONJUNTA DEL CONVENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTION SOCIAL

1. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD
2. REUNION DE ACLARACIÓN DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD SOBRE INICIO DEL PROYECTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL

1. RECOLECCION DE MATERIAL PETREO PARA ELABORACIÓN DE ENSAYOS
2. VISITA PLANTA DE AGREGADOS DE LA ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO

RESPONSABLE

ING. ZAYRA JOHANA BAUTISTA VARELA TP-68238-249691 STD

Ing. Zayra Bautista

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION SEGUIMIENTO SST

RESPONSABLE

ESPECIALISTA

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION SEGUIMIENTO SST

RESPONSABLE

ESPECIALISTA

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO

6. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA					
DESCRIPCION	FORMATO	OBSERVACIONES			
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	ANEXO	SI	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	ANEXO	SI	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	ANEXO	SI	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	ANEXO	SI	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	ANEXO	N/A	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	MEPI-MN-IN-3-FR-1	ANEXO	N/A	
	Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-2	ANEXO	N/A	
	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	ANEXO	SI	
	Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	ANEXO	N/A	
	Bitacora		ANEXO	N/A	
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES					
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	Nº	FECHA	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA		
	ASUNTO/REFERENCIA				
	DIRIGIDO A				
	OF-INTER_LOTE4-001	18-sep-24	RADICACION DE POLIZAS DE INTERVENTORIA		
	OF-INTER_LOTE4-002	1-nov-24	Solicitud de Anticipo y Documentación para Apertura de Cuenta Conjunta		
	OF-INTER_LOTE4-003	12-nov-24	SOLICITUD DE REVISIÓN Y AVAL DE HOJAS DE VIDA PARA INICIO DE ETAPA DE ALISTAMIENTO		
	OF-INTER_LOTE4-004	18-nov-24	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO EN LOS 16 CONVENIOS CON ORDEN DE INICIO		
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas correspondientes a la etapa previa de alistamiento, como revisión de la documentación e información inicial del proyecto, reuniones y capacitaciones convocadas por la entidad contratante- INVIAS.		Correo electrónico	29-oct-24	0. Información General y formatos convenios 2024	Grucoring S.A.S
		Correo electrónico	29-oct-24	Informes Grucorin SAS	Grucoring S.A.S
ELABORÓ					
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		PROFESIONAL	Ing. Alvaro Solano Aguilar	
APROBÓ			MATRICULA PROFESIONAL	05202-66512 ANT	
CARGO	SUPERVISOR		PROFESIONAL	Ing. Carlos German Corzo Upegui	
			MATRICULA PROFESIONAL	25202-250038	
			FRMA		
			FRMA		

	REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
					FECHA	3/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
PROYECTO:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL	
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	META	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	1	nov-24	NO ☐	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	NUMERO DEL PROCESO:	ID DEL SECOP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
3565-2024	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024	CO1.SLCNTR.13459802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
CONVENIO No.:	ID DEL SECOP:	OBJETO CONVENIO	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDIGENA:			
2704-2024	SPSC-CD-CS-489-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE			

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	<div><p>San José del Guaviare Colombia INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO Y ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES LECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LAS ZONAS SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 4</p></div> <p>DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Socialización de actividades del proyecto- San José del Guaviare</p> <p>FUENTE: Propia</p>
<div></div> <p>DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Visita a planta de agregados de la zona</p> <p>FUENTE: Propia</p>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																															
			VERSIÓN	1																															
			PÁGINA																																
			FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																
CONTRATO No. 2704-2024			CONTRATISTA: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE																																
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3565-2024			INTERVENTORÍA: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																			
TOTAL ACTIVO																																			
TOTAL EN REPARACIÓN																																			
TOTAL INACTIVO																																			
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																			
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																			
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																			
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																			
Firma _____ N.A. _____ Nombre: _____ Residente de Obra _____ Matrícula Profesional No.: _____																																			
Firma _____ Nombre: Deyanira Cristancho Residente de Interventoría _____ Matrícula Profesional No.: 25202-82693 CND																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN		1									
																					PÁGINA											
																				FECHA		3/12/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: META												
CONTRATO DE OBRA No: 2704-2024																				CONTRATISTA: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24																				PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3565-2024																				INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco															8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			88
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																
<div><div>Firma N.A</div><div>Nombre: _____</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: _____</div></div> <div><div>Firma </div><div>Nombre: Deyanira Cristancho</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-82693 CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META	
CONTRATO DE OBRA No.:		2704-2024				CONTRATISTA: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		nov-24				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		3565-2024				INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
OBSERVACIONES:									
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma		N.A				Firma			
Nombre:						Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar			
Director de Obra						Director de Interventoría			
Matrícula Profesional No.:						Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																																	
		VERSIÓN	1																																																																	
		PÁGINA																																																																		
		FECHA	3/12/2024 (Día) (Mes) (Año)																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																																		
CONTRATO DE OBRA No. 2704-2024		CONTRATISTA: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																				
FECHA DE INICIO: 11/10/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199.447.553,00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.447.553,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 19.944.755,30</td><td>2</td><td>8</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9.972.377,65</td><td>2</td><td>8</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>27</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 39.889.510,60</td><td>31</td><td>12</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>29</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 19.944.755,30	2	8	24	31	12	25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.972.377,65	2	8	24	31	12	27	Calidad de Estudios y Diseños									Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39.889.510,60	31	12	24	31	12	29
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Cumplimiento	10%	\$ 19.944.755,30	2	8	24	31	12	25																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.972.377,65	2	8	24	31	12	27																																																												
Calidad de Estudios y Diseños																																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39.889.510,60	31	12	24	31	12	29																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100043420 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																				
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 260.000.000,00</td><td>2</td><td>8</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	2	8	24	31	12	24	Otros																																			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	2	8	24	31	12	24																																																												
Otros																																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV-100011576 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																																				
		VERSIÓN	1																																																																				
		PÁGINA																																																																					
		FECHA	3/12/2024																																																																				
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																							
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																														
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																					
Cumplimiento																																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																																							
Calidad de Estudios y Diseños																																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																																							
VIGENCIA																																																																							
Desde			Hasta																																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																																																							
Certificado de modificación o anexo No.:																																																																							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																							
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																							
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																							
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																																							
Otros																																																																							
VIGENCIA																																																																							
Desde			Hasta																																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																																							
Certificado de modificación o anexo No.																																																																							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																							
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																																																							
NOTAS:																																																																							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																																							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																																							
Firma																																																																							
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar																																																																							
Director de Interventoría																																																																							
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT																																																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																																							
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO					
		VERSIÓN	14 de 26				
		PÁGINA					
		FECHA	03/12/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META					
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 2704-2024 (Indicar número y año)		EJECUTOR: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE					
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS					
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ -	#¡DIV/0!
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)					\$ -	#¡DIV/0!
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -	#¡DIV/0!
4							
5							
N							
	TOTAL					\$ -	#¡DIV/0!
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica. 2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría. 3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio. 4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica) . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: N.A Nombre: JAIRO ALONSO COY TORRES Representante Legal o su Apoderado Ejecutor		Firma: Nombre: LUZ-ANGELA YARAMILLO DIAZ Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD					
Firma: N.A Nombre: Contador de la OAC Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Tarjeta Profesional No.:		Firma: N.A Nombre: Ingeniero Residente del Proyecto Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.:					
Contratista Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS					CÓDIGO	15 de 26				
						VERSIÓN					
						PÁGINA					

FECHA

03/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.

1

MES:

nov-24

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

☐

CONVENIO No.

2704-2024
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO:

0

%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:

\$ -

(M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL

LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3565-2024
(Indicar número y año)

0

INTERVENTOR:

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		\$ -	\$ -		\$ -
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL		\$ -	\$ -		\$ -
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ -				

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:

N.A

Nombre:

JAIRO ALONSO COY TORRES

Representante Legal OAC

Ejecutor

Firma:

N.A

Nombre:

LUZ ANGELA JARAMILLO

Representante Legal o Delegado

Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma:

N.A

Nombre:

Contador de la OAC

Tarjeta Profesional No.:

Firma:

N.A

Nombre:


Ingeniero Residente del Proyecto

Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica


Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3565-2024			INTERVENTORÍA: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																													
CONTRATO DE OBRA No. 2704-2024			CONTRATISTA: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MARCA FOTON-MODELO 2020-2776 CC-PLACAS GZO322															A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Fecha de mantenimiento camioneta 8 de noviembre de 2024																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div>Firma</div><div>Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT</div></div> <div><div>Firma</div><div>Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 25202-250038</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

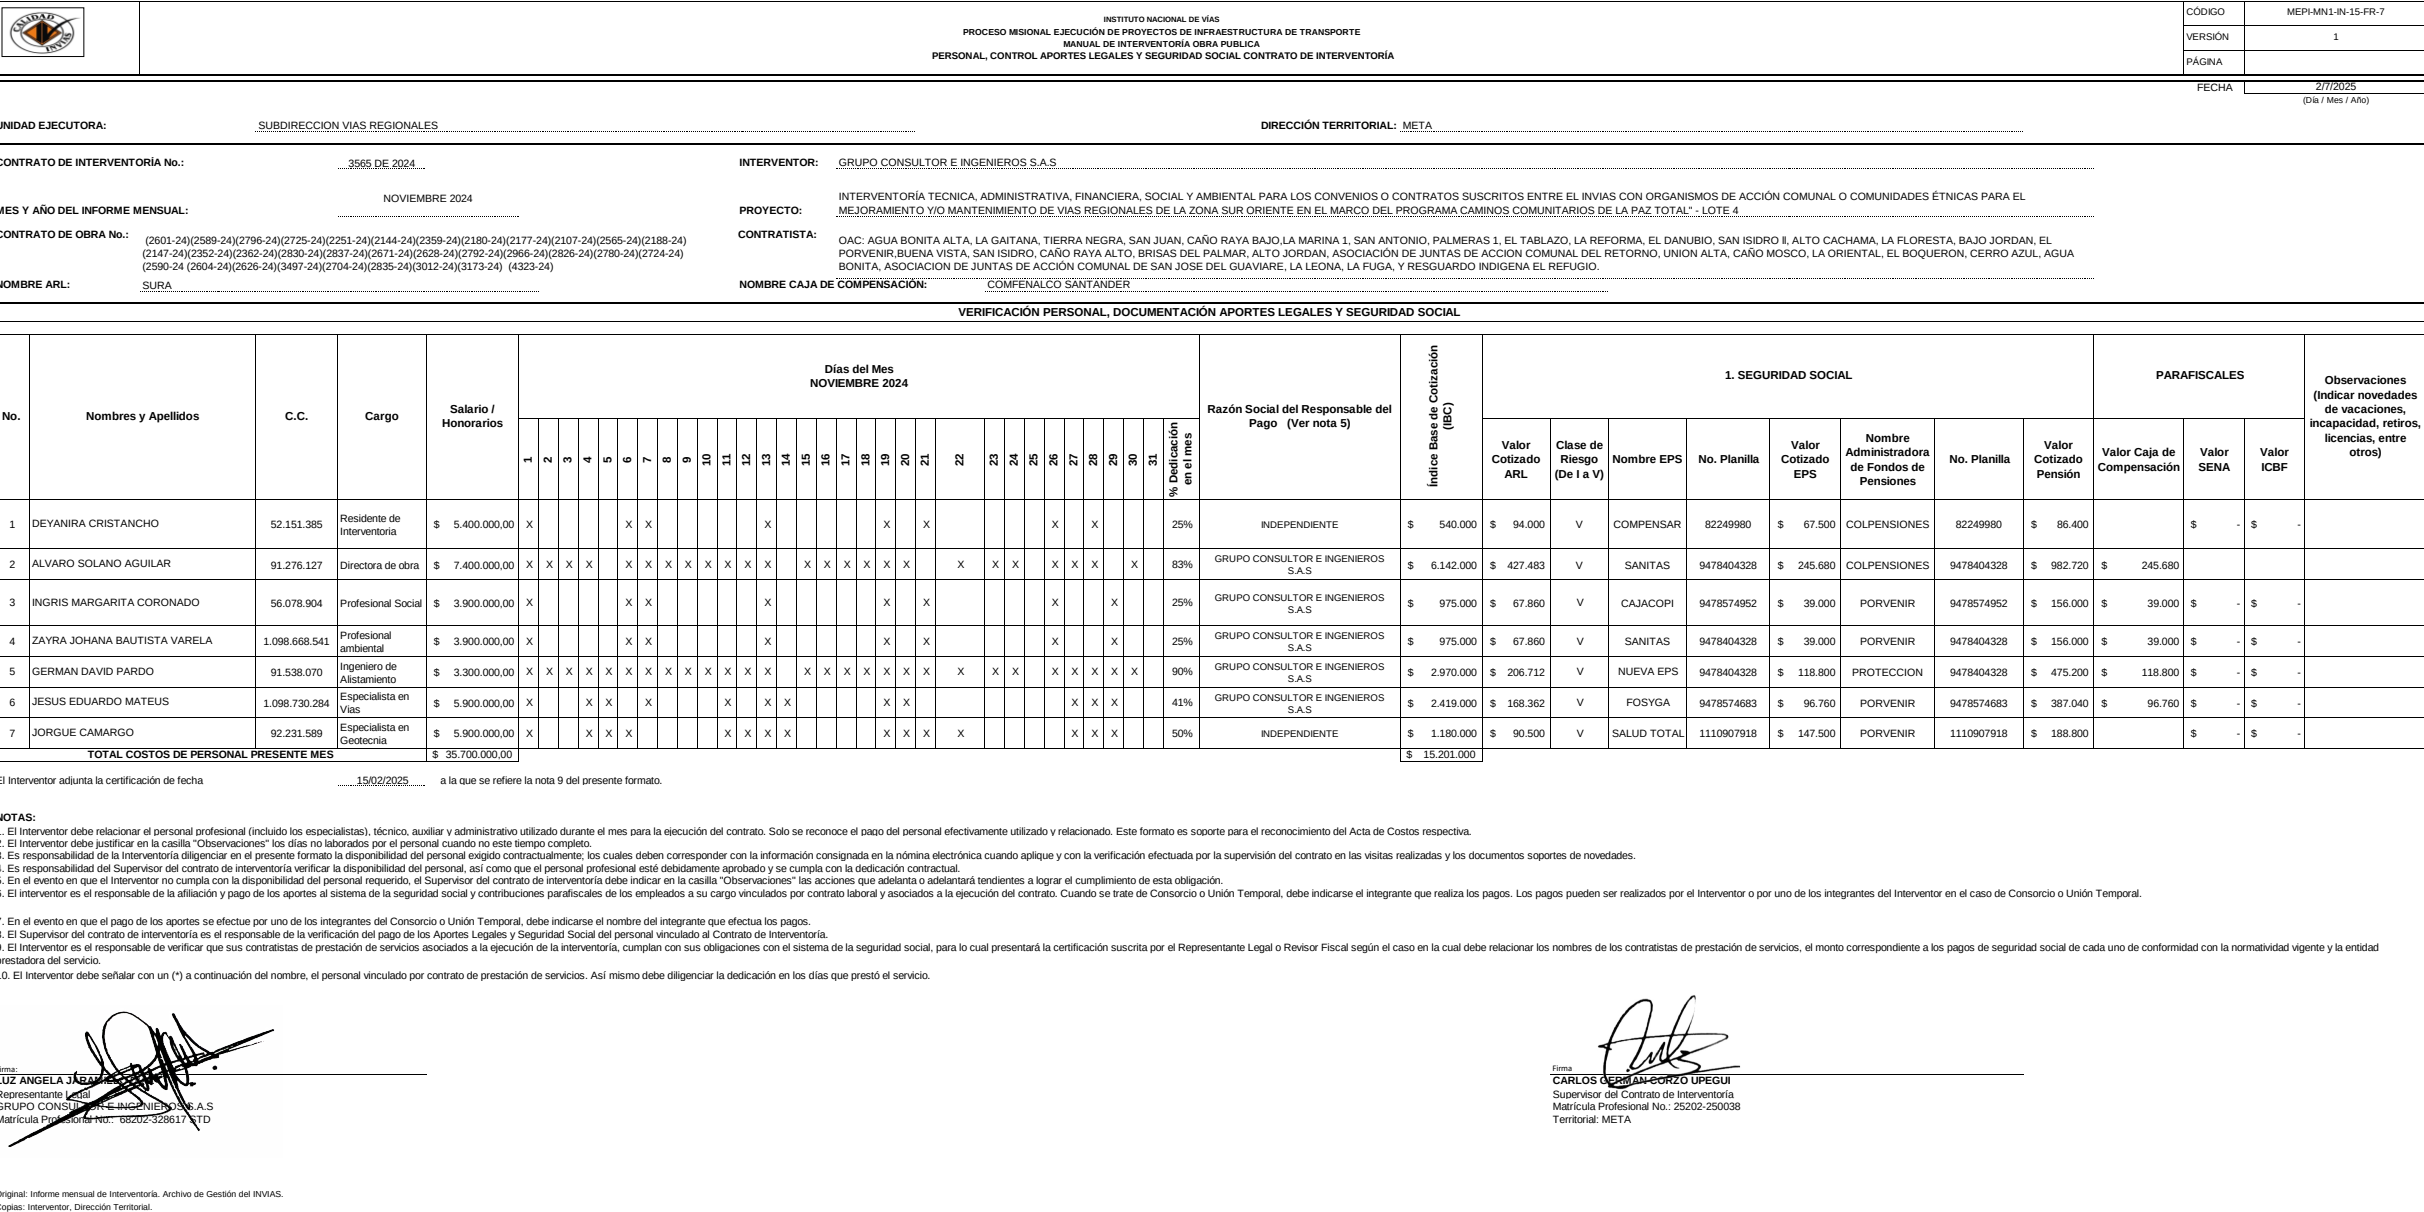

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

2/7/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	---------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3565 DE 2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
--------------------------------	--------------	--------------	------------------------------------

MES INFORME MENSUAL:	NOVIEMBRE 2024	PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No:	(2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24)(2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24)(2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24)(2147-24)(2352-24)(2362-24)(2830-24)(2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24)(2966-24)(2826-24)(2780-24)(2724-24)(2590-24 (2604-24)(2626-24)(3497-24)(2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24) (4323-24)	CONTRATISTA:	OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO,LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR,BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	966524	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Principal	\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00
TOTAL						\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.014.395.039,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
ACTA No. 1	NOVIEMBRE/2024	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.368,00	75.053.725,00			-	966524 Septiembre- 26-2024	\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		ACTA 01
TOTALES		63.070.357,00	11.983.368,00	75.053.725,00		-	-		\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 41.963.160,00	\$ 7.973.000,00	\$ 49.936.160,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos,Alquiler equipos, Oficina)	\$ 21.107.197,00	\$ 4.010.367,00	\$ 25.117.564,00
VALOR TOTAL	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.367,00	\$ 75.053.724,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Representante Legal
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038
Territorial: META

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 17/10/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 2.014.395.039,00 VALOR ACUMULADO: \$ 2.014.395.039,00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 201.439.503,90</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 604.318.511,70</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>2</td><td>28</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>25</td><td>5</td><td>2</td><td>30</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			17	10	24	5	6	25	17	10	24	5	6	25	17	10	24	5	2	28	5	2	25	5	2	30
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
17	10	24	5	6	25																																																			
17	10	24	5	6	25																																																			
17	10	24	5	2	28																																																			
5	2	25	5	2	30																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191894 Certificado de modificación o anexo No.: 5 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																				
		VERSIÓN	1																																				
		PÁGINA																																					
		FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																																							
Desde			Hasta																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																		
Cumplimiento																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																							
Calidad del servicio																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																							
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																							
Razón Social Compañía Aseguradora:																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																							
OBSERVACIONES:																																							
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																							
NOTAS:																																							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.																																							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																							
Firma 		Firma 																																					
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT CLD		Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

3/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

3565-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

INTERVENTOR:

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

FECHA DE INICIO:

17/10/2024
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

2704-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:

SI

NO

X

APROBADO:

SI

NO

X

VERSIÓN No.

FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:

SI

NO

APROBADO:

SI

NO

FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

SI

NO

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

3/12/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Firma

N.A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1					
		VERSIÓN	1 24 de 26					
		PÁGINA						
		FECHA	03/12/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META						
DATOS GENERALES								
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI								
JUSTIFICACIÓN: No se ha tramitado anticipo (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)								
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	
1							%	
2							%	
3							%	
4							%	
5							%	
							%	
TOTAL								
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.								
Firma:  Nombre: LUZ ANCELES JARAMILLO Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD		Firma:  Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038						
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2		
			VERSIÓN	25 de 26		
			PÁGINA			

FECHA		03/12/2024
		(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	------------------------------	------------------------	------

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	
(Indique si corresponde)		(Indique si corresponde)	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3565-2024
	(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.:	BANCO	SUCURSAL:
----------------------	-------	-----------

ANTICIPO OTORGADO:	%
--------------------	---

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	-	(M/CTE)
------------------------------	----	---	---------

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____):	\$	-
	(Indicar el mes)	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:	\$	-
	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)	

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:


Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:	
Nombre:	LUZ ÁNGELA JARAMILLO
Representante Legal o Delegado	
Interventor	
Matrícula Profesional No.:	68202-328617 STD

Firma:	
Nombre:	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del contrato de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

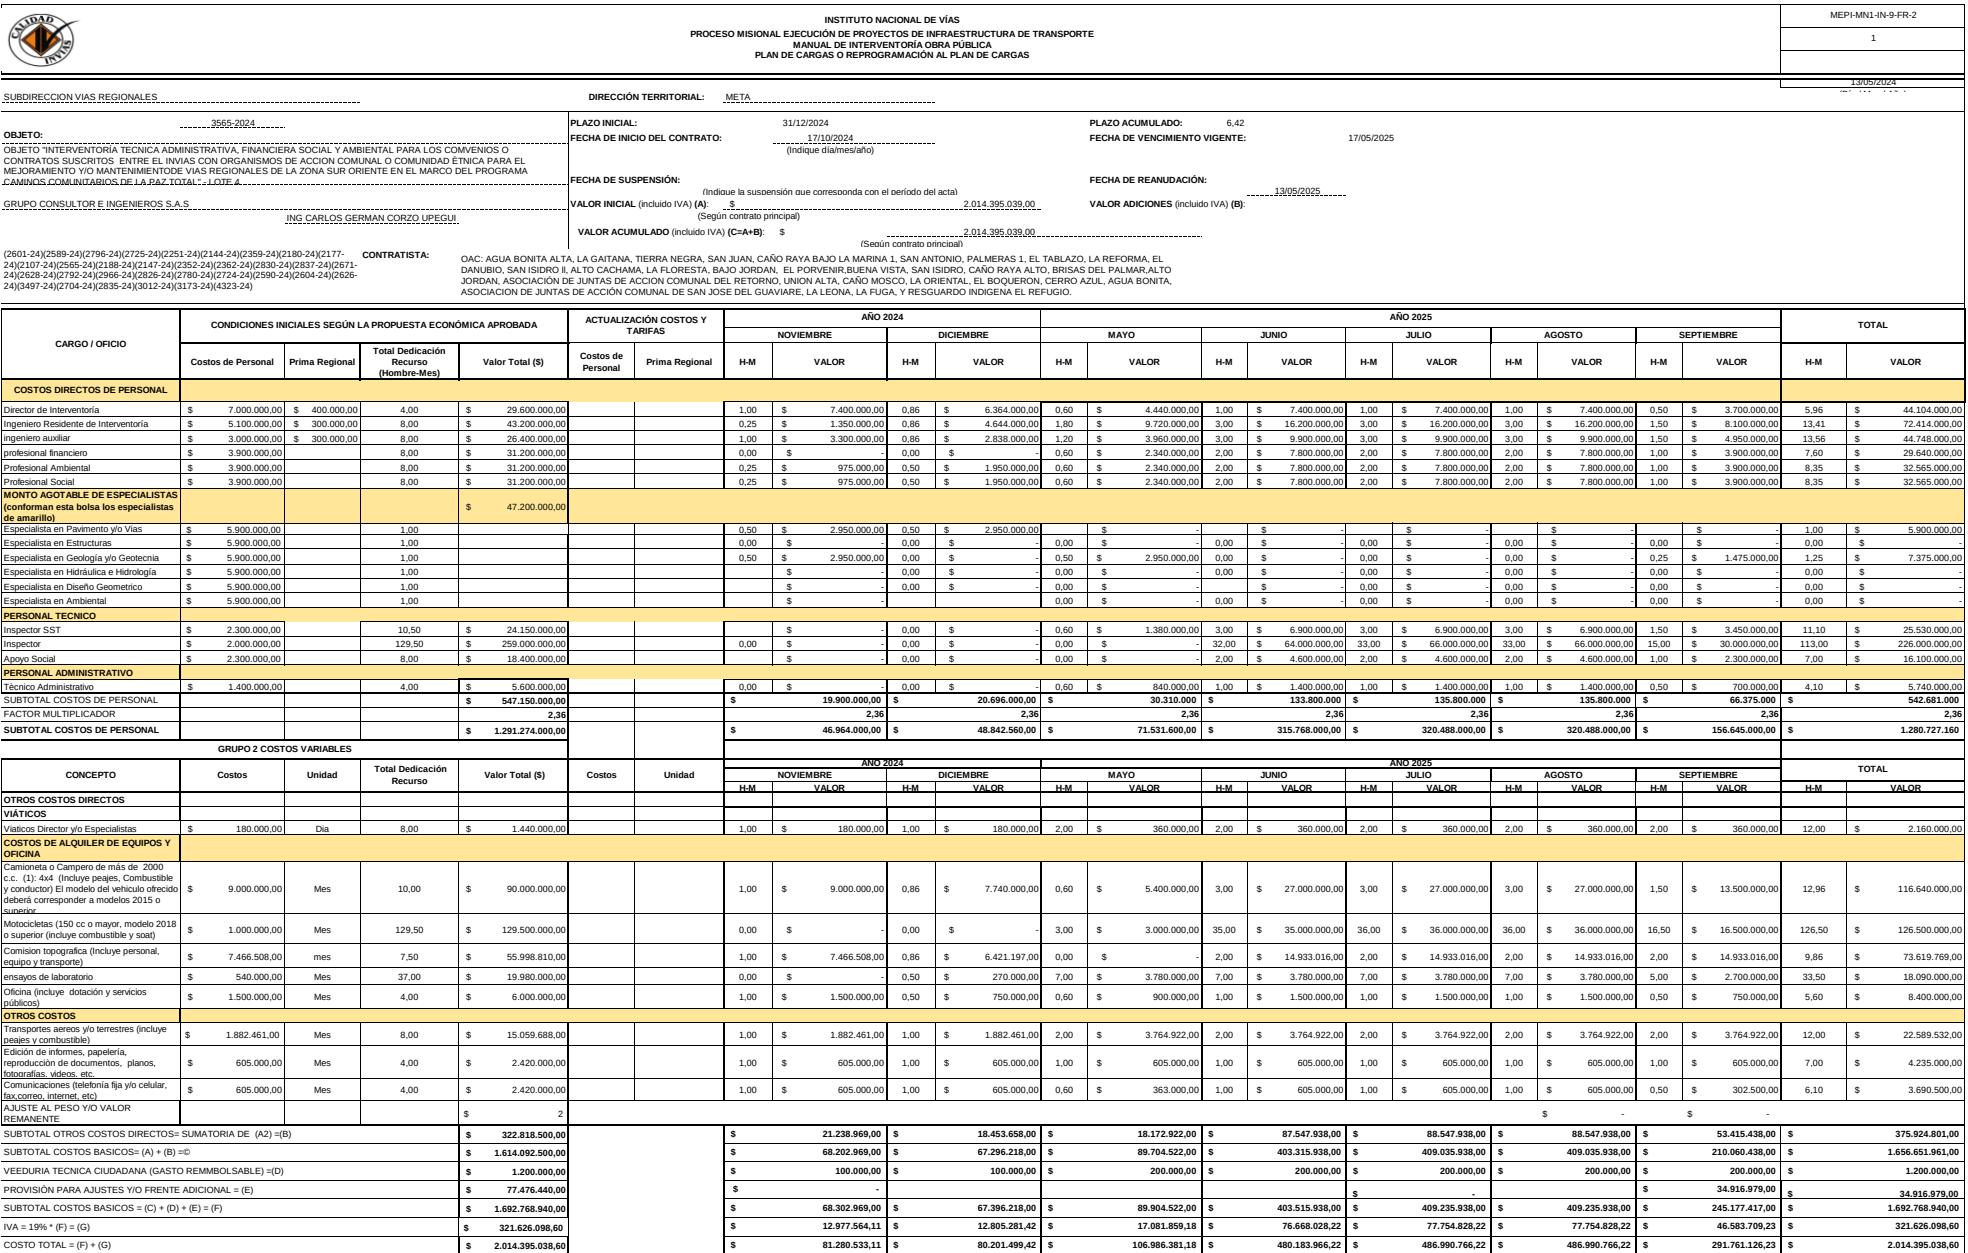

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de intervención.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma 
 ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CDN
 Territorial: META
