

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Consortio RC Deportivo
Informe de Actividades N.º	03
Periodo	Del 1 al 30 de junio de 2025
Número del Contrato	6904-2024
Objeto:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA
Plazo	Once (11) meses
Valor Total del Contrato	\$ 26.111.451.383
Valor del Periodo del Informe	\$ 2.161.996.127,00
Fecha de Inicio	Febrero 27 de 2025
Fecha de Terminación	Enero 26 de 2026
Proyecto	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA BPIN 2021660010056
Interventor	Consortio Inter Coliseo 2024
Dependencia	Secretaria de Deportes



Ing. Hoover Fernando Ortiz Montoya
Representante Legal
Consortio Inter Coliseo 2024

Alcaldia de PEREIRA																	ACTA DE OBRA		
Version: 01																	Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017		
CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024						Fecha: del 01-06-2025 al 10-07-2025						Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0.00 Valor total: 26.111.451.383						ACTA DE OBRA 3	
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						Contratista: CONSORCIO RC DEPORTIVO						Valor Anticipo: 0.00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo: Once (11) meses Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspensión: Fecha Reiniciación: Fecha Terminación Real:						10-jul-25	
						Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024												Valor: \$ 2.161,986,127.00	
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción																			
CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO ACTA -2		EJECUTADO PRESENTA ACTA -3		ACUMULADO			
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		
	1.1	PRELIMINARES				30,109,825			-		20,604,879		-		-		20,604,879		
	1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	7081.44	4,252	30,109,825			-	4846.00	20,604,879		-	0.00	-	4846.00	20,604,879		
		SUBTOTAL CAP. 1.1 PRELIMINARES :				30,109,825			-		20,604,879		-		-		20,604,879		
	1.2	DEMONTES + DEMOLICIONES				74,851,837			-		38,150,710		3,309,200		-		41,459,911		
	1.2.01	Desm. Tableros de baloncesto	UND	2	44,064	88,128			-	2.00	88,128	0.00	-	0.00	-	2.00	88,128		
	1.2.02	Desmonte poste concreto	UND	3	102,642	307,926			-	3.00	307,926	0.00	-	0.00	-	3.00	307,926		
	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	UND	45	174,168	7,837,579			-	26.00	4,528,379	19.00	3,309,200	0.00	-	45.00	7,837,579		
	1.2.04	Demol. Placa contrapiso canchas	M2	1863.43	17,555	32,712,652			-	968.50	17,002,089	0.00	-	0.00	-	968.50	17,002,089		
	1.2.05	Demol. Graderia existente. Espesor 10-15cm.	M2	255.73	31,346	8,016,031			-	238.97	7,490,677	0.00	-	0.00	-	238.97	7,490,677		
	1.2.06	Retiro material extraído de la excavacion. medido	M3	625.9	39,608	24,790,498			-	220.50	8,733,511	0.00	-	0.00	-	220.50	8,733,511		
	1.2.07	Demol.camara de concreto profund hasta 3m +	UND	5	219,805	1,099,023			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
		SUBTOTAL CAP. 1.2 DEMONTES + DEMOLICIONES :				74,851,837			-		38,150,710		3,309,200		-		41,459,911		
	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS				691,413,784			-		44,771,750		172,180,245		105,155,484		322,107,478		
	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	M2	5494.56	7,448	40,923,914			-	1436.57	10,699,686	1830.19	13,631,399	0.00	-	3266.76	24,331,085		
	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	3491.68	8,066	28,164,450			-	677.91	5,468,131	1239.28	9,996,231	842.81	6,798,261	2760.00	22,262,622		
	2.03	Excavacion manual tierra seca h=1.8m(sr)	M3	3062.02	33,468	102,480,146			-	0.00	-	439.04	14,693,857	414.21	13,862,850	853.25	28,556,706		
	2.04	Conform.compact.subrasante cb=95	M2	5494.56	2,776	15,254,624			-	0.00	-	1590.24	4,415,006	0.00	-	1590.24	4,415,006		
	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	M3	2225.34	69,866	155,475,103			-	0.00	-	901.29	62,969,254	1030.39	71,988,858	1931.68	134,958,113		
	2.06	Sub base granular compactada al 100% del	M3	824.19	108,638	89,538,160			-	0.00	-	0.00	-	115.11	12,505,515	115.11	12,505,515		
	2.07	Retiro material extraído de la excavacion. medido	M3	6553.7	39,608	259,577,387			-	722.18	28,603,933	1678.32	66,474,498	0.00	-	2400.50	95,078,432		
		SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:				691,413,784			-		44,771,750		172,180,245		105,155,484		322,107,478		
	3	CIMENTACIONES				1,345,366,679			-		474,449,582		322,848,039		242,691,762		1,039,989,382		
	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA,	M2	1559.48	34,999	54,580,196			-	0.00	-	643.68	22,528,120	390.01	13,650,089	1033.69	36,178,209		
	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado,	M3	403.39	869,449	350,726,980			-	0.00	-	130.28	113,271,799	53.01	46,087,311	183.29	159,359,110		
	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion	M3	124.10	935,672	116,116,925			-	0.00	-	0.00	-	66.01	61,762,789	66.01	61,762,789		
	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3	62.21	858,941	53,434,701			-	0.00	-	0.00	-	28.31	24,317,470	28.31	24,317,470		
	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion	M3	242.42	735,455	178,288,997			-	0.00	-	144.62	106,361,500	81.30	59,791,424	225.92	166,152,924		
	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	79355.59	7,463	592,218,880			-	63574.85	474,449,582	10811.77	80,686,620	4968.97	37,082,679	79355.59	592,218,880		
		SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:				1,345,366,679			-		474,449,582		322,848,039		242,691,762		1,039,989,382		
	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				1,922,257,686			-		-		481,654,124		287,521,604		769,175,727		
	4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado	M3	21.35	1,407,733	30,055,110			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.02	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-	M3	211.90	667,995	141,548,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.03	Viga concreto aerea 4000 psi Acabado	M3	36.30	1,285,864	46,676,867			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.04	Viga concreto amiarre muro 10-12x20cm	M3	15.04	1,441,836	21,685,214			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.05	Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado	M3	95.22	1,322,005	125,881,331			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.06	Losa concreto 3000 psi maciza Espesor 15cm	M2	1964.28	168,108	330,211,390			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.07	Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura	M3	4.80	1,165,851	5,596,086			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m	M3	272.86	937,076	255,690,648			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	77155.91	7,463	575,802,998			-	0.00	-	62617.83	467,307,485	14538.08	108,495,513	77155.91	575,802,998		
	4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada	KLS	21607.08	9,754	210,795,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [orta]	M2	788.36	197,010	155,314,982			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	4.12	Escalera concreto 3000 psi	M3	18.16	1,268,663	23,038,916			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
		SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:				1,922,257,686			-		-		481,654,124		287,521,604		769,175,727		
	5.1	MAMPOSTERIAS				312,204,623			-		-		-		-		-		
	5.1.01	Muro bloque concreto 12x19x39cm. Resistecia 13	M2	2230.96	126,123	281,375,074			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	5.1.02	suministro e instalacion de Lavatrapero	UND	1	247,677	247,677			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	5.1.03	Muro calado cemento 20x20 incluye refuerzo #2	M2	15	129,041	1,935,622			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	5.1.04	Matera en U concreto 3000psi [U] reforzado	ML	60.87	335,739	20,436,424			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		
	5.1.05	Banca concreto 3000 psi reforzado ancho 50cm	ML	60.87	134,375	8,209,826			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		

Alcalde(a) PEREIRA																	ACTA DE OBRA															
Version: 01																																
Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017																																
<div>CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024</div> <div>Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA</div> <div>Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción</div>																			<div>Fecha: del 01-06-2025 al 10-07-2025</div> <div>Contratista: CONSORCIO RC DEPORTIVO</div> <div>Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024</div>				<div>Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0.00 Valor total: 26.111.451.383</div> <div>Valor Anticipo: 0.00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo: Once (11) meses Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspensión: Fecha Reiniciación: Fecha Terminación Real:</div>					<div>ACTA DE OBRA 3</div> <div>10-jul-25</div> <div>Valor: \$ 2,161,996,127.00</div>				
CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO ACTA -2		EJECUTADO PRESENTA ACTA -3		ACUMULADO																
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial															
		SUBTOTAL CAP. 5.1 MAIMPOSTERIAS:				312,204,623			-		-		-		-		0.00															
	5.2	SISTEMA LIVIANO EN SECO				39,892,905			-		-		-		-		0.00															
	5.2.01	Estruc.muro panel [canal-paral] 93mm c24	M2	304.51	37,225	11,335,337			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	5.2.02	Muro 1-panel 13mm 1-panel 13mm RH. Incluye	M2	304.51	93,782	28,557,568			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
		SUBTOTAL CAP. 5.2 SISTEMA LIVIANO EN SECO:				39,892,905			-		0.00	-	0.00		-	0.00	-															
	6.1	ESTRUCTURA METALICA				7,733,492,082			-		1,909,681,267		1,464,867,849		946,483,460		4,321,032,576															
	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica	KLS	427446.60	18,092	7,733,492,082			-	105552.16	1,909,681,267	80966.37	1,464,867,849	52314.16	946,483,460	238832.89	4,321,032,576															
		SUBTOTAL CAP. 6.1 ESTRUCTURA METALICA:				7,733,492,082			-		1,909,681,267		1,464,867,849		946,483,460		4,321,032,576															
	12	INSTALACIONES ELECTRICAS				1,085,331,940			-		172,968,675		-		-		172,968,675															
		SUMINISTRO Y MEDIDA DE ENERGIA DESDE							-		-		-		-		0.00															
	12.1	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE EQUIPO DE	UND	1	2,109,182	2,109,182			-	1.00	2,109,182	0.00	-	0.00	-	1.00	2,109,182															
	12.2	EQUIPOS PARA PROTECCIONES EN MEDIA	UND	1	3,303,816	3,303,816			-	1.00	3,303,816	0.00	-	0.00	-	1.00	3,303,816															
	12.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA	UND	1	1,139,949	1,139,949			-	1.00	1,139,949	0.00	-	0.00	-	1.00	1,139,949															
	12.4	CABLE ACSR SEMIASLADO 1/0 XLPE 15 KV	ML	12	68,303	819,637			-	12.00	819,637	0.00	-	0.00	-	12.00	819,637															
	12.5	BAJANTE MEDIA TENSION EN POSTE	UND	2	3,234,531	6,469,062			-	2.00	6,469,062	0.00	-	0.00	-	2.00	6,469,062															
	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES	JGO	2	1,343,680	2,687,360			-	1.00	1,343,680	0.00	-	0.00	-	1.00	1,343,680															
	12.7	CANALIZACION PARA 13.2KV DESDE POSTE	ML	77	356,881	27,479,847			-	77.00	27,479,847	0.00	-	0.00	-	77.00	27,479,847															
	12.8	CAMARA DE CABLEADO MT TIPO EEP CON	UND	4	2,231,436	8,925,743			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA	ML	72	279,886	20,151,795			-	72.00	20,151,795	0.00	-	0.00	-	72.00	20,151,795															
		SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR							-		-		-		-		0.00															
	12.10	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE	UND	1	6,518,885	6,518,885			-	1.00	6,518,885	0.00	-	0.00	-	1.00	6,518,885															
	12.11	EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA 3	UND	1	4,688,682	4,688,682			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.12	TRANSFORMADOR CONVENCIONAL EN ACEITE	UND	1	26,817,596	26,817,596			-	1.00	26,817,596	0.00	-	0.00	-	1.00	26,817,596															
	12.13	EQUIPOS PARA PROTECCIONES DE	UND	1	3,289,774	3,289,774			-	1.00	3,289,774	0.00	-	0.00	-	1.00	3,289,774															
	12.14	MALLA TIERRA SUBESTACION COLISEO	UND	1	4,097,649	4,097,649			-	1.00	4,097,649	0.00	-	0.00	-	1.00	4,097,649															
	12.15	MALLA CERRAMIENTO CON PUERTA altura 2.5	M2	52	230,057	11,962,964			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero con	UND	1	25,789,947	25,789,947			-	1.00	25,789,947	0.00	-	0.00	-	1.00	25,789,947															
	12.17	PLANTA ELECTRICA CON CABINA INSONORA	UND	1	90,188,821	90,188,821			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.18	Acometida Principal Baja tension - 400A BT en	ML	55	863,096	47,470,293			-	44.00	37,976,234	0.00	-	0.00	-	44.00	37,976,234															
	12.19	BAJANTE BAJA TENSION DE TRANSFORMADOR	UN	1	1,679,986	1,679,986			-	1.00	1,679,986	0.00	-	0.00	-	1.00	1,679,986															
	12.20	TRAMO ACOMETIDA BT INTERPERIE EN IMC	ML	6	365,636	2,193,817			-	6.00	2,193,817	0.00	-	0.00	-	6.00	2,193,817															
	12.21	EXCAVACION EN TIERRA IMPROF	M3	39	46,209	1,811,400			-	25.00	1,155,230	0.00	-	0.00	-	25.00	1,155,230															
	12.22	DUCTOS PVC 2X4" DESDE TRANSFERENCIA	ML	50	63,259	3,162,945			-	10.00	632,589	0.00	-	0.00	-	10.00	632,589															
	12.23	Construcción cámara de BT. Incluye localización,	UND	4.00	1,064,012	4,256,047			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.24	Suministro, transporte, hincada y aplomada de	UND	2.00	1,276,245	2,552,491			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.25	Suministro y montaje y conexionado de Luminaria	UND	2.00	787,551	1,575,102			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.26	UPS MONOFASICA 6 KVA CON BYPASS	UND	1.00	14,097,671	14,097,671			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	12.27	TABLERO GENERAL DE BT METALICO TIPO	UN	1.00	18,231,476	18,231,476			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-															
	14	OBRAS EXTERIORES				815,889,579			-		-		-		55,377,230		55,377,230															
	14.01	Localizacion-replanteo parques-z verdes	M2	3272.00	1,060	3,469,816			-		-		-		-		0.00															
	14.02	Excavacion a maquina sin retro	M3	1080.65	3,013	3,255,633			-		-		-		-		0.00															
	14.03	Configuracion-nivelacion terreno	M2	3272.00	912	2,983,940			-		-		-		-		0.00															
	14.04	Relleno roca muerta compac-cilindro +aca	M3	335.02	69,767	23,373,074			-		-		-		-		0.00															
	14.05	Geotextil no tejido	M2	1981.00	9,773	19,359,694			-		-		-		-		0.00															
	14.06	Sub-base compac.mat.selecc. 10k tipo invl	M3	540.62	105,671	57,128,276			-		-		-		-		0.00															
	14.07	Pav.concr mr=36 e=0.15,inc,junta	M2	1981.00	91,817	181,888,713			-		-		-		-		0.00															
	14.08	Pompeyanos en Pav.concr mr=36 e=0.15,inc,junta	M2	82.43	92,013	7,584,593			-		-		-		-		0.00															
	14.09	Piso en adoquin de concreto peatonal 20x10x6cm	M2	1291.00	90,573	116,929,325			-		-		-		-		0.00															
	14.10	Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal	ML	866.03	72,375	62,679,284			-		-		-		-		0.00															
	14.11	Rampas vehiculares en Pav.concr.mr=36	M2	290.72	111,501	32,415,616			-		-		-		-		0.00															
	14.12	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 1m-a 3m	M3	86.96	734,160	63,842,530			-		-		-		-		0.00															
	14.13	Suministro e instalacion riego de Tierra negra para	M3	336.90	80,212	27,023,500			-		-		-		-		0.00															
	14.14	Suministro e instalacion de prado trenza	M2	2979.67	16,878	50,290,589			-		-		-		-		0.00															
	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	10614.04	7,463	79,210,990			-		-		-	7420.39	55,377,230	7420.39	55,377,230															
	14.16	Loseta tactil guia	ML	1022.12	32,201	32,913,172			-		-		-		-		0.00															

ACTA DE OBRA 3	
10-jul-25	
Valor:	\$ 2,161,996,127.00

B	ITEMS POR FUERA DE AIJ				1,694,549,707					-	-		47,167,738		-
1.1	Inspeccion Retie	UND	1	7,472,717						-	-		-		-
1.2	Inspeccion RetilAP	UND	1	10,690,201						-	-		-		-
1.3	PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS	UND	1	3,130,252						-	-		-		-
2	DESIGNOS Y DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS	UND	1	525,210						-	-		-		-
3	PMO Plan de gestion integral de la obra: PMA - POS - PMI	UND	1	234,348,739						-	-	0.20	47,167,738		-
4	Man mano e instalacion de piso de madera oscuramada	M2	1855	775,406						-	-		-		-
					1,694,549,707					-	-		47,167,738		-
	Suma				\$ 1,694,549,707			Costo Directo		\$ -	\$ -		\$ 47,167,738		\$ -
	IVA 19%				\$ 321,964,445			IVA		\$ -	\$ -		\$ 8,961,871		\$ -
	TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIJ				\$ 2,016,514,152			VALOR TOTAL		\$ -	\$ -		\$ 56,129,609		\$ -

	(-) Amortización anticipo obra ejecutada	\$ -	\$ -	\$ -
	(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada	\$ -	\$ -	\$ -
Son:	Neto acta	\$ 3,422,198,838.00	\$ 3,144,670,645.00	\$ 2,161,996,127.00

VALOR ANTICIPO	\$	-	Vr. contrato	\$	26,111,451,383	\$	-	\$	-
Vr. amortizaciones actas anteriores	\$	-	Vr. actas anteriores ACTA-1			\$	3,422,198,838		
Vr. amortización presente acta			Vr. actas anteriores ACTA-2			\$	3,144,670,645		
			Vr. Presente ACTA-3			\$	2,161,996,127		
Saldo			Saldo			\$	17,382,585,773		
Sumas iguales	\$	-	Sumas iguales	\$	26,111,451,383	\$	26,111,451,383	\$	-

Contratista Arq Otto Lozano

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS	CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	

FECHA	DD	10	MM	7	2025	CORTE N°	3	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
-------	----	----	----	---	------	----------	---	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS	ITEM / ACTIVIDAD	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-----------------------------------	------------------	------	---------------------------------	-------	----	-----------	---------------------------




[illegible]

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS	ITEM / ACTIVIDAD	2.03	Excavacion manual,tierra seca h=1,8m(sr)	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-----------------------------------	------------------	------	--	-------	----	-----------	---------------------------

ILUSTRACION				Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total
				ACTA-3						
				ZAPATA AISLADA C13	1	2	2	1.27	5.08	5.08
				ZAPATA AISLADA D13	1	2	2	1.27	5.08	10.16
				ZAPATA AISLADA F12	1	2.6	2.6	1.27	8.59	18.75
				ZAPATA COMBINADA EJE 13	1	1.65	21	1.5	51.98	70.72
				EXCAVACION ZARPA M6	1	6.33	2.65	0.47	7.88	78.60
				M-7	1	3.65	8.86	0.47	15.20	93.80
				DENTELON	1	0.45	8.86	0.52	2.07	95.88
				M-8	1	5.6	11.76	0.57	37.54	133.41
				M-9	1	3.05	32.93	0.37	37.16	170.58
				DENTELON	1	0.3	32.93	0.37	3.88	174.23
				M-10	1	3.05	5.4	0.37	6.09	180.33
				DENTELON	1	0.3	5.4	0.37	0.80	180.92
				ZAPATA AISLADA L9	1	2.6	2.97	2.6	20.08	201.00
				ZAPATA AISLADA L8	1	2.6	3.17	2.6	21.43	222.43
				ZAPATA AISLADA L7	1	2.6	2.97	2.6	20.08	242.51
				ZAPATA AISLADA L6	1	2.6	2.87	2.6	19.40	261.91
									261.91	
				ZAPATA GRADERIA B1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	268.62
				ZAPATA GRADERIA C1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	275.34
				ZAPATA GRADERIA D1 11a	1	2.35	2.25	1.27	6.72	282.05
				ZAPATA GRADERIA E1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	290.31
				ZAPATA GRADERIA E2 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	298.56
				ZAPATA GRADERIA G1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	306.82
				ZAPATA GRADERIA H1 11a	1	2.6	2.5	1.27	8.26	315.07
									0.00	315.07
				VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	1	0.3	11.2	0.6	2.02	317.09
				VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	1	0.4	3.2	0.6	0.77	317.86
				VIGA V-8 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	1	0.4	3.2	0.6	0.77	318.63
				VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	2	0.3	3.4	0.6	1.22	319.85
				VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	2	0.3	3.98	0.6	1.43	321.28
				VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	4	0.3	3.98	0.6	2.87	324.


ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

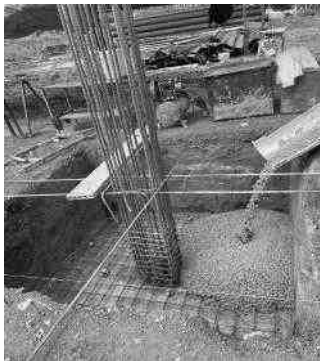
CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS	ITEM / ACTIVIDAD	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-----------------------------------	------------------	------	---	-------	----	-----------	---------------------------

[illegible]

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO														
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO														
FECHA EMISION						VERSION														
FECHA		DD	10	MM	7	2025	CORTE N°	3	ELABORO		CONSORCIO RC DEPORTIVO									
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA																		
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.		901892584-4		Contrato N°		7120-2024								
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.		901889250-9		Contrato N°		6904-2024								
CAPÍTULO		EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS		ITEM / ACTIVIDAD		2.06		Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado		UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA							
ILUSTRACION																				
								Localización		CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total					
								ACTA-3												
								RELLENO ENTRE EJE A-B CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE LOSA DE CONTRAPISO ESP: 20 CM		1.00	49.7	6	0.2	59.64	59.64					
RELLENO EJE 2-3 CONFORMACION DE SUBRASANTE		1.00	31.59	8.78	0.2	55.47	115.11													

DIRECCIÓN		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO							
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO							
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA		DD	10	MM	7	2025	CORTE N°	3	ELABORO		CONSORCIO RC DEPORTIVO		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA											
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.	901892584-4				Contrato N°	7120-2024	
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.	901889250-9				Contrato N°	6904-2024	

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA						
<div>ILUSTRACION</div> <div></div>				Localización		Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total			
				ACTA-3										
				ZAPATA COMBINADA EJE 12		1	2.15	0.5	21.00	22.58	22.58			
				ZAPATA AISLADA I2		1	2.6	0.5	2.60	3.38	25.96			
				ZAPATA AISLADA J2		1	2.6	0.5	2.60	3.38	29.34			
				ZAPATA COMBINADA EJE 13		1	1.65	0.35	21.00	12.13	41.46			
				ZAPATA GRADERIA B1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	43.58			
				ZAPATA GRADERIA C1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	45.69			
				ZAPATA GRADERIA D1 11a		1	2.35	0.4	2.25	2.12	47.81			
				ZAPATA GRADERIA E1 11a		1	2.6	0.4	2.50	2.60	50.41			
				ZAPATA GRADERIA E2 11a		1	2.6	0.4	2.50	2.60	53.01			
				OBSERVACIONES:				ACTA 1	0.00	0.00				
				ACTA 2	130.28	0.00								
				ACTA 3	53.01									
				ACTA 4	0.00									
				ACUMULADO ITEM										
				183.29										
				Subtotal							53.01			
				Vienen							183.29			
				TOTAL							183.29			

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS	CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	

FECHA	DD	10	MM	7	2025	CORTE N°	3	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
-------	----	----	----	---	------	----------	---	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4			Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9			Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	---------------	------------------	------	---	-------	----	-----------	---------------------------

ILUSTRACION	Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total
	AL: 1 A-3						

[illegible][illegible]

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCIÓN	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS	CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	
FECHA	DD 10 MM 7 2025	CORTE N°	3
ELABORÓ	CONSORCIO RC DEPORTIVO		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9
		Contrato N°	7120-2024
		Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA			
ILUSTRACION				Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud	Subtotal	Volumen Total	
				ACTA-3							
				PEDESTAL A4		1	0.9	1	0.90	0.81	0.81
				PEDESTAL A5		1	0.9	1.15	0.90	0.93	1.74
				PEDESTAL A6		1	1.2	1.15	1.20	1.66	3.40
				PEDESTAL A7		1	1.2	1.15	1.20	1.66	5.05
				PEDESTAL A8		1	1.2	1.15	1.20	1.66	6.71
				PEDESTAL A9		1	1.2	1.15	1.20	1.66	8.37
				PEDESTAL A10		1	0.9	1.15	0.90	0.93	9.30
										0.00	9.30
				PEDESTAL B4		1	0.7	1	0.70	0.49	9.79
				PEDESTAL B5		1	0.7	1.15	0.70	0.56	10.35
				PEDESTAL B6		1	1	1.15	1.00	1.15	11.50
				PEDESTAL B7		1	1	1.15	1.00	1.15	12.65
				PEDESTAL B8		1	1	1.15	1.00	1.15	13.80
				PEDESTAL B9		1	1	1.15	1.00	1.15	14.95
				PEDESTAL B10		1	0.7	1.15	0.70	0.56	15.51
				PEDESTAL A2 B2 C2 D2		4	0.7	1	0.70	1.96	17.47
				PEDESTAL A3 B3 3F 3G		4	0.9	1	0.90	3.24	20.71
				PEDESTAL 3 C-D		2	1.2	1.15	1.20	3.31	24.03
				PEDESTAL 2C		1	0.7	1	0.70	0.49	24.52
				PEDESTAL 3E		1	0.9	1.15	0.90	0.93	25.45
				PEDESTAL 2 B 2 F		2	1	1.15	1.00	2.30	27.75
				PEDESTAL 2G		1	0.7	1.15	0.70	0.56	28.31
											28.31
OBSERVACIONES:											
	ACTA 1	0.00	0.00								
	ACTA 2	0.00	0.00								
	ACTA 3	28.31		ACUMULADO ITEM 28.31	Subtotal						28.31
	ACTA 4	0.00			Vienen						28.31
					TOTAL						28.31

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	---------------	------------------	------	--	-------	----	-----------	---------------------------

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

<div><div><div><div><div><div></div><div>Alcaldía de</div><div>PEREIRA</div></div><div><div>Tramite: 01</div><div>PRE-ACT</div></div></div><div><div>Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017</div></div></div></div></div>									
DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO			
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO			
FECHA EMISION						VERSION			
FECHA		DD	MM	YY	CORTE N°	ELABORQ CONSORCIO RC DEPORTIVO			
OBJETO DEL CONTRATO		C							
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.		901892584-4	
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.		901889250-9	
						Contrato N°		7120-2024	
						Contrato N°		6804-2024	
CAPITULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.06	Acero refuerzo fijado 60000 psi 420mpa		UNID.	KLS	Subtotal	Peso Total
ILUSTRACION									
Localización		% COMPRA ACTA-1	% SUMINISTRO ACTA-2	% INSTALACION ACTA-2	CANT	Subtotal	Peso Total		
ACTA-3									
ZAPATA AISLADA D				0.0863	245.85	21.22	21.22		
ZAPATA AISLADA D				0.0863	245.85	21.22	42.44		
ZAPATA AISLADA C3				0.0863	131.30	11.33	53.77		
ZAPATA AISLADA D13				0.0863	131.30	11.33	65.11		
ZAPATA COMBINADA EJE 13				0.0863	2509.13	216.54	281.66		
ZAPATA AISLADA F12				0.0863	122.93	10.61	292.24		
ZAPATA GRADERIA B1 11a				0.0863	75.44	6.51	298.77		
ZAPATA GRADERIA C1 11a				0.0863	75.44	6.51	305.28		
ZAPATA GRADERIA D1 11a				0.0863	75.44	6.51	311.77		
ZAPATA GRADERIA E1 11a				0.0863	75.44	6.51	318.28		
ZAPATA GRADERIA E2 11a				0.0863	75.44	6.51	324.80		
ZAPATA GRADERIA G1 11a				0.0863	75.44	6.51	331.31		
ZAPATA GRADERIA H1 11a				0.0863	75.44	6.51	337.82		
VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D				0.0863	389.50	33.61	371.41		
VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B				0.0863	139.48	12.04	383.41		
VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B				0.0863	139.48	12.04	395.51		
VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B				0.0863	125.25	10.81	406.31		
VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B				0.0863	125.25	10.81	417.11		
VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B				0.0863	127.07	10.97	428.01		
VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E				0.0863	401.86	34.68	462.77		
VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2				0.0863	386.74	33.38	496.11		
VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2				0.0863	388.58	33.53	529.64		
VIGA V-3 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2				0.0863	126.16	10.89	540.51		
VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2				0.0863	154.21	13.31	553.81		
ZAPATA AISLADA L10				0.0863	122.93	10.61	564.41		
ZAPATA AISLADA L11				0.0863	122.93	10.61	575.01		
ZAPATA AISLADA L12				0.0863	122.93	10.61	585.71		
ZAPATA AISLADA L13				0.0863	122.93	10.61	596.31		
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073		2,193.31	2004.07	2600.31		
PEDIDO ACERO DE REFUERZO REMISION COMPRA Y SUMINISTRO		0.9064	0.0073		2,592.31	2368.59	4968.91		
OBSERVACIONES:									
ACTA 1	63524.65								
ACTA 2	10811.77								
ACTA 3	4968.97								
ACTA 4	0.00								
ACUMULADO ITEM		79355.59		Subtotal		4968.91			
				Vienen		79355.59			
				TOTAL		79355.59			
ING. MIGUEL FLORES RESIDENTE DE OBRA									
ING. RUBEN GONZALEZ RESIDENTE INTERVENTORIA									

DESPIECE CONSORCIO RC											
ZAPATAS COLISEO											
	Acero de refuerzo de zapatas	kg	6803.9546								
Z-1	Refuerzo longitudinal inferior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625			4
Z-1	Refuerzo transversal inferior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625	245.85		4
Z-1	Refuerzo longitudinal superior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625			4
Z-1	Refuerzo transversal superior	kg	245.85	6	2.5	2.235	11	61.4625			4
Z-2	Refuerzo longitudinal inferior	kg	229.7736	4	2.35	1.552	9	32.8248			7
Z-2	Refuerzo transversal inferior	kg	229.7736	4	2.35	1.552	9	32.8248	131.2992		7
Z-2	Refuerzo longitudinal superior	kg	229.7736	4	2.35	1.552	9	32.8248			7
Z-2	Refuerzo transversal superior	kg	229.7736	4	2.35	1.552	9	32.8248			7
Z-3	Refuerzo longitudinal inferior	kg	168.519	6	2.9	2.235	13	84.2595	168.519		2
Z-3	Refuerzo transversal inferior	kg	168.519	6	2.9	2.235	13	84.2595			2
Z-4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	1352.175	6	2.5	2.235	11	61.4625	122.925		22
Z-4	Refuerzo transversal inferior	kg	1352.175	6	2.5	2.235	11	61.4625			22
ZAPATAS GRADERIA											
Z-2.60*2.50*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	267.1872	4	2.4	0.994	16	38.1696	75.4446		7
Z-2.60*2.50*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	260.925	4	2.5	0.994	15	37.275			7
Z-2.35*2.25*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	598.388	4	2.15	0.994	14	29.9194	58.9939		20
Z-2.35*2.25*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	581.49	4	2.25	0.994	13	29.0745			20
Z-1.80*2.80*0.4	Refuerzo longitudinal inferior	kg	80.514	4	2.7	0.994	10	26.838	50.694		3
Z-1.80*2.80*0.4	Refuerzo transversal inferior	kg	71.568	4	1.5	0.994	16	23.856			3

ZAPATA AISLADA I2	245.85
ZAPATA AISLADA I2	245.85
ZAPATA AISLADA C13	131.2992
ZAPATA AISLADA D13	131.2992
ZAPATA COMBINADA EJE 13	2509.1308
ZAPATA AISLADA F12	122.925
ZAPATA GRADERIA B1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA C1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA D1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA E1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA E2 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA G1 11a	75.4446
ZAPATA GRADERIA H1 11a	75.4446
ZAPATA AISLADA L10	122.925
ZAPATA AISLADA L11	122.925
ZAPATA AISLADA L12	122.925
ZAPATA AISLADA L13	122.925

	Acero de refuerzo de zapatas	kg	2509.1308	8							
	Acero transversal inferior Zapat	kg	488.88	5	1.5	1.552	105	244.44			
	Acero transversal superior Zapat	kg	488.88	5	1.5	1.552	105	244.44			
	Estribo	kg	1279.8744	4	3.7	0.994	174	639.9372			
ZAPATA COMBINADA EJE 2 Y 13	Acero longitudinal superior 1	kg	228.8448	8	7.2	3.973	4	114.4224			
	Acero longitudinal superior 2	kg	572.112	8	12	3.973	6	286.056			
	Acero longitudinal superior 3	kg	190.848	4	12	0.994	8	95.424			
	Acero longitudinal superior 4	kg	155.8592	4	9.8	0.994	8	77.9296			
	Acero longitudinal inferior 1	kg	446.976	5	12	1.552	12	223.488			
	Acero longitudinal inferior 2	kg	365.0304	5	9.8	1.552	12	182.5152			
	Acero longitudinal inferior 3	kg	572.112	8	12	3.973	6	286.056			
	Acero longitudinal inferior 3	kg	228.8448	8	7.2	3.973	4	114.4224			

DESPIECE CONSORCIO RC

VIGAS

	Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoXMetro	und Barras	Kg	Und. De viga	Cant. Viga	
	Acero de refuerzo de vigas de cimentación	kg	23230.0918								
V-1 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174	125.2524	6 VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	389.4984
V-1 -1.00	Acero longitudinal inferior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174		6 VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	139.4808
V-1 -1.00	Estribo	kg	214.9056	3	1.64	0.56	39	35.8176		6 VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	139.4808
										VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	125.2524
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	7 VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	125.2524
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 2	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63		7 VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	127.066
V-2 -1.00	Estribos	kg	244.2944	3	1.64	0.56	38	34.8992		7 VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	401.856
										VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	386.7432
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 5	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	2 VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	388.58
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 6	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63		2 VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2	126.1592
V-3 -1.00	Estribos	kg	69.7984	3	1.64	0.56	38	34.8992		2 VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	154.213
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 3	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977	154.213		3
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977			3
V-4 -1.00	Estribos	kg	107.4528	3	1.64	0.56	39	35.8176			3
V-5 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426	127.066		4
V-5 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426			4
V-5 -1.00	Estribos	kg	135.9232	3	1.64	0.56	37	33.9808			4
V-6 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714	139.4808		2
V-6 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714			2
V-6 -1.00	Estribos	kg	72.1056	3	1.74	0.56	37	36.0528			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	386.7432		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-7 -1.00	Estribos	kg	225.9264	3	1.64	0.56	123	112.9632			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	388.58		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-8 -1.00	Estribos	kg	229.6	3	1.64	0.56	125	114.8			2

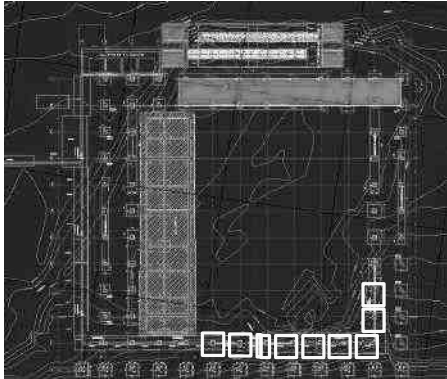
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7	401.856	1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Estribos	kg	151.536	3	1.64	0.56	165	151.536		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008	389.4984	1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	115.7184	3	1.64	0.56	126	115.7184		1

DESPIECE CONSORCIO RC

VIGAS

	Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoXMetro	und Barras	Kg	Und. De viga	Cant. Viga	
	Acero de refuerzo de vigas de cimentación	kg	23230.0918								
V-1 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174	125.2524	6 VIGA V-13 SOBRE EJE 2 ENTRE EJES A AL D	389.4984
V-1 -1.00	Acero longitudinal inferior 1	kg	268.3044	7	7.35	3.042	2	44.7174		6 VIGA V-6 SOBRE EJE 3 ENTRE EJES A AL B	139.4808
V-1 -1.00	Estribo	kg	214.9056	3	1.64	0.56	39	35.8176		6 VIGA V-6 SOBRE EJE 12 ENTRE EJES A AL B	139.4808
										VIGA V-1 SOBRE EJE 4 Y 11 ENTRE EJES A AL B	125.2524
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	7 VIGA V-1 SOBRE EJE 5 Y 10 ENTRE EJES A AL B	125.2524
V-2 -1.00	Acero longitudinal superior 2	kg	319.41	7	7.5	3.042	2	45.63		7 VIGA V-5 SOBRE EJE 6, 7, 8, 9 ENTRE EJES A AL B	127.066
V-2 -1.00	Estribos	kg	244.2944	3	1.64	0.56	38	34.8992		7 VIGA V-10 SOBRE EJE 13 ENTRE EJES A AL E	401.856
										VIGA V-7 SOBRE EJE A ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	386.7432
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 5	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63	126.1592	2 VIGA V-8 SOBRE EJE B ENTRE EJES 13 AL 10 Y ENTRE EJES 5 AL 2	388.58
V-3 -1.00	Acero longitudinal superior 6	kg	91.26	7	7.5	3.042	2	45.63		2 VIGA V-2 SOBRE EJE C Y D ENTRE EJES 13 Y 12 Y ENTRE EJES 3 AL 2	126.1592
V-3 -1.00	Estribos	kg	69.7984	3	1.64	0.56	38	34.8992		2 VIGA V-4 SOBRE EJE E, F, G ENTRE EJES 3 Y 2	154.213
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 3	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977	154.213		3
V-4 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	177.5931	8	7.45	3.973	2	59.1977			3
V-4 -1.00	Estribos	kg	107.4528	3	1.64	0.56	39	35.8176			3
V-5 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426	127.066		4
V-5 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	186.1704	7	7.65	3.042	2	46.5426			4
V-5 -1.00	Estribos	kg	135.9232	3	1.64	0.56	37	33.9808			4
V-6 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714	139.4808		2
V-6 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	103.428	7	8.5	3.042	2	51.714			2
V-6 -1.00	Estribos	kg	72.1056	3	1.74	0.56	37	36.0528			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	386.7432		2
V-7 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008			2
V-7 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-7 -1.00	Estribos	kg	225.9264	3	1.64	0.56	123	112.9632			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008	388.58		2
V-8 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	146.016	7	12	3.042	2	73.008			2
V-8 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	127.764	7	10.5	3.042	2	63.882			2
V-8 -1.00	Estribos	kg	229.6	3	1.64	0.56	125	114.8			2

V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7	401.856	1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	44.7	6	10	2.235	2	44.7		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	33.525	6	7.5	2.235	2	33.525		1
V-10 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	46.935	6	10.5	2.235	2	46.935		1
V-10 -1.00	Estribos	kg	151.536	3	1.64	0.56	165	151.536		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008	389.4984	1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal superior 1	kg	73.008	7	12	3.042	2	73.008		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	63.882	7	10.5	3.042	2	63.882		1
V-13 -1.00	Acero longitudinal inferior 4	kg	115.7184	3	1.64	0.56	126	115.7184		1

DIRECCIÓN	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83		FORMATO					
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS		CODIGO					
FECHA EMISION			VERSION					
FECHA	DD	10	MM	7	2025			
CORTE N°	3		ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO				
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024		Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N° 7120-2024			
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO		Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N° 6904-2024			
CAPÍTULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM / ACTIVIDAD	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	UNID. M3 UBICACIÓN COLISEO DEPORTIVO PEREIRA			
ILUSTRACION				Localización	Cant Elementos			
				Ancho	Alto			
			ACTA-3			Longitud	Volumen Total	
			MURO M-2	1	0.4	3.6	24.90	35.86
			MURO M-3	1	0.5	4.4	9.60	21.12
			MURO M-4	1	0.5	5.4	16.40	44.28
			MURO M-5	1	0.45	4	6.00	10.80
			MURO M-9	1	0.3	2.9	16.20	14.09
			MURO M-7	1	0.375	3.8	8.86	12.63
			COLUMNAS M-2	3	0.9	3.6	0.90	8.75
			COLUMNAS M-2	2	1.2	3.6	1.20	10.37
			COLUMNAS M-3	1	0.9	4.4	0.90	3.56
			COLUMNAS M-3	1	1.2	4.4	1.20	6.34
			COLUMNAS M-4	4	0.9	5.4	0.90	17.50
			COLUMNA M-5	1	1.2	4	1.20	5.76
			OBSERVACIONES:			ACTA 1	0.00	0.00
			ACTA 2	15.31	0.00			
			ACTA 3	191.05				
			ACTA 4	0.00				
			ACUMULADO ITEM					
			206.36					
			Subtotal		191.05			
			Vienen		206.36			
			TOTAL		206.36			
ING. MIGUEL FLOREZ RESIDENTE DE OBRA			ING. RUBEN GONZÁLEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA					

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

DESPIECE CONSORCIO RC

MUROS DE CONTENCIÓN											
Sector		Elemento	U.M.	Cantidad Kg total	#barra	Longitud	PesoxMetro	und Barras	Kg	d. De M. contenci	Kg/Viga
	M-5	Acero vertical 1	kg	245.85	6	5.50	2.235	20.00	245.85	966.93	1.00
	M-5	Acero vertical 2	kg	245.85	6	5.50	2.235	20.00	245.85		1.00
	M-5	Acero vertical 3	kg	100.58	6	2.25	2.235	20.00	100.58		1.00
	M-5	Refuerzo	kg	146.51	5	5.90	1.552	16.00	146.51		1.00
	M-5	Refuerzo	kg	146.51	5	5.90	1.552	16.00	146.51		1.00
	M-5	Estribo	kg	28.90	3	1.72	0.560	30.00	28.90		1.00
	M-5	Longitudinales Viga	kg	52.75	6	5.90	2.235	4.00	52.75		1.00
	M-6	Acero vertical 1	kg	173.28	5	3.85	1.552	29.00	173.28	605.20	1.00
	M-6	Acero vertical 2	kg	173.28	5	3.85	1.552	29.00	173.28		1.00
	M-6	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	87.02	5	6.23	1.552	9.00	87.02		1.00
	M-6	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	87.02	5	6.23	1.552	9.00	87.02		1.00
	M-6	Estribo	kg	28.90	3	1.72	0.560	30.00	28.90		1.00
	M-6	Longitudinales Viga	kg	55.70	6	6.23	2.235	4.00	55.70		1.00
	M-7	Acero vertical 1	kg	325.19	6	4.85	2.235	30.00	325.19	1,019.32	1.00
	M-7	Acero vertical 2	kg	225.82	5	4.85	1.552	30.00	225.82		1.00
	M-7	Acero vertical 3	kg	224.51	6	2.45	2.235	41.00	224.51		1.00
	M-7	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	121.90	4	8.76	0.994	14.00	121.90		1.00
	M-7	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	121.90	4	8.76	0.994	14.00	121.90		1.00
									0.00		
	M-8	Acero vertical 1	kg	712.07	6	5.40	2.235	59.00	712.07	2,128.29	1.00
	M-8	Acero vertical 2	kg	712.07	6	5.40	2.235	59.00	712.07		1.00
	M-8	Acero vertical 3	kg	263.73	6	2.00	2.235	59.00	263.73		1.00
	M-8	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	220.21	4	11.66	0.994	19.00	220.21		1.00
	M-8	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	220.21	4	11.66	0.994	19.00	220.21		1.00
									0.00		
	M-9	Acero vertical 1	kg	934.69	5	3.65	1.552	165.00	934.69	2,143.25	1.00
	M-9	Acero vertical 2	kg	934.69	5	3.65	1.552	165.00	934.69		1.00
	M-9	Refuerzo	kg	40.32	4	5.07	0.994	8.00	40.32		1.00
	M-9	Refuerzo	kg	95.42	4	12.00	0.994	8.00	95.42		1.00
	M-9	Refuerzo	kg	95.42	4	12.00	0.994	8.00	95.42		1.00
	M-9	Refuerzo	kg	42.70	4	5.37	0.994	8.00	42.70		1.00

	M-10	Acero vertical 1	kg	207.04	5	4.60	1.552	29.00	207.04	597.84	1.00
	M-10	Acero vertical 2	kg	207.04	5	4.60	1.552	29.00	207.04		1.00
	M-10	Refuerzo longitudinal superior 1	kg	49.20	4	5.50	0.994	9.00	49.20		1.00
	M-10	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	49.20	4	5.50	0.994	9.00	49.20		1.00
	M-10	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	42.68	5	5.50	1.552	5.00	42.68		1.00
	M-10	Refuerzo longitudinal superior 2	kg	42.68	5	5.50	1.552	5.00	42.68		1.00

M-5	885.29
M-6	520.60
M-7	1,019.32
DENTELLON	
M-8	2,128.29
M-9	2,143.25
DENTELLON	
M-10	597.84
DENTELLON	

FECHA	DD	10	MM	7	###	CORTE N°	3	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
-------	----	----	----	---	-----	----------	---	---------	------------------------

CAPÍTULO	OBRAS EXTERIORES	ITEM / ACTIVIDAD	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	UNID.	KLS	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	------------------	------------------	-------	---	-------	-----	-----------	---------------------------




ING. MIGUEL FLOREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
 RESIDENTE INTERVENTORIA
