

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA: 01/MAR/2022

Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
Localización del proyecto (municipio / departamento):	MUNICIPIO DE CAJICÁ
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	UNIÓN TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
Numero del contrato:	COP-008-2024
Fecha del registro fotográfico:	22/01/2025 – 31/03/2025

FOTOGRAFÍA (1)



1.01 Campamento 18 m2. Se realiza la adquisición de un contenedor de 2.5 m X 6 m, el cual fue descargado en obra el día 17 de Febrero, cumpliendo de esta manera la ejecución total de dicho ítem..



Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión. Se inicio, en compañía de la comisión topográfica, la actividad de localización y replanteo del predio a intervenir, identificando principalmente las áreas del

terreno versus la implantación arquitectónica, luego se procedió con el levantamiento topográfico para corroborar los niveles del terreno versus los niveles de implantación, para dar inicio con las actividades de construcción de la cimentación, según los diseños presentados ante la entidad contratante.



25 feb 2025 2:33:36 p. m.
246° SW
Altitud: 2535m
Número de índice: 265

24 feb 2025 7:24:38 a. m.
206° SW
Altitud: 2505m
Número de índice: 238




25 feb 2025 2:33:36 p. m.
246° SW
Altitud: 2535m
Número de índice: 265



24 feb 2025 7:24:38 a. m.
206° SW
Altitud: 2505m
Número de índice: 238



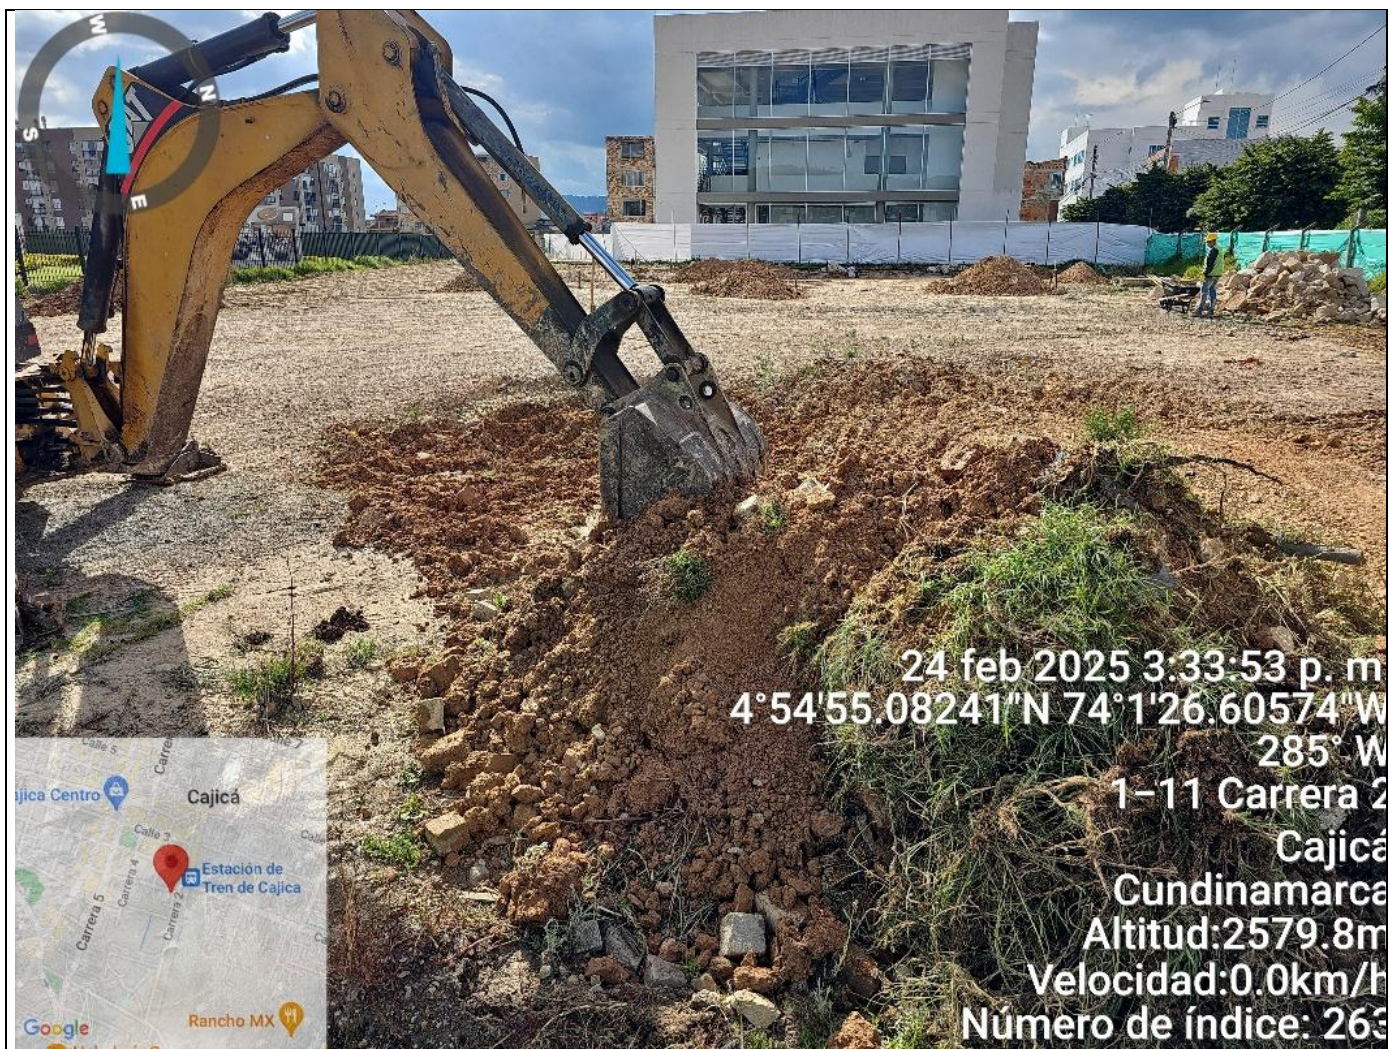

24 feb 2025 3:33:53 p. m
4°54'55.08241"N 74°1'26.60574"W
285° W
1-11 Carrera 2
Cajicá
Cundinamarca
Altitud:2579.8m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 263

Retiro de sobrantes a una distancia de 5km (incluye cargue). Tanto en el costado sur oriental como nor oriental, se encontraron escombros y material sobrante de la ejecución de la etapa 1, los cuales fueron cargados y retirados de obra con la maquinaria dispuesta en el sitio de trabajo.
