

Apto 11/15 (Lunar).


Se inicia labores de mantenimiento preventivo a cada una de las bombas de la Ciénaga El Porvenir para que queden operativas para la temporada y como cuando le necesite.

Se requiere al contratista exigir a cada trabajador el uso de los EPP durante todo el tiempo de labor.

Programa

11/19 hasta 2 obra
1 Herrero + 4 ayudantes.

Hora de inicio = 9:00 AM
Hora final = 4:30 PM


Jey Jairo Nolasco

11/19
h.1


Aprobado 12/25 (maría)

Se conforma haber en la Compañía El porvenir
con el mantenimiento de cada una de las tareas y del
Sistema.

La interventoría ha revisado el avance y
se solicita revisar los primeros resultados
ya que no se encuentran a satisfacción.

Los detalles ya fueron informados al
ingeniero Jaime Aldana

Se procederá a la revisión posterior.


DI


X
Pabayan

1 ing. publico

2 técnicos + 4 ayudantes.

Hora inicio: 8:00 AM

Hora final: 5:00 PM.



José Jaime Aldana

Agosto B/15 Miraflores

Se continuaron labores en la Grupería el porvenir
con el voluntariado cooperativo a cada una de las
Secciones de la Grupería.

- Avance conforme a la programación de obra.
- Se realizó charla SISO "Rescate en agua"

ATA
P.A
19
18-0


Trabajo

1 kg pasta

2 horas + 1 hora

hora inicio: 8:00 am.

hora fin: 5:00 pm



Jy Jaim Aldar

Apilo 14/01 (para)

Se continuara labor en las Compuertas El porvenir
con el material conectado en cada una de las
zonas y todo lo sistema.

- Se avanza conforme a la programación.
- Se requiere al contratista adelantar una brigada de
limpieza y aseo

1191

Trabaja

2 brigadas

2 brigadas + 4 ayudantes.

Hora inicio: 8:00 am
Hora fin: 5:00 pm.


1191

Sup. para el trabajo.

Apito 11/18 (viewer)

El Gobierno cubano de Matanzas es todo un
de los libros de la Compañía El porvenir para
dignos operarios Chab se pague la apertura.

Se debe constatar que el contrato
acagió la corrección propuesta
ch los libros uno y dos y
por fueron recibidos a satisfacción


D-1

Trabaja

2 ing. Perfil
2 libros + 4 copias

Libro de más 7:00 am
" fuel 5:00 pm




14 June 1964

Agosto 16/8 (School)

De Continuar labores de mantenimiento en los Comets
El personal es cada uno de la herramienta para operar
operativo todo el sistema.

Se avanza conforme a la programación, sin
embargo por solicitud del contratista se
autoriza adelantar labores el día domingo
con el fin de aprovechar el factor clima.




Trabajo

1 ing. Perito

2 Técnicos + 4 ayudantes.

hora de inicio = 7:00 am
" final = 5:00 pm.




José Luis Nolasco

Agosto 17/25 (domingo)

Se continuó laboreando en la Compostela El porvenir
en el mantenimiento Corativo en todo una de las
zonas.

Se superviso el trabajo de mantenimiento
se solicita al contratista regresar a
su equipo de trabajo mayor detalle
en la labor supone de tener que
repetir o corregir.



Trabajo

1 brig Peche

2 brigs + 4 apaches

hora de mano 7.00 am

hora fin: 1.00 pm



Sup. Juan Alvarado

Aprobado 18/25 (finca) 20/08/2018

Se continuó labores de trabajo correctivo en la Computadora El Porvenir.

Se avanza con normalidad y calidad, se realizó revisión conjunta con el inc. Jaime Aldana y se encontraron gastos en la calidad y detalle por lo que ya existen lecciones con recibo por parte de la interventoría



Trabajo

1 día trabajo

2 personas + 4 computadores

Horas de mano: 7.00 AM
Hora final: 5.00 PM.




Ing Jaime Aldana J.

Apelo 19/05 (vater)

Se Continúan labores de mantenimiento correspondiente a cada uno de los turnos en las Cooperativas El Porvenir.

Avance con normalidad se suspenden labores por lluvia por 3 horas y se reanuda con normalidad




Trabaja

1 ing. Técnico de Labores
2 Auxiliares y 4 operarios

Horario inicio: 8:00 AM

Horario fin: 5:00 PM



Ing. Jaime Alvarado

Apob 10/15 (viernes)

Se Continúan labores de mantenimiento Coordinado
de toda una de las barrietas de la Compañía El Porvenir.

Se avanza con normalidad y calidad, se
reciben visitas de miembros de la comunidad
sin ningún contratiempo




Trabajamos

1 iny paralela de obra

1 Arriero + 4 ayudantes

hora de inicio : 9:00 am
hora final: 5:00 pm


Jug José Alfaro f.

Agosto 21/22 (pasa)

Se trabajará sobre el material completo en las
Compartes El Potrero.

Se avanza con normalidad y calidad

[Signature]

Trabajo

1 día visible

2 horas + 3 aydada


hora de inicio 8:00 am

hora fin: 5:00 pm

[Signature] Log por el trabajo

Abril 27/15 (viernes)
 Re. Guillermo Lobos de Velasco Guevara en la
 Compañía El porvenir.


Se revisó la programación de obra
 en conjunto con el contratista y
 se evidenció un pequeño atraso, el
 contratista se comprometió a realizar
 las acciones necesarias para normalizar
 el avance



Trabajo:

1 ing. residente
 1 técnico + 3 ayudantes.


Hora de inicio: 8:00 AM
 " fin: 5:00 PM

 Ing. Jaime Navarro

April 23/05 (Sabbath)

De Construcción Iglesia de Hualand, Comodoro de Cacha
vaya de los Llanos de la Guapeta El poverano

Se trabaja con normalidad y se
avanza de acuerdo con lo programado
para la jornada




Trabajaron

1 Ing. Emilio

1 Cemento 2 apilados.

Hor de inicio: 8:00 AM

Hor fin: 4:00 PM



Ing. Luis Alvarado

April 24/25 (Sunday)

Le Colman Vane de retribuir Capelito en cada
una de la band de las Capela El porvenir

Hobopasu.

1 ing. Reclite
2 Hanes + 2 ap. de la

Hora de inicio: 8:00 AM

Hora final: 4:00 PM

Ing. Reclite
Hanes + 2 ap. de la

Año 28/05 (lun).

Se continúan labores en la Compañía El porvenir con el cumplimiento de toda una de las normas y de la Sistema para de los operarios.

Se solicita brigada de limpieza y aseo.

Se llamó la atención a los ayudantes respecto del uso de los EPP.

En caso de no acatar instrucciones se solicitará el retiro y cambio del personal.

P.A.
P.A.

P.I.

Trabajamos

1 hora perdida

1 hora de aseo y 1 hora de aseo.

hora de mano: 8:00 am

hora de fin: 5:00 pm.



Sup. Juan Nolasco

Sup. Juan Nolasco

Asíto 26/12 (wrote)

Se continuará la obra en la Compañía. El personal que
el momento de cada una de las tareas y de forma
de control.

Se avanza conforme a la programación de obra.

Integran:

1 Ing. Civil
2 Alumnos 1 2 operarios

Hor. de trav. 8:00 am
Hor. fin 5:00 pm


Ing. Luis Alcaraz

April 22/18 (Wednesday)

Se continuaron trabajos en las banquetas de las
carreteras El pueblo.

Actividades de mantenimiento se
realizan conforme a lo previsto

11/9
R.F.


Trabajos

1 iny. Reduct

2 feneos & 2 cilindros

Hora de inicio : 8:00 AM

Hora fin : 5:00 PM




Ing. José Alfaro

Aprobado 28/05 (peru).

Se continuará labor en la Corporación El
Ponson con el material recibido de
la laminas

Se continúa conforme a la programación, cada lámina
se va recibiendo a satisfacción según lo
requerido




Trabaja

1. Ley Prolata

2. Materiales + 2 ay. later.

hora de mano: 8:00 AM -
hora final: 5:00 PM




Luz para N. de f.

Apr 29/25

(viernes)

En Continuo labora de rubrica con elio en 1^a de
 los de la ciudad de la Computa. Aporreña

Avance conforme a la programación




X Rodriguez

1 ing pedro

2 Andres 1 Aydelin

Hora de inicio " 8:00 AM

Hora final " 5:00 PM



José Luis Robert

April 30/15

(School)

Re: Contract for labor of valuable computer in school
one of the teachers of the Computer El personal.

Se requiere al contratista brigada de
limpieza y aseo.

PAEA

Trabajando

1 ing. White

2 Asesor + 1 capataz.

Horario de trabajo = 8:00 AM


Horario final = 2:00 PM

[Signature]

Ing. José Alvarado

Sept 2/15 (damp)

No to Polycryst. Act. v. d. d. d.

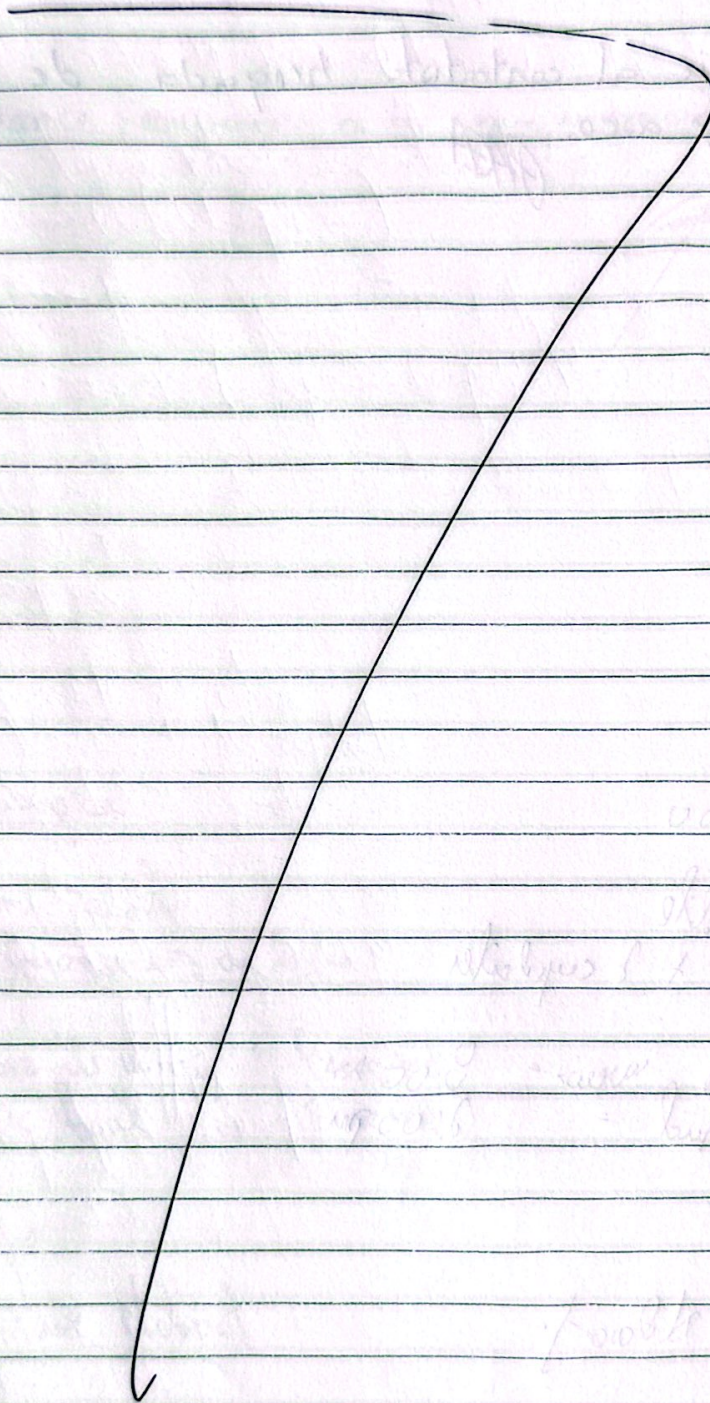

Septiembre 01/05 (Lun)

① Se continúan labores de mantenimiento Corralito en cada una de las lavas de las Compostas. El presente

② Se inician labores de preparación de la superficie en cada una de las lavas antes de ser pintadas

③ Se inician labores de mantenimiento Corralito en cada uno de los distribuidores presentes por el operativo el sistema de apertura y cierre de Compostas

④ Se inician labores de limpieza en Aqueducto de pablos de las Compostas de agua viva con la colaboración de personal de la zona.

⑤ Se inician labores en el curso de colocación de agua con el mantenimiento de las barreras.

Requisitos

1 eq. pelle de chivo

2 Ollas + 6 ayudantes

1 Horno + 1 ayudante

10 personas

15 ayudantes de variados baranderos

Hora de inicio: 07:00 am

Hora final: 5:00 pm

José Luis Nolasco

Septiembre 02/25 (Mañana)

○ Se continuó realizando trabajos a toda hora de la mañana en la Compuera El porvenir

○ Se continuó labores de preparación de la Esquina antes de los trabajos (Laminar Compuera).

○ Se siguen labores de voladura en los sectores de la Compuera (El porvenir)

○ Se continuó labores de limpieza de Compuera de agua viva (Agua de pablo).

○ Se continuó labores en las banderas de la Peña.

Trabajos

1 periodo de obra.

3 horas + 10 minutos.

1 Oficial + 4 ayudantes

Hora de inicio: 8:00 AM

Hora final: 5:00 PM


Jorge José [illegible]

Se realizó visita a la aguada de Pablo, la Peña y el porvenir para revisar de manera conjunta los avances.

Se solicita mayor detalle en las banderas respecto de limpieza, grates y anticorrosivo



Septiembre 03/25 (viernes)

Se Continúa realizando trabajos en las lavas de las Corporación El Porvenir.


Se Continúan labores de preparación de la superficie antes de aplicar la pintura (Laminar Corporación).

Se Sigue la obra de vallados de las instalaciones perimetrales (El Porvenir).

Se Continúan labores de limpieza de desperdicios de obra dentro de la parcela de pasto.

Se Continúan labores de vallados en las lavas de la zona.

No se autoriza pintura entre tanto la interventoría no de recibo previo de las tareas previas en bancadas.



Techyrow.

2 puntos de obra
3 horas + 16 puntos
1 punto 84 puntos

hora de inv. 8:00 am.
hora final: 5:00 pm

 Sig. Jaime Alvar.

Septiembre 01/05 (pasa)

① Se Continúan realizando trabajos (El personal) de
Cada una de las damas.


② Se Continúan labores de pintura en cada una de las
zonas de los Comedores El Personal.

③ Se Siguen labores de trabajos Comedores de las
habilitaciones para.

④ Se Continúan labores de corte de gas para la
con la obtención de los perfiles de Apodas de perfil.

⑤ Se Continúan labores en el uso de Siderano
de la zona.

Se revisaron los avances en la peña y
aguada de pablo y se observa adecuado
desempeño de las asociaciones a cargo.



Tehapan


1 pueblo de obra

3 personas a la salida

1 oficial + capataz

Hora de inicio = 8:00 AM

Hora final = 5:00 PM




José José Alderete

Septiembre 05/15 (viernes)

- ① Se continúan labores de mantenimiento correctivo en cada una de las barras de la Casapeta El Porvenir.
- ② Se continúan labores de pintura sobre las barras de la Casapeta El Porvenir.
- ③ Se continúa manteniendo a las instalaciones por dentro.
- ④ Se continúan labores de limpieza en alrededores de PCH.
- ⑤ Se continúan labores en la zona (manteniendo barridos).

Se avanza conforme a la programación.



Plaboyes:


1 Perito de obra

3 Operarios + 18 ayudantes

1 Oficial + 4 ayudantes

Horas de mano: 8.000 M

Horas fuel: 5.00 M

 Sr. Juan Nolasco.

Septiembre 2018 (Sábado)

Se Continúa labor de materializar Cooperas en
Cada uno de los Laminas de las Cooperas El porvenir.

Se Continúa labor de poner plus las Cooperas
El porvenir


Se Continúa retribuyendo de los trabajadores pequeños


Se Continúa limpieza en aguas de pinto

Se Continúa labor en la zona

Se realiza visita conjunta en la zona y
ayuda de Pablo encontrando avance
de acuerdo con la programación de
obras.

11/9
P.I.


D.I.


P.A.

Trabajo


1 punto de obra

3 personas + 10 ayudantes

1 oficial + 4 ayudantes

hora de mano: 8.00 am



hora fin: 4.00 pm



Ing. Jorge Nelson

September 03/25 (Sunday)

No to polygon activities

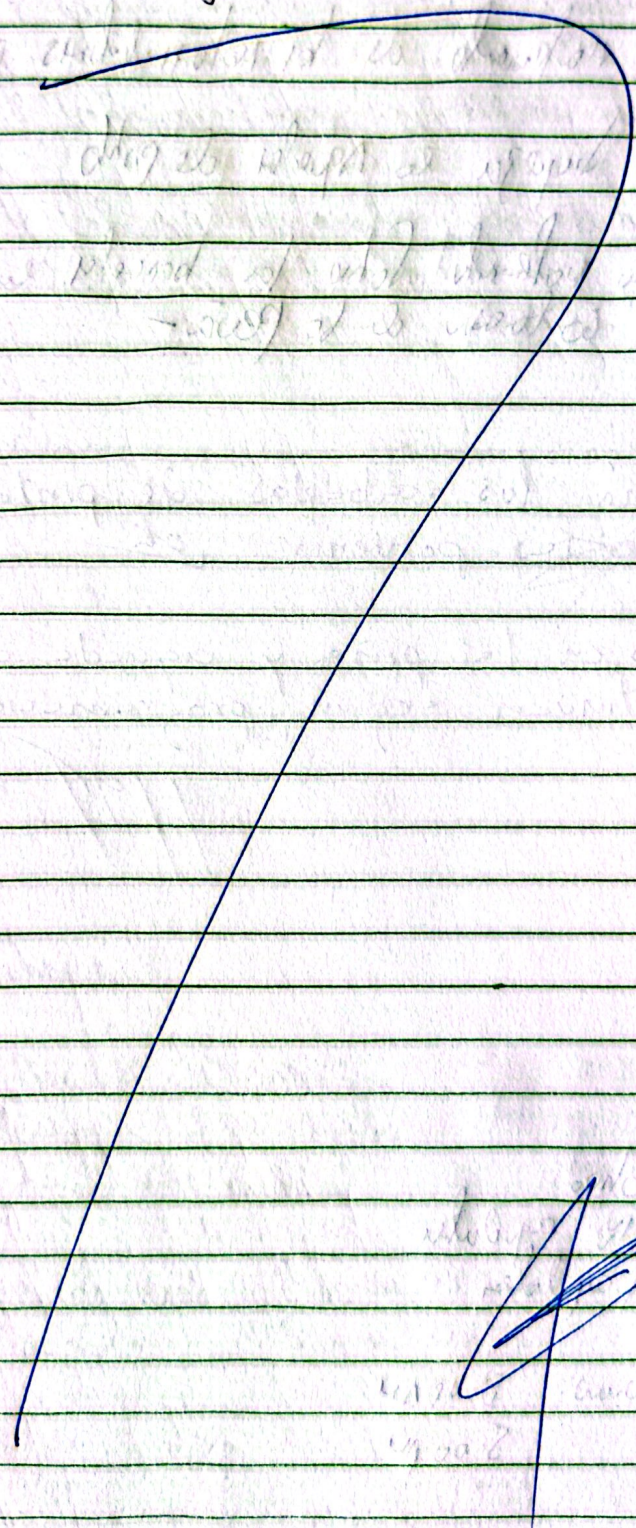

Full time pay 1/2

○ Pe cutrem rezultat de bi matematica pe baza

o P. Cartman bayera le Aquela de pinto

o fe Gutman volkshat lohu la barcelo e d
mulo se Gutman de fe pua-

Se inspeccionó los acabados de pintura en compuertas porvenir. OK

las labores en la peña y aguada de pablo continúan según programación

1191

T Rahn pawa

1. Public & Soc.

3 boxes of 10 apples

1 of each + 4 cry. I later

Ans. 2 (viii): 8.00 AM


How much fuel = 5.00 gm

~~Dr. Xing Jiaqi~~ Xing Jiaqi

Septiembre 09/01 (martes)

- ① P Continuar trabajo de pintura sobre las carpetas El porqué
- ② P Continuar trabajo de los materiales papeles
- ③ P Continuar trabajo en Aguada de pueblo.
- ④ P Continuar trabajo sobre la búsqueda en el grupo de Codificación de la zona.

Avance según programación



Techonpaw


1 Pueblo de Jura.

3 Hermanos + 13 apellidos

1 Oficial + 4 apellidos

Hora de inicio: 8:00 am

Hora fin: 5:00 pm

 por José Nelson P.

Septiembre 10 de (Miércoles)

Se Continúan labores de pintura sobre las Computas El yonca

Se Continúan trabajos sobre las instalaciones puentes

Se Continúan trabajos en Apala de pinto

Se Continúan trabajos en el caso de estacion de la púa (borrador).

Se lleva a cabo el corte de avance de obra para proyectar acto de recibo parcial No. 02, de manera conjunta se revisa el soporte de cantidades y registro fotografico.

- El contratista se compromete a proyectar informe para reunion.

- Interventor: proyectar acto de R. P. 02 y recibo a satisfaccion.

Proyectos

1. Balle de obra
2. Herrero + 1/2 piqueta
1. Piqueta + 3 apuntes

Horario de man. 8:00 AM
Horario final: 5:00 PM

Ing. Jaime Aldana.
