

**INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO**

CONTRATO	VEJ-302-2025
PROYECTO DE CONCESIÓN	CÓRDOBA - SUCRE

Informe correspondiente al periodo 1 de mayo al 31 de mayo de 2025.

Fecha de elaboración: 22 de julio de 2025.

Contrato de Prestación de Servicios VEJ-302 de 2025.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Contrato No.	No. 002 del 06 de marzo 2007
Objeto:	Estudios y Diseños Definitivos, Gestión Predial, Gestión Social, Gestión Ambiental, Financiación, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento, del Proyecto de Concesión Córdoba-Sucre.
Contratista:	Autopistas de la Sabana S.A.S
Plazo del contrato:	De acuerdo con la cláusula octava del Contrato de Concesión el término de ejecución es de 19 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera y segunda del otrosí No. 7 la fecha de permanencia mínima y fecha de terminación del contrato será el 30 de junio de 2024. Se alcanzó el ingreso esperado el 20 de abril del 2025
Valor inicial:	\$ 215.435.000.000 (pesos de diciembre de 2005).
Valor total de contrato:	\$ 1.612.904.600.707 (pesos de diciembre de 2005).
Generación:	Tercera
Ingreso esperado:	En la Cláusula Segunda del Otrosí No. 7 del 01 de diciembre de 2015 se modificó el valor del Ingreso Esperado a \$519.621.162.123 pesos constantes de diciembre de 2005.



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO	VEJ-302-2025
PROYECTO DE CONCESIÓN	CÓRDOBA - SUCRE

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

TIPO DE DOCUMENTO	OBJETO	VALOR	FECHA
Contrato 002 de 2007	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL "CÓRDOBA - SUCRE"	\$215.435.000.000	6/03/2007
Adicional 1	Adicionar recursos para el desarrollo de las labores del alcance progresivo, del apéndice E, respecto al tramo Corozal –Cruz del Viso. b) Desembolso por actualización del pago del aporte estatal por valor de \$178.191.032.	\$27.885.828.720 Alcance Progresivo - Apéndice E	28/12/2007
Modificación 1	Modificar el texto del numeral 26.5.1 del contrato de Concesión, el cual quedará como sigue: GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El Concesionario dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá presentar para aprobación del INCO de manera adicional la Garantía única de cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, una garantía para responder y mantener indemne por cualquier concepto a la Nación – INCO frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, o de la nación – INCO, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agente o subcontratistas de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones imputables al Concesionario en la ejecución del contrato. (...).	N.A.	15/02/2008
Modificación 2	Las partes acuerdan modificar y complementar el esquema de adquisición de predios establecido en el contrato de concesión No. 002 de 2007 para el proyecto vial "Córdoba – Sucre", con el ánimo de agilizar su ejecución y establecer, a su vez, mecanismos concretos de control y vigilancia en materia de gestión predial, en armonía con el ordenamiento jurídico que regula la función administrativa, la adquisición de predios de utilidad pública y la ejecución de obras por concesión.	N.A.	8/05/2008
Otrosí No. 1	1)Realizar los estudios, diseños definitivos, gestión social, gestión predial, gestión ambiental, operación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente (ampliación de la sección a ley 105 de 1993) entre el municipio de Corozal en el PR11+0800 de la Ruta 2515 de la Red Vial nacional hasta la Ye de acceso al municipio de Puerta de Hierro, en el PR25+000 de la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud de 13.2 km. 2)realizar los estudios y diseños definitivos del sector Puerta del Hierro – Cruz del viso 3)construcción de los peajes las Florez y Los Garzones y de seguridad Vial, en el tramo Corozal – Carmen de Bolívar.	Valor acordado en el adicional 1	27/06/2008
Otrosí No. 2	Se acuerda modificar los incisos relacionados con los siguientes numerales del contrato de concesión: • 1,85 de la cláusula 1. Definiciones subcuenta 1. • 23.4 de la cláusula 23. Manejo de los recursos financieros – FIDEICOMISO. • 63.6 de la cláusula 63. INTERVENTORIA Y CONTROL.	N.A.	2/10/2008

**INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO**

CONTRATO	VEJ-302-2025
PROYECTO DE CONCESIÓN	CÓRDOBA - SUCRE

TIPO DE DOCUMENTO	OBJETO	VALOR	FECHA
Otrosí No. 3	Adicionar el alcance físico del objeto del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 – proyecto de Concesión Vial Córdoba – Sucre, con la vía paralela a la circunvalar entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional Las Mercedes; la intersección de la vía paralela a la circunvalar en el K0+000 de la misma vía; la calle 41 en extensión de 1,60 km y la intersección a nivel en la misma, y la continuación a la denominada paralela a la circunvalar entre PR 5+850 y la intersección con la vía que conduce de Montería a Cereté (Mocari) para incluir las siguientes actividades: A) Obras del alcance progresivo previstas en el apéndice E del contrato de Concesión 002 de 2007. B) OBRAS ADICIONALES. 2) Modificar el inciso primero de la cláusula 14 relativa al cumplimiento del Ingreso Esperado.	\$46.659.414.354 Alcance Progresivo - Apéndice E	10/12/2008
Otrosí No. 4	Adicionar al alcance físico del objeto del contrato de Concesión, el estudio, diseño y construcción del puente vehicular en el Municipio de Lorica.	N.A. El valor se encuentra adicionado en el valor del adicional 2.	31/12/2008
Adicional 2	Adicionar al alcance del objeto del contrato de concesión la ejecución de las siguientes obras y actividades: A) Obras adicionales. Rehabilitación de la calzada entre Puerta de Hierro y Carreto. Rehabilitación de la calzada entre Carreto y Cruz del Viso. Estudio, diseño y reconstrucción de la variante El Maizal en Sincelejo. Estudio, diseño y rehabilitación de la vía Cereté – Lorica. Estudio, diseño y construcción de un puente vehicular en Lorica. B) Operación y mantenimiento.	\$161.785.495.354	5/08/2009
Adicional 3	Activar parcialmente el Alcance Progresivo y adicionar el alcance físico del objeto del Contrato de Concesión, para la ejecución por cuenta y riesgo del concesionario de las siguientes obras y actividades: A) Alcance progresivo. Rehabilitación y mantenimiento de la calzada existente entre la ciudad de Sincelejo y el municipio de Toluviéjo. Y Estudio, diseño y construcción de la segunda calzada en los tramos Sincelejo – Sampués y la Ye – Sahagún. B) Obras adicionales.	\$407.399.904.906 Alcance Progresivo - Apéndice E	29/03/2010
Modificación 3	Modificar la cláusula 64 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	N.A.	4/05/2010
Otrosí No. 5	Modificar el numeral 2 de la CLAUSULA 64. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	N.A.	26/11/2012
Otrosí No. 6	Modificar la cláusula 12 del contrato de concesión, en el sentido de eliminar el numeral 12.1 que establece el hito 1 del alcance básico del contrato, correspondiente a la ejecución del Puente Curvo de la calle 42 de Montería.	No se tiene en cuenta el valor de este otrosí, en razón a que las obras pactadas se realizarán en sustitución de obras que se eliminaron del alcance básico y del adicional 3.	1/11/2013
Otrosí No. 7	Modificar el numeral 1.26 de la cláusula 1, la cláusula 13 y el numeral 14,3 de la cláusula 14 del contrato y establecer la fecha de terminación del "Período de permanencia mínima" y la fecha de terminación del contrato. Modificar la cláusula 14 del contrato – Ingreso esperando total del	N.A.	11/12/2015

**INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO**

CONTRATO	VEJ-302-2025
PROYECTO DE CONCESIÓN	CÓRDOBA - SUCRE

TIPO DE DOCUMENTO	OBJETO	VALOR	FECHA
	Concesionario. Modificar el numeral 23.4 – Subcuenta 3. Eliminar de la cláusula 12 del contrato, los incisos tercero y cuarto. Inicio de la etapa de operación y mantenimiento. Modificar el apéndice técnico B del contrato – Calificaciones mínimas del índice de estado para entrar a la etapa de operación y mantenimiento. Cronograma de obras pendientes – Anexo técnico del acuerdo conciliatorio. Eliminar de la cláusula 54 el numeral 54.1.9 y adicionar la cláusula 54A. Modificar las denominaciones contenidas en la cláusula 54. Modificación de las garantías del contrato. Reconocimiento de intereses previstos en el literal b de la cláusula 37 desde la fecha efectiva del uso de los recursos.		
Otrosí No. 8	El Concesionario ejecutará los estudios y definitivos (Fase III), gestión social, gestión ambiental, gestión predial, construcción, operación y mantenimiento de LA INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO GLORIETA EN LA DOBLE CALZADA DEL TRAMO SINCELEJO - COROZAL PR8+380 (SECTOR LA VIRGENCITA), municipio de Corozal Sucre, en sustitución de las inversiones previstas en la ejecución de obras y acciones de recuperación, preservación y conservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas del área de influencia del Proyecto. Para el efecto, se utilizarán los recursos disponibles en la Subcuenta 4, de acuerdo con las modificaciones que se incorporan en el modificadorio propuesto, y en la Subcuenta 3.	\$ 7.293.590.421 Estas obras fueron financiadas con recursos de la Subcuenta de Excedentes - Recursos propios del Proyecto.	20/11/2020

FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Inicio Fase Proconstrucción	1 de noviembre de 2007.
Inicio Fase Construcción	01 de noviembre de 2008.
Inicio Etapa Operación y Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 2 de agosto de 2018: La Yé – Sincelejo y Paralela Mocarí.• 15 de mayo de 2019: Montería – Cereté, Cereté – La Ye y Corozal – Puerta de Hierro.• 28 de junio de 2019: Sincelejo – Corozal.• 25 de febrero de 2021: Sincelejo – Tolviejo. El 25 de febrero de 2021 con la suscripción del acta de inicio de operación y mantenimiento del último de los tramos correspondiente al tramo Sincelejo – Tolviejo, se cumplieron las condiciones contractuales (De acuerdo con lo establecido en el otrosí No. 7) para iniciar la etapa de Operación y mantenimiento total del Proyecto, cuya acta fue suscrita el 25 de febrero de 2021.
Fecha Reversión	La fecha de terminación del Contrato de Concesión 002 de 2007 y por ende de reversión, está sujeta a la obtención del ingreso esperado y de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera y segunda del otrosí No. 7 la fecha de permanencia mínima era el 30 de junio de 2024, no obstante, como no se alcanzó el 100% del ingreso esperado en esta fecha, el mencionado otrosí prevé un plazo adicional de 2 años para la respectiva obtención, es decir, hasta el 30 de junio de 2026; El avance de ingreso esperado con corte a 30 de noviembre de 2024 es del 98,3%, de modo que según la proyección que se tiene, el Contrato de Concesión terminaría en febrero de 2025.



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

ASPECTOS TÉCNICOS

Actividades desarrolladas:

En el periodo correspondiente del 1 de mayo hasta el 31 de mayo se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación y validación de la información correspondiente al tráfico y recaudo de los meses febrero y marzo 2025 por medio de la información suministrada por la Agencia Nacional de Infra estructura, Zima Seguridad y Autopista de la sabana,
- Se realizo el informe de tráfico y recaudo de la estación de peaje las flores de los periodos 2009 – febrero 2025, para apoyar la respuesta de la información solicitada por la alcaldía de Sincelejo
- Apoyo a respuesta al Oficio ANI 20254090563392
- Se dio apoyo a respuesta del oficio remitido por la alcaldía de Sincelejo en el cual solicitaban las estadísticas del tráfico en los peajes flores y esperanza, información la cual se presentó por sentido en cada estación de peaje y discriminando cada categoría
- Se realizo la actualización de las tarifas en la Plataforma ANISCOPIO
- Se realizo el cargue de la información de tráfico y recaudo de las estaciones de peajes del proyecto Córdoba – Sucre en la plataforma ANISCOPIO correspondiente a los periodos febrero, marzo.
- Se llevo a cabo la verificación de la información correspondiente al área de planeación OETR fase de acopio, verificación y aprobación del tráfico y recaudo estaciones de peaje Córdoba – Sucre
- Proyección de oficio

-2025305016569. Asunto: solicitud de información tráfico y recaudo abril 2025 - contrato de concesión 002 de 2007 - proyecto vial Córdoba Sucre. Destinatario: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S Sergio Alejandro Camacho

- Asistencia a las siguientes Reuniones

-14/05/2025 Seguimiento de actividades tráfico y recaudo.

Descripción de las actividades realizadas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En el periodo correspondiente del 1 de mayo hasta el 31 de mayo se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevo a cabo la verificación y validación de la información correspondiente al tráfico y recaudo de los meses febrero 20 al 28 y marzo 2025 por medio de la información suministrada por la Agencia Nacional de Infra estructura, Zima Seguridad y Autopista de la sabana, teniendo en cuenta que no contábamos con interventoría en estas fechas no se pudo verificar la información en campo, se verifico por medio del seguimiento de los archivos que reposaban en los correos donde se nos siguió suministrado el tráfico y recaudo diario, información suministrada por parte del concesionario, información suministrada por la ANI dando cumplimiento a las



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

obligaciones tenemos que para los periodos febrero 20 al 28 y marzo 2025 el tráfico que tuvieron las estaciones de peaje Garzones 1, Garzones 2, Flores , Esperanza fue:


Febrero 20 al 28 del 2025

Garzones 1: **53.013**, Garzones 2: **54.730**, Flores: **95.375**, Esperanza: **37.477**

Marzo 2025:

Garzones 1: **174.966**, Garzones 2: **183.142**, Flores: **314.246**, Esperanza: **123.406**

- Se realizó el informe de tráfico y recaudo de la estación de peaje las flores de los periodos 2009 – febrero 2025, para apoyar la respuesta al requerimiento solicitado por la alcaldía de Sincelejo vía correo, en el cual también se solicitaba las estadísticas del flujo vehicular en los tramos concesionados de Autopista de la Sabana S.A.S año 2024 a 2025 y comportamiento del tráfico por categorías de la estación de peaje la Esperanza, esto dando cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por parte de la alcaldía de Sincelejo.



- Apoyo a respuesta al Oficio ANI 20254090563392 en el cual la Policía Nacional solicitaba el apoyo para la verificación del paso de los vehículos KPM-346 y ENU-054, a lo que se dio respuesta de que ya no se contaba con acceso a la base de datos U-TOLL desde el 30 de abril, por cuanto a esta fecha el sistema quedo a cargo del INVIAS, por lo anterior no fue posible verificar.



- Se dio apoyo a respuesta del oficio remitido por la alcaldía de Sincelejo en el cual solicitaban las estadísticas del tráfico en los peajes flores y esperanza, información la cual se presentó por sentido en cada estación de peaje y discriminando cada categoría.




INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE



- Se realizó la actualización de las tarifas en la Plataforma ANISCOPIO, dando cumplimiento a uno de los compromisos el cual es, que cada que se actualicen las tarifas en las estaciones de peaje deben ser actualizadas en el aplicativo de la ANI ANISCOPIO para poder llevar seguimiento.

Cambio de Tarifas ANISCOPIO:

Peaje	Estado Peaje	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Acciones
LOS GARDONES 2	Funcionamiento	02/04/2025			
LOS GARDONES 3	Funcionamiento	02/04/2025			
LA ESPERANZA	Funcionamiento	01/04/2025			
LAS FLORES	Funcionamiento	01/04/2025			

Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Acciones
02/04/2025	01/04/2025	Vigente	Publicado
01/04/2025	31/03/2025	Publicado	
01/04/2025	14/01/2025	Publicado	
01/04/2024	31/12/2024	Publicado	
15/01/2024	31/07/2024	Publicado	

- Se realizó el cargue de la información de tráfico y recaudo de las estaciones de peajes del proyecto Córdoba – Sucre en la plataforma ANISCOPIO correspondiente a los periodos febrero, marzo, dando cumplimiento a las obligaciones se debe cargar mensualmente el tráfico y recaudo de cada una de las estaciones de peajes concesionadas para que el área de planeación OETR lleve el seguimiento de cada uno de estos tráficos.

Cargue De Informacion Trafico y Recaudo ANISCOPIO:

Periodo	Estado	Acciones	Tráfico Sin Recaudo
01/04/2025 - 30/04/2025	Sin iniciar		
01/03/2025 - 31/03/2025	Sin iniciar		
01/04/2025 - 30/04/2025	Empezado a recaudar		
01/03/2025 - 31/03/2025	Publicado		
01/02/2025 - 30/02/2025	Publicado		
01/03/2025 - 31/03/2025	Publicado		
01/12/2024 - 31/12/2024	Publicado		
01/11/2024 - 30/11/2024	Publicado		
01/10/2024 - 30/10/2024	Publicado		
01/09/2024 - 31/08/2024	Publicado		

- Se llevo a cabo la verificación de la información correspondiente al área de planeación OETR fase de acopio, verificación y aprobación del tráfico y recaudo estaciones de peaje Córdoba – Sucre.




INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE




- Se Proyecto el oficio con Radicado ANI-2025305016569 con el fin de solicitar la información del tráfico y recaudo correspondiente al mes de abril, para verificación y aprobación.

-2025305016569. Asunto: solicitud de información tráfico y recaudo abril 2025 - contrato de concesión 002 de 2007 - proyecto vial Córdoba Sucre. Destinatario: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S Sergio Alejandro Camacho

- Asistencia a las siguientes Reuniones

-14/05/2025 Seguimiento de actividades tráfico y recaudo, reunión en la cual se mostró el avance y el trabajo que se estaba llevando a cabo con respecto a la validación y aprobación de los tráficos y recaudos correspondientes a los meses febrero y marzo, se mostraron los avances y el compromiso de la posterior entrega del respectivo informe de los tráficos validados.



- A continuación, se presentará una pequeña parte del informe de tráfico correspondiente a los meses febrero 20 al 28 2025 y marzo 2025.

Informe tráfico y recaudo:

4.2 COMPOSICIÓN DE TRÁFICO POR CATEGORÍAS

Los datos con los que se produjo el presente informe corresponden desde el 20 de febrero de 2025 a las 00:00 hasta el 28 de febrero a las 00:00 de 2025. A continuación, se presenta la composición promedio de tráfico por categorías de las estaciones de peaje Los Garzones I, Los Garzones II, Las Flores y La Esperanza, de acuerdo con el tráfico promedio diario.



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO


CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

COMPOSICIÓN PROMEDIO POR CATEGORÍAS FEBRERO 20 AL 28 DE 2025 ESTACIÓN DE PEAJE GARZONES I.

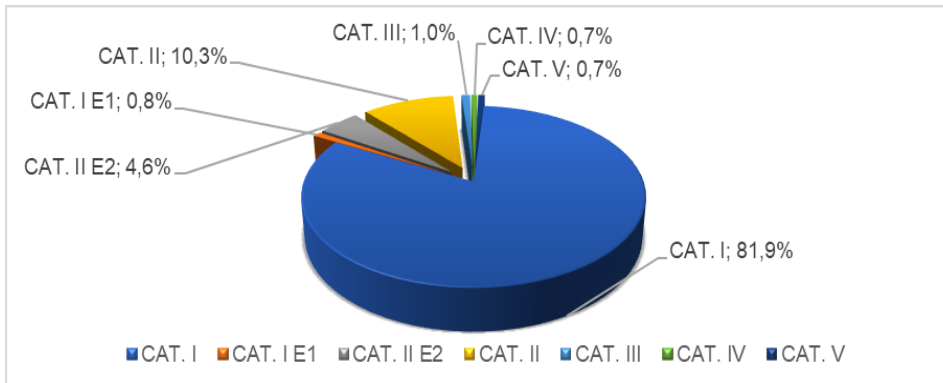

ESTACIÓN DE PEAJE GARZONES I - COMPOSICIÓN POR CATEGORÍA

FEBRERO 20 al 28 2025	CAT. I	CAT. I E1	CAT. II E2	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
VEHICULOS MES	42.838	441	2.431	5.389	499	344	379	52.321
PROMEDIO DIARIO	4.760	49	270	599	55	38	42	5.813
%	81,9%	0,8%	4,6%	10,3%	1,0%	0,7%	0,7%	100,0%

VEHICULOS EXENTOS	630	-	-	62	-	-	-	692
-------------------	-----	---	---	----	---	---	---	-----

TRÁFICO TOTAL ESTACIÓN	53.013
------------------------	--------



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO


CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

COMPOSICIÓN PROMEDIO POR CATEGORÍAS FEBRERO 20 AL 28 DE 2025 ESTACIÓN DE PEAJE GARZONES II.

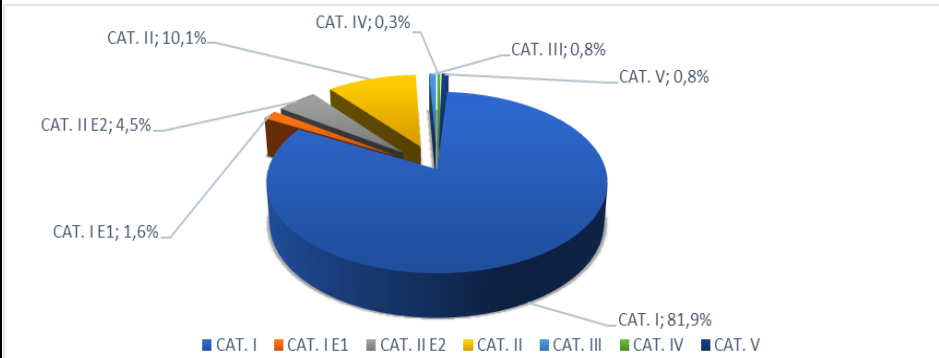

ESTACIÓN DE PEAJE GARZONES II - COMPOSICIÓN POR CATEGORÍA

FEBRERO 20 al 28 2025	CAT. I	CAT. I E1	CAT. II E2	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
VEHICULOS MES	44.176	883	2.440	5.444	417	178	419	53.957
PROMEDIO DIARIO	4.908	98	271	605	46	20	47	5.995
%	81,9%	1,6%	4,5%	10,1%	0,8%	0,3%	0,8%	100,0%

VEHICULOS EXENTOS	CAT. I	CAT. I E1	CAT. II E2	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
	710	-	-	63	-	-	-	773

TRÁFICO TOTAL ESTACIÓN	54.730
------------------------	--------



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO


CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

COMPOSICIÓN PROMEDIO POR CATEGORÍAS FEBRERO 20 AL 28 DE 2025 ESTACIÓN DE PEAJE LAS FLORES

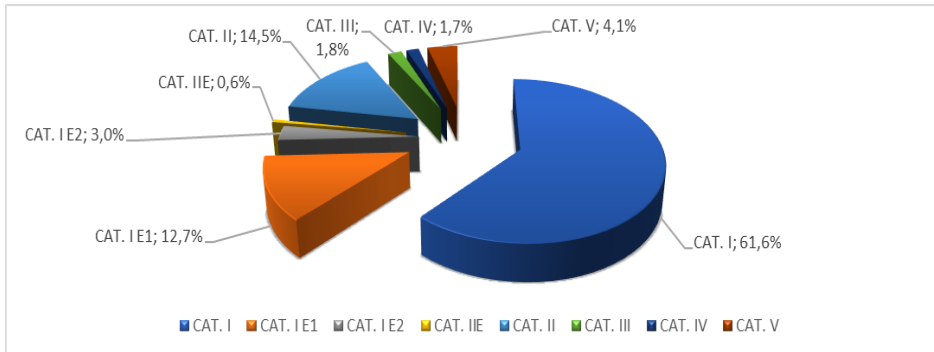

ESTACIÓN DE PEAJE FLORES COMPOSICIÓN POR CATEGORÍA

FEBRERO 20 al 28 2025	CAT. I	CAT. I E1	CAT. I E2	CAT. IIE	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
VEHÍCULOS MES	57.531	11.908	2.772	565	13.571	1.717	1.557	3.835	93.456
PROMEDIO DIARIO	6.392	1.323	308	63	1.508	191	173	426	10.384
%	61,6%	12,7%	3,0%	0,6%	14,5%	1,8%	1,7%	4,1%	100,0%

VEHICULOS EXENTOS	CAT. I	CAT. I E1	CAT. I E2	CAT. IIE	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
	1.682		-	-	235	2	-	-	1.919

TRÁFICO TOTAL ESTACIÓN	95.375
------------------------	--------



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO


CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

COMPOSICIÓN PROMEDIO POR CATEGORÍAS FEBRERO 20 AL 28 DE 2025 ESTACIÓN DE PEAJE LA ESPERANZA

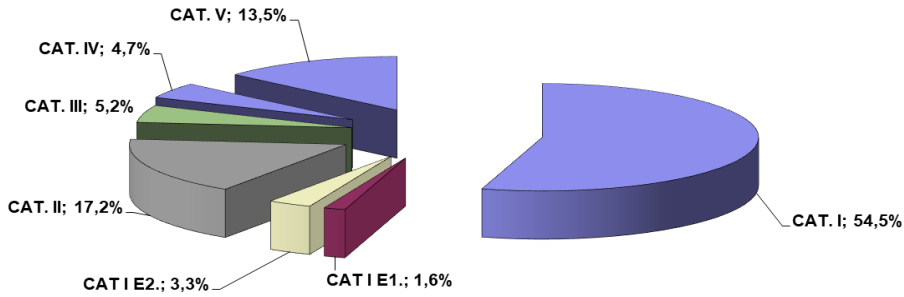

ESTACIÓN DE PEAJE LA ESPERANZA - COMPOSICIÓN POR CATEGORÍA

FEBRERO 20 al 28 2025	CAT. I	CAT. I E1	CAT. I E2	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
VEHÍCULOS MES	20.127	595	1.201	6.361	1.909	1.751	4.977	36.921
PROMEDIO DIARIO	2.236	66	133	707	212	195	553	4.102
%	54,5%	1,6%	3,3%	17,2%	5,2%	4,7%	13,5%	100,0%

VEHICULOS EXENTOS	CAT. I	CAT. I E1	CAT. I E2	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
	471	-	-	81	4	0	-	556

E. ADIC	E. REM.	E. GRUA
1	54	5

TRÁFICO TOTAL ESTACIÓN	
	37.477



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO


CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

COMPOSICIÓN PROMEDIO POR CATEGORÍAS FEBRERO 20 AL 28 DE 2025
TOTAL, PEAJES DEL PROYECTO

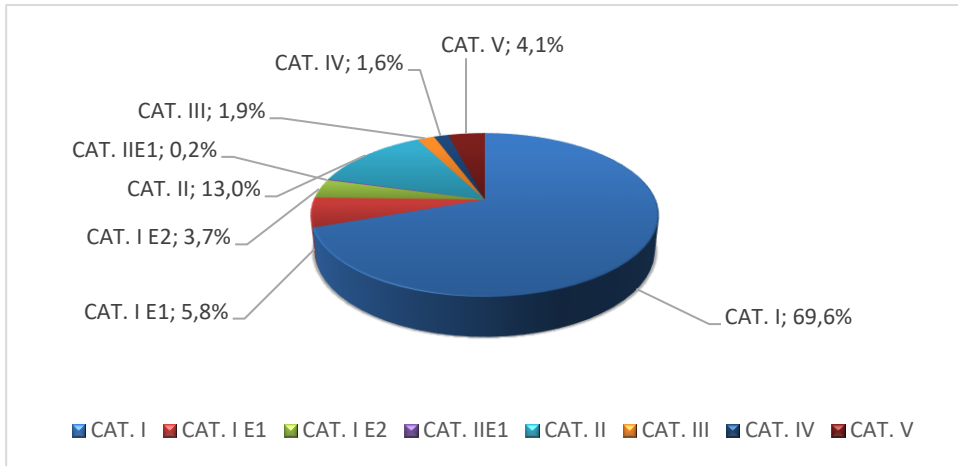

TOTAL, PEAJES DEL PROYECTO - COMPOSICIÓN POR CATEGORÍA

FEB FEBRERO 20 al 28 2025	CAT. I	CAT. I E1	CAT. I E2	CAT. IIE1	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOTAL
VEHÍCULOS MES	164.672	13.827	8.844	565	30.765	4.542	3.830	9.610	236.655
PROMEDIO DIARIO	18.297	1.536	983	63	3.418	505	426	1.068	26.295
%	69,6%	5,8%	3,7%	0,2%	13,0%	1,9%	1,6%	4,1%	100,0%
VEHICULOS EXENTOS	3.493	-	-	-	441	6	-	0	3.940

TRÁFICO TOTAL	240.595
---------------	---------

A continuación, se muestra tablas de tráfico anual de los Peajes de la Concesión:



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

AÑO	TRÁFICO ANUAL (con Exentos)				TOTAL, AÑO
	GARZONES 1	GARZONES 2	FLORES	ESPERANZA	
2017	2.405.585	2.833.344	3.724.865	1.255.016	10.218.810
2018	2.388.529	2.809.026	3.677.219	1.263.392	10.138.166
2019	2.385.255	2.822.001	3.682.980	1.263.697	10.153.933
2020	1.651.284	1.945.969	2.818.416	1.071.279	7.486.948
2021	2.184.891	2.811.680	3.775.520	1.424.244	10.196.335
2022	2.406.218	3.070.416	4.085.506	1.632.283	11.194.423
2023	2.378.803	2.612.899	4.013.376	1.579.851	10.584.929
2024	2.230.456	2.387.884	3.870.620	1.477.799	9.966.759

AÑO	TRÁFICO ANUAL (Vehículos)			
	GARZONES 1	GARZONES 2	FLORES	ESPERANZA
2007	309.809	94.508	135.409	0
2008	1.614.066	1.879.225	3.041.712	0
2009	1.679.654	1.906.429	3.095.825	0
2010	1.796.525	2.059.809	3.189.536	0
2011	1.869.177	2.096.826	3.523.938	0
2012	1.975.005	2.191.159	3.680.294	0
2013	2.073.777	2.345.767	3.622.026	0
2014	2.174.669	2.474.374	3.660.628	0
2015	2.317.148	2.661.371	3.697.118	0
2016	2.424.418	2.808.674	3.725.417	851.749
2017	2.374.377	2.796.857	3.652.809	1.235.102
2018	2.359.261	2.774.755	3.608.876	1.240.101
2019	2.354.807	2.786.304	3.617.208	1.239.693
2020	1.628.080	1.920.756	2.763.951	1.055.959
2021	2.154.704	2.777.938	3.709.274	1.402.484
2022	2.374.362	3.033.363	4.015.108	1.611.531
2023	2.347.774	2.577.294	3.935.125	1.554.863
2024	2.200.658	2.354.779	3.793.387	1.452.973



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

CONTRATO

VEJ-302-2025

PROYECTO DE CONCESIÓN

CÓRDOBA - SUCRE

DESCRIPCIÓN	TRÁFICO 2025 (con Exentos)				
	GARZONES 1	GARZONES 2	FLORES	ESPERANZA	TOTAL
ENERO	185.755	195.782	347.389	156.940	885.866
FEBRERO 20 al 28 2025	53.013	54.730	95.375	37.477	240.595
MARZO	174.966	183.142	314.246	123.406	795.760

DESCRIPCIÓN	TRÁFICO 2025				
	GARZONES 1	GARZONES 2	FLORES	ESPERANZA	TOTAL
ENERO	183.325	193.220	341.826	155.063	873.434
FEBRERO 20 al 28 2025	52.321	53.957	93.456	36.921	236.655
MARZO	172.707	180.581	307.715	121.363	782.366

Informe

Completo:

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcvelez_ani_gov_co/EnIDEV1COIJj4LaD-E2dZcBboltXxSv01gHDyo0gFjsMA?e=K2al6k

COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	RADICADO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO
2025-05-14	20253050165691	SOLICITUD DE INFORMACION TRAFICO Y RECAUDO ABRIL 2025 - CONTRATO DE CONCESION 002 DE 2007 - PROYECTO VIAL CORDOBA SUCRE.	AUTOPISTAS DE LA SABANA S AS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Jhon Carlos Velez Figueroa	Carretero 1	<i>Jhonvelez</i>

Revisado por:

NOMBRE	ÁREA	Vo.Bo.
Lilian Mercedes Laza Pinedo	Gerente de Proyectos Carretero 1	<i>Lilian Laza Pinedo</i>

Vo.Bo. Ana María Herrera Pedraza – Contratista – Líder de Seguimiento *Ana Herrera*

Vo.Bo. Henry Javier Contreras Morales – Contratista – Ingeniero Carretero *Henry Contreras*

Anexos: CCDESC_ANEXOS
