

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	21

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO 3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	21

	3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Periodo:	Febrero de 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento de Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 540 ML**

- **UBICACIÓN:**



Ilustración 1. Ubicación de Municipio Cantagallo con respecto al departamento de Bolívar.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 21

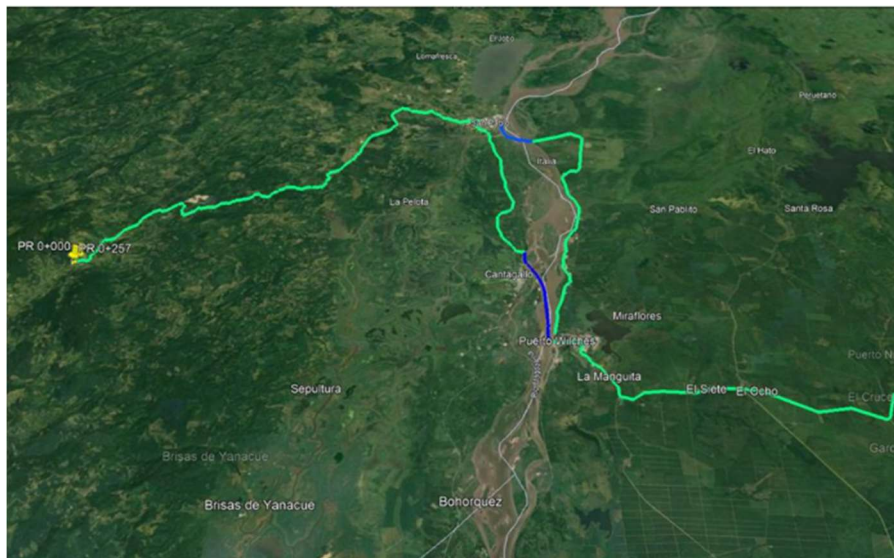


Ilustración 2. Localización a San Juan Medio.

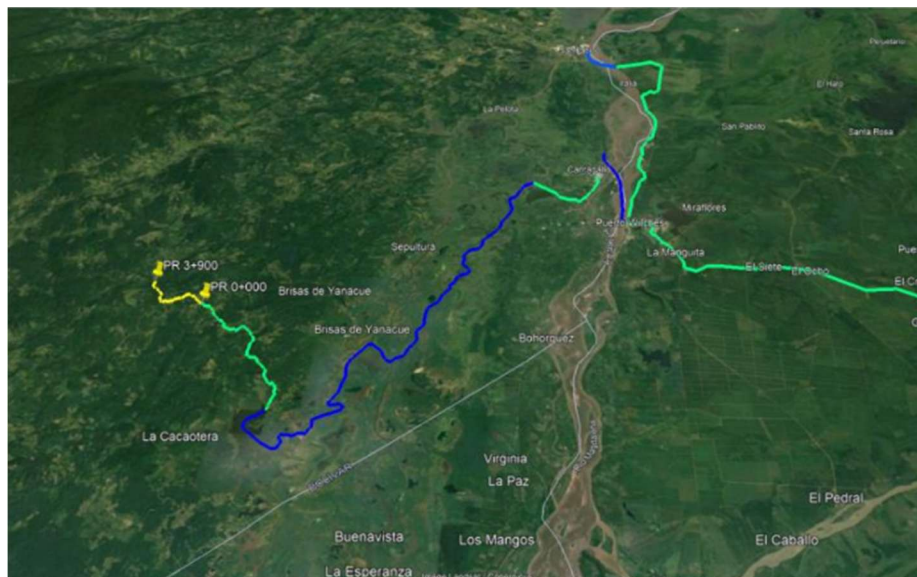


Ilustración 3. Localización a Patio Bonito.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	21

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024
-------------------------------	------------

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

CONTRATO DE OBRA	3943 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 199.967.114,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO DE OBRA	3873 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTACTO:	3133000111, manuelblandoncardenas@gmail.com		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	21

FECHA DE INICIO:	26/12/2023
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.056.050,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024
REANUDACIÓN	23/01/204
PRÓRROGA No.1	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO DE OBRA	3747 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO SECO	NIT:	901.679.470-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3233688470, jiaccanosecocantagallo@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 198.353.348,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

CONTRATO DE OBRA	3964 DE 2023
------------------	--------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	21

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	NIT:	901-675-293-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.798.436,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	CONVENIO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166023	10	3782 - 2023	NACIÓN	\$ 200.221.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1210723	10	3943 - 2023	NACIÓN	\$ 199.967.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1232823	10	3873 - 2023	NACIÓN	\$ 200.056.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1173123	10	3747 - 2023	NACIÓN	\$ 198.353.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1232323	10	3964 - 2023	NACIÓN	\$ 200.798.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES					\$ 0,00	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	21

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha de Febrero 2024 el contrato reporta un avance de % 0

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,365,654.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 145,345,333.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143,431,345.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	21

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143.784.630,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,149,319.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	21

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	21

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.204.425,40	NB-100288170	5/10/2023	31/10/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 21

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.051.106,35	NB-100288170	5/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.306.638,10	NB-100288170	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.993.423,00	NB-100291145	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 21

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.998.356,00	NB-100291145	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.990.135,00	NB-100291145	31/12/2023	31/12/2026

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.011.210,00	NB-100292252	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.002.803,00	NB-100292252	17/10/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	21

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.016.815,00	NB-100292252	31/12/2023	31/12/2026

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.670.670,00	NB-100291962	09/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.917.668,00	NB-100291962	9/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.506.005,00	NB-100291962	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		16	DE 21

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 49.159.688,00	NB-100291967	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 10.039.922,00	NB-100291967	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 60.239.511,00	NB-100291967	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	17	DE	21

Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	5075 DE 2023
----------------------------------	--------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	21

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT:	891.101.100-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2		
CONTACTO:	3186081555		
VALOR DEL INICIAL:	\$179.951.800,00		
ADICIONES:	0		
VALOR ACTUALIZADO:	\$179.951.800,00		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024		
PRÓRROGA No.1	25/03/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25/03/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1450723	2024	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$179.951.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	21

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha de Febrero 2024 el contrato reporta un avance de % 0

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	\$ 0,00	0 %
Total inversión ejecutada	\$ 0,00	0 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	10%	\$ 17.995.180,00	61-44-101052519	30/12/2023	27/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	27/08/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	21

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20%	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	26/03/2027
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 53.985.540,00	61-44-101052519	02/01/2024	02/01/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		CORRESPONDENCIA ENVIADA					
		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A		ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO	OBSERVACIONES RESPUESTA
		NOMBRE	ENTIDAD				
Int-Inv-Bolivar-001	1/02/2024	Presidentes JAC Veredas Cantagallo, Bolivar	JAC San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco Y Palto Bonito.	Solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.	Hojas de vida	1/2/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-002	7/02/2024	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio	Concepto hojas de vida JAC San Juan Medio y solicitud de documentación contractual	Hojas de vida	7/2/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-006	21/02/2024	Presidentes JAC Veredas Cantagallo, Bolivar	JAC San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco Y Palto Bonito.	Reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.	Hojas de vida	21/2/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-010	22/02/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Concepto hojas de vida JAC El Diamante	Hojas de vida	22/2/2024	Requiere Respuesta

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.				
CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	DIRIGIDO A	REMITE	ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO EXTERNO
N/A - CORREO ELECTRONICO	21/02/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	HOJA DE VIDA TECNOLOGO Y CONTADOR PUBLICO JUNTA EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	28/02/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	DOCUMENTOS SOPORTES FALTANTES EN LA HOJA DE VIDA DE ANA CASTILLO CONTADOR PUBLICO JUNTA EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA	N/A

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	21

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes legales.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director Territorial Bolívar (e.)

Supervisor del contrato 5075 de 2023

MP No. 13202-097750 BLV
