

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	20

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO 3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	20

	3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Periodo:	Marzo de 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento de Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 540 ML**

- **UBICACIÓN:**



Ilustración 1. Ubicación de Municipio Cantagallo con respecto al departamento de Bolívar.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE

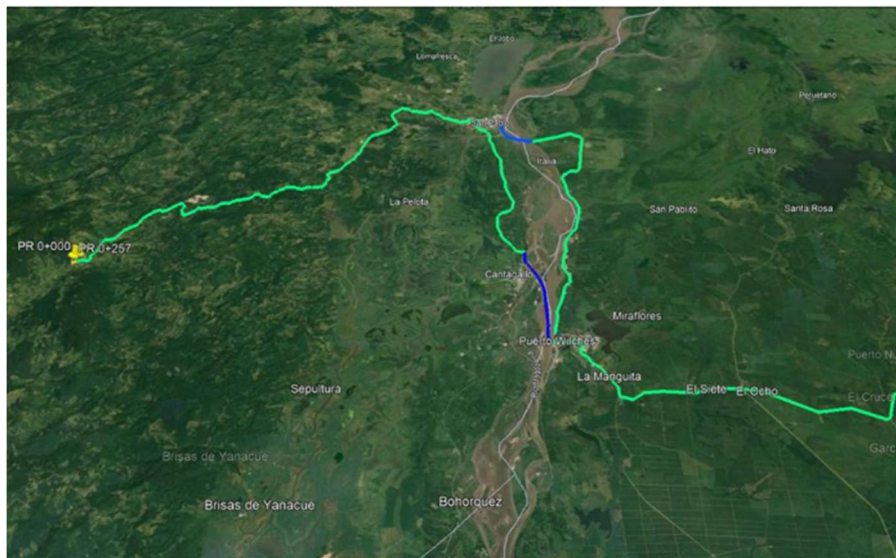


Ilustración 2. Localización a San Juan Medio.

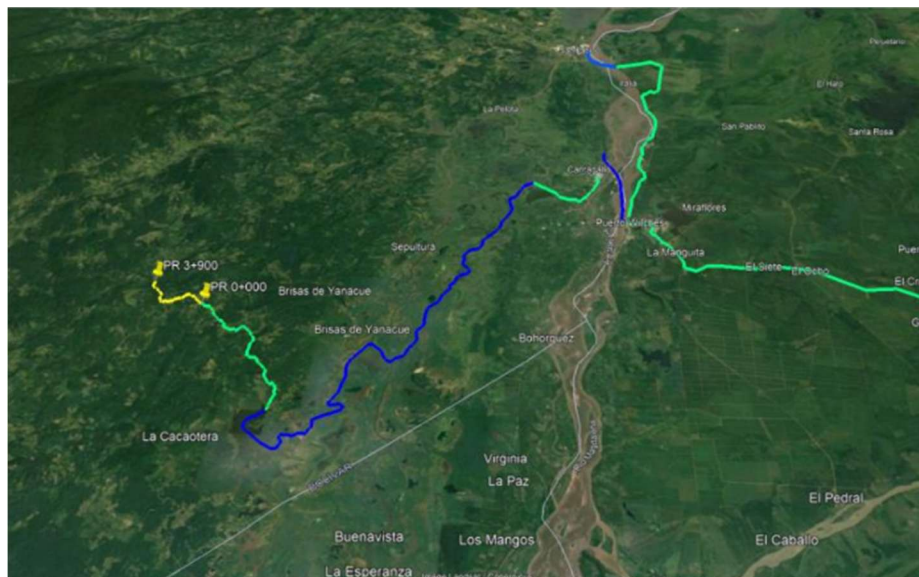


Ilustración 3. Localización a Patio Bonito.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 20

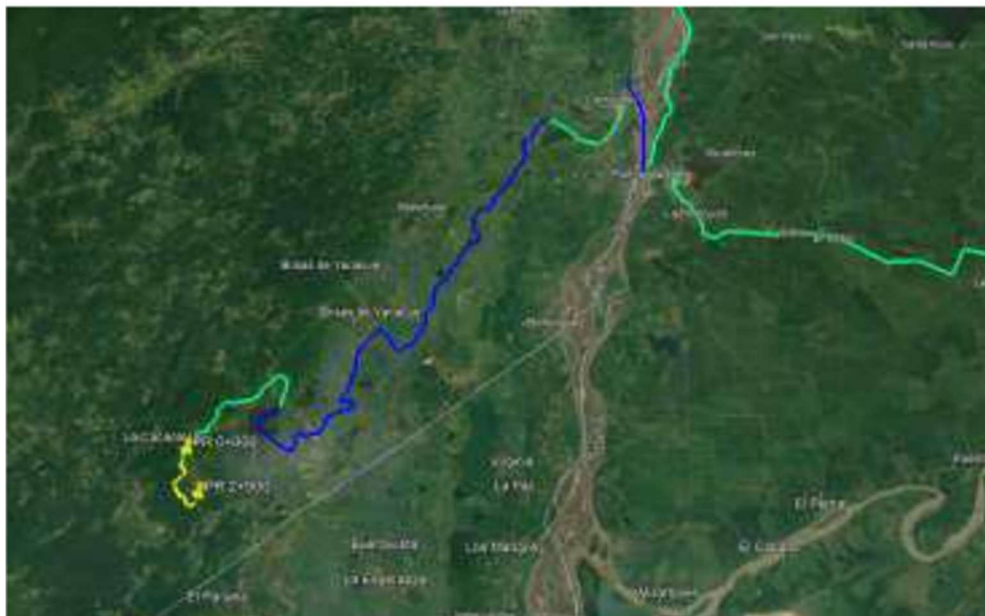


Ilustración 6. Localización a Caño Seco

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

CONTRATO DE OBRA	3782 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTACTO:	3116776721, jacveredasanjuanmedio@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2024		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 201.022.127,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
PRÓRROGA 1:	23/01/2024 (4 meses a partir del acta de inicio)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/06/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	20

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

CONTRATO DE OBRA	3943 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 199.967.114,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO DE OBRA	3873 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTACTO:	3133000111, manuelblandoencardenas@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.056.050,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	20

PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024
REANUDACIÓN	23/01/204
PRÓRROGA No.1	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO DE OBRA	3747 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO SECO	NIT:	901.679.470-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3233688470, jjaccanosecocantagallo@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 198.353.348,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

CONTRATO DE OBRA	3964 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	NIT:	901-675-293-6

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	20

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTACTO:	3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.798.436,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024
REANUDACIÓN	23/01/204
PRÓRROGA No.1	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	CONVENIO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166023	10	3782 - 2023	NACIÓN	\$ 200.221.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1210723	10	3943 - 2023	NACIÓN	\$ 199.967.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1232823	10	3873 - 2023	NACIÓN	\$ 200.056.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1173123	10	3747 - 2023	NACIÓN	\$ 198.353.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1232323	10	3964 - 2023	NACIÓN	\$ 200.798.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES					\$ 0,00	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha de Marzo 2024 el contrato reporta un avance de % 0

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,365,654.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 145,345,333.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143,431,345.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	20

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143.784.630,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,149,319.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	20

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	20

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___ O NO ___

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.204.425,40	NB-100288170	5/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.051.106,35	NB-100288170	5/10/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	20

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.306.638,10	NB-100288170	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.993.423,00	NB-100291145	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo					
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.998.356,00	NB-100291145	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.990.135,00	NB-100291145	31/12/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 20

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.011.210,00	NB-100292252	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.002.803,00	NB-100292252	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.016.815,00	NB-100292252	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 20

Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.670.670,00	NB-100291962	09/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.917.668,00	NB-100291962	9/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.506.005,00	NB-100291962	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		16	DE 20

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 49.159.688,00	NB-100291967	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 10.039.922,00	NB-100291967	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 60.239.511,00	NB-100291967	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	20

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	5075 DE 2023		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT:	891.101.100-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2		
CONTACTO:	3186081555		
VALOR DEL INICIAL:	\$179.951.800,00		
ADICIONES:	0		
VALOR ACTUALIZADO:	\$179.951.800,00		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024		
PRÓRROGA No.1	25/03/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	20

PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1450723	2024	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$179.951.800,00	\$ 24.885.756,00	\$ 155.066.044,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	\$ 20.912.400,00	\$ 3.973.356,00	\$ 0	\$ 24.885.756,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha de marzo 2024 el contrato reporta un avance de % 0

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	<u>\$ 0,00</u>	<u>0 %</u>
Total inversión ejecutada	<u>\$ 0,00</u>	<u>0 %</u>

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	20

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2024	2	PRÓRROGA	APROBADO

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	10%	\$ 17.995.180,00	61-44-101052519	30/12/2023	27/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	27/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20%	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	26/03/2027
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 53.985.540,00	61-44-101052519	02/01/2024	02/01/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 20

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		CORRESPONDENCIA ENVIADA					
		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A		ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO	OBSERVACIONES RESPUESTA
		NOMBRE	ENTIDAD				
Int-Inv-Bolivar-014	11/03/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Concepto hojas de vida JAC El Diamante.	Hojas de vida	11/3/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-015	11/03/2024	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio	Concepto hoja de vida Contador JAC San Juan Medio	Hojas de vida	11/3/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-016	12/03/2024	MIGUEL ROBERTO QUIROGA SERRANO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Patio Bonito	Concepto hojas de vida JAC Patio Bonito.	Hojas de vida	12/3/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-019	19/03/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Concepto hoja de vida Residente de obra - JAC El Diamante	Hojas de vida	19/3/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-020	19/03/2024	OLIVERIO DE JESUS OSORIO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Caño Seco	Concepto hojas de vida JAC Caño Seco.	Hojas de vida	19/3/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-021	19/03/2024	Presidentes JAC vereda San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito	Representante legales Junta de Acción Comunal vereda El Diamante, San Juan Medio, Santo Domingo, Caño Seco y Patio Bonito	Reunión de seguimiento presencial a los convenios solidario No. 3782-2023, No. 3964-2023, No. 3943, No. 3873-2023 y No. 3747-2023.	Seguimiento convenios	19/3/2024	Informativa

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.				
CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	DIRIGIDO A	REMITE	ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO EXTERNO
N/A - CORREO ELECTRONICO	1/03/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA INGENIEROS CIVIL DE LA JUNTA EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	4/03/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	DAMARIS OVIEDO - JAC SAN JUAN MEDIO	NUEVA HOJA DE VIDA CONTADOR FERNANDO FAJARDO JIMENEZ	HOJAS DE VIDA	N/A

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes legales.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
 Director Territorial Bolívar (e.)
 Supervisor del contrato 5075 de 2023
 MP No. 13202-097750 BLV
