

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	21

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO 3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL
---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	21

	PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Periodo:	Junio de 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento de Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 540 ML**

- **UBICACIÓN:**



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 21

Ilustración 1. Ubicación de Municipio Cantagallo con respecto al departamento de Bolívar.

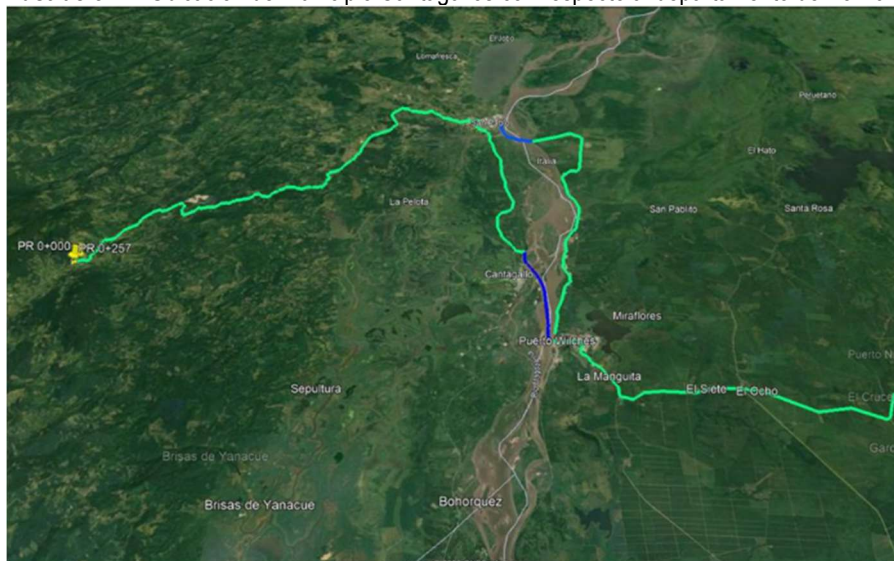


Ilustración 2. Localización a San Juan Medio.

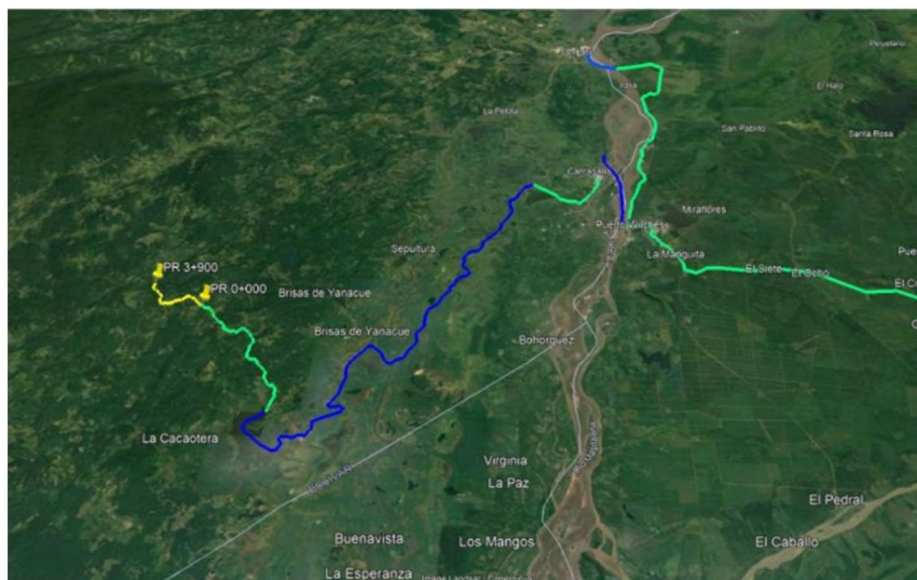


Ilustración 3. Localización a Patio Bonito.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 21

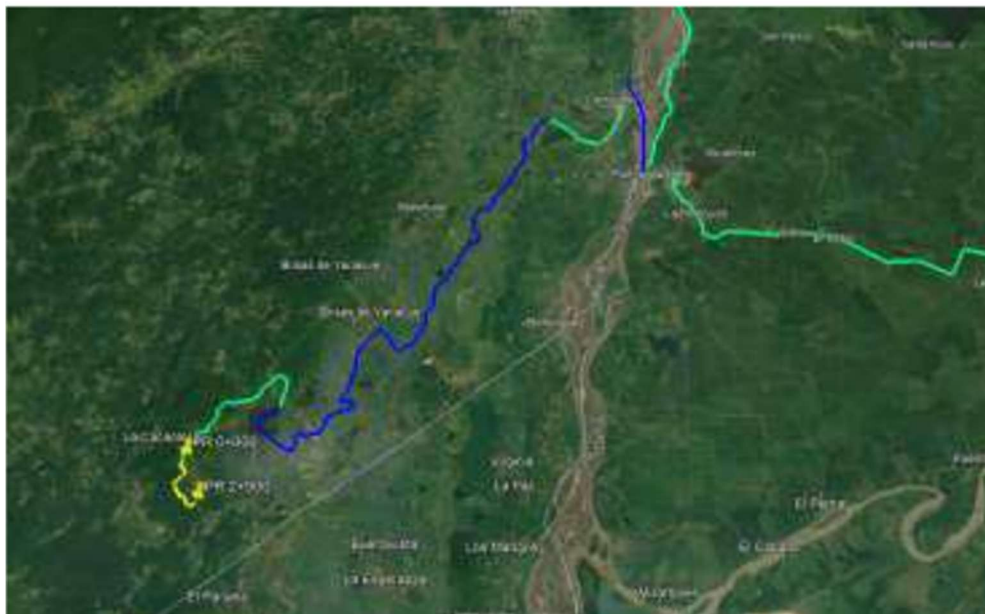


Ilustración 6. Localización a Caño Seco

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

CONTRATO DE OBRA	3782 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTACTO:	3116776721, jacveredasanjuanmedio@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2024		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 201.022.127,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
PRÓRROGA No. 1:	23/01/2024 (4 meses a partir del acta de inicio)		
PRÓRROGA No. 2:	30/06/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	21

PRÓRROGA No. 3	31/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2024

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

CONTRATO DE OBRA	3943 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.476.654-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 199.967.114,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/204		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		
PRÓRROGA No. 2	30/06/2024		
PRÓRROGA No. 3	31/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2024		

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO DE OBRA	3873 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE	NIT:	900.476.654-4

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	21

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTACTO:	3133000111, manuelblandoncardenas@gmail.com
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.056.050,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024
REANUDACIÓN	23/01/204
PRÓRROGA No.1	30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	31/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2024

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO DE OBRA	3747 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO SECO	NIT:	901.679.470-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3233688470, jjaccanosecocantagallo@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 198.353.348,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	21

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024
REANUDACIÓN	23/01/2024
PRÓRROGA No.1	30/04/2024
PRÓRROGA No. 2	30/06/2024
PRÓRROGA No. 3	31/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

CONTRATO DE OBRA	3964 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	NIT:	901-675-293-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
CONTACTO:	3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.798.436,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	17/01/2024		
REANUDACIÓN	23/01/2024		
PRÓRROGA No.1	30/04/2024		
PRÓRROGA No. 2	30/06/2024		
PRÓRROGA No. 3	31/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	CONVENIO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166023	10	3782 - 2023	NACIÓN	\$ 200.221.277,00	\$ 7.638.665,00	\$ 192.582.612,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	21

1210723	10	3943 - 2023	NACIÓN	\$ 199.967.114,00	\$ 7.213.845,59	\$ 192.753.268,41
1232823	10	3873 - 2023	NACIÓN	\$ 200.056.050,00	\$ 7.351.238,98	\$ 192.704.811,02
1173123	10	3747 - 2023	NACIÓN	\$ 198.353.348,00	\$ 7.219.052,94	\$ 191.134.295,06
1232323	10	3964 - 2023	NACIÓN	\$ 200.798.436,00	\$ 5.869.407,00	\$ 194.929.029,00
TOTALES				\$999.396.225,00	\$ 35.292.209,51	\$ 964.104.015,49

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha de Junio 2024 el contrato reporta un avance de 3.53 %

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,365,654.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 7.638.665,00	5,22%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 7.638.665,00	5,22%

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	21

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 145,345,333.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 7.213.845,59	4,96%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 7.213.845,59	4,96%

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143,431,345.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 7.351.238,98	5,13%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 7.351.238,98	5,13%

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143.784.630,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 7.219.052,94	5,02%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 7.219.052,94	5,02%

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146,149,319.00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 5.869.407,00	4,02 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 5.869.407,00	4,02 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	21

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

Meta física programada:	5,22 %
Meta física ejecutada:	5,22 %

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

Meta física programada:	4,96 %
Meta física ejecutada:	4,96 %

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

Meta física programada:	5,13 %
Meta física ejecutada:	5,13 %

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

Meta física programada:	5,02 %
Meta física ejecutada:	5,02 %

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Meta física programada:	4,02 %
Meta física ejecutada:	4,02 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	21

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	21

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

3782 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.204.425,40	NB-100288170	5/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.051.106,35	NB-100288170	5/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.306.638,10	NB-100288170	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100070500	05/10/2023	31/12/2023

3943 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	21

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.993.423,00	NB-100291145	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo					
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.998.356,00	NB-100291145	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.990.135,00	NB-100291145	31/12/2023	31/12/2026

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071501	17/10/2023	31/12/2023

3873 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 21

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	20%	\$ 40.011.210,00	NB-100292252	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5%	\$ 10.002.803,00	NB-100292252	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 60.016.815,00	NB-100292252	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071871	17/10/2023	31/12/2023

3747 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.670.670,00	NB-100291962	09/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios,	%	\$ 9.917.668,00	NB-100291962	9/10/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		16	DE 21

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.					
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.506.005,00	NB-100291962	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071758	09/10/2023	31/12/2026

3964 – 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 49.159.688,00	NB-100291967	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 10.039.922,00	NB-100291967	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 60.239.511,00	NB-100291967	31/12/2023	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	21

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Amparo básico - predios, labores y operaciones		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios		\$ 230.000.000,00	NB-100071761	17/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	21

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	5075 DE 2023		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT:	891.101.100-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2		
CONTACTO:	3186081555		
VALOR DEL INICIAL:	\$179.951.800,00		
ADICIONES:	0		
VALOR ACTUALIZADO:	\$179.951.800,00		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	25/03/2024		
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024		
PRÓRROGA No. 3	31/05/2024		
PRÓRROGA No. 4	30/06/2024		
PRÓRROGA No. 5	30/07/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/07/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1450723	2024	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$179.951.800,00	\$ 114.082.206,00	\$ 65.869.594,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	21

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	\$ 24.985.000,00	\$ 4.747.150,00	\$ 0	\$ 29.732.150,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha de Junio 2024 el contrato reporta un avance de 16.52 %

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	<u>\$ 29.732.150,00</u>	<u>16.52 %</u>
Total inversión ejecutada	<u>\$ 29.732.150,00</u>	<u>16.52 %</u>

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/06/2024	5	PRÓRROGA	APROBADO

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		20	DE 21

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	10%	\$ 17.995.180,00	61-44-101052519	30/12/2023	03/02/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	03/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20%	\$ 35.990.360,00	61-44-101052519	30/12/2023	02/08/2027
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 53.985.540,00	61-44-101052519	03/01/2024	03/01/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A		ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO	OBSERVACIONES RESPUESTA
		NOMBRE	ENTIDAD				
Int-inv-Bolivar-067	12/06/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Santo Domingo	Concepto hoja de vida JAC Santo Domingo	Seguimiento convenios	12/06/2024	No requiere Respuesta
CORRESPONDENCIA RECIBIDA							
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A		ASUNTO	COMPONENTE	FECHA DE RADICADO	OBSERVACIONES RESPUESTA
		NOMBRE	ENTIDAD				
N/A CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA EL DIAMANTE	SOLICITUD DE REINTEGRO PAGO POLIZAS JUNTA DE ACCION	DESEMBOLSOS	14/06/2024	N/A
N/A CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA SAN JUAN MEDIO	COTIZACIONES MATERIALES	DESEMBOLSOS	14/06/2024	N/A
N/A CORREO ELECTRONICO	17/06/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA PATIO BONITO	COTIZACIONES MATERIALES Y EQUIPOS	DESEMBOLSOS	17/06/2024	N/A
N/A CORREO ELECTRONICO	17/06/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA SANTO DOMINGO	DOCUMENTOS PARA SOLICITAR REEMBOLSO POLIZAS INICIALES JAC SANTO DOMINGO	DESEMBOLSOS	17/06/2024	N/A
N/A CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA SAN JUAN MEDIO	ENVIO DOCUMENTOS DE LAS COTIZACIONES SOLICITADAS	DESEMBOLSOS	18/06/2024	N/A

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	21

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.**


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 **ASPECTOS LEGALES.**

A la fecha o periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes legales.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director Territorial Bolívar (e.)

Supervisor del contrato 5075 de 2023

MP No. 13202-097750 BLV
