

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	26

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	26

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO - 3866 de 2023
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLOR - 3990 de 2023
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLOR, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Periodo:	Marzo de 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

VEREDA LA CEIBA: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Ceiba teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+500 en la vereda La Ceiba.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	26

VEREDA LA CUMBRE: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Cumbre, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+200 en la vereda la Cumbre.

VEREDA LA MENDOZA: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda La Mendoza, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 3+280 en la vereda La Mendoza.

CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda San francisco, teniendo como punto de cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 6+880 en el corregimiento de San Francisco

VEREDA JUAN PABLO II: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda Juan Pablo Segundo, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 5+510 en la vereda Juan Pablo II.

VEREDA SAN BENITO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar, en la vereda San Benito, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 4+790 en el corregimiento San Benito.

CORREGIMIENTO VILLAFLORES: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar, en la vereda Villaflores, teniendo como punto de referencia cuyo inicio de intervención es el PR 0+000 y finaliza en el PR 0+670 en el corregimiento Villaflores

- **LONGITUD TOTAL POR INTERVENIR:** 838 ML
- **UBICACIÓN:**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 26

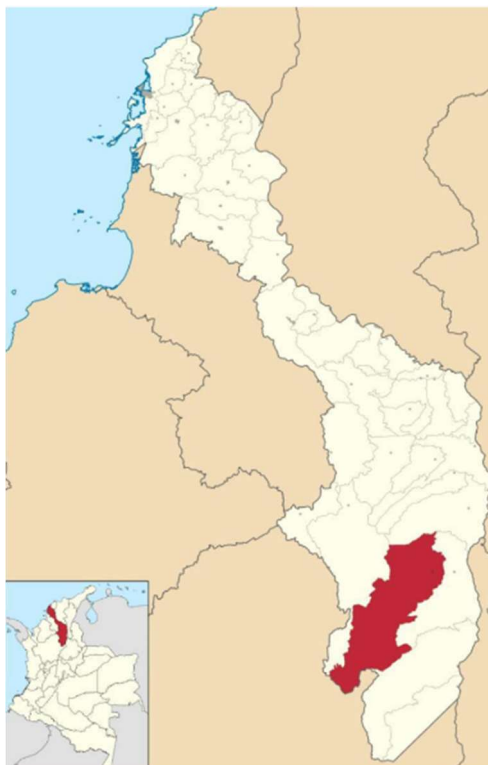


Ilustración 1. Ubicación de Municipio Santa Rosa del Sur con respecto al departamento de Bolívar.


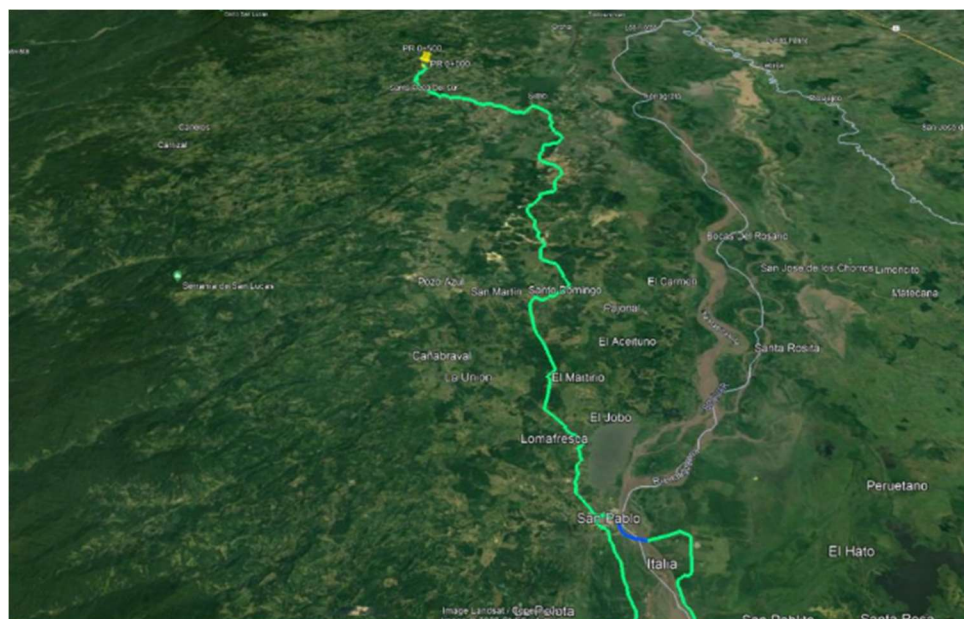


Ilustración 2. Localización Vía a Intervénir- la Ceiba



CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	26

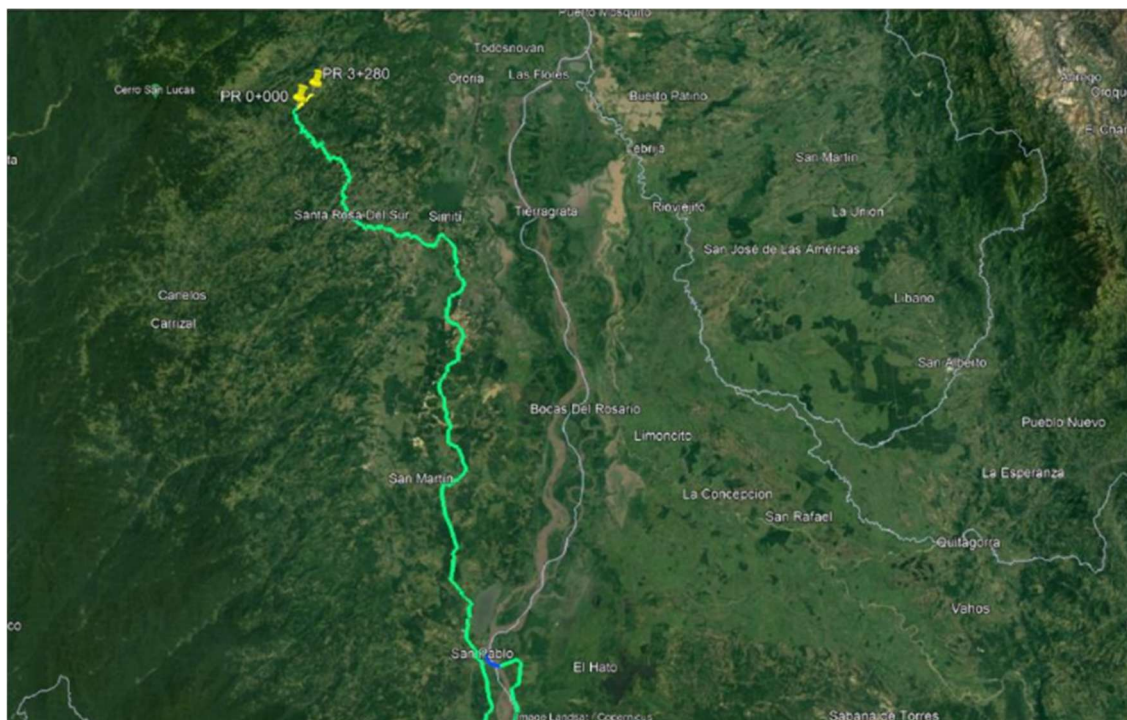
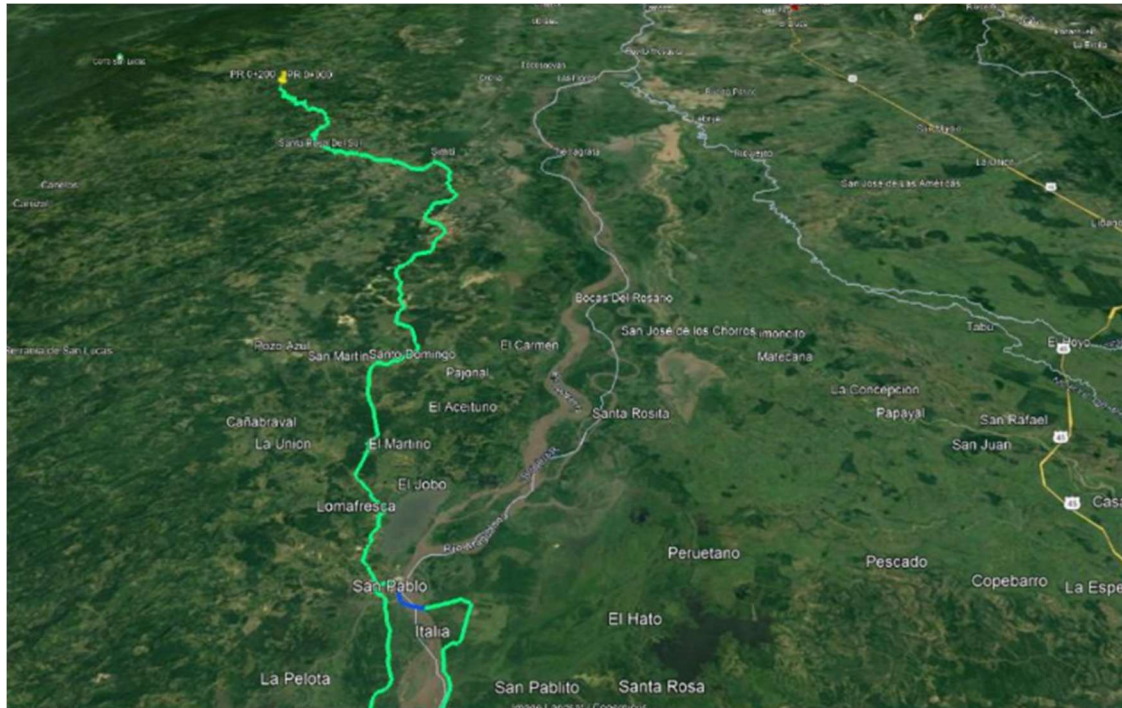


Ilustración 4. Localización del tramo a intervenir vereda la Mendoza

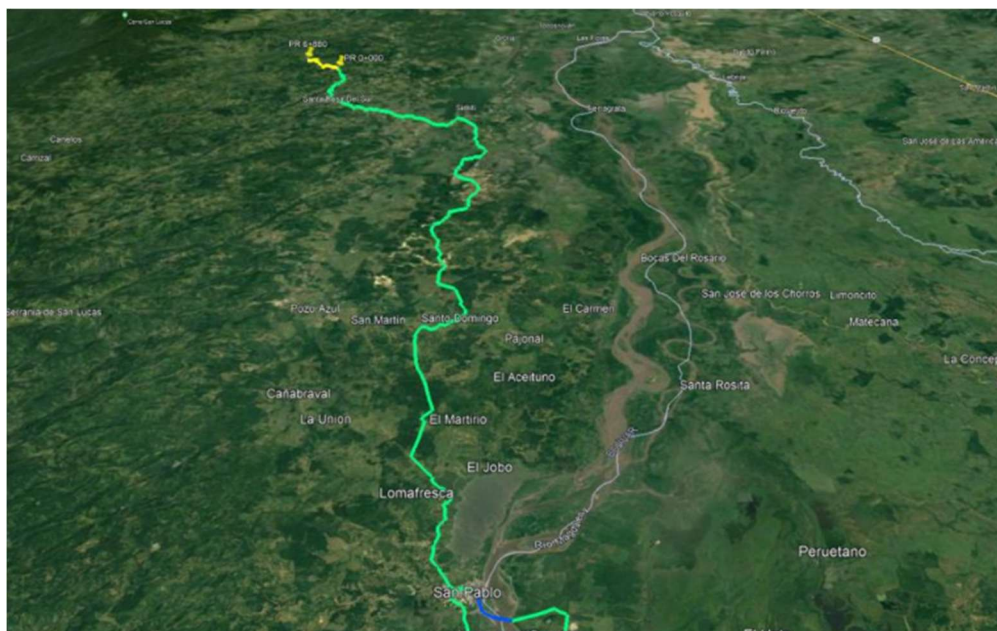


Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir corregimiento de San Francisco.




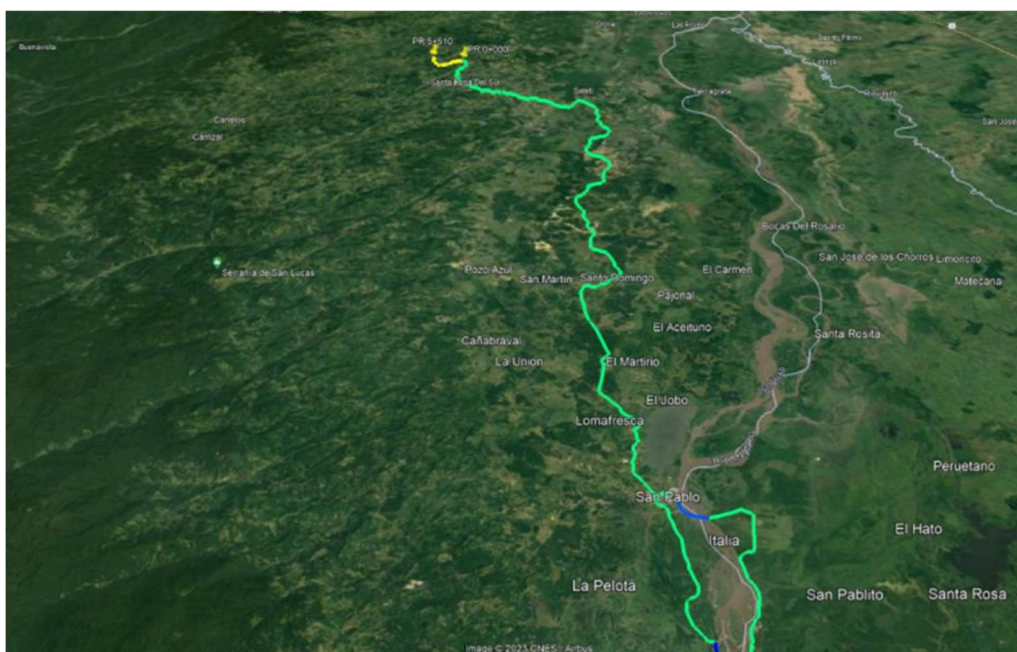


Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda San Pablo II



CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	26



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 26

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3923 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA	NIT:	901.091.058-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 199.956.933,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	22/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3811 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE	NIT:	900.457.884-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$198.500.764		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	22/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	26

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024
-------------------------------	------------

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3721 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO.	NIT:	900.360.950-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 199.393.902,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023		
REANUDACIÓN No. 1	22/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3888 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO	NIT:	806.004.664-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	26

VALOR DEL CONVENIO:	\$198.376.729,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 2	22/01/2024
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3566 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II	NIT:	900.436.702-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 198.044.180,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023		
REANUDACIÓN No. 2	22/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3866 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO	NIT:	900.361.024-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	26

FECHA DE INICIO:	22/12/2023
VALOR DEL CONVENIO:	\$199.433.373,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 2	22/01/2024
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023

CONTRATO DE OBRA	3990 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES	NIT:	901.272.801-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 200.824.675,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 26/06/2024		
SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023		
REANUDACIÓN No. 2	22/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/06/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	CONVENIO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1385623	10	3566 -2023	NACIÓN	\$ 199.956.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1173823	10	3721- 2023	NACIÓN	\$198.500.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1164523	10	3811 -2023	NACIÓN	\$ 199.393.902,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1229623	10	3866 - 2023	NACIÓN	\$198.376.729,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1163923	10	3888 - 2023	NACIÓN	\$ 198.044.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1232023	10	3923 - 2023	NACIÓN	\$199.433.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220323	10	3990 - 2023	NACIÓN	\$ 200.824.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES				\$1.394.530.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	26

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$141.950.574,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$143.927.190,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA - 3721 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	26

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$141.406.056,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$140.422.330,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$143.485.628,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 144.829.142,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	26

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 142.789.783,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares.

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	26

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	26

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA - 3923 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39,991,386.60	NB - 100290107	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9,997,846.65	NB - 100290107	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59,987,079.90	NB - 100290107	31/12/2023	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		17	DE 26

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	NB-100071269	12/10/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE - 3811 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___ O NO ___

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.700.152,80	NB - 100289304	09/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.925.038,20	NB - 100289304	9/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.550.229,20	NB - 100289304	31/12/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	NB-100071770	09/10/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO - 3721 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		18	DE 26

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.878.781,00	NB - 100293688	6/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9,969,696.00	NB - 100293688	06/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59,818,171.00	NB - 100293688	17/10/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	NB-100072413	06/10/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO - 3888 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.675.345,00	NB - 100288689	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		19	DE 26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9,918,836.45	NB - 100288689	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59,513,018.70	NB - 100288689	17/10/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	NB-100071250	17/10/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II - 3566 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39.608.836,00	No. 100294049	28/09/2023	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9.902.209,00	No. 100294049	28/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59.413.254,00	No. 100294049	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		20	DE 26

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	%	\$ 232.000.000,00	No. 100072535	28/09/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO -3866 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$ 39,886,674.60	NB - 100288722	11/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$ 9,971,668.65	NB - 100288722	11/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 59,830,011.90	NB - 100288722	31/10/2023	31/12/2028

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	NB-100071964	11/10/2023	31/12/2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLORES - 3990 de 2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		21	DE 26

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	%	\$40.164.935,00	No:100294654	19/10/2023	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	%	\$10.041.234,00	No:100294654	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	%	\$ 60.247.403.00	No:100294654	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Garantías de RCE

Amparos	% Asegurado	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	%	\$ 232.000.000,00	No. 100072711	19/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	26

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	5074 DE 2023
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.5682666
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -LOTE 1"
CONTRATISTA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
NIT	800.173.768-1
SUPERVISOR	ING. FABIAN ARANGO PINEDA
VALOR	\$ 249.062.240
ADICIÓN No.1	\$ 0,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	\$ 249.062.240
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		23	DE 26

2.1. INFORMACION GENERAL

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
170123	2023	NACION	No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 249.062.240,00	\$ 49.433.195,00	\$ 199.629.045,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	\$ 18.039.000,00	\$ 3.427.410,00	\$ 0,00	\$ 21.466.410,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	<u>\$ 21.466.410,00</u>	<u>8.6%</u>
Total inversión ejecutada	<u>\$ 21.466.410,00</u>	<u>8.6%</u>

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	26

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/03/2027	2	PRÓRROGA	APROBADO

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento	10%	\$ 24,906,224,00	No. 11-44-101215227	28/12/2023	23/09/2024
Buen Manejo Anticipo	100%	\$ 41,859,200,00	No. 11-44-101215227	28/12/2023	23/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20%	\$ 49,812,448,00	No. 11-44-101215227	28/12/2023	23/03/2027
Calidad del Servicio	30%	\$ 74,718,672,00	No. 11-44-101215227	31/12/2023	31/12/2028

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GER-014-24	07/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión pólizas
GER-015-24	08/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Solicitud Diseño Vallas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 26

GER-016-24	11/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Respuesta a su comunicado "SOLICITUD DE INFORMACION PARA ACTUALIZACION POLIZAS DEL CONVENIO"
GER-017-24	11/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 1 v2
GER-018-24	11/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 2
GER-019-24	11/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 3
GER-020-24	12/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 4
GER-021-24	12/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 5
GER-022-24	12/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 6
GER-023-24	13/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Solicitud Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría No. 5074 DE 2023
GER-024-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 1
GER-025-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Respuesta a su comunicado "Respuesta al radicado No 2024EVUVRAZ-022366" - Remisión de informe Semanal 2
GER-026-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 3
GER-027-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 4
GER-028-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 5
GER-029-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 6
GER-030-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 7
GER-031-24	15/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Remisión de informe Semanal 8
GER-032-24	27/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Desembolsos pendientes
GER-033-24	27/03/2024	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDO	Solicitud autorización para ingreso comisión de topografía de interventoría

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	26

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha ó periodo del presente informe, se realizó prórroga al contrato 5074 – 2023 hasta 30/04/2024

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar (e.)
Supervisor del contrato 5074 de 2023
MP No. 13202-097750 BLV
