




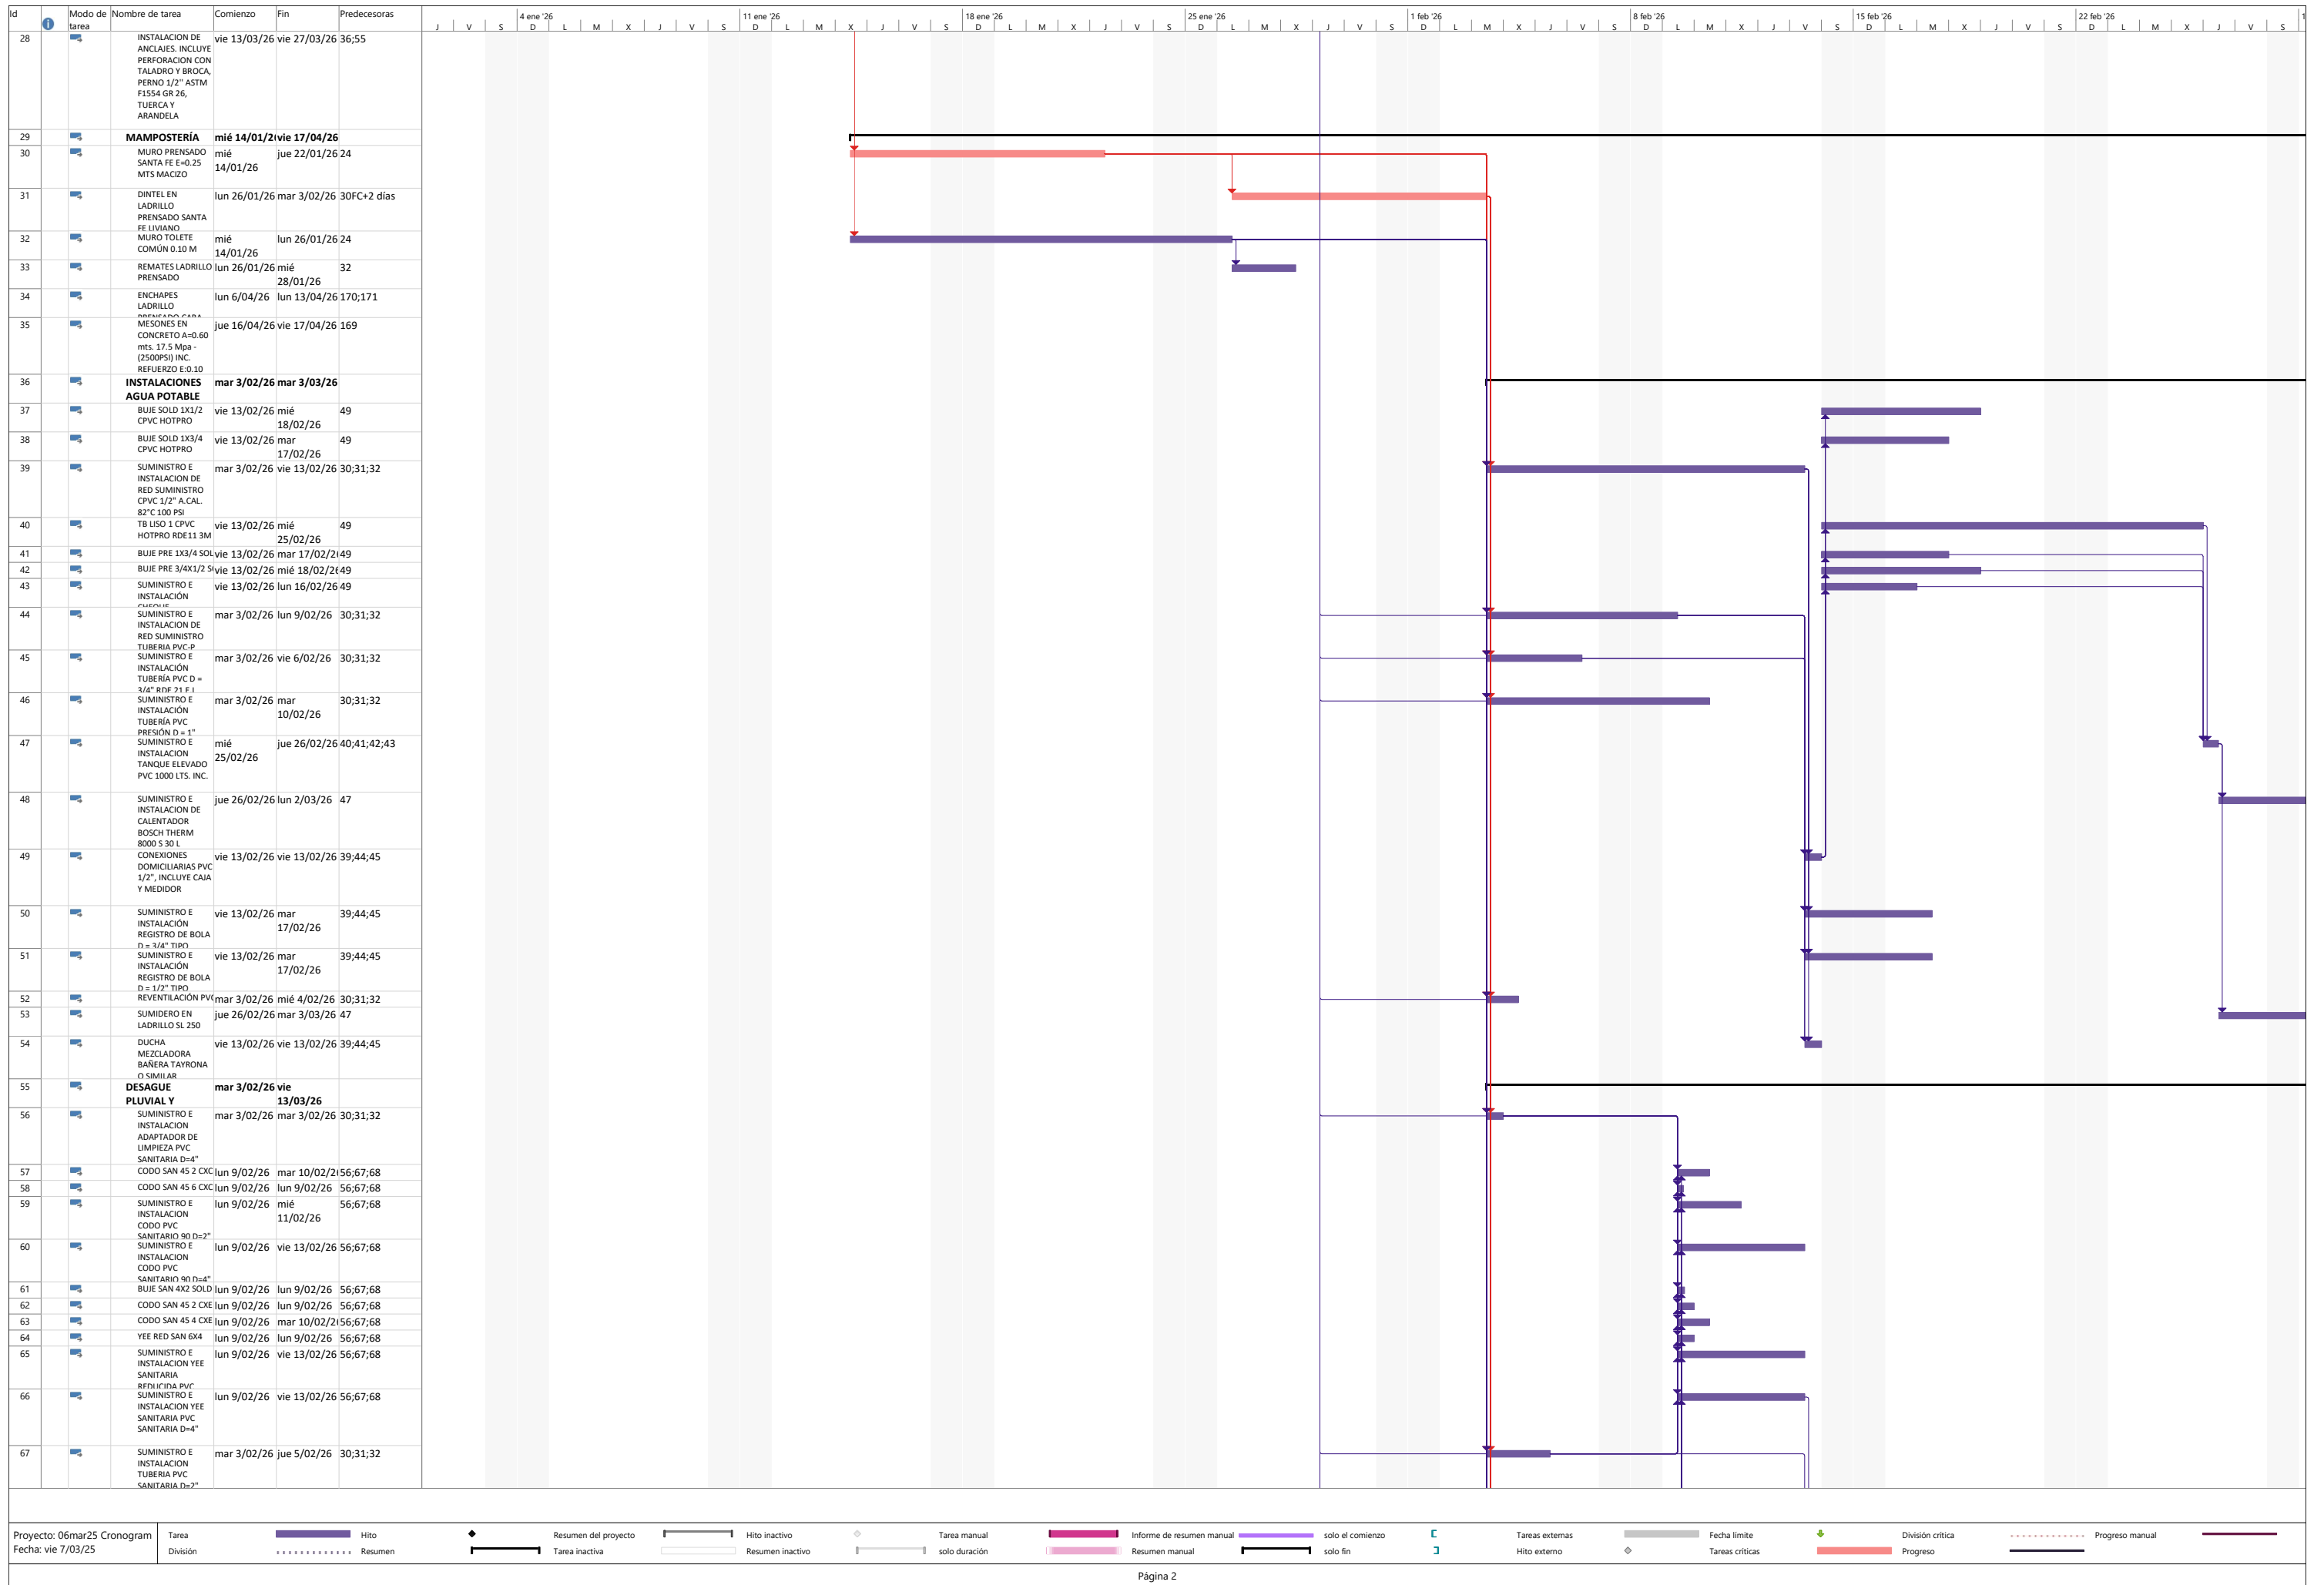

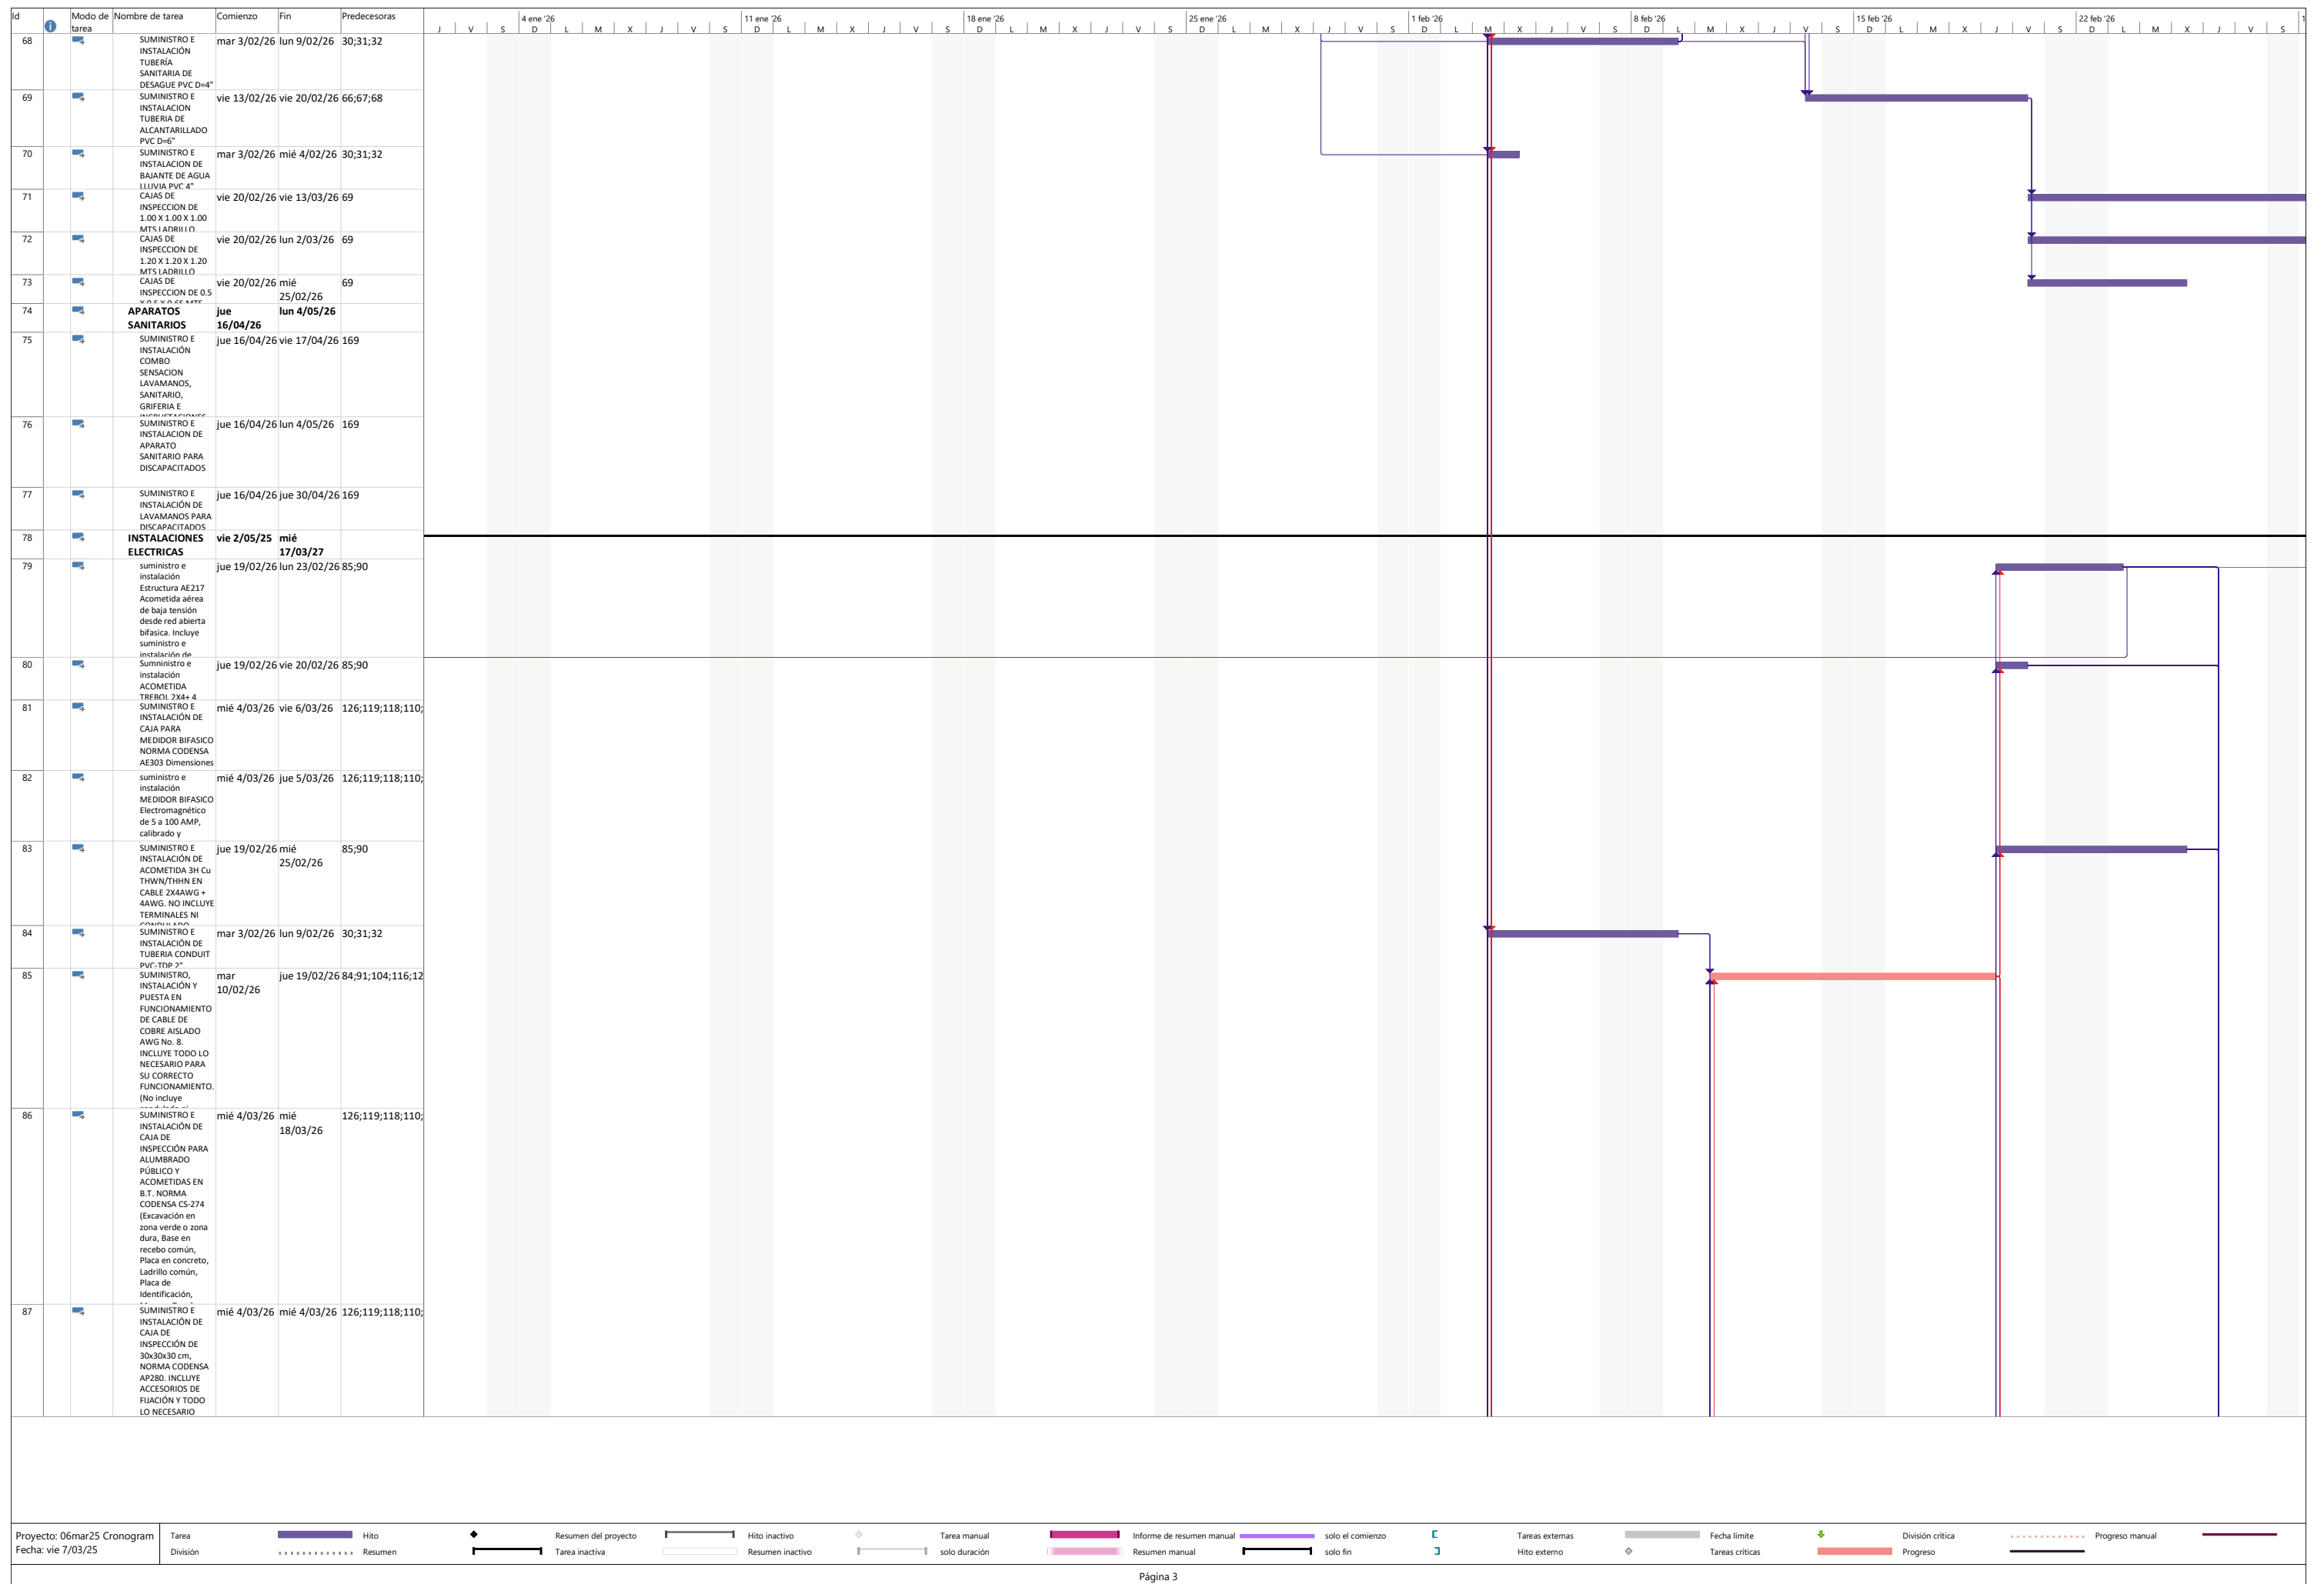

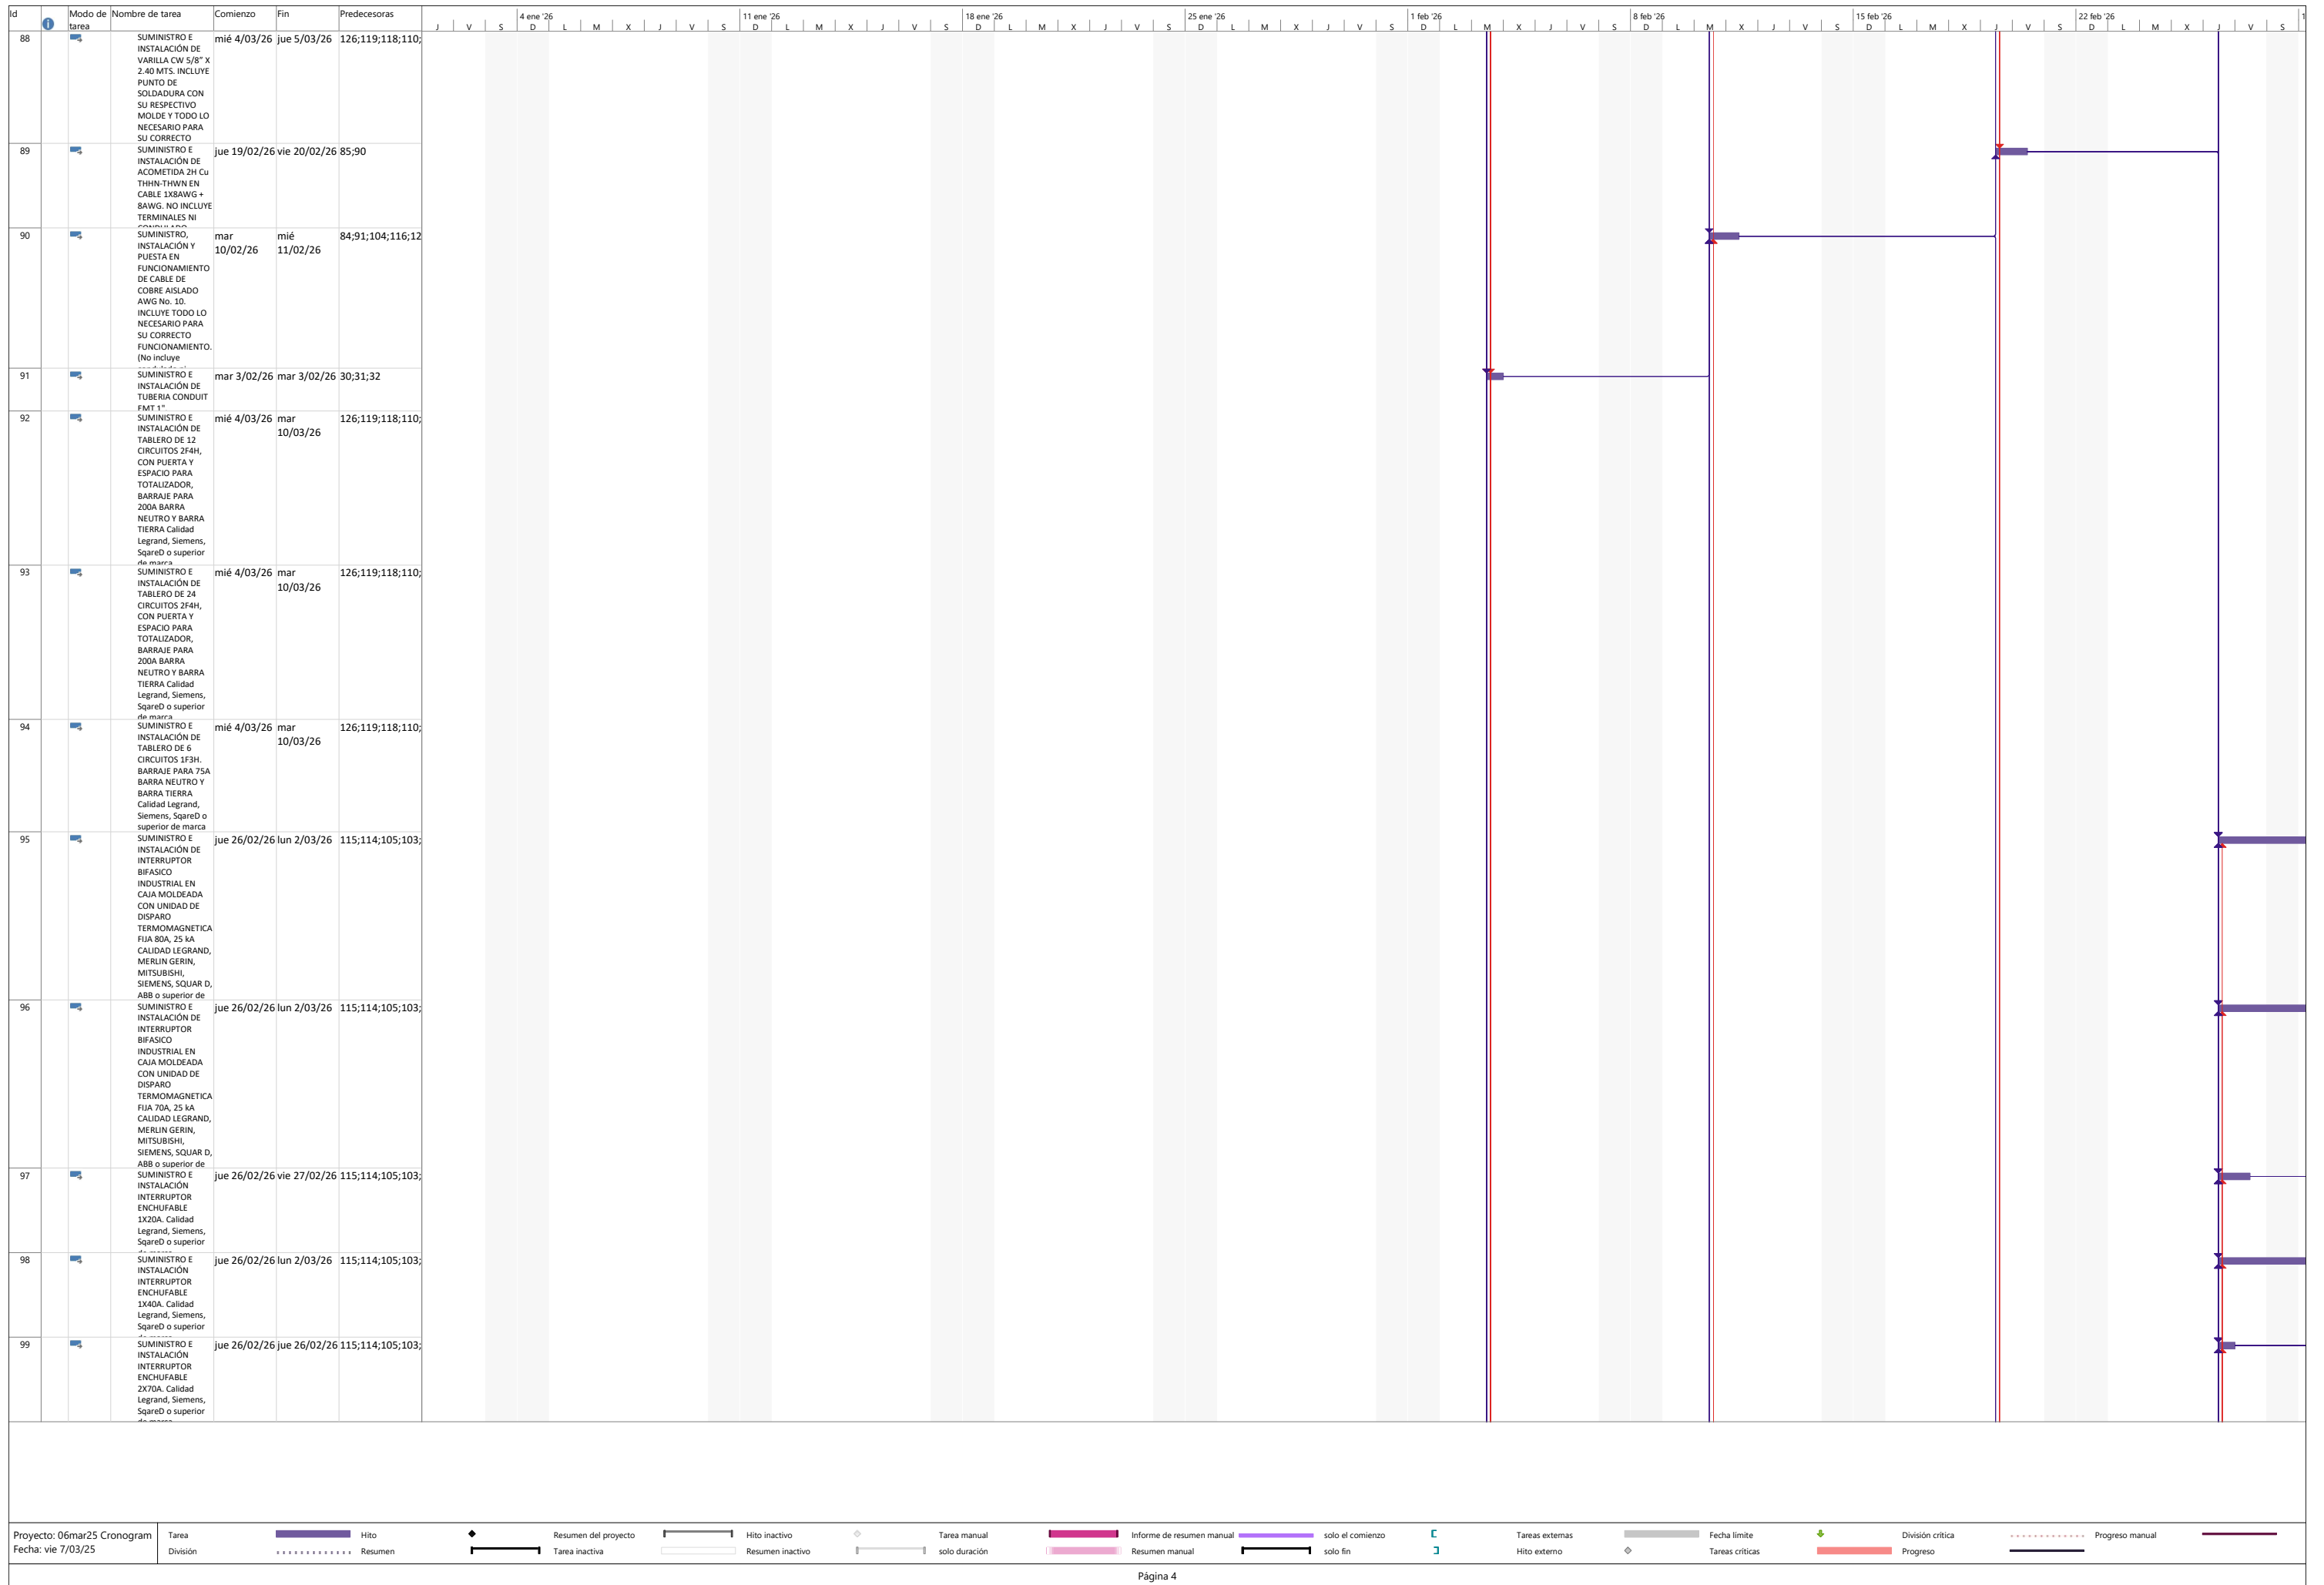

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
100	[icon]	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (OR). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACCIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA PRECAUCION.	mar 3/03/26	mié 17/03/27	79;102
101	[icon]	CERTIFICACIÓN RETIE EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: 1)ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS O	vie 2/05/25	vie 15/05/26	79;102
102	[icon]	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS RACKABLE DE 1.5 kVA monofasica; Tecnología ON-LINE, Doble Conversión - Configuración tipo torre o similar; Controlador DSP, Entrada Dual /Red u	jue 26/02/26	mar 3/03/26	115;114;105;103;
103	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. NO INCLUYE	jue 19/02/26	jue 26/02/26	85;90
104	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1"	mar 3/02/26	mar 10/02/26	30;31;32
105	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12T AWG. NO INCLUYE	jue 19/02/26	vie 20/02/26	85;90
106	[icon]	SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. Conectores de tornillo, brazo metálico norma	mié 4/03/26	lun 16/03/26	126;119;118;110;
107	[icon]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EMPALME SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14,	mié 4/03/26	vie 6/03/26	126;119;118;110;
108	[icon]	Suministro, montaje y conexión de luminaria LED exterior, 35W, 120/208V, IP65. Incluye fotocelda, y todos los	jue 16/04/26	jue 23/04/26	169
109	[icon]	suninistro e instalacón de poste metalico 3m, incluye pedestal y todos los elementos para su	mié 4/03/26	jue 5/03/26	126;119;118;110;
110	[icon]	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40,	jue 26/02/26	mié 4/03/26	115;114;105;103;
111	[icon]	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40,	jue 26/02/26	mié 4/03/26	115;114;105;103;
112	[icon]	CABE No.12 AWG. SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40,	jue 26/02/26	mié 4/03/26	115;114;105;103;

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas


División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 5

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart																											
113		suministro e instalación de tomacorriente pata trabada, incluye caja metálica 5800 y todo lo necesario	jue 26/02/26	mar 3/03/26	115;114;105;103;																												
114		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFR LS EN CABLE 1X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI	jue 19/02/26	mar 24/02/26	85;90																												
115		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFR LS EN CABLE 1X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI	jue 19/02/26	vie 20/02/26	85;90																												
116		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	mar 3/02/26	mar 10/02/26	30;31;32																												
117		SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS	mar 3/02/26	lun 9/02/26	30;31;32																												
118		SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC sch 40 3/4", cable No 12 HFFR	jue 26/02/26	vie 27/02/26	115;114;105;103;																												
119		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior. La luminaria deberá	jue 26/02/26	jue 26/02/26	115;114;105;103;																												
120		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje	jue 16/04/26	lun 20/04/26	169																												
121		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4.3", Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K o similar o 6500K o similar según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°	jue 16/04/26	jue 23/04/26	169																												
122		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 12W de >4.3", Flujo Luminoso ≥1030lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K o similar o 6500K o similar según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°	jue 16/04/26	jue 23/04/26	169																												
123		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Ancho 120°, Horas	jue 16/04/26	jue 16/04/26	169																												
124		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE RAP REDONDO/ OVAL HIGH LIGHTS IP 65 EQUIVALENTE O DE características técnicas superiores DE INCRUSTAR EN PARED, CUERPO EN POLICARBONATO Y VIDRIO OPALIZADO, USO INTERIOR O	mié 4/03/26	mié 4/03/26	126;119;118;110;																												
125		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS TECNOLOGIA COMBINADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE	jue 16/04/26	mar 21/04/26	169																												
Proyecto: 06mar25 Cronogram																																	
Fecha: vie 7/03/25																																	
Tarea																																	
División																																	
Hito																																	
Resumen																																	
Resumen del proyecto																																	
Tarea inactiva																																	
Hito inactivo																																	
Resumen inactivo																																	
Tarea manual																																	
solo duración																																	
Informe de resumen manual																																	
Resumen manual																																	
solo el comienzo																																	
solo fin																																	
Tareas externas																																	
Hito externo																																	
Fecha limite																																	
Tareas críticas																																	
División crítica																																	
Progreso																																	
Progreso manual																																	

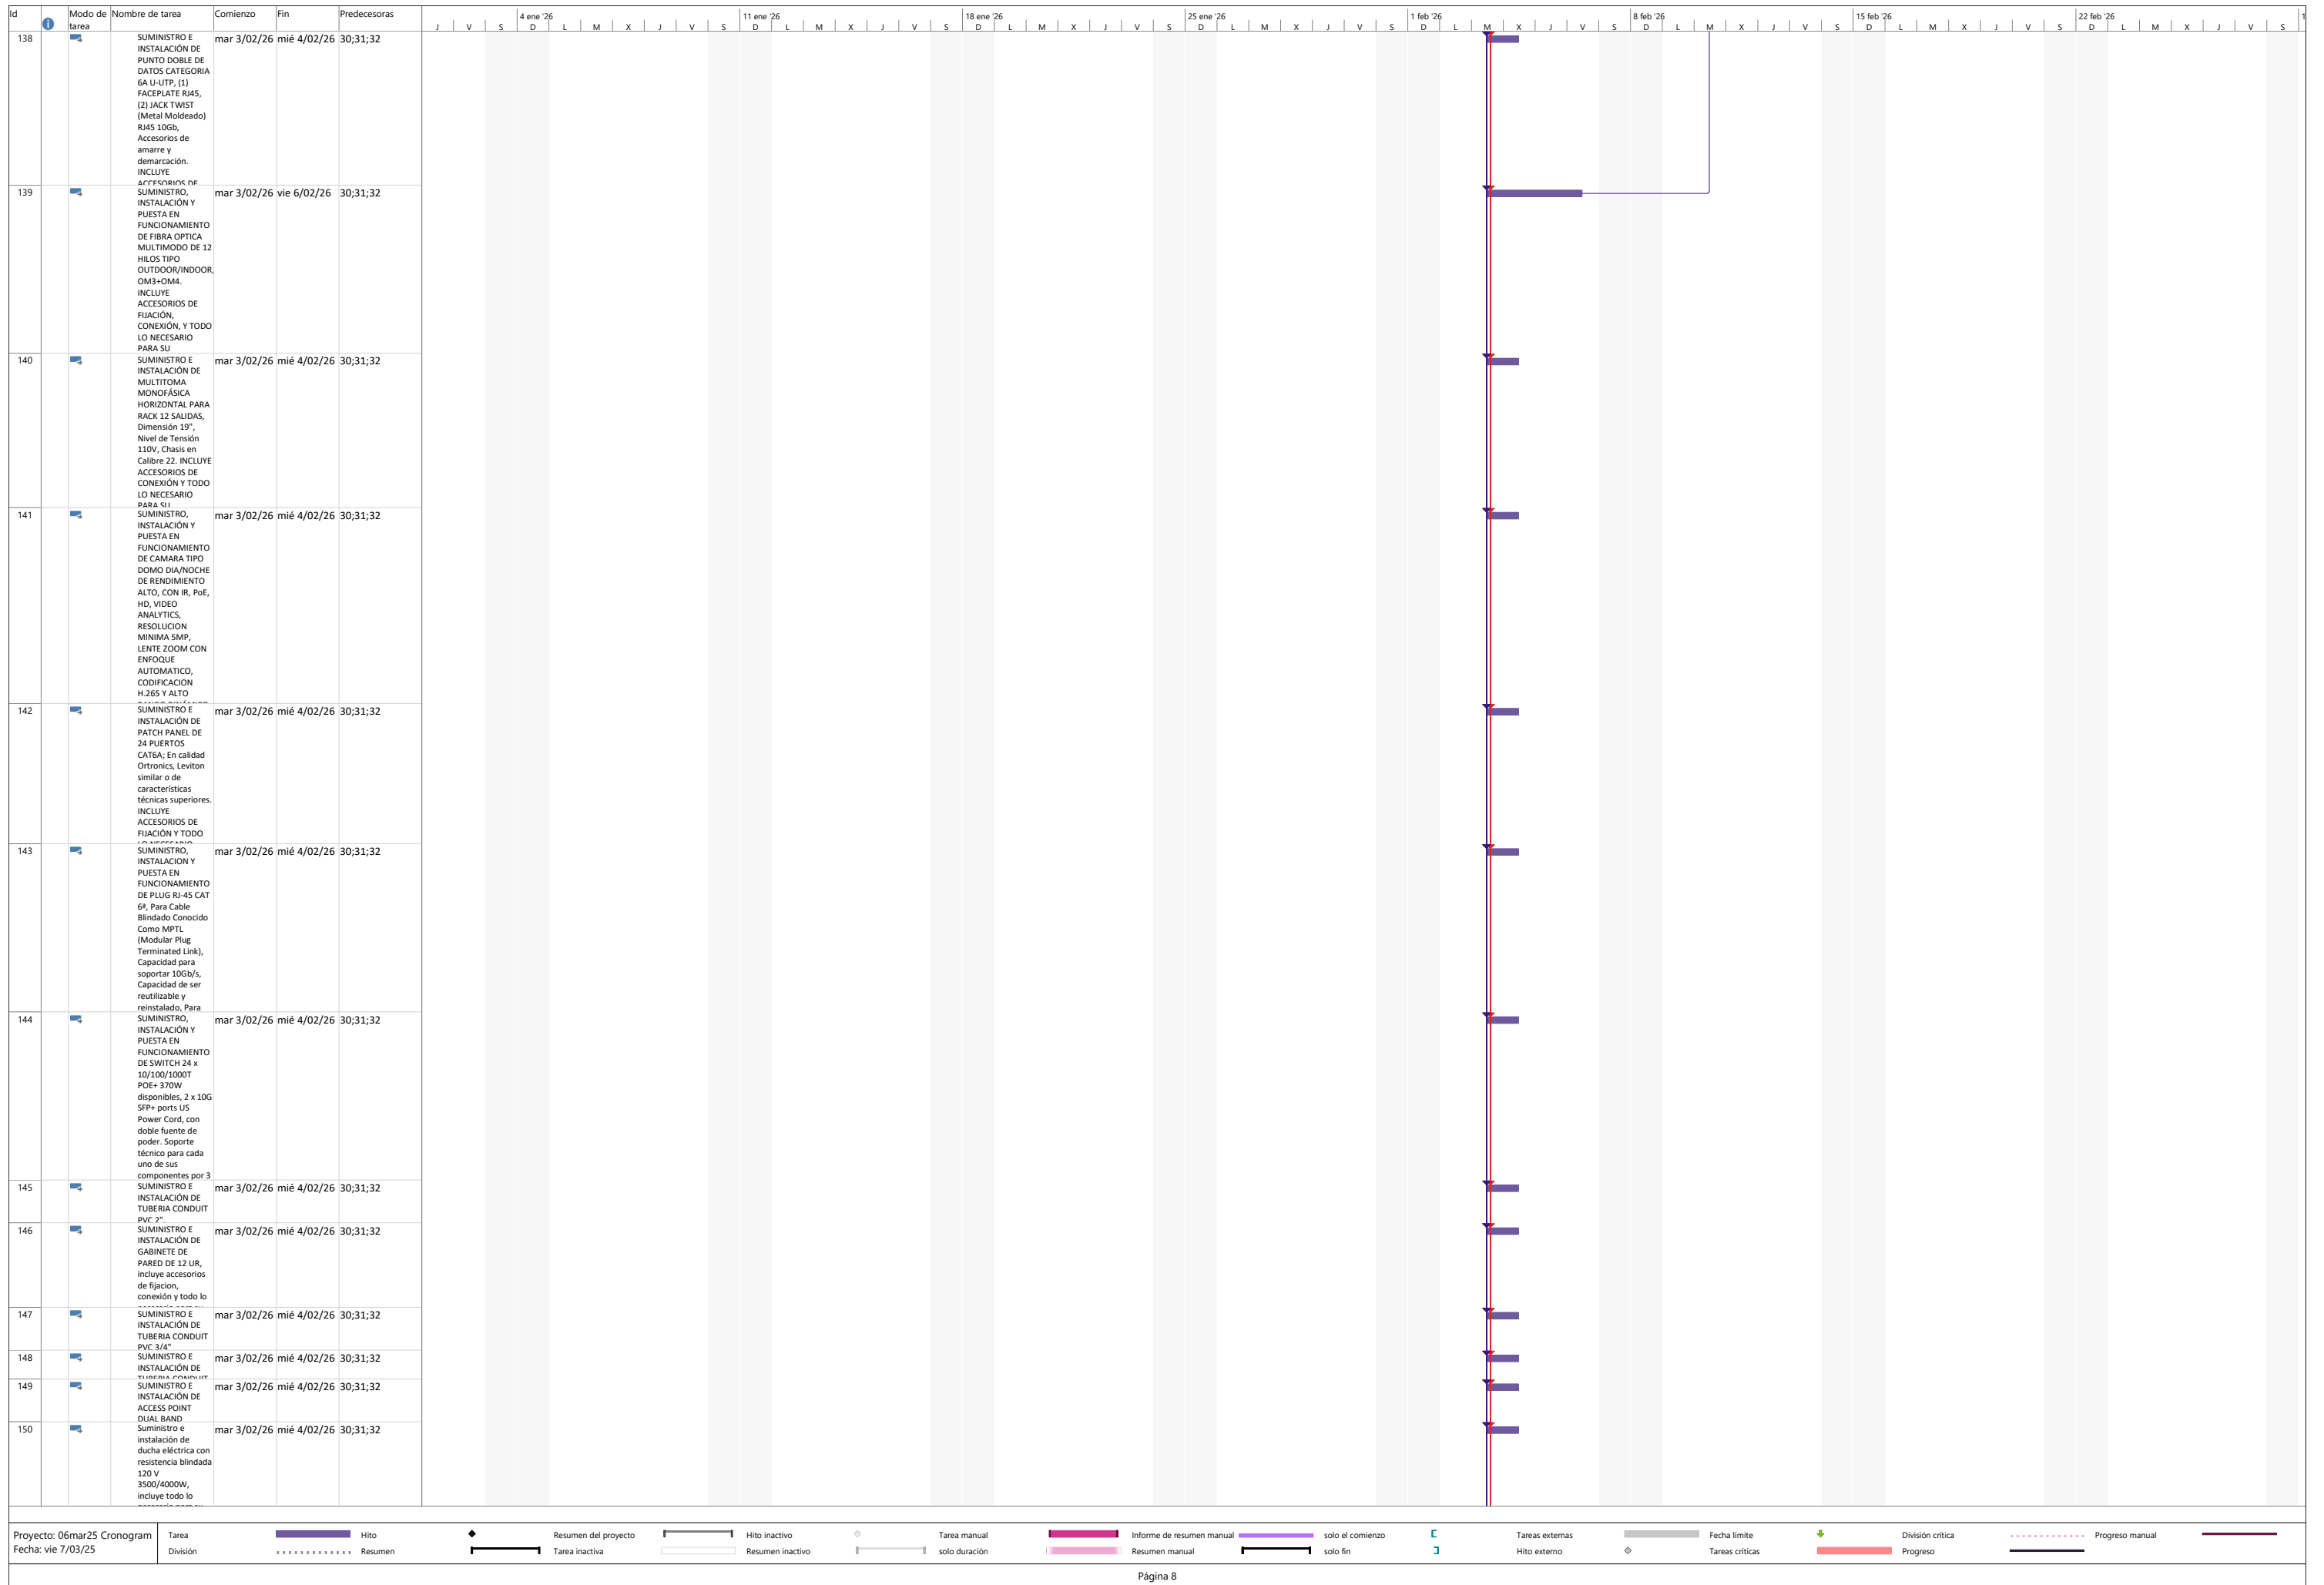

[illegible]
