
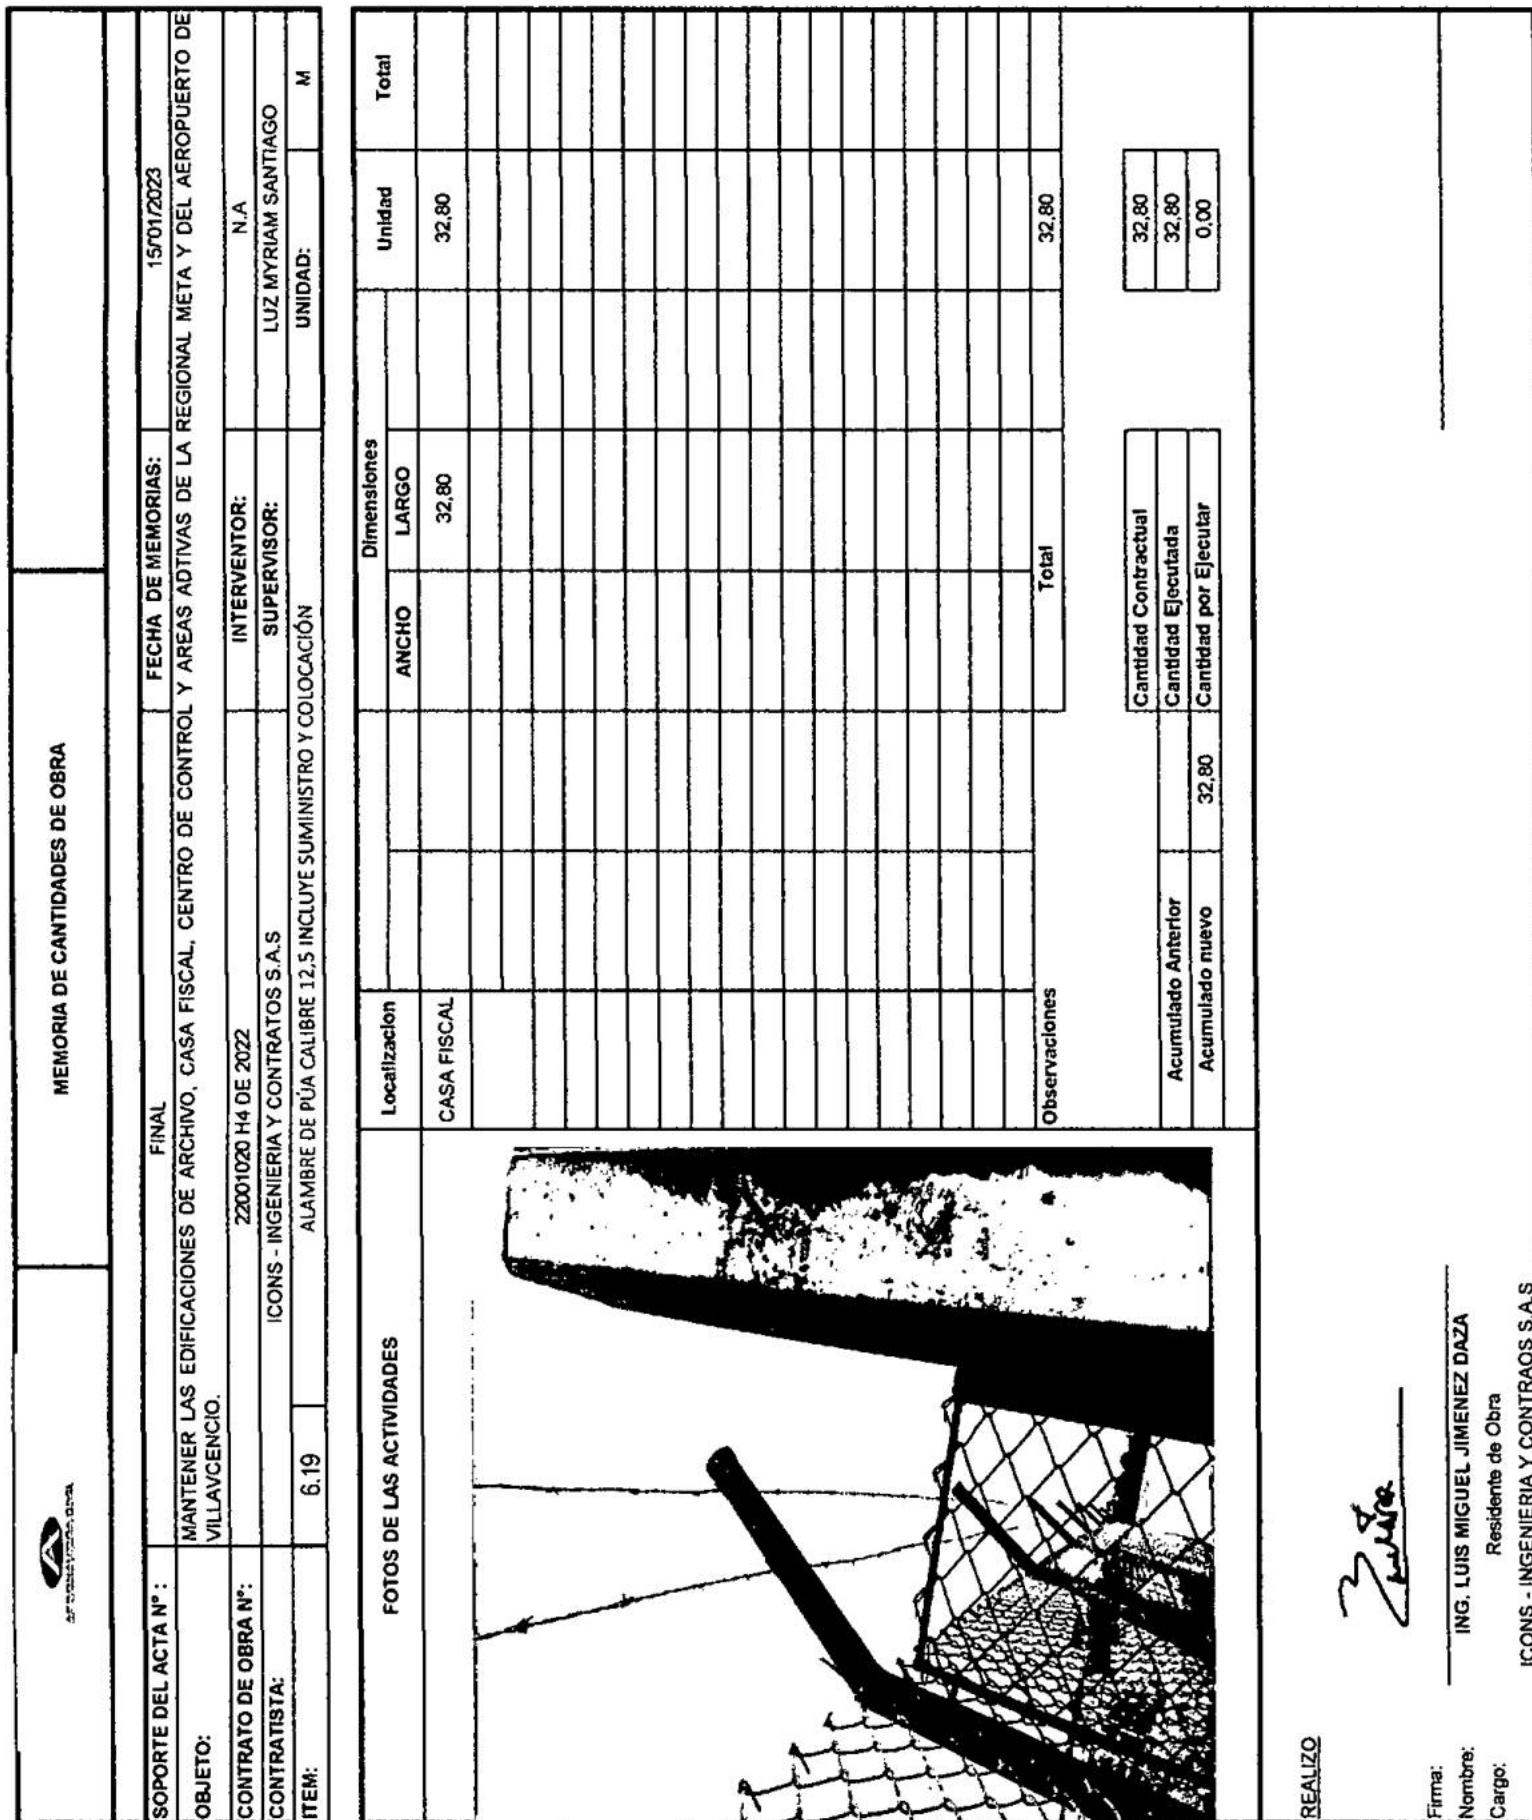


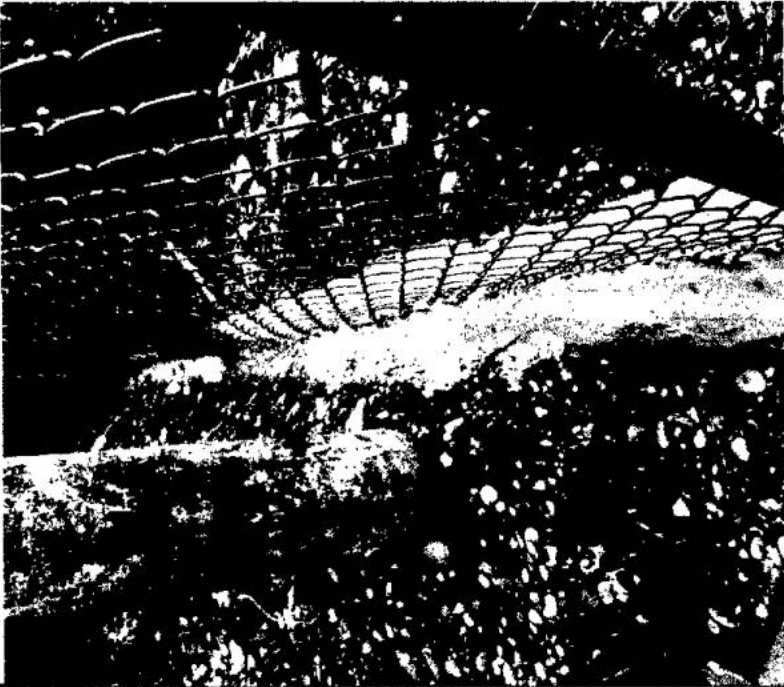

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENITOR:
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:
ITEM:		6.18	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
UNIDAD:		M	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total	
		ANCHO	LARGO			
	CASA FISCAL		32,80	32,80		
Observaciones			Total	32,80		

Cantidad Contratual	32,80
Cantidad Ejecutada	32,80
Cantidad por Ejecutar	0,00

Acumulado Anterior		Cantidad Contratual	32,80
Acumulado nuevo	32,80	Cantidad Ejecutada	32,80
		Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO




Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:	
OBJETO:	
CONTRATO DE OBRA N°:	
CONTRATISTA:	
ITEM:	
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	
LOCALIZACION	
DIMENSIONES	
UNIDAD	
TOTAL	
OBSERVACIONES	
CANTIDAD CONTRACTUAL	
CANTIDAD EJECUTADA	
CANTIDAD POR EJECUTAR	
ACUMULADO ANTERIOR	
ACUMULADO NUEVO	
FIRMA:	
NOMBRE:	
CARGO:	

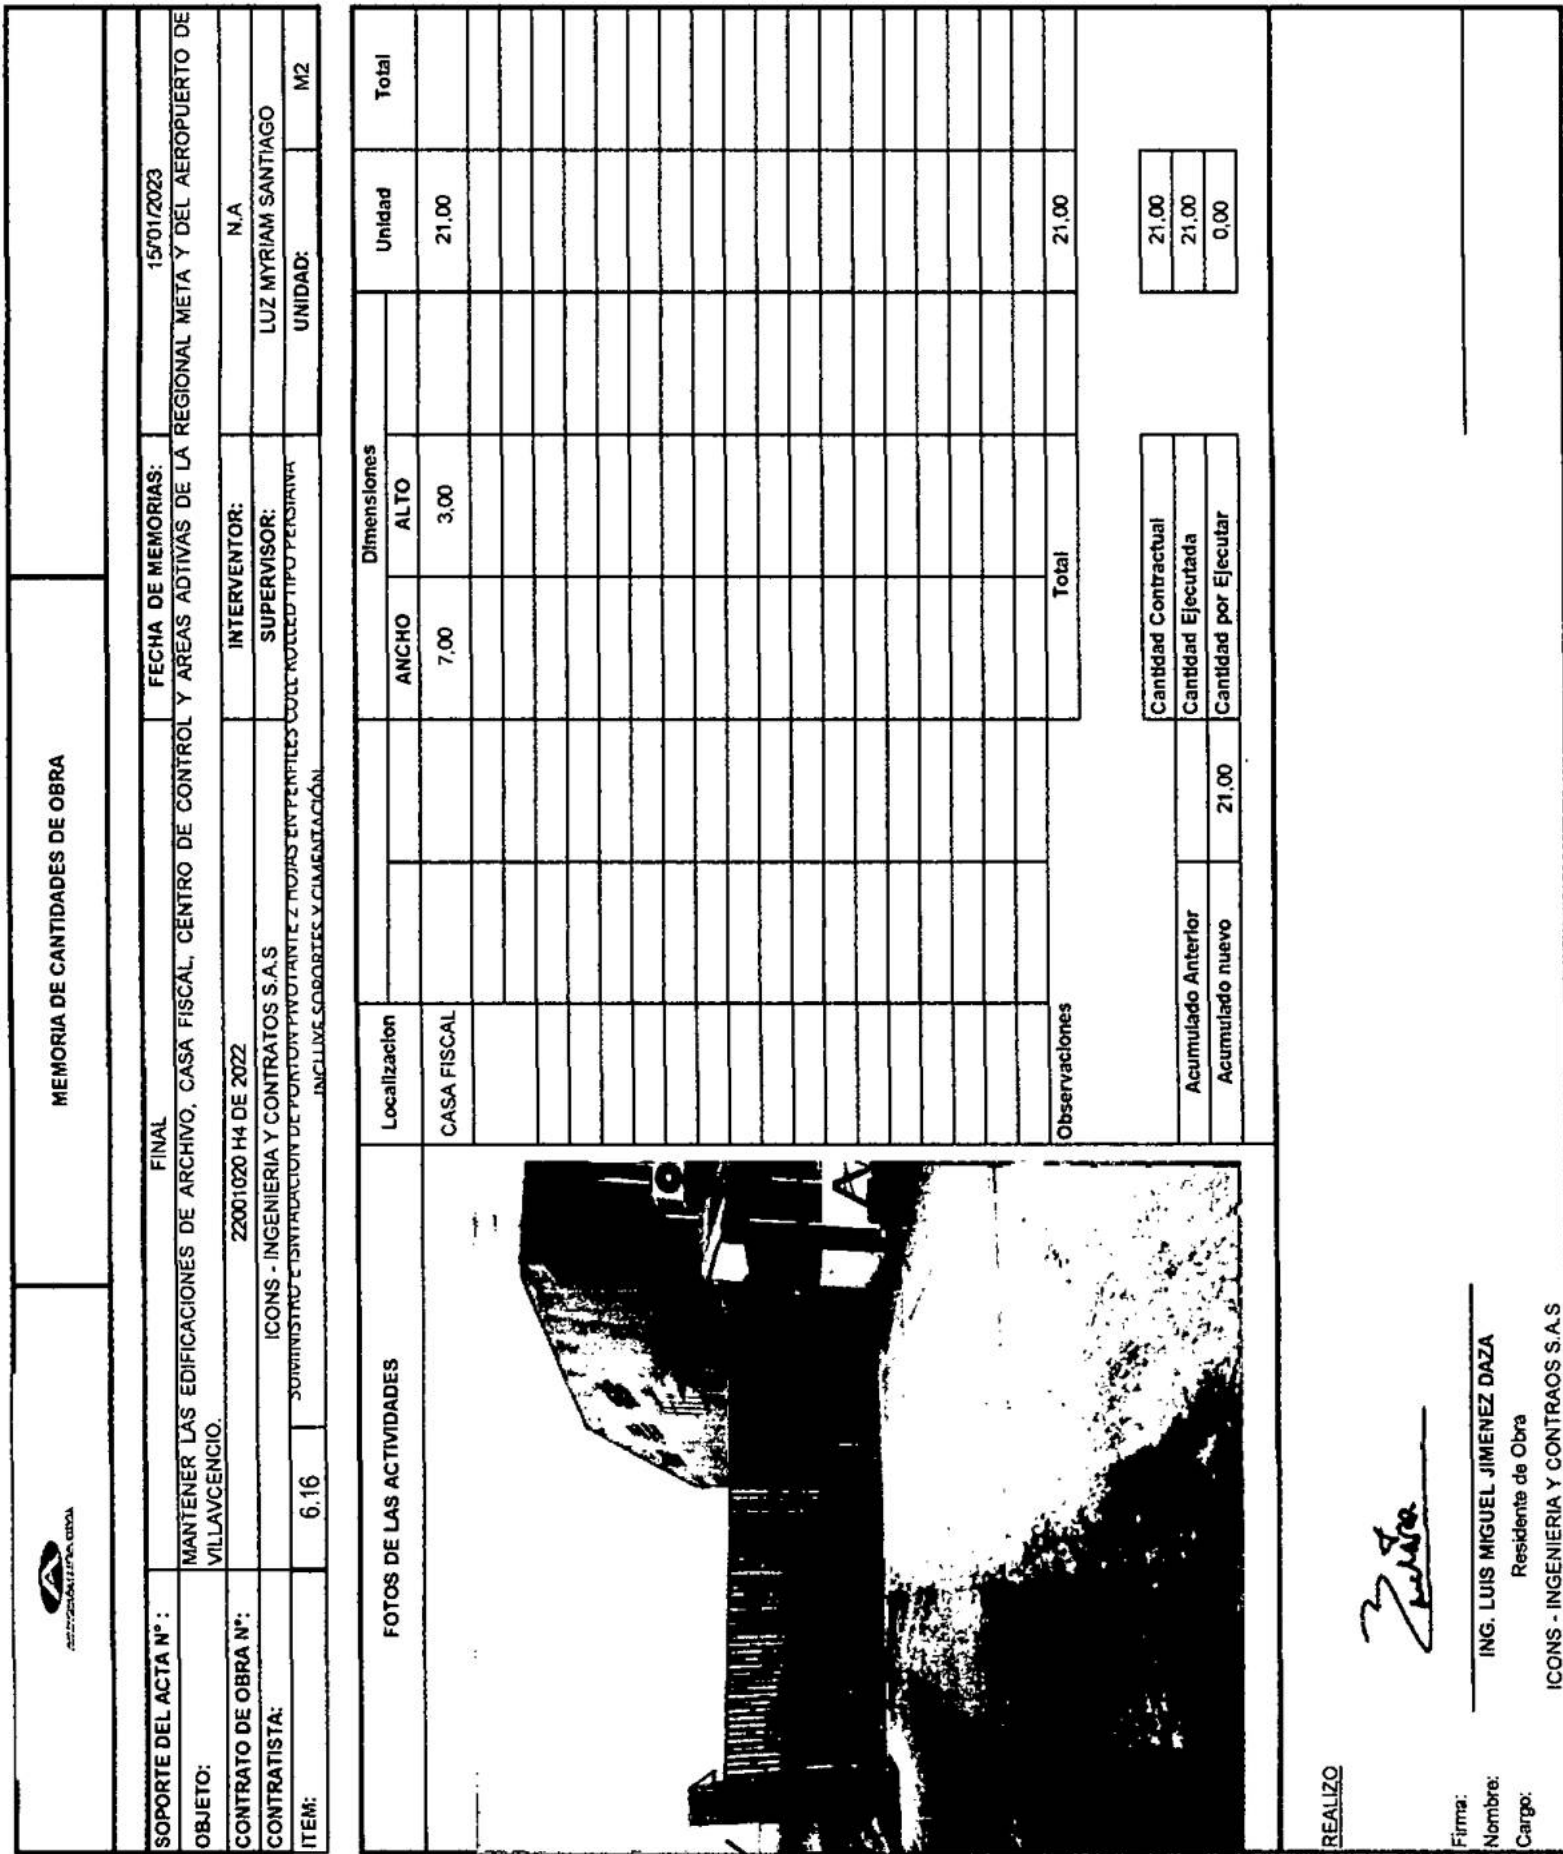


34
24

ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y ÁREAS ADJAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENIOR:
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:
ITEM:		6.15	SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)
UNIDAD:			M

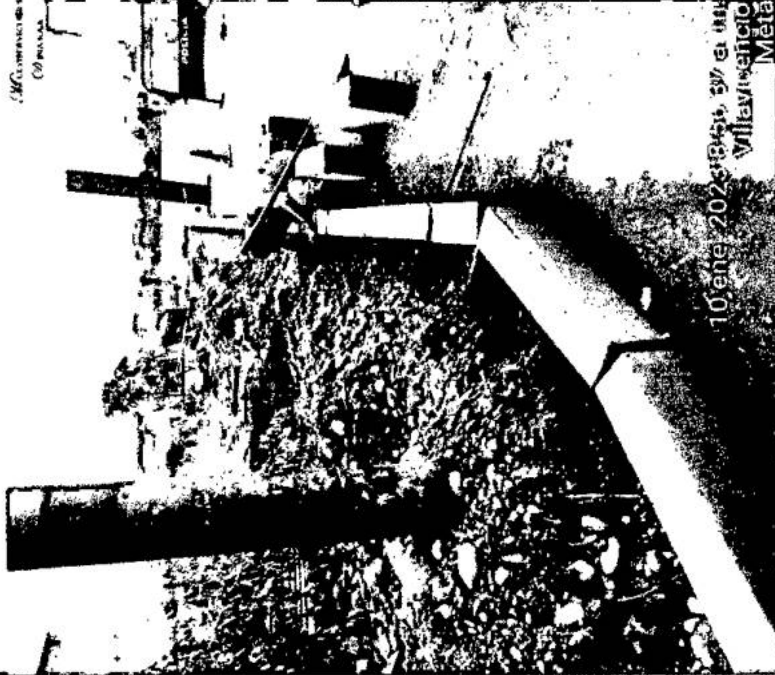FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total	
		ANCHO	LARGO			
	CASA FISCAL		32,80	32,80		
Observaciones				Total	32,80	
		Acumulado Anterior	32,80	Cantidad Contractual	32,80	
		Acumulado nuevo		Cantidad Ejecutada	32,80	
				Cantidad por Ejecutar	0,00	

REALIZO



Firma: _____

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:	15/01/2023
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.		
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:		6.14	UNIDAD:	M3
		CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN.) E.10CM		

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	LARGO	ESPESOR		
	CASA FISCAL	4,72	32,80	0,1	15,48	
Observaciones		Total			15,48	

Cantidad Contractual	15,48
Cantidad Ejecutada	15,48
Cantidad por Ejecutar	0,00

Acumulado Anterior	
Acumulado nuevo	15,48

REALIZO



ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Residente de Obra


ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Firma:

Nombre:

Cargo:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
SOPORTE DEL ACTA N°: FINAL			
FECHA DE MEMORIAS: 15/01/2023			
OBJETO: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°: 22001020 H4 DE 2022			
CONTRATISTA: ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S			
ITEM: 6.13			
UNIDAD: M2			
INTERVENIENTOS: N.A			
SUPERVISOR: LUZ MYRIAM SANTIAGO			
UNIDAD: M2			
RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO			
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES			
			
Localizacion	Entrada de Bomberos		
Dimensiones			
ANCHO	LARGO	Unidad	Total
3.50	32.80	114.80	
3.50	32.80	114.80	
3.50	32.80	114.80	
Observaciones			
Total			
344.40			
Cantidad Contratual		25.00	
Cantidad Ejecutada		344.40	
Cantidad por Ejecutar		-319.40	
Acumulado Anterior		344.40	
Acumulado nuevo		344.40	
REALIZO			
Firma:			
Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA			
Cargo: Residente de Obra			
ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S			

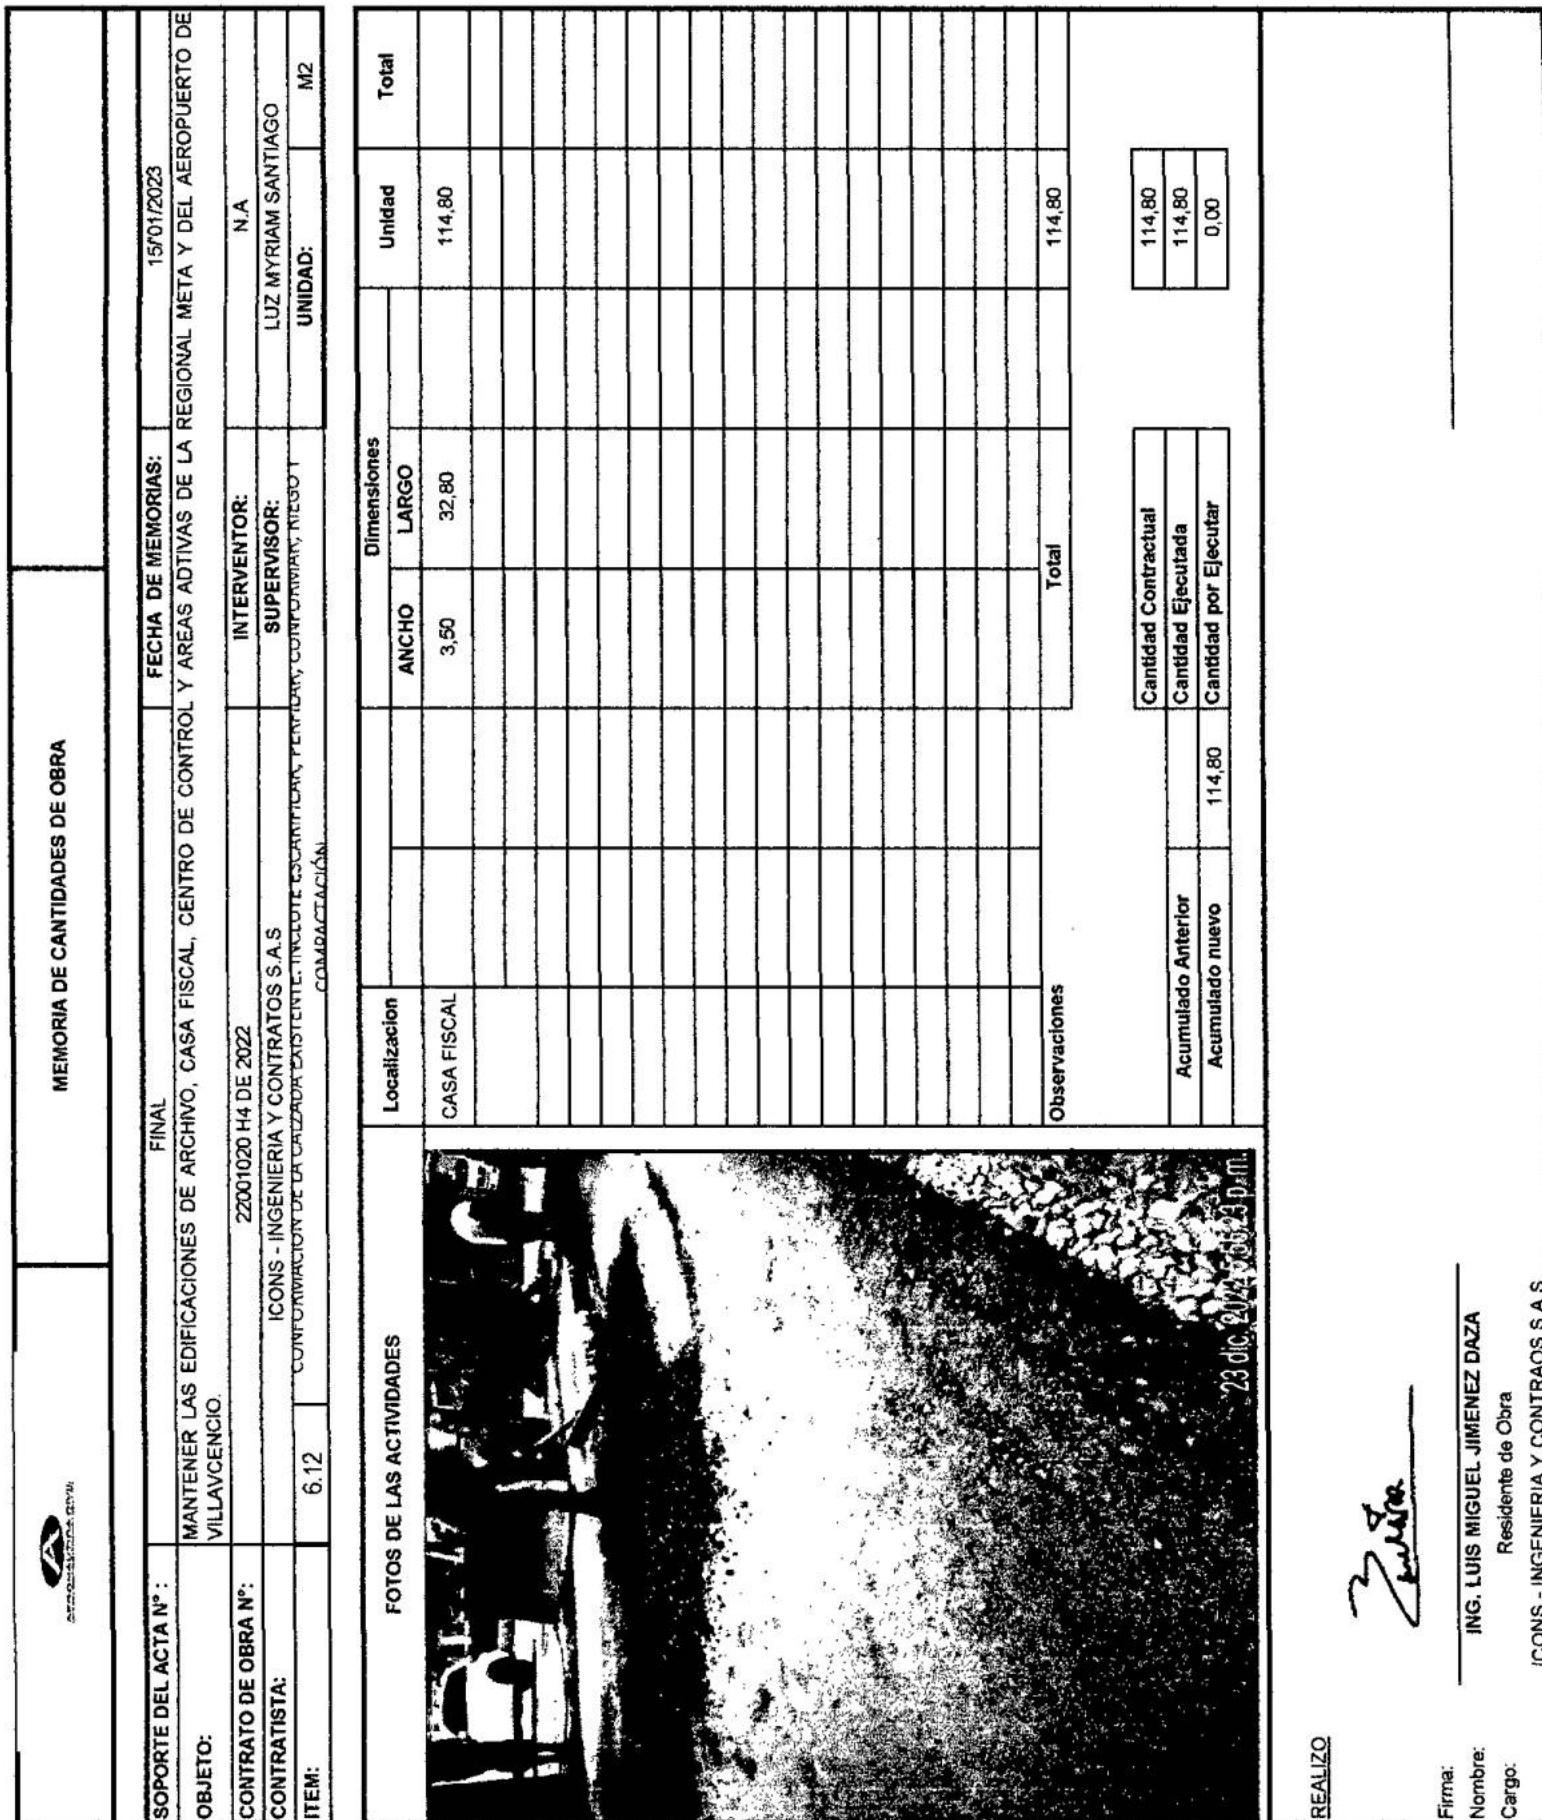

Zubair

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**
Cargo: **Residente de Obra**
ICONSA - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL		FECHA DE MEMORIAS:	
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	
ITEM:		6.11		UNIDAD:	
		BASE GRANULAR TIPO BG-1		M3	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	LARGO	ESPESOR		
	CASA FISCAL	7,00	32,80	0,05	11,48	
Observaciones					Total	11,48
					Cantidad Contractual	11,48
					Cantidad Ejecutada	11,48
					Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO	
Firma:	ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Nombre:	Residente de Obra
Cargo:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL		FECHA DE MEMORIAS:	
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022		INTERVENITOR:	
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	
ITEM:		6.10		RELENO EN SUB-BASE GRANULAR S8G COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	
		UNIDAD:		M3	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	LARGO	ESPESOR		
	CASA FISCAL	7,00	32,80	0,1	22,96	
Observaciones					Total	22,96
Acumulado Anterior					22,96	
Acumulado nuevo						
Cantidad Contratual						22,96
Cantidad Ejecutada						22,96
Cantidad por Ejecutar						0,00

REALIZO




Firma: _____

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

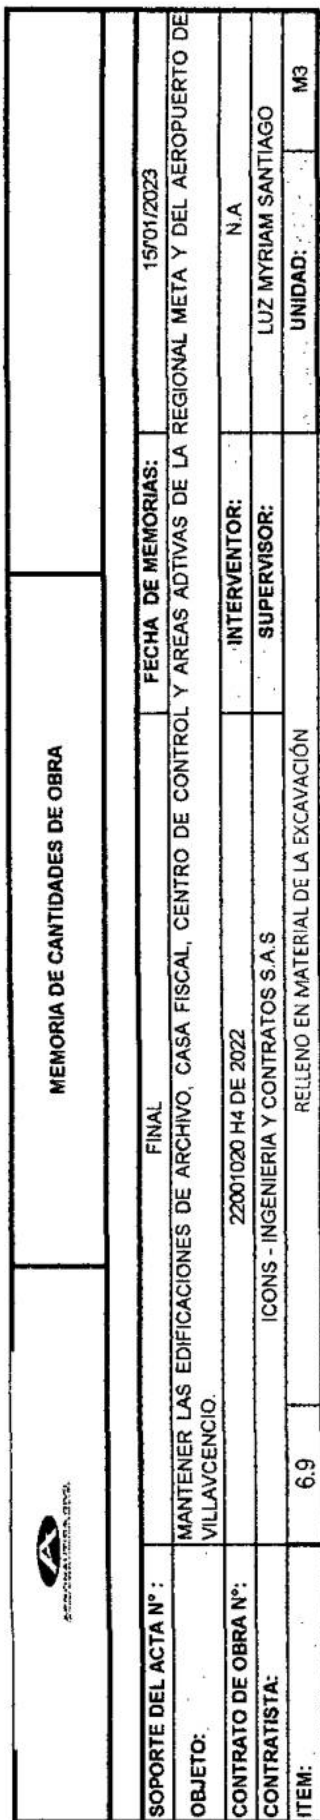

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total	
		ANCHO	LARGO			
	CASA FISCAL	2,00	4,20	5,00		
Observaciones		Total		5,00		

Cantidad Contractual	5,00
Cantidad Ejecutada	5,00
Cantidad por Ejecutar	0,00

Cantidad Contractual	
Cantidad Ejecutada	
Cantidad por Ejecutar	

Acumulado Anterior	
Acumulado nuevo	5,00

22 dic. 2022 3:02:49 p. m.

REALIZO

38

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**
Cargo: **Residente de Obra**
ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:
OBJETO:		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.	
CONTRATISTA:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:
ITEM:		6.8	LUZ MYRIAM SANTIAGO
UNIDAD:		M	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total
		ANCHO	LARGO		
	CASA FISCAL		3,00	3,00	
Observaciones				Total	3,00

Cantidad Contractual	Cantidad Ejecutada	Cantidad por Ejecutar
3,00	3,00	0,00

Acumulado Anterior	Acumulado nuevo	3,00

REALIZO




ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:
OBJETO:		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y ÁREAS ADYACENTES DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.	
CONTRATISTA:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENIENTE:
ITEM:		6.7	CONTRATOS S.A.S
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES		SUPERVISOR:	
		LUZ MYRIAM SANTIAGO	
		UNIDAD:	
		M2	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Dimensiones			Unidad	Total
	Localizacion	ANCHO	LARGO		
	ENTRADA DE BOMBEROS	3,50	16,86	0,5	29,50
Observaciones	Total			29,50	

Cantidad Contratual	29,50
Cantidad Ejecutada	29,50
Cantidad por Ejecutar	0,00

Cantidad Contratual	29,50
Cantidad Ejecutada	29,50
Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma: 

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL		FECHA DE MEMORIAS:	
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVENCIO.		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	
ITEM:		6.6		UNIDAD: M2	
DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO					

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD		
	CASA FISCAL	3.50	32.80	0.2	22.96	
Observaciones					Total	22.96
Cantidad Contractual						22.96
Cantidad Ejecutada						22.96
Cantidad por Ejecutar						0.00

REALIZO



ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Residente de Obra
ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL		FECHA DE MEMORIAS: 15/01/2023	
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:		ZZ001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR: N/A	
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR: LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:		6.5		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	
UNIDAD: M2				UNIDAD:	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total
		ANCHO	LARGO		
	ENTRADA DE BOMBEROS	3.50	32.80	114.80	
Observaciones			Total	114,80	

Acumulado Anterior	114,80	Cantidad Contractual	114,80
Acumulado nuevo	114,80	Cantidad Ejecutada	114,80
		Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO




Firma: _____

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:	15/01/2023
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.		
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022		
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		
ITEM:		6.4	INTERVENIOR:	N.A
			SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
			UNIDAD:	M3

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	ESPESOR	ALTURA		
	CASA FISCAL	7.00	0.57	2	8.00	
Observaciones					Total	8.00
					Cantidad Contractual	8.00
					Cantidad Ejecutada	8.00
					Cantidad por Ejecutar	0.00

REALIZO




Firma: _____

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

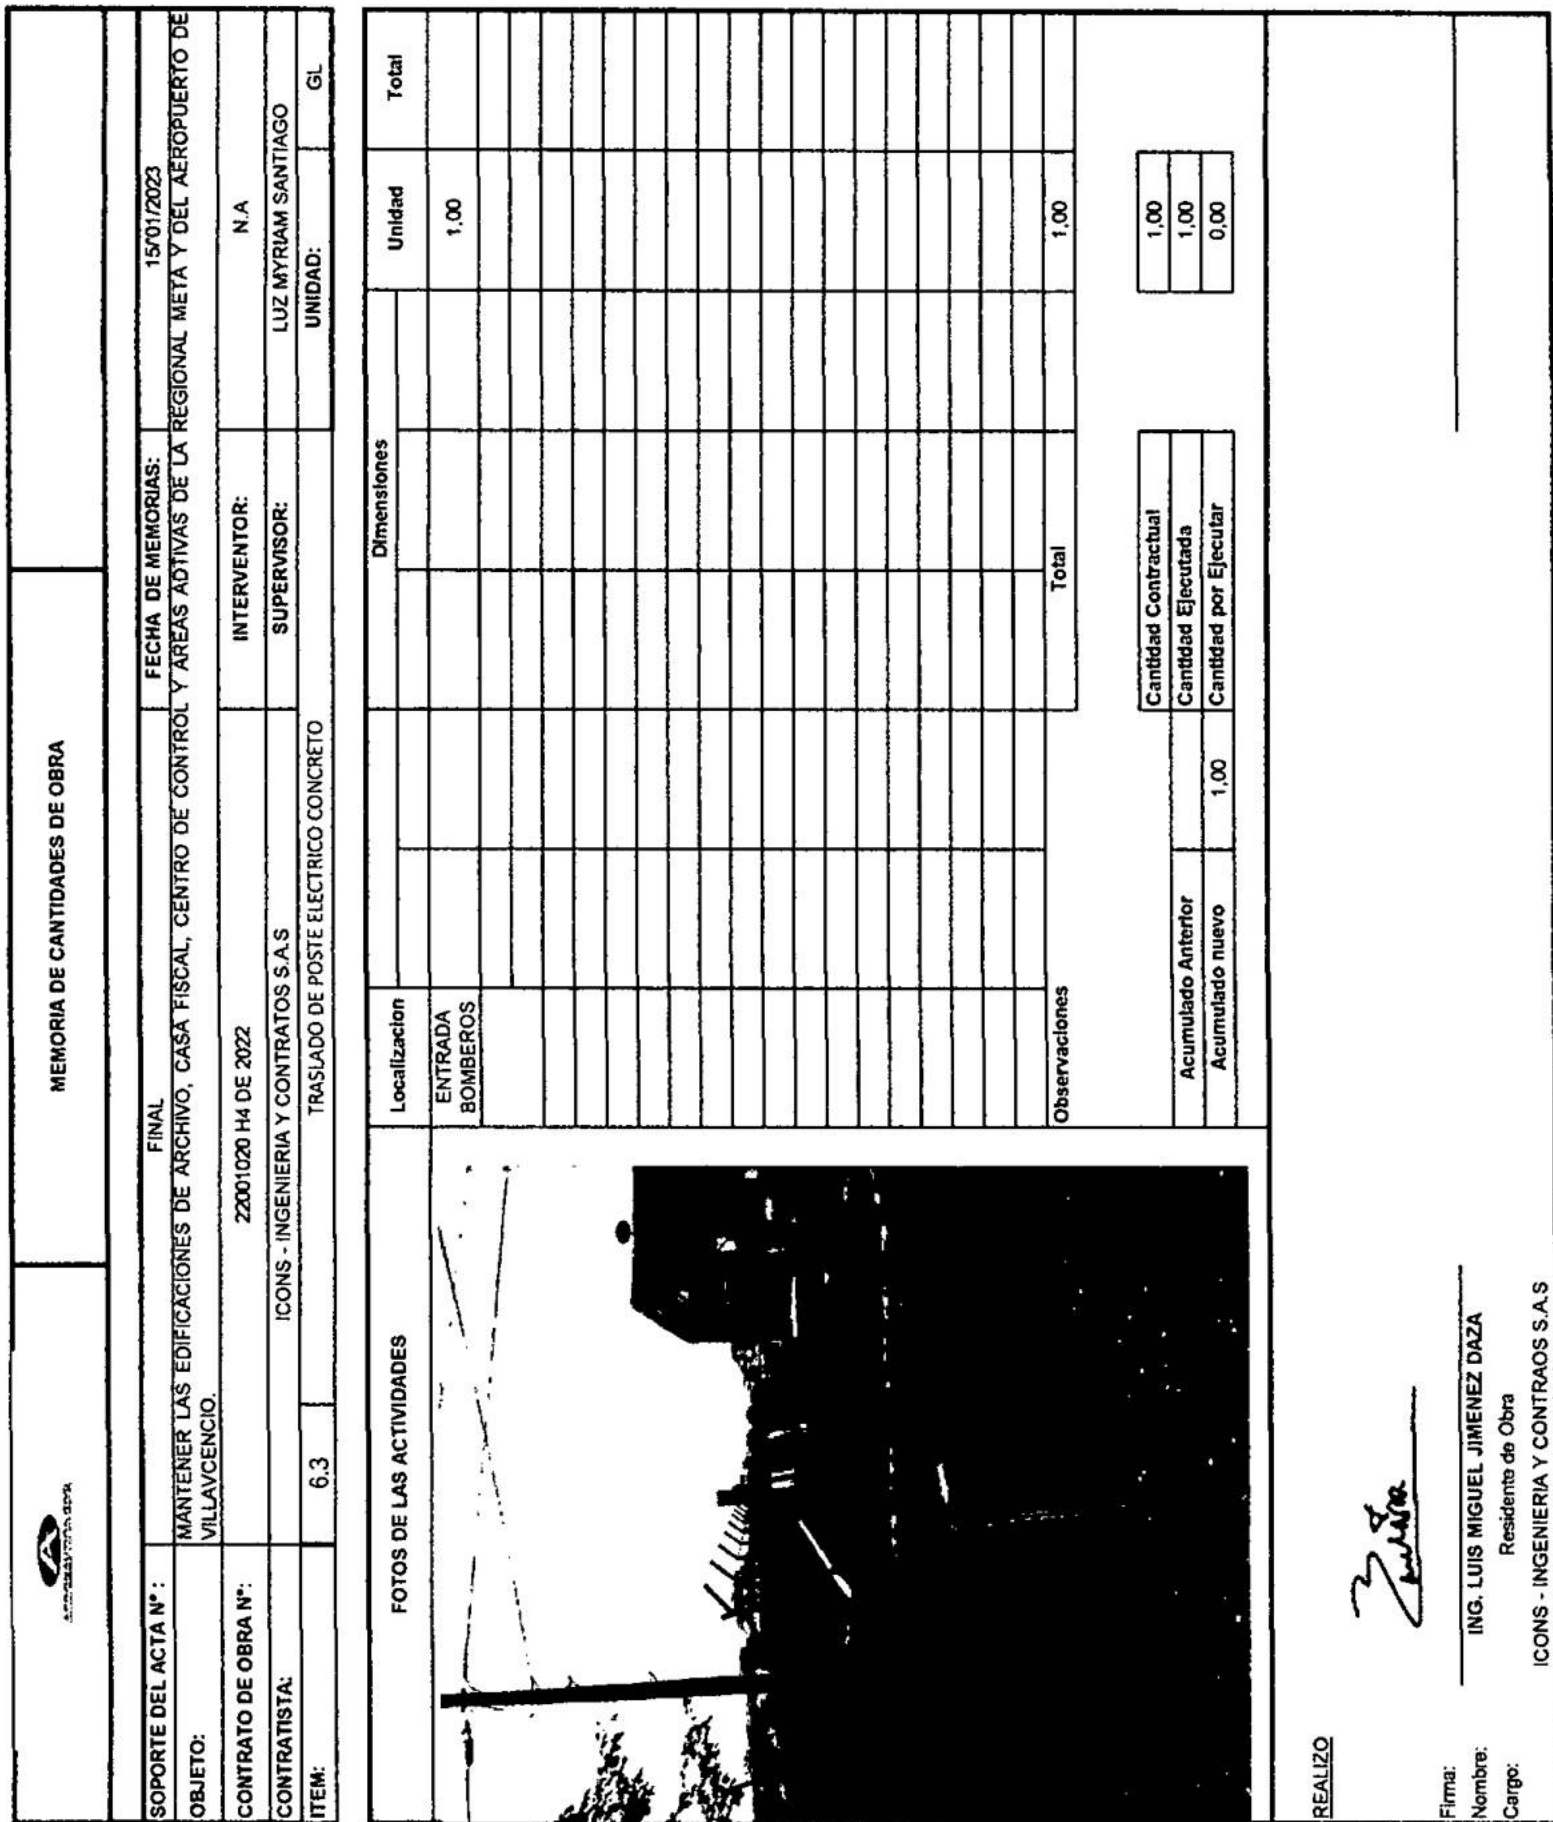

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS: 15/01/2023
OBJETO:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVENCIO.	
CONTRATO DE OBRA N°:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR: N.A
CONTRATISTA:		ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR: LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:		6.1	UNIDAD: M2
		RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total
		ALTO	LARGO		
	ENTRADA BOMBEROS	2,00	37,00	74,00	
Observaciones				Total	74,00
				Cantidad Contractual	74,00
				Cantidad Ejecutada	74,00
				Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO	
Firma:	ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Nombre:	Residente de Obra
Cargo:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N°:	FINAL	FECHA DE MEMORIAS:	15/01/2023
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.		
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTAJE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE GRANITO)	
		UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total
		ANCHO	LARGO		
	CASA FISCAL	1,20	7,00	8,40	
		1,20	2,00	2,40	
		1,20	5,00	6,00	
		1,20	3,00	3,60	
		1,2	2,05	2,46	
				0,00	
Observaciones		Total	22,86		

Cantidad Contractual	25,00
Cantidad Ejecutada	22,86
Cantidad por Ejecutar	2,14

Acumulado Anterior		Cantidad Contractual
Acumulado nuevo	22,86	Cantidad Ejecutada
		Cantidad por Ejecutar

REALIZO

Firma:

Nombre:

Residente de Obra

Residente de Obra



FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones			Unidad	Total
		ANCHO	LARGO			
	CASA FISCAL		655,00		655,00	
				Total	655,00	
Observaciones						

Cantidad Contractual	2.400,00
Cantidad Ejecutada	655,00
Cantidad por Ejecutar	0,00


Cantidad Contractual	
Cantidad Ejecutada	
Cantidad por Ejecutar	

Acumulado Anterior	1.745,00
Acumulado nuevo	2.400,00

3 June

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**
Cargo: Residente de Obra
CONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
SOPORTE DEL ACTA N°:		FINAL	FECHA DE MEMORIAS:
OBJETO:		15/01/2023	
CONTRATO DE OBRA N°:		MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVENCIO.	
CONTRATISTA:		22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:
ITEM:		2.3	UNIDAD: M
		ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S	LUZ MYRIAM SANTIAGO
		MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación	

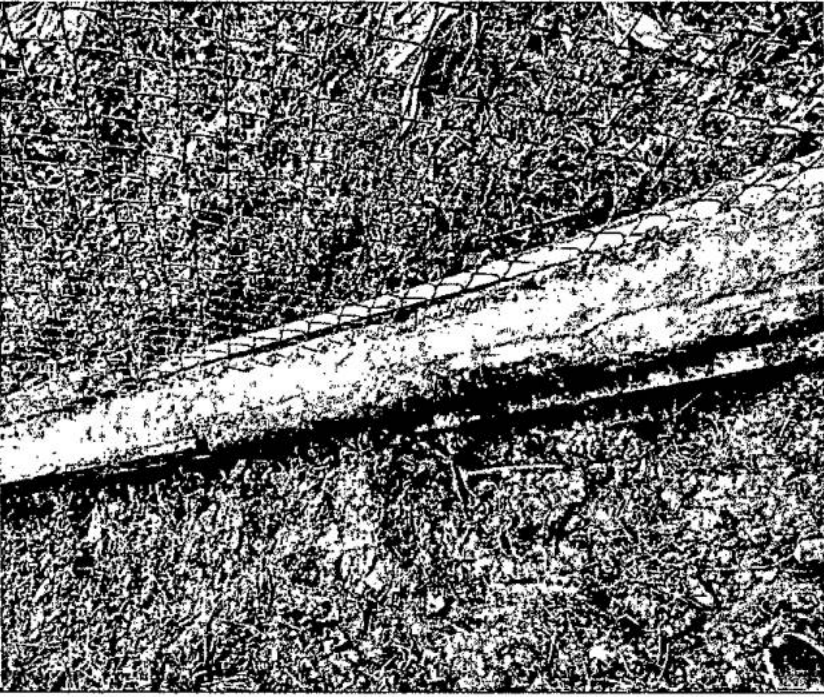FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion	Dimensiones		Unidad	Total
		ANCHO	LARGO		
	CASA FISCAL		440,00	440,00	
Observaciones		Total		440,00	
		Acumulado Anterior	360,00	Cantidad Contractual	800,00
		Acumulado nuevo	800,00	Cantidad Ejecutada	440,00
				Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO	
Firma:	ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Nombre:	Residente de Obra
Cargo:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3612.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 20

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001020 H4 DE 2022
Nombre del Contratista:	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
Periodo informe:	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO
Nombre de Supervisor:	LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AEROPUERTO VANGUARDIA-VILLAVICENCIO

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	FECHA	DETALLES
CASA FISCAL		
1	16/12	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación
2	10/01	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación
3	12/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)
AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS		
1	16/12	RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS
2	22/12	TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES INCLUYE CARGUE
3	16/12	TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO
4	22/12	DEMOLICION MECANICA BORDILLO CONCRETO REFORZADO PARA CIMIENTOS INC RETIRO
5	23/12	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO
6	22/12	DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO
7	22/12	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES
8	16/12	CAMBIO TUBERÍA 2" PVCP
9	23/12	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
10	23/12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO
11	23/12	BASE GRANULAR TIPO BG-1
12	23/12	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE. INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN
13	23/12	RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 20

14	23/12	CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.) E.10CM
15	10/01	SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)
16	14/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN
17	13/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS
18	13/01	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
19	13/01	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

3.1.1 Actividades:

- Fue instalado mortero de dosificación 1:4 para fijar la malla eslabonada instalada anteriormente, para que esta quedara debidamente templada y asegurada.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- También fueron instaladas tabletas tipo gres de 30 x 30cm, para tapar los parches que había a las afueras de la cabaña principal y que afeaban la fachada de la misma.
- Se procede a realizar el desmonte del cerramiento ubicado en los predios de la casa fiscal, se hizo el desmonte de postes en concreto y también los 3 hilos de alambre de púas que se encontraron.
- Se realizo la debida tala de 6 árboles que se encontraban a la entrada de los bomberos, estos con los debidos permisos expedidos por comarcarena.
- Se procedió a trasladar de posición un poste eléctrico para así asegurar el ángulo de entrada nuevo a la estación de bomberos del aeropuerto.
- Se procedió a demoler con ayuda de maquinaria pesada el bordillo que se encontraba al costado izquierdo de la entrada a la estación de bomberos.
- Se procedió a realizar actividades de localización, trazado y replanteo, para el nuevo asfalto que se instaló.
- Con ayuda de maquinaria pesada, se procedió a realizar el descapote mecánico del terreno.
- Se procedió a realizar actividades pertinentes a la excavación en material común.
- Se procedió a cambiar la tubería de 2" en la pista del aeropuerto, que estaba en mal estado y presentaba fuga.
- Se procedió a rellenar el terreno con el mismo material extraído de la excavación.
- Se realizo el riego de sub-base granular compactada al 95%
- Se procedió a instalar la base tipo BG-1.
- Se ejecutaron labores pertinentes al nuevo trazado y conformación de la calzada nueva que hicimos.
- Se procedió a realizar el respectivo riego con asfalto liquido en un total de 3 capas.
- Se realizo la actividad pertinente a la realización de la carpeta asfáltica con mezcla densa en caliente de asfalto y maquinaria especial para esto.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 20

- Se instalaron 32,80m de sardinel tipo A10.
- Fue instalado mortero de dosificación 1:4 para fijar la malla eslabonada instalada anteriormente, para que esta quedara debidamente templada y asegurada.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- Se realizaron actividades pertinentes para hacer la instalación de malla eslabonada, incluyendo la tubería, ángulos y platinas correspondientes para su correcto funcionamiento.b

a. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

No. 1	CASA FISCAL MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 20

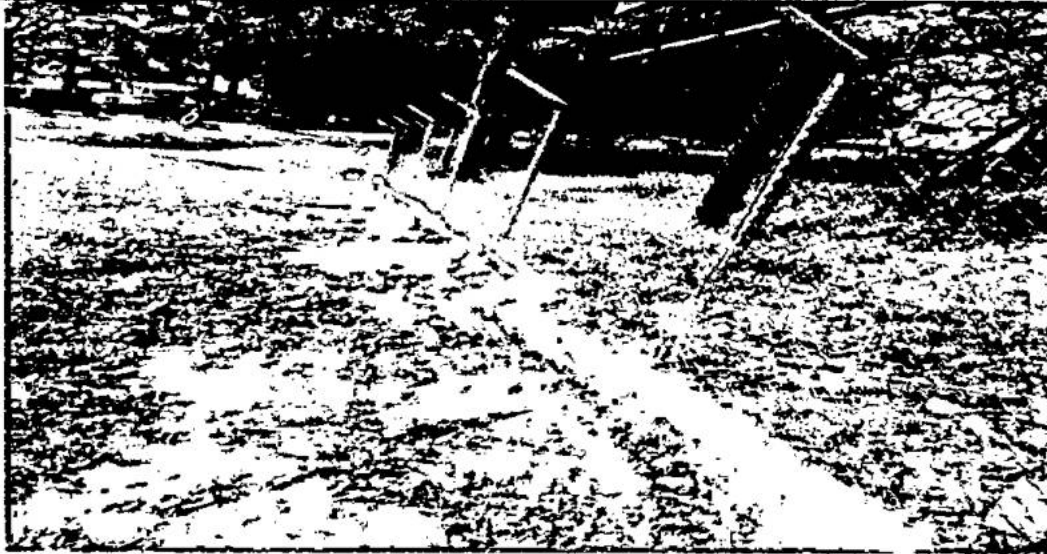

No.	CASA FISCAL
2	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación



No.	CASA FISCAL
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 20



No.	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
4	RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS



No.	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
5	RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3612.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 20





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 20



No.	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
8	TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO



No.	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
9	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 20



No. 10 **AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS**
DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO



No. 11 **AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS**
DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 20



No.
12

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES



No.
13

PISTA

CAMBIO TUBERÍA 2" PVCP



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 20

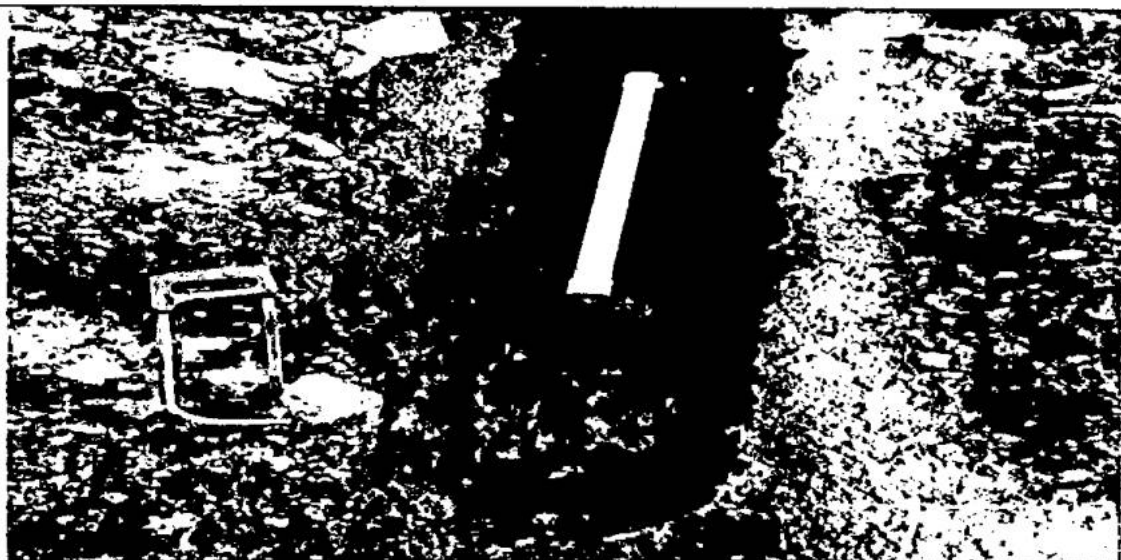

No.	PISTA
14	CAMBIO TUBERÍA 2" PVC



22 dic. 2022 3:02:49 p. m.

No.	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
15	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 11 de 20



No.
16

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO



No.
16

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02


Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 20



23 dic. 2022 4:50:14 p. m.

No. **AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS**
17 **BASE GRANULAR TIPO BG-1**

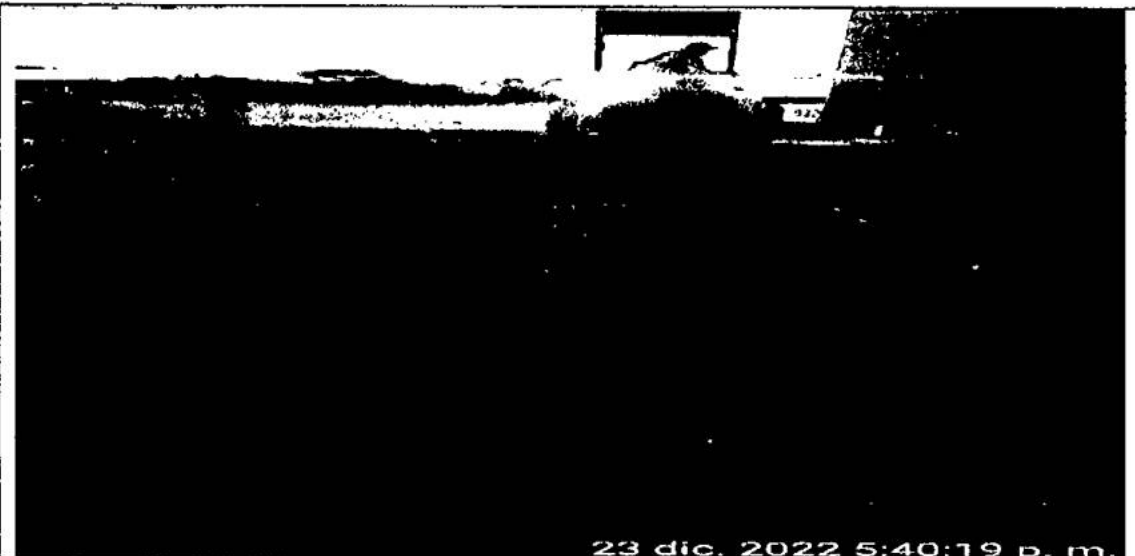

23 dic. 2022 5:40:19 p. m.

No. **AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS**
18 **BASE GRANULAR TIPO BG-1**



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 13 de 20



23 dic. 2022 5:56:23 p.m.

No.
19

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE. INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR,
CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN



No.
20

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02


Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 20



No.
21

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO



No.
22

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS
CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
COMPACTACIÓN.) E.10CM



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 15 de 20



No.
23

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.) E.10CM

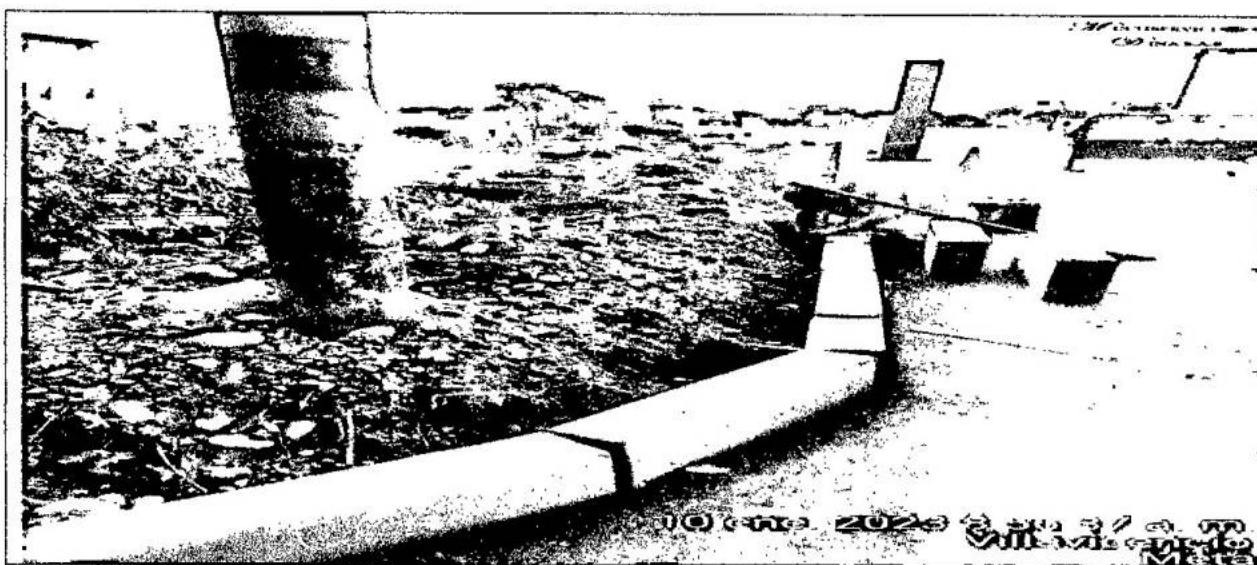

No.
24

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 16 de 20

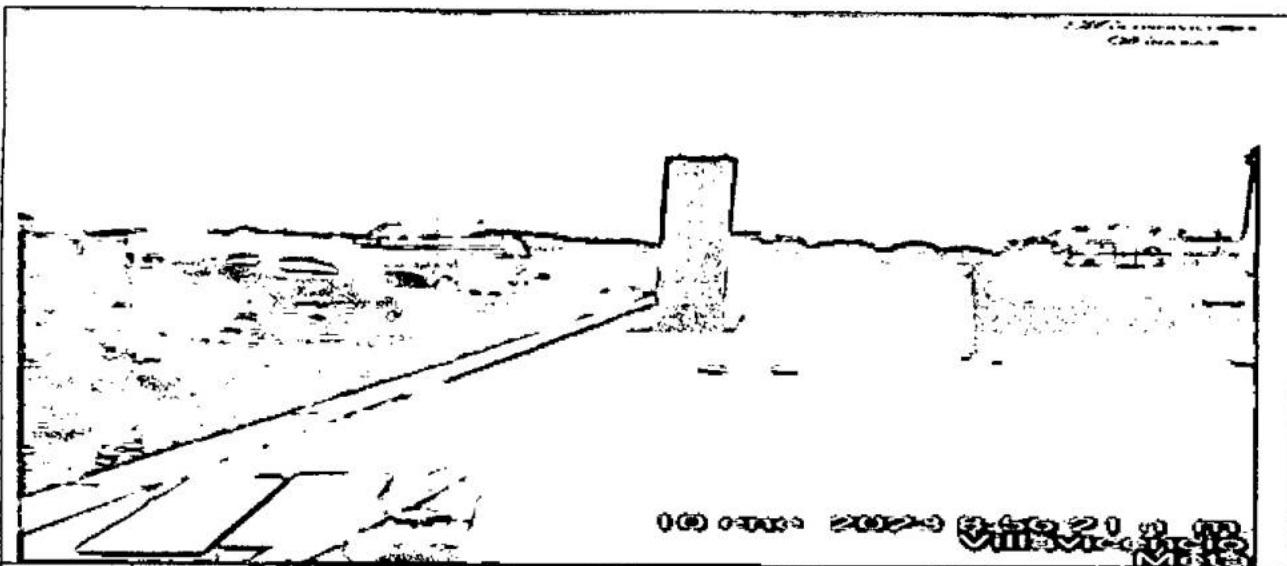

No.
25

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)

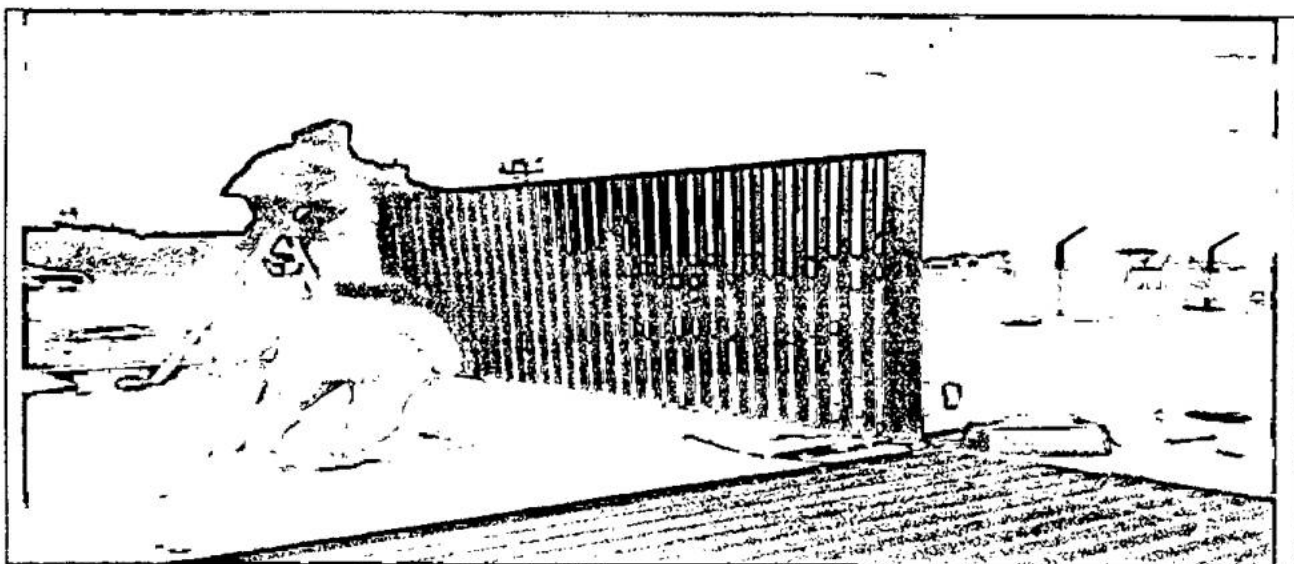

No.
26

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 17 de 20

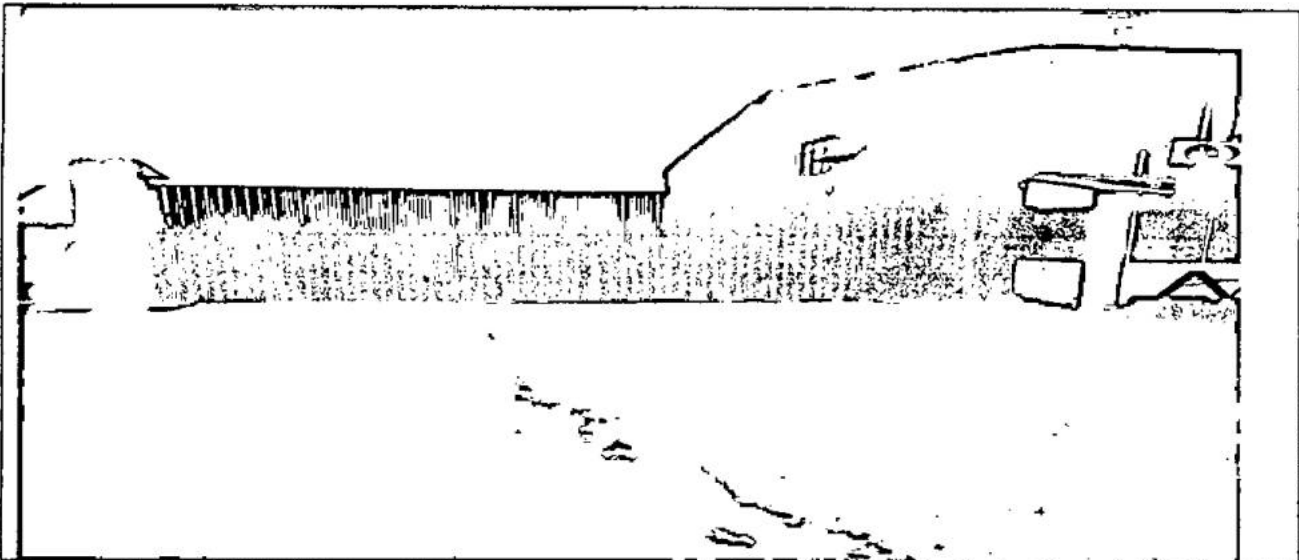

No.
27

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO
PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN



13 ene. 2023 7:08:28 a.m.
Villa Encino
Meta

No.
28

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE
10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO,
ANGULOS PLATINAS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 18 de 20



No.
29

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS

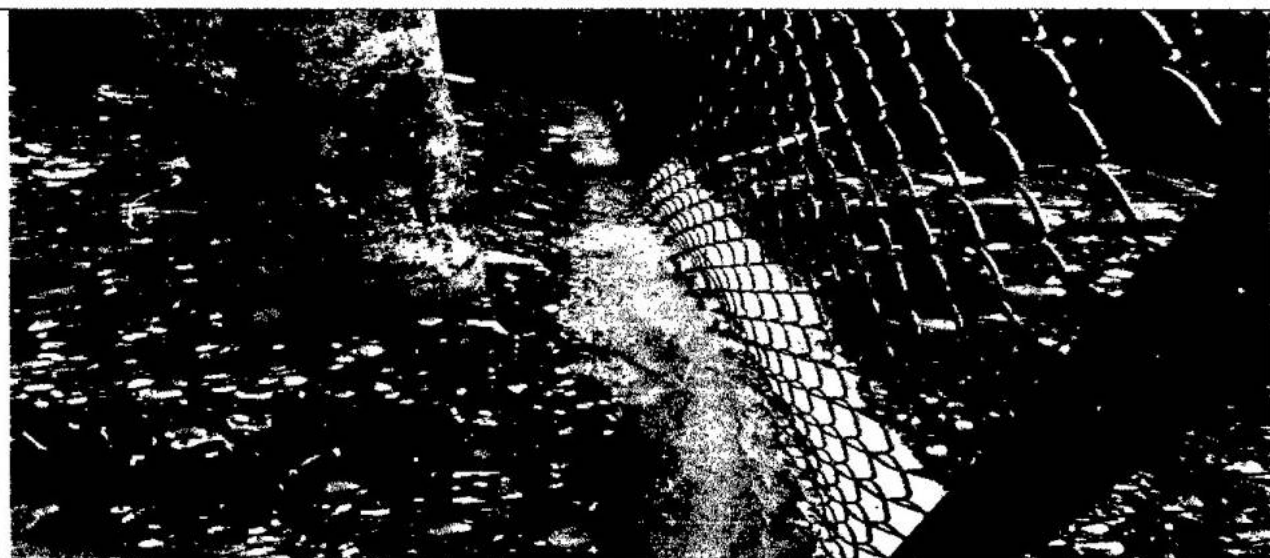


No.
30

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3612.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 19 de 20

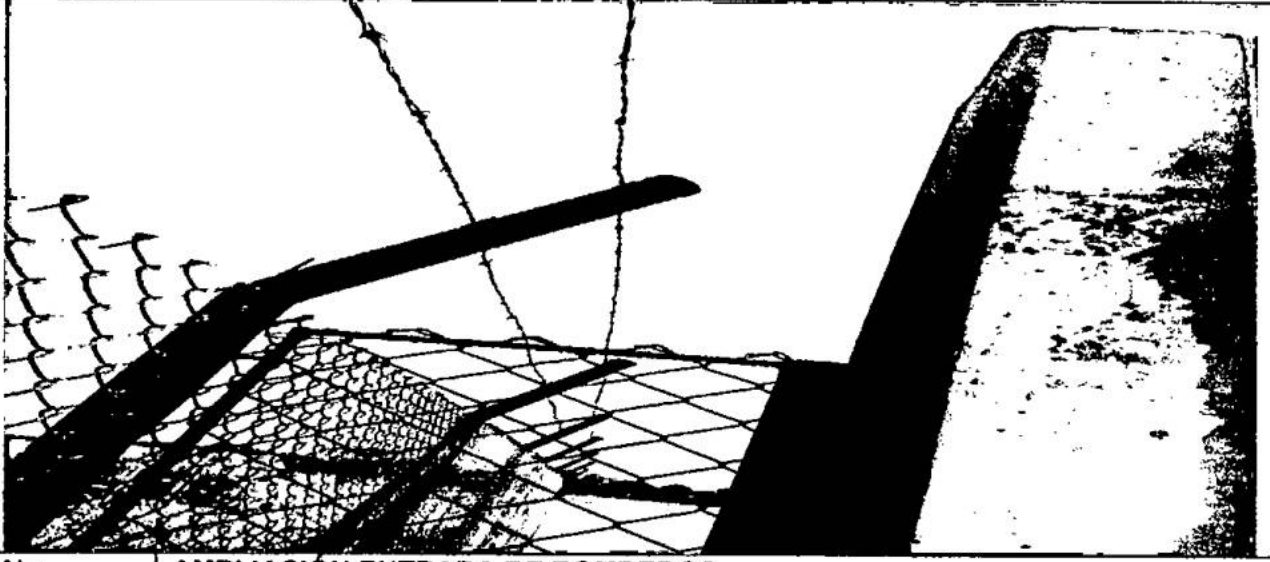	
No. 31	AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NA

4.1. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

4.1.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
--	--

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3612.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 20 de 20

02/7/2022	02/07/2023
-----------	------------

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No. 4	SALDO POR EJECUTAR
\$ 551.680.535,00	ICS - 32	\$ 155.097.578,11	\$0

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No.2	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
\$ 551.680.535,00	ICS - 32	\$ 155.097.578,11	\$0	100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
 Supervisora

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 18

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 15
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 15
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 16

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001020 H4 DE 2022
Nombre del Contratista:	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
Periodo informe:	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO
Nombre de Supervisor:	LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Oriente

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

2. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nº	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ARCHIVO					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	\$ 64.359,83	91,00	\$ 5.856.745,00
1.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	\$ 8.604,00	120,00	\$ 1.032.480,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 18

1.3	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	\$ 57.426,92	12,00	\$ 689.123,00
1.4	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE	M2	\$ 23.517,60	12,00	\$ 282.211,00
1.5	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	\$ 35.589,97	132,00	\$ 4.697.876,00
1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 37.790,68	252,00	\$ 9.523.251,00
1.7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD	M2	\$ 150.187,03	40,00	\$ 6.007.481,00
1.8	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	\$ 34.148,32	264,00	\$ 9.015.156,00
1.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 33.746,80	264,00	\$ 8.909.155,00
1.10	LIMPIEZA GENERAL	M2	\$ 1.195,00	120,00	\$ 143.400,00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO	M2	\$ 83.611,76	20,00	\$ 1.672.235,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 18

DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)					
				SUBTOTAL	\$ 47.829.113,00
2. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA FISCAL					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M	\$ 241.805,86	488,25	\$ 118.061.711,00
2.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	\$ 5.010,27	800,00	\$ 4.008.213,00
2.3	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación	M	\$ 17.214,69	800,00	\$ 13.771.754,00
2.4	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación	ML	\$ 1.463,64	2.400,00	\$ 3.512.726,00
2.5	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	\$ 35.589,97	252,00	\$ 8.968.672,00
2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINOLO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 37.790,68	422,63	\$ 15.971.475,00
2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINOLO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 33.742,98	403,20	\$ 13.605.168,00
2.8	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	\$ 8.604,00	170,00	\$ 1.462.680,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 18

2.9	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE	M	\$ 23.517,60	25,00	\$ 587.940,00
2.10	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M	\$ 57.426,92	25,00	\$ 1.435.673,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS	UND	\$ 239.000,00	6,00	\$ 1.434.000,00
2.12	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI PARA COLUMNAS .40x.40x.60	M3	\$ 590.706,66	1,20	\$ 708.848,00
2.13	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	\$ 4.932,96	215,63	\$ 1.063.670,00
2.14	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA COLUMNAS 100x100x3mm - ACCESO A CASA Y PARQUEADERO	KG	\$ 18.458,45	202,50	\$ 3.737.836,00
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA VIGAS DE CUBIERTA 120x60x2,5mm	KG	\$ 18.458,45	1.009,34	\$ 18.630.850,00
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA CORREAS 60x40x2mm	KG	\$ 18.458,45	342,00	\$ 6.312.789,00
	PLATINERIA PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO	KG	\$ 18.459,40	137,63	\$ 2.540.475,00
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	\$ 64.357,92	60,00	\$ 3.861.475,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 18

				SUBTOTAL	\$	219.675.955,00
3. MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL ANTIGUA - OFICINA IDEAM						
3.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	\$ 6.351,66	150,00	\$	952.750,00
3.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	\$ 8.346,84	89,00	\$	742.868,00
3.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	\$ 34.148,32	150,00	\$	5.122.248,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 37.790,68	150,00	\$	5.668.602,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 33.746,80	449,16	\$	15.157.713,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	\$ 105.305,31	6,50	\$	684.485,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	\$ 525.800,00	8,00	\$	4.206.400,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	\$ 334.600,00	8,00	\$	2.676.800,00
				SUBTOTAL	\$	35.211.866,00
4. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS						
4.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	\$ 34.148,32	325,00	\$	11.098.204,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 18

4.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 37.790,68	294,17	\$ 11.116.884,00
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	\$ 33.746,80	404,00	\$ 13.633.707,00
4.4	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	\$ 4.508,43	200,00	\$ 901.686,00
4.5	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	\$ 6.019,93	30,00	\$ 180.598,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	\$ 105.305,31	30,00	\$ 3.159.159,00
				SUBTOTAL	\$ 40.090.238,00
5. MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS					
5.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HOR A	\$ 14.033,12	120,00	\$ 1.683.975,00
5.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HOR A	\$ 17.273,01	120,00	\$ 2.072.761,00
5.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HOR A	\$ 34.043,16	120,00	\$ 4.085.179,00
				SUBTOTAL	\$ 7.841.915,00
5. ITEMS NO PREVISTOS					
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA	UND	\$ 906.945,00	1,00	\$ 906.945,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 18

	ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 203x96cm				
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205x83cm	UND	\$ 713.535,00	1,00	\$ 713.535,00
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205x90cm	UND	\$ 895.395,00	1,00	\$ 895.395,00
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA 198x66cm	UND	\$ 240.282,00	1,00	\$ 240.282,00
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO	UND	\$ 225.169,00	11,00	\$ 2.476.859,00
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 100x100 EN ALUMINIO Y VIDRIO EN 4mm	UND	\$ 217.217,00	1,00	\$ 217.217,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU A 220 (INCLUYE RETIRO)	UND	\$ 4.319.000,00	1,00	\$ 4.319.000,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)	M2	\$ 70.859,00	25,00	\$ 1.771.475,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 8 PERFIL 7	M2	\$ 64.583,00	6,00	\$ 387.498,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES	M2	\$ 48.050,00	140,00	\$ 6.727.000,00
				SUBTOTAL	\$ 18.655.206,00
6. OBRAS DE PARQUEADERO					



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 18

6.1	RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS	M2	\$ 22.250,00	74,00	\$ 1.646.500,00
6.2	TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES INCLUYE CARGUE	UND	\$ 1.500.000,00	6,00	\$ 9.000.000,00
6.3	TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO	GL	\$ 4.812.500,00	1,00	\$ 4.812.500,00
6.4	DEMOLICION MECANICA BORDILLO CONCRETO REFORZADO PARA CIMIENTOS INC RETIRO	M3	\$ 122.500,00	8,00	\$ 980.000,00
6.5	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	\$ 6.112,50	114,80	\$ 701.715,00
6.6	DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO	M3	\$ 206.250,00	22,96	\$ 4.735.500,00
6.7	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	\$ 122.000,00	29,50	\$ 3.599.000,00
6.8	CAMBIO TUBERÍA 2" PVC	M	\$ 262.500,00	3,00	\$ 787.500,00
6.9	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	\$ 95.000,00	5,00	\$ 475.000,00
6.10	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	\$ 248.000,00	22,96	\$ 5.694.080,00
6.11	BASE GRANULAR TIPO BG-1	M3	\$ 256.250,00	11,48	\$ 2.941.750,00
6.12	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE. INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN	M2	\$ 206.250,00	114,80	\$ 23.677.500,00
6.13	RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	M2	\$ 34.750,00	344,40	\$ 11.967.900,00
6.14	CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.) E.10CM	M3	\$ 1.812.500,00	15,48	\$ 28.057.500,00
6.15	SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION,	M	\$ 302.500,00	32,80	\$ 9.922.000,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 18

	INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)				
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN	M2	\$ 1.321.028,75	21,00	\$ 27.741.604,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS	M	\$ 241.805,86	185,80	\$ 44.927.529,00
6.18	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	\$ 17.214,69	32,80	\$ 564.642,00
6.19	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	\$ 1.463,64	98,40	\$ 144.022,00
				SUBTOTAL	\$ 182.376.242,00
SUB TOTAL OBRAS					\$ 551.680.535,00

SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU (A:19% - I:1% - U:5%)	\$ 551.680.535,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	\$ 4.192.772,07
VALOR TOTAL	\$ 555.862.391,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 18

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019



Página: 11 de 18

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA FISCAL

ANTES



DESPUES





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
XXXX.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 18

MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL ANTIGUA - OFICINA IDEAM

ANTES



DESPUES





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 13 de 18

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS

ANTES



DESPUES

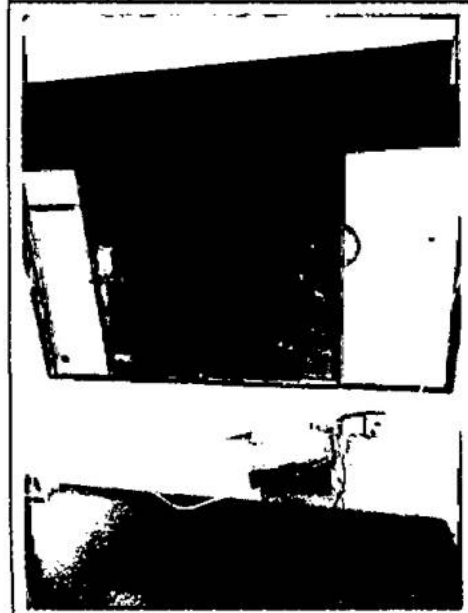



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 14 de 18

OBRAS DE PARQUEADERO

ANTES



DESPUES



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 18

2.2. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó a satisfacción la entrega de los siguientes productos y/o bienes AREA DE ARCHIVO, EDIFICIO IDEAM, AREA ADMINISTRATIVA Y PREDIOS DE LA CASA FISCAL. por parte de ICONS- INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 16 de 18

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
02/7/2022	

4.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 18

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
22001020 H4 DE 2022	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$372.110.089,72)	DEL 14 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2022	\$372.110.089,72	\$105.867.515,33-	\$266.242.574,39
22001020 H4 DE 2022	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$372.110.089,72)	DEL 03 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022	\$266.242.574,39	\$204.801.813,15	\$61.441.678,65
22001020 H4 DE 2022	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRES CIENTOS SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 555.873.307,07)	DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE	\$243.817.920,65	\$88.474.224,19	\$ 155.097.578,11

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 18 de 18


22001020 H4 DE 2022	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRES CIENTOS SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 555.873.307,07)	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO	\$ 155.097.578,11	\$ 155.097.578,11	\$0
---------------------------	--	--	------------------------------------	-------------------	-------------------	-----

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100.00% hasta el 14 de ENERO de 2023.

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 14 de Enero se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR CONTRATO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3612.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001020 H4 DE 2022
Nombre del Contratista:	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
Periodo informe:	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO
Nombre de Supervisor:	LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AEROPUERTO VANGUARDIA-VILLAVICENCIO

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	FECHA	DETALLES
CASA FISCAL		
2	10/01	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación
3	12/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)
AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS		
15	10/01	SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)
16	14/01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN
17	13/01	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS
18	13/01	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
19	13/01	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

3.1.1 Actividades:

- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- También fueron instaladas tabletas tipo gres de 30 x 30cm, para tapar los parches que había a las afueras de la cabaña principal y que afeaban la fachada de la misma.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 8

- Se instalaron 32,80m de sardinel tipo A10.
- Fue instalado mortero de dosificación 1:4 para fijar la malla eslabonada instalada anteriormente, para que esta quedara debidamente templada y asegurada.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- Se realizaron actividades pertinentes para hacer la instalación de malla eslabonada, incluyendo la tubería, ángulos y platinas correspondientes para su correcto funcionamiento.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 8

a. REGISTRO FOTOGRÁFICO



No.
3

CASA FISCAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 8



No.
24

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)



No.
25

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 8

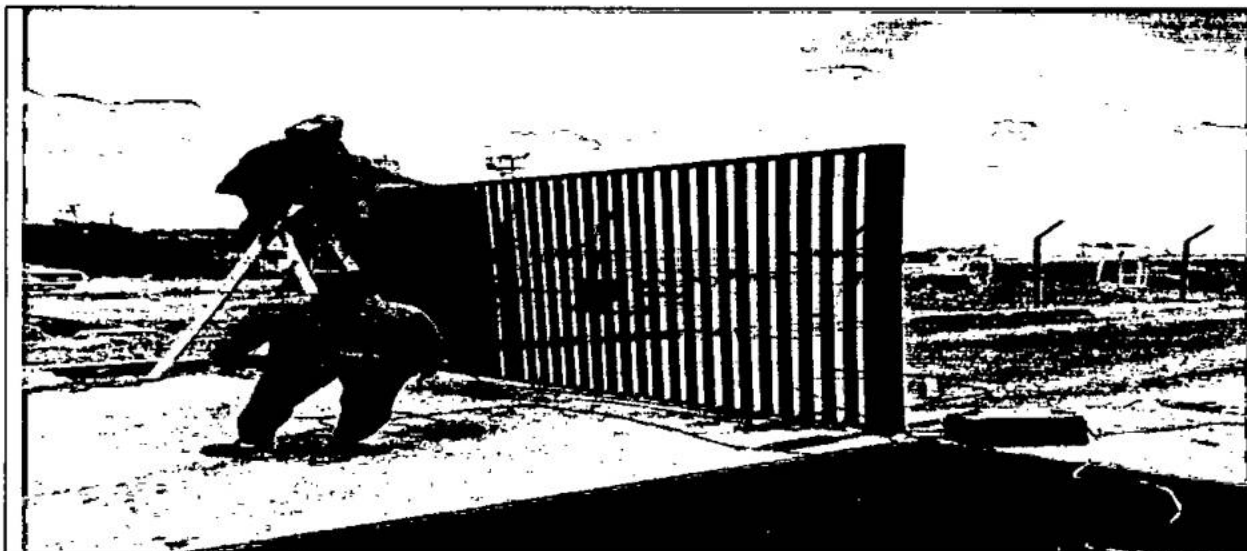

No.
26

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO
PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN



No.
27

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO
PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 6 de 8

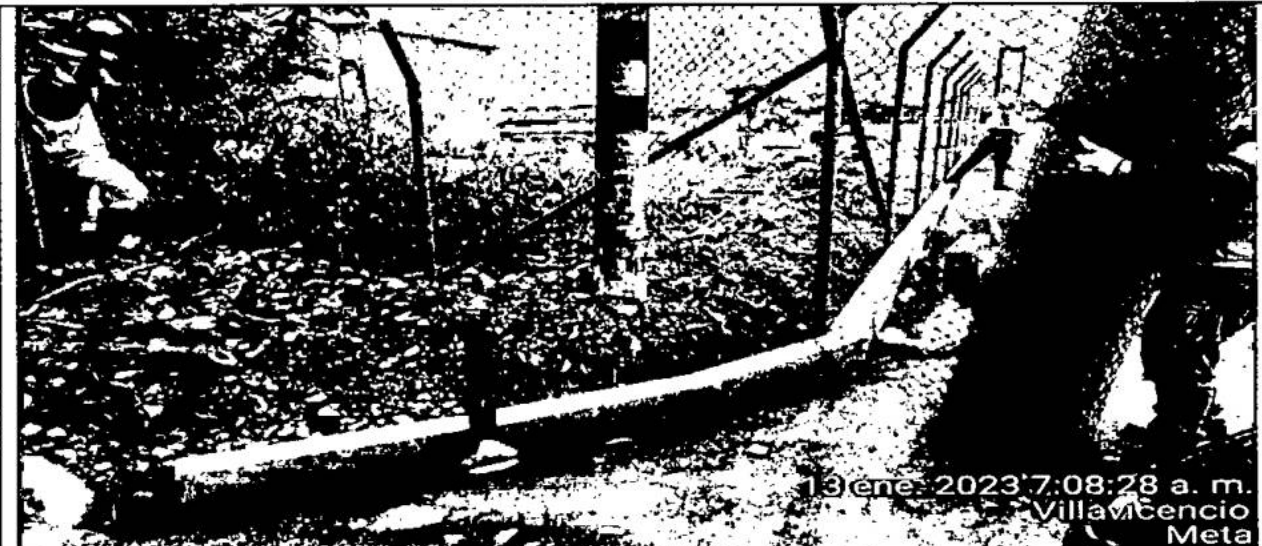

No.
28

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS

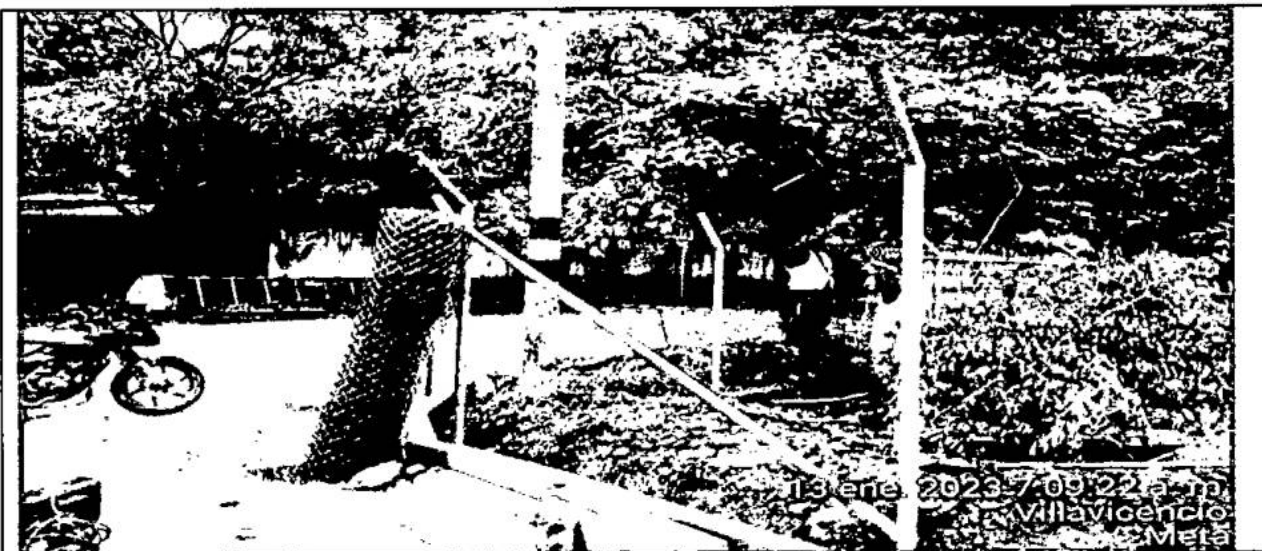

No.
29

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3612.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019


Página: 7 de 8



No.
30

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

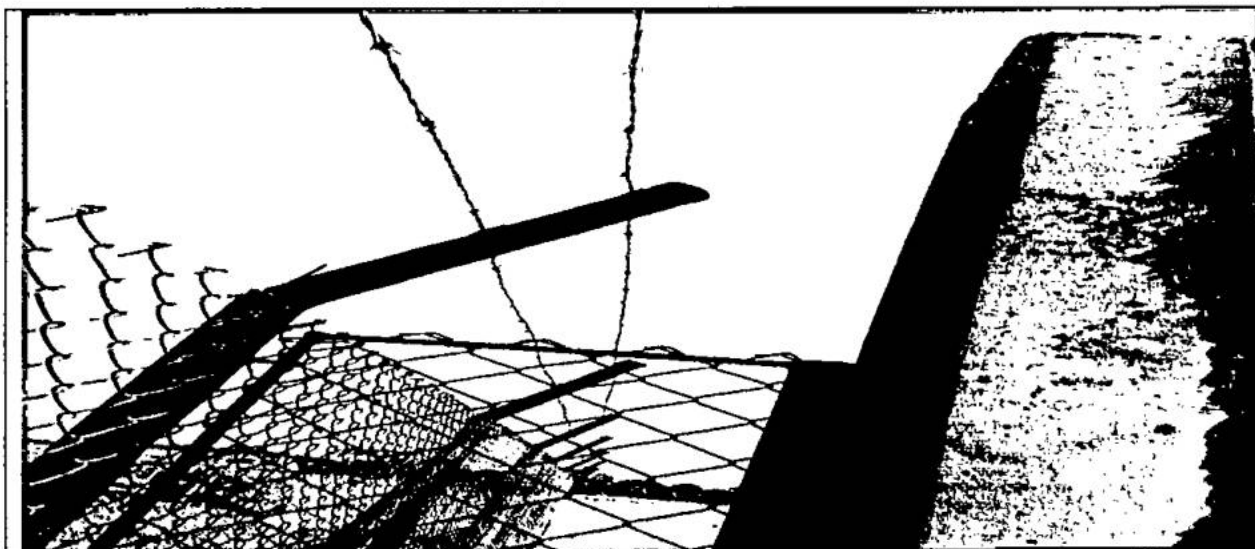

No.
31

AMPLIACIÓN ENTRADA DE BOMBEROS

ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil consiente de pertenecer a una sociedad necesitada de cambio, con altos valores éticos y morales, capaz de forjar condiciones optimas para un correcto desarrollo de las labores fijadas, con un carácter de emprendimiento sobresaliente y capacidad de diálogo, tenacidad al enfrentar nuevos retos, autonomía de decisión y responsabilidad, que combinada con metas y propósitos me permiten consolidarme como profesional ejemplar.

DATOS PERSONALES.

NOMBRES Y APELLIDOS	HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
CÉDULA DE CIUDADANIA.	1098616374
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.	SAN JUAN DEL CESAR ABRIL 30 DE 1986.
ESTADO CIVIL.	SOLTERO.
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA.	CRA 39 No 41 – 09 Apto 1003
MÓVIL.	3043794019.
CIUDAD – PAÍS.	BUCARAMANGA, COLOMBIA.
E-MAIL.	hugues_2004@hotmail.com
CATEGORIA DE LICENCIA	CUATRO – AUTOMOVILES

ESTUDIOS REALIZADOS

- **Secundaria**
Colegio Nacionalizado El Carmelo.
Bachiller Académico.
San Juan del Cesar –La Guajira, 2002.
- **Universitario**
Universidad Pontificia Bolivariana.
Ingeniero Civil.
Proyecto de Grado: ANÁLISIS DEL ESFUERZO CORTANTE EN LA MAMPOSTERÍA POR MEDIO ENSAYO DE CORTE DIAGONAL EN MURETES CONSTRUIDOS CON UNIDADES H-10 Y H-15.
Bucaramanga-2010.
- **Diplomado**
Universidad Pontificia Bolivariana.
Gerencia e Interventoria de Proyectos
- **Postgrado.**
Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialización en Vías Terrestres.
Monografía

TALLERES CURSOS Y SEMINARIOS

TALLER	VII JORNADA TECNICA DE INGENIERIA CIVIL. La Ingeniería Civil en el Contexto Nacional. Bucaramanga Octubre 25 al 27 de 2007.
SEMINARIO	VIII JORNADA TECNICA DE INGENIERIA CIVIL. Primer Seminario Internacional de Grandes Presas. Bucaramanga Octubre 15 al 18 de 2008.
SEMINARIO	SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE TRANSPORTE BASADO EN AUTOBUSES. Bucaramanga Marzo 4 al 6 de 2010
CURSO	ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO APLICADOS A PAVIMENTOS, ICPC. Bucaramanga Octubre 19 y 20 de 2007.
CURSO	AUTOCAD 2D. SERVICIO DE NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIPLOMADO	GERENCIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

EXPERIENCIA LABORAL

- **CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**
Ingeniero Residente – 26/07/2010 – 25/10/2010
Chínu - Córdoba
- **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO A LA SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA COMO INGENIERO CIVIL DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS Y REQUERIDAS PARA EL PROYECTO TRANSVERSAL EL BOSQUE Y DEMAS PROYECTOS DE INTERES QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION.**
Ingeniero Civil – 01/02/2011 – 23/12/2011
Bucaramanga – Colombia.
- **CONSTRUCCION DE UN JARILLON EN EL RIO LEBRIJA PARA PROTECCION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS PECUARIAS Y AGRICOLAS DEL ÁREA RIBEREÑA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**
Ingeniero Residente – 17/01/2012 – 17/04/2012
Consorcio Lebrija.
- **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CIVILES ADELANTADAS EN EL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO Y LAS DEMAS RELATIVAS A LA DISPOSICION FINAL QUE OPERA LA EMPRESA PROACTIVA CHICAMOCHA EN LA CIUDAD DE BUCARAMAGA**
Ingeniero Residente – 21/04/2012 – 20/08/2012
Proactiva Chicamocha
- **MANTENIMIENTO DE CARPETA DE RODADURA DE LA VIA COMPRENDIDA ENTRE LIZAMA – PUERTO SALGAR PROYECTO RUTA DEL SOL.**
Ingeniero Residente – 21/08/2012 – 20/12/2012
Macsol & Cia Ltda
- **COMFORMACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL AFIRMADO Y LEVANTE DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO EN LAS VIAS QUE COMUNICAN A LAS VEREDAS DE LA ISLA Y EL SINU EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE SAN ANGEL - MAGDALENA**
Contratista
Alcaldía de Sabana de San Ángel

REFERENCIA PROFESIONAL

Ingeniera Civil Andrea Liliana Ramírez Gamboa. –
3002123265.
Bucaramanga - Santander


Arquitecto Carlos Mario Mendoza Alvarez.
3008160425.
Chinu - Córdoba

REFERENCIA PERSONAL

Luz Dary Carmona Díaz.
Ingeniera Ambiental
3186996482
Bucaramanga - Santander

Viviana Marcela Pérez Rodríguez
Ingeniera Civil
3013954467.
Bucaramanga – Santander.

Renata Jaqueline Bravo Saavedra
Ingeniera Civil
300 4438398
Bucaramanga – Colombia



Universidad
Pontificia
Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

VERIFICADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

teniendo en cuenta que


Hugues Leonardo Barros Mendoza


Cédula de ciudadanía No 1498419344- Expedida en Bucaramanga


Quien aprobó los estudios exigidos por las normas legales
reglamentarias vigentes le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 12 del mes de Noviembre del año 2010


El Rector


El Decano


El Secretario General

Anotado al tomo 1695 del libro (P) de registro de diplomas
reconocido en Bucaramanga el 11 de Noviembre de 2010



ACTA DE GRADO No. 3981

(Libro 12 - P1, Folio 1696)

La Escuela de **INGENIERÍA** de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, en su programa académico: **INGENIERÍA CIVIL** aprobado por Acuerdo 008 de Noviembre 12 de 1993, expedido por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPB.

Confiere el título de: **INGENIERO CIVIL**

a: **HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA**

Identificado con la cédula de ciudadanía 1.098.616.374 expedida en Bucaramanga (Santander) en cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al pensum de: **INGENIERÍA CIVIL**, cumplió los demás requisitos y realizó el Trabajo de Grado en la modalidad de Proyecto de grado titulado: "**ANÁLISIS DEL ESFUERZO CORTANTE EN LA MAMPOSTERÍA POR MEDIO DEL ENSAYO DE CORTE DIAGONAL EN MURETES CONSTRUIDOS CON UNIDADES H - 10 Y H - 15**"; el cual fue aprobado; y prestó juramento de rigor en los siguientes términos:

"¿JURA A DIOS Y PROMETE A LA PATRIA, SOSTENER LA INDEPENDENCIA, EL ORDEN, Y LAS LIBERTADES SUYAS, DEFENDER SIEMPRE LOS FUEROS DE LA JUSTICIA, PRACTICAR LA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA MORAL CRISTIANA, Y TRABAJAR POR LA PAZ DE COLOMBIA, EL ADELANTO Y PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA?"

El graduando respondió: **"SI JURO"**

"SI ASI LO HACE, DIOS Y LA PATRIA SE LO PREMIEN, SI NO, EL Y ELLA SE LO DEMANDEN"

La Ceremonia de Grado se llevó a cabo el DOCE (12) de NOVIEMBRE del año DOS MIL DIEZ (2010).

El Rector Seccional, MONS. PRIMITIVO SIERRA CANO.


El Secretario General, Abo. CARLOS AUGUSTO MORA GONZÁLEZ.

El Decano, Ing. SAMUEL MONTERO VARGAS.


Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales.

Es fiel copia tomada del original, el día 12 de Noviembre de 2010.

El Secretario General,


Abo. CARLOS AUGUSTO MORA GONZÁLEZ



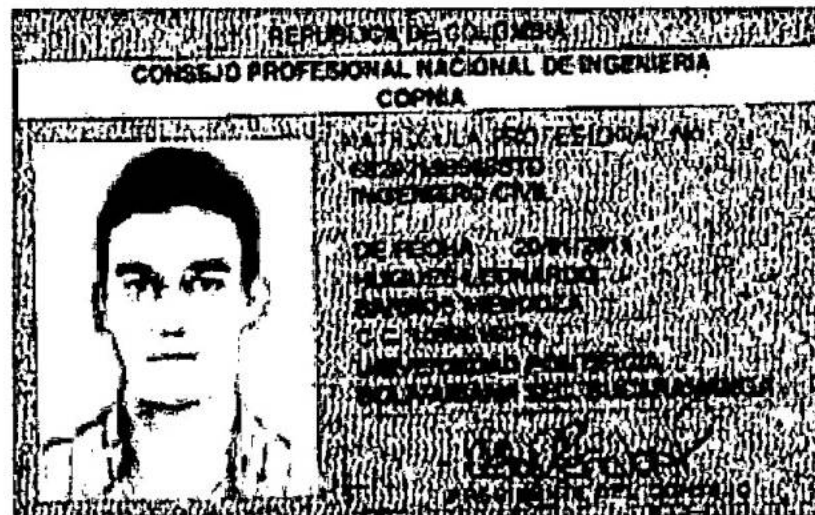

Este es un documento público expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para
ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.616.374
BARROS MENDOZA

APELLIDOS
HUGUES LEONARDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1986
SAN JUAN DEL CESAR
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 B+ M

ESTATURA G.S. RM SEXO

24-JUN-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1282500-00409057-M-1098610374-20130013 0034890852A 1 39026541

CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ

ARQUITECTO

Dir. Cra. 12 N° 14-39 Chinú-Córdoba. Tel. 3008160425

CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA** identificado con la cedula N° 1.098.616.374 de Bucaramanga; laboro como residente de obra en el proyecto **CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENITO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**

N° DEL CONTRATO: 151


DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENITO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DURACION: 3 MESES

VALOR: \$ 6.000.000

ESTADO DEL CONTRATO: LEGALIZADO, CON ACTAS DE INICIO Y FINAL.

Se expide el siguiente certificado a los 18 días de Noviembre del 2010.



CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ

C.c. 79.390.584 de Bogotá.

T.P. A25012000-79790584



Comprometidos con la Excelencia

Diseño, montaje, programación, construcción e Interventoría de obras civiles.
NIT 12.625.799-2

TITO VELÁSQUEZ

Barranquilla, 16 de julio 2012

Yo, TITO II VELÁSQUEZ BECERRA

NIT. 12.625.799-2

CERTIFICO QUE:

HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.616.374 de Bucaramanga. Desempeño el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** con una dedicación al 100% durante la ejecución del contrato que tuvo por objeto: **ADECUACION, RESTAURACION, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**. Cuyo valor fue: **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L.C** (\$ 1.799.609.999,97) y se ejecutó entre las fechas del 29 de febrero de 2011 hasta el 26 de junio de 2012.

Se expide a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil doce (2012).

TITO VELASQUEZ BECERRA

C.C. No. 12.625.799-2 de Cga, Magdalena

Diseño, programación, construcción e interventoría de obras civiles.

e-mail: gerenciageneral@titovelasquez.com, gerenciaadministrativa@titovelasquez.com

Somos interventores innatos, trabajamos constantemente para construir futuro.

www.constructoratitovelasquez.com



CONSTRUCTORES & CONSULTORES

CERTIFICA

Que el Ingeniero Hugues Leonardo Barros Mendoza identificado con cedula de ciudadanía No 1.098.616.374 de Bucaramanga laboro en el contrato de Obra cuyo objeto es **MANTENIMIENTO DE CARPETA DE RODADURA DE LA VIA COMPRENDIDA ENTRE LIZAMA – PUERTO SALGAR PROYECTO RUTA DEL SOL.**, A partir del 21 de Agosto del 2012 hasta el 20 de Diciembre del 2012 , Prestando sus servicios como ingeniero residente desempeñándose a satisfacción en las labores encomendadas.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de Febrero del 2013.

Atentamente.

Marco Tulio Solano Glen
MARCO TULIO SOLANO GLEN
GERENTE

	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Código: MSSA-DA-00-00
	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Fecha de actualización: 30-11-2010
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL	Version: 01
	NIT. 819083224 - 8	Certificación
		Página 1 de 1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE SABANAS DE SAN ÁNGEL MAGDALENA

CERTIFICA:

Que el señor HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1098 616.374 expedida en Bucaramanga, y Representante Legal del Consorcio Sabana Realizo el contrato de Mínima Cuantía No P-MC-MSSA/002- 2013 cuyo objeto es "CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE AFIRMADO Y LEVANTE DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN LAS VÍAS QUE COMUNICAN A LAS VEREDAS DE LA ISLA Y EL SINU EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL- MAGDALENA". Por un valor de TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$13.934.778.00) MCTE. Mediante fecha Enero 24 hasta Enero 30 de 2013.

Dada en la cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel - Magdalena a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero 2013


YULIETH JOHANNA CONTRERAS ARCA
Secretaria de Planeación y Obras.

Plazo: Muestra de
Cargo: Asesor a la Alcaldía
Iniciado y emitido: 2013-02-25
Cargo: Asesor a la Alcaldía y Obras Públicas



Certifican que:

**HUGUES LEONARDO BARROS
MENDOZA**


Asistió al Curso:

Estabilizaciones con Cemento Aplicados a Pavimentos

Realizado en la Ciudad de Bucaramanga durante los días 19 y 20 de
Octubre de 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Alberto Alvarez', is written over a horizontal line.

JORGE ALBERTO ALVAREZ
— Director de Infraestructura ICPC



LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA

Certifica que:

HUGUES LEONARDO BARROS

Participó en la

**VII JORNADA TÉCNICA DE INGENIERÍA CIVIL
"La Ingeniería Civil en el Contexto Nacional"**

Realizada en la ciudad de Bucaramanga,
durante los días del 25 al 27 de Octubre de 2007

ING. SAMUEL MONTERO VARGAS



LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA

Certifican que

HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA

Participó en la

**VIII JORNADA TÉCNICA DE INGENIERÍA CIVIL
"PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE GRANDES PRESAS"**

Realizado en Bucaramanga los días del 15 al 18 de Octubre de 2008.

ING. SAMUEL MONTERO VARGAS
Decano de la Escuela de Ingeniería y Administración



SEMINARIO TALLER
INTERNACIONAL
SISTEMAS DE
TRANSPORTE RÁPIDO
BASADO EN AUTOBUSES
(BRT-Bus Rapid Transit)




Certifican que


HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
C.C. 1.098.616.374

Participó en el

**SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS
DE TRANSPORTE RÁPIDO BASADO EN AUTOBUSES**

Realizado en Bucaramanga los días 4, 5 y 6 de Marzo de 2010,
con una duración de 19 horas


ALDEMAR REMOLINA MILLÁN
Director Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Pontificia Bolivariana


GERMÁN GARCÍA VERA
Director Escuela de Ingeniería Civil
Universidad Industrial de Santander



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
HUGUES LEONARDO BARROS MENDOZA
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1098616374.

SENA
Curso y aprobó la acción de Formación
AUTOCAD-2D
Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en La plata a los Veintidos (22) días del mes de Noviembre de Dos Mil Diez (2010)

GUILLERMO ALVIRA VARGAS

SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
REGIONAL HUILA



SGCV20102889306 22/11/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006


PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATO No. 22001020 H4 DE 2022

OBJETO: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL.

CONTRATISTA: ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

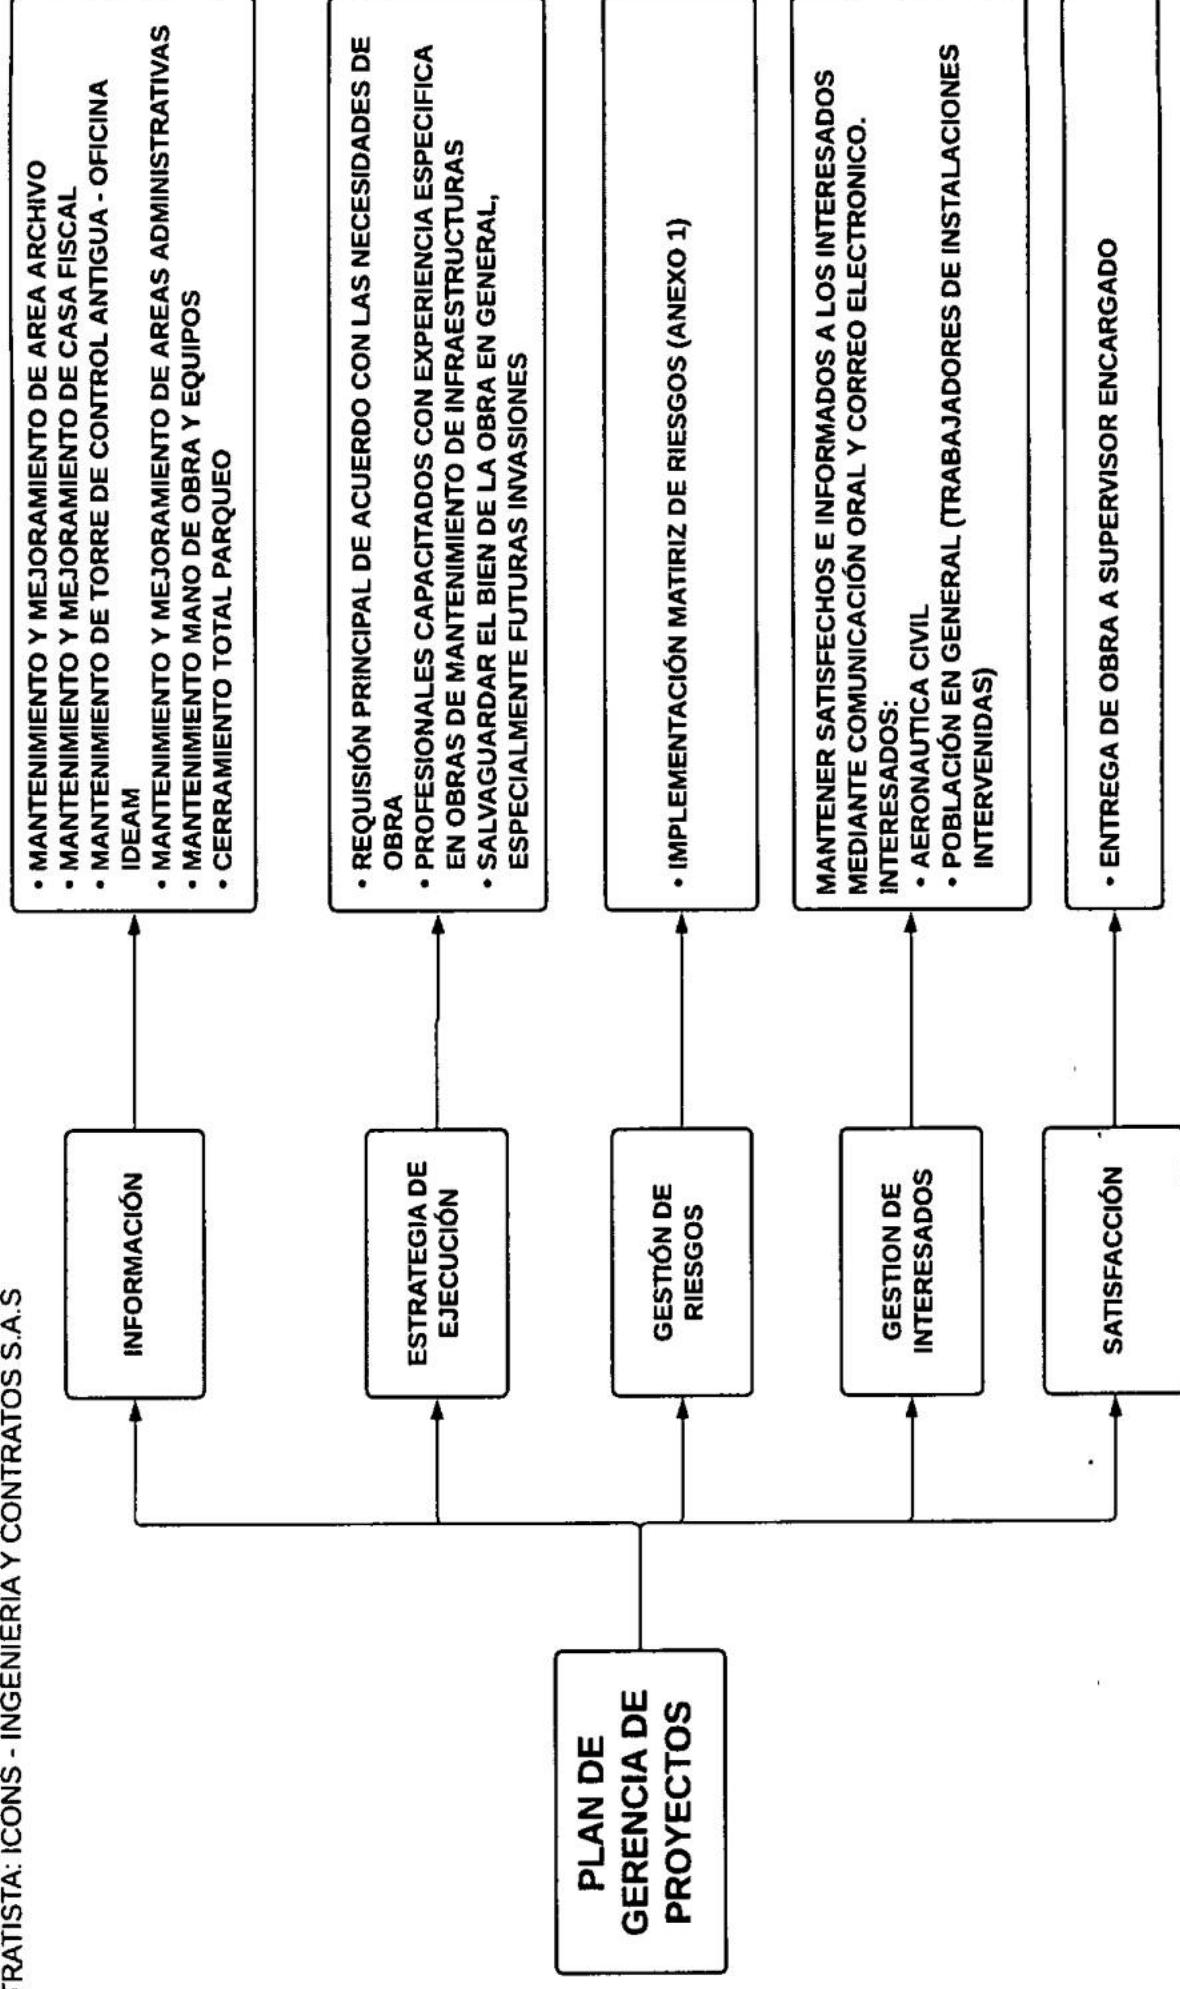




MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

DATOS DEL INCUMBIDO DE LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL
 NOMBRE: ANA RAQUEL SINGELEDO

CÉDULA: 123456789
 Nº DE LICENCIA: 123456789

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						REQUISITO LEGAL APLICABLE	SITIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	FECHA DEL RIESGO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y MEDIDA	OBSERVACIONES Y VERIFICACIÓN DEL RIESGO
	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				Jorge Luis González Reyes
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA FISCAL	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				Jorge Luis González Reyes
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CONTROL DE RIESGO	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				Jorge Luis González Reyes
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AS ADMINISTRATIVAS	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				Jorge Luis González Reyes
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				
	Identificación del riesgo						Resolución 1407 de 2007				

ANEXO 1
DECRETO 1072 DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN 2013 DE 1995
RESOLUCIÓN 1407 DE 2007
DECRETO 1072 DE 2013
RESOLUCIÓN 2013 DE 1995
DECRETO 3088 DE 2007
RESOLUCIÓN 1212 DE 2001

ANA RAQUEL SINGELEDO

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-75	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL 22001020 H4 DE 2022 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 19
		FECHA		DD 17	MM 5
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1	ETIQUETADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACERQUE DE PAVIMENTOS	M2	74,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/ANCHO	RENDIMIENTO	VR UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	847,62
SUBTOTAL \$					847,62
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR UNITARIO	
SUBTOTAL \$					-
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VR UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	2,10	\$ 6.357,14
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,10	\$ 3.531,75
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,10	\$ 3.531,75
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,10	\$ 3.531,75
SUBTOTAL \$					18.952,38
TOTAL COSTO DIRECTO \$					17.800,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	10%	3.382,00			
IMPREVISTOS	1%	178,00			
UTILIDAD	5%	890,00			
SUBTOTAL \$					4.450,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					22.250,00
Firma:  Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No.: 65202232918STD					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No.: _____					

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		2	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					

FECHA	DD	MM	AA
	17	5	2023

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	ALA Y RETIRO DE ÁRBOLES INCLUYE CARGUE	UN	8,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	7.142,88
SUBTOTAL \$					7.142,88

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ² o Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
VOLOQUETA DE 15M3	15,00	8,00	1,88	\$ 580.000,00	1.050.000,00
SUBTOTAL \$					1.050.000,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	0,25	\$ 53.571,43
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.416,67	0,25	\$ 29.761,90
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.416,67	0,25	\$ 29.761,90
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.416,67	0,25	\$ 29.761,90
SUBTOTAL \$					142.857,14

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.200.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	18%	228.000,00
IMPREVISTOS	1%	12.000,00
UTILIDAD	5%	60.000,00
SUBTOTAL \$		300.000,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 1.500.000,00

Firma
 Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula No.: 682022326185TD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
 Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
 Nombre:
 Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		22001020 H4 DE 2022		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
VERSIÓN		1			
PÁGINA		3	DE	19	
FECHA		DD	MM	AA	
		17	5	2023	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
3	TRASLADO DE POSTE ELÉCTRICO CONCRETO	GL	1,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vt. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	7.470,19
GRUA	VOLTAS	HIDRAULICA	\$ 880.000,00	0,24	3.893.126,08
SUBTOTAL \$					3.700.596,28
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vt. UNITARIO	
SUBTOTAL \$					-
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. e PESO	DISTANCIA	M ³ e Ton/Km	TARIFA	Vt. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vt. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	176%	\$ 13.350,00	0,24	\$ 56.026,40
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	176%	\$ 7.416,67	0,24	\$ 31.125,78
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	176%	\$ 7.416,67	0,24	\$ 31.125,78
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	176%	\$ 7.416,67	0,24	\$ 31.125,78
SUBTOTAL \$					149.403,74
TOTAL COSTO DIRECTO \$					3.850.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	10%	731.500,00			
IMPREVISTOS	1%	38.500,00			
UTILIDAD	5%	192.500,00			
SUBTOTAL \$					962.500,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					4.812.500,00
<p>Firma</p> <p>Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES</p> <p>Representante Legal del Contratista o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.: 68202232918STD</p>					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
<p>APROBACIÓN POR INTERVENTORIA</p> <p>Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.</p> <p>Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de</p>					
<p>Firma</p> <p>Nombre:</p> <p>Representante Legal del Interventor o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.:</p>					

Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		22001020 H4 DE 2022		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
VERSIÓN		1			
PÁGINA		5		DE 19	
FECHA		DD		MM	
		17		5	
				2023	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	
5	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	114,80		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	232,86
SUBTOTAL I					232,86
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL II					-
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL III					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	7,64	\$ 1.748,43
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	7,64	\$ 970,24
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	7,64	\$ 970,24
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	7,64	\$ 970,24
SUBTOTAL IV					\$ 4.657,14
TOTAL COSTO DIRECTO \$					4.890,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	10%	929,10			
IMPREVISTOS	1%	48,90			
UTILIDAD	5%	244,50			
SUBTOTAL V					1.222,50
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					6.112,50
<div style="text-align: right;">  Firma Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No. : 68202232918STD </div>					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de					
<div style="text-align: right;"> Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No. : </div>					

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		6	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
				FECHA	DD MM AA
				17	5 2023
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
6	DESCAPOTE MECANICO H= 0,20 M INCLUYE RETIRO	M3	22,06		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	390,48
SUBTOTAL \$					390,48
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$					
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ² o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOQUE DE 15M3	1,40	5,00	0,28	\$ 580.000,00	156.800,00
SUBTOTAL \$					156.800,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	4,56	\$ 2.928,57
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	4,56	\$ 1.626,98
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	4,56	\$ 1.626,98
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	4,56	\$ 1.626,98
SUBTOTAL \$					7.809,53
TOTAL COSTO DIRECTO \$					186.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	19%	31.350,00			
IMPREVISTOS	1%	1.850,00			
UTILIDAD	5%	8.250,00			
SUBTOTAL \$					41.250,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					206.250,00
<div style="text-align: center;">  Firma Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula No.: 66202232918STD </div>					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a Items de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada Item, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de Items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada Item no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de					
<div style="text-align: center;"> Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula No.: </div>					

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviado de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSION		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		7	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	
FECHA		DD	MM
		17	5

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	29.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	804.52
RETROEXCAVADORA	VOLTAS	RETRO	\$ 250.000,00	2,94	84.905,00
SUBTOTAL					85.509,52

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO
SUBTOTAL				

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	Nº de Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	2,94	\$ 4.533,93
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	2,94	\$ 2.518,85
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	2,94	\$ 2.518,85
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	2,94	\$ 2.518,85
SUBTOTAL					\$ 12.090,47

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 97.600,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	18.544,00	
IMPREVISTOS	1%	976,00	
UTILIDAD	5%	4.880,00	
		SUBTOTAL	24.400,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 122.000,00

Firma
Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No.: 68202232918STD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.:

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FA-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		22001020 H4 DE 2022				
		VERSIÓN	1			
		PÁGINA	8	DE 19		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		FECHA		DD	MM	AA
				17	5	2023
ITEMS NO PREVISTOS						
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
8	CAMBIO TUBERÍA 2" PVC	ML	3,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VI. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	1.368,62	
SUBTOTAL \$					1.368,62	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VI. UNITARIO		
TUBERÍA PVC DE 2" X MT	ML	1,00	\$ 20.500,00	\$ 20.500,00		
ACCESORIO PVC DE 2"	UN	0,50	\$ 55.501,00	\$ 27.750,50		
SOLDADURA PVC Y LIMPIADOR	GL	0,70	\$ 190.012,00	\$ 133.008,40		
SUBTOTAL \$					181.258,90	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL. a PERO	DISTANCIA	N° de Tonelaje	TARIFA	VI. UNITARIO	
SUBTOTAL \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VI. UNITARIO	
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	1,30	\$ 10.264,68	
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	1,30	\$ 5.702,60	
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	1,30	\$ 5.702,60	
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	1,30	\$ 5.702,60	
SUBTOTAL \$					27.372,48	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					210.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACIÓN	10%	39.900,00				
IMPREVISTOS	1%	2.100,00				
UTILIDAD	5%	10.500,00				
SUBTOTAL \$					52.500,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					262.500,00	
<div> <div>Firma</div> <div> <div>Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES</div> <div>Representante Legal del Contratista o su Apoderado</div> <div>Matrícula No.: 68202232018STD</div> </div> </div>						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA						
<div> <div>APROBACIÓN POR INTERVENTORIA</div> <div> <div>Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.</div> <div>Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de</div> </div> </div>						
<div> <div>Firma</div> <div> <div>Nombre:</div> <div>Representante Legal del Interventor o su Apoderado</div> <div>Matrícula No.:</div> </div> </div>						

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		9	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		
FECHA		DD	MM	AA
		17	5	2023

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	5,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	470,74
RETROEXCAVADORA	VOLTAS	RETRO	\$ 250.000,00	3,78	66.114,55
SUBTOTAL \$					66.585,29

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO	
SUBTOTAL \$					-

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	Nº o Tonelón	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	3,78	\$ 3.530,52
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	3,78	\$ 1.961,40
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	3,78	\$ 1.961,40
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	3,78	\$ 1.961,40
SUBTOTAL \$					\$ 9.414,71

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 76.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	19%	14.440,00	
IMPREVISTOS	1%	760,00	
UTILIDAD	5%	3.800,00	
SUBTOTAL \$			19.000,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 95.000,00

Firma
 Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matrícula No. : 68202232918STD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
 Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a Items de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada Item, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
 Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de Items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada Item no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
 Nombre:
 Representante Legal del Interventor o su Apoderado
 Matrícula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		10	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			
FECHA		DD	MM	AA	
		17	5	2023	
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
10	RELLENO EN SUBBASE GRANULAR SBG CON RUTEROS REVISAR DEL PROYECTO MODIFICADO	M3	22.96		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	704.38
RETROEXCAVADORA	VOLTAS	RETRO	\$ 250.000,00	2,53	68.929,30
COMPACTADORA MECANICA	N.A.	N.A.	\$ 75.000,00	2,53	29.678,79
SUBTOTAL \$					129.312,47
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO	
SUB BASE GRANULAR SBG	M3	1,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	
SUBTOTAL \$					55.000,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PCBO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	2,53	\$ 5.282,82
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,53	\$ 2.934,90
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,53	\$ 2.934,90
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	2,53	\$ 2.934,90
SUBTOTAL \$					14.087,53
TOTAL COSTO DIRECTO \$					198.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	10%	37.696,00			
IMPREVISTOS	1%	1.984,00			
UTILIDAD	5%	9.920,00			
SUBTOTAL \$					49.600,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					248.000,00
<p>Firma: </p> <p>Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES</p> <p>Representante Legal del Contratista o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.: 68202232916STD</p>					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
<p>APROBACIÓN POR INTERVENTORIA</p> <p>Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.</p> <p>Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de</p>					
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Representante Legal del Interventor o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.: _____</p>					

Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2		
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión 2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		13	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
FECHA			DD	MM	AA
			17	5	2023
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
13	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO	M2	344,40		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	997,57
SUBTOTAL \$					997,57
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO	
ASFALTO LIQUIDO	M3	0,10	\$ 68.511,00	\$ 6.851,10	
SUBTOTAL \$					6.851,10
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ² o Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	1,78	\$ 7.481,75
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.418,67	1,78	\$ 4.156,53
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.418,67	1,78	\$ 4.156,53
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,67	178%	\$ 7.418,67	1,78	\$ 4.156,53
SUBTOTAL \$					19.951,33
TOTAL COSTO DIRECTO \$					27.800,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	18%	5.282,00			
IMPREVISTOS	1%	278,00			
UTILIDAD	5%	1.390,00			
SUBTOTAL \$					6.950,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					34.750,00
Firma					
Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES					
Representante Legal del Contratista o su Apoderado					
Matrícula No.: 68202232918STD					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de					
Firma					
Nombre:					
Representante Legal del Interventor o su Apoderado					
Matrícula No.:					

<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL</p> <p>22001020 H4 DE 2022</p> <p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>				
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	14	DE	19

FECHA	DD	MM	AA
	17	5	2023

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
14	CONCRETO PARA PAVIMENTO DE CEMENTO Y AGREGADO DE 100% CUMPLIENDO CON NORMAS COLOMBIANAS DE 1994	M3	15.48

1. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	6.168,32
CARROTANQUE DE 1000 GALONES	N.A.	N.A.	\$ 6.500,00	0.22	39.008,04
COMPRESOR DE BARRIDO Y SOPLADO	N.A.	N.A.	\$ 101.500,00	0.22	465.777,06
SUBTOTAL C					512.952,32

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VT. UNITARIO
EMULSION ASFALTICA RC250 O SIMILAR	M3	1,02	\$ 758.511,00	\$ 773.681,22
			SUBTOTAL \$	773.681,22

TRANSPORTER

[illegible]

TV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/L UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	0,22	\$ 61.292,42
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,22	\$ 34.034,68
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,22	\$ 34.034,68
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,22	\$ 34.034,68
SUBTOTAL					\$ 163.366,46

TOTAL COSTO DIRECTO \$	1 450,000.00
------------------------	--------------

IV. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	19%	275,500.00
IMPREVISTOS	1%	14,500.00
UTILIDAD	5%	72,500.00
		SUBTOTAL \$ 362,500.00

Preço Unitário Total Aproximado al peso \$ 1.812.500,00

Firma _____
Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 68202232918STD

<p>OBSERVACIONES INTERVENTORA</p>
--

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo al mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matrícula No. : _____

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCVIL		22001020 H4 DE 2022		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
VERSIÓN		1			
PÁGINA		15	DE	16	
FECHA		DD	MM	AA	
		17	5	2023	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			ITEMS NO PREVISTOS		
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
15	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCVIL	M	32,80		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	3.357,14
SUBTOTAL \$					3.357,14
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SARDINEL PREFABRICADO X M 0,20X0,20	UN	1,00	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00	
MORTERO 1:5	M3	0,03	\$ 550.000,00	\$ 16.500,00	
SUBTOTAL \$					171.500,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ² o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	0,53	\$ 25.178,57
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.168,67	178%	\$ 7.418,67	0,53	\$ 13.988,09
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.168,67	178%	\$ 7.418,67	0,53	\$ 13.988,09
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.168,67	178%	\$ 7.418,67	0,53	\$ 13.988,09
SUBTOTAL \$					67.142,85
TOTAL COSTO DIRECTO \$					242.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACIÓN	19%	45.980,00			
IMPREVISTOS	1%	2.420,00			
UTILIDAD	5%	12.100,00			
SUBTOTAL \$					60.500,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					302.500,00
Firma					
Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES					
Representante Legal del Contratista o su Apoderado					
Matrícula No. : 68202232918STD					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de					
Firma					
Nombre:					
Representante Legal del Interventor o su Apoderado					
Matrícula No. :					

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1, del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL			
22001020 H4 DE 2022			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17 DE 19

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS	

FECHA			
DD	MM	AA	
17	5	2023	

DATOS ESPECÍFICOS			
-------------------	--	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
17	DOMINIO ENTREGA DE DOMINIO EN PAVIMENTO EN PAVIMENTO GALVANIZADO DE 2X2 CALIBRE 10 REQUERIDO EN PVC TIPO	M	185,80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	5.473,58
SUBTOTAL					5.473,58

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO
MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 CON RECUBRIMIENTO EN PVC COLOR TIPO BEZINAL	M2	1,00	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00
TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML	2,00	\$ 16.500,00	\$ 33.000,00
ANGULOS PLATINAS	UN	4,00	\$ 2.500,00	\$ 10.000,00
PINTURA ANTICORROSIVA	GL	0,10	\$ 250.000,00	\$ 25.000,00
SUBTOTAL				78.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PERO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	0,33	\$ 41.051,67
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,33	\$ 22.806,49
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,33	\$ 22.806,49
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.416,67	0,33	\$ 22.806,49
SUBTOTAL					109.471,13

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 193.444,88

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	10%	36.754,49
IMPREVISTOS	1%	1.934,45
UTILIDAD	5%	9.672,23
SUBTOTAL		48.361,17

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 241.806,88

Firma

Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 68202232918STD

OBSERVACIONES INTERVENTORIA


APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN		1	
22001020 H4 DE 2022		PÁGINA		17	DE 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS		FECHA	
				DD	MM
				17	5
				AA	2023
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
17	MORTERO PARA TRABAJO DE REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN EN INOCULTE. CEMENTO Y COLOCACIÓN.	M	32,80		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VL. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	377,89
MEZCLADORA	N.A.	N.A.	\$ 25.000,00	4,71	5.308,89
SUBTOTAL \$					5.686,89
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VL. UNITARIO	
MORTERO 1:4	M3	0,05	\$ 10.500,00	\$ 525,00	
SUBTOTAL \$					525,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	VL. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	4,71	\$ 2.834,95
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	4,71	\$ 1.574,97
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	4,71	\$ 1.574,97
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.186,87	178%	\$ 7.416,87	4,71	\$ 1.574,97
SUBTOTAL \$					7.559,86
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 13.771,75					
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	19%	2.816,63			
IMPREVISTOS	1%	137,72			
UTILIDAD	5%	688,58			
SUBTOTAL \$					3.442,94
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 17.214,69					
<p>Firma: </p> <p>Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES</p> <p>Representante Legal del Contratista o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.: 68202232918STD</p>					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
<p>APROBACIÓN POR INTERVENTORIA</p> <p>Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.</p> <p>Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de</p>					
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Representante Legal del Interventor o su Apoderado</p> <p>Matrícula No.: _____</p>					

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 6.1. del Documento Base)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL		VERSIÓN			
22001020 H4 DE 2022		1			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	17	DE	19
FECHA		DD	MM	AA	
		17	5	2023	
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
17	ADQUISICIÓN DE UN UNIFORME TECNICO DE DOMINIO T. COLOCACIÓN	M	98,40		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.	N.A.	5%	14,09
SUBTOTAL \$					14,09
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO	
ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5	ML	1,00	\$ 750,00	\$ 750,00	
SOPORTE EN VARILLA	UN	0,50	\$ 250,00	\$ 125,00	
SUBTOTAL \$					875,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	V. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA	\$ 7.500,00	178%	\$ 13.350,00	126,32	\$ 105,68
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.418,67	126,32	\$ 58,71
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.418,67	126,32	\$ 58,71
AUXILIAR DE OBRA	\$ 4.166,67	178%	\$ 7.418,67	126,32	\$ 58,71
SUBTOTAL \$					281,82
TOTAL COSTO DIRECTO \$					1.170,91
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	19%	222,47			
IMPREVISTOS	1%	11,71			
UTILIDAD	5%	58,55			
SUBTOTAL \$					292,73
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					1.463,64
Firma					
Nombre: JORGE LUIS GONZALEZ REYES					
Representante Legal del Contratista o su Apoderado					
Matrícula No. : 68202232918STD					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a Items de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada Item, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de Items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada Item no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el					
Firma					
Nombre:					
Representante Legal del Interventor o su Apoderado					
Matrícula No. :					

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 3612	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO
VALOR	\$372.100.090
CDP	12122 DEL 28/03/2022 -31622 27/09/2022
RP	26222 DE 08/06/2022 – 48322 29/09/2022
PLAZO	HASTA EL 15/01/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	22/09/2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ

En la ciudad de Villavicencio, a los Dieciséis (16) días del mes de Enero de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto Vanguardia JORGE LUIS GONZALEZ REYES , actuando como Representante Legal de la empresa ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S, identificada con Numero de Nit 901389503-1, obrando en calidad de contratista; y la doctora LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.393.810 de Villavicencio, supervisor designada por la entidad, con el fin de recibir la ejecución total del contrato y liquidación del mismo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 3612	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

14 DE JUNIO DE 2022

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

\$183.762.301

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

15 DE ENERO DE 2023

ACTA DE RECIBO FINAL

15 DE ENERO DE 2023

SANCIONES

N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 3612	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL CERO NOVENTA PESOS MCTE
 (\$372.100.090)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
 TRESCIENTOS UN PESOS MCTE
 (\$ 183.762.301)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE
 (\$ 555.862.391)

FORMA DE PAGO:

Se pagará la totalidad de contrato a la entrega y recibo a satisfacción del servicio prestado, bien adquirido o producto, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor designado

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO FINAL

15/01/2023

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 3612	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: (\$399.143.552,67) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

VALOR PENDIENTE DE PAGO: (\$156.718.838,33) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$372.100.090
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$183.762.301
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$555.862.391

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	554.241.130,78
VALOR NO EJECUTADO	\$	1.621.260,22

VALOR PAGADO	\$	399.143.552,67
VALOR DESCUENTOS	\$	0
VALOR PENDIENTE PAGO	\$	155.097.578,11
SALDO A FAVOR ENTIDAD	\$	1.621.260,22

TOTALES	\$555.862.391	\$555.862.391	\$555.862.391
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.


CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 3612	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

1. N/A.

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.



ÍCONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
CONTRATISTA
JORGE LUIS GONZALES REYES
Representante Legal



LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisora



Vo.Bo _____
 Vo. Bo. **DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ**
DIRECTOR REGIONAL META
