 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	<i>Grupo Mantenimiento</i> <i>ATSEP DRCS</i>	PROCESO:	<i>CONTRATO 25000809 H3 2025</i>		
TEMA DE LA REUNIÓN:	<i>ACTUALIZACION CRONOGRAMA ACTIVIDADES SEDES GUAYMARAL-NEIVA Y LETICIA Y PRECISION CON ENTREGA FIRMA INDRA TORRE VHF</i>				
LUGAR:	<i>CGAC- VIRTUAL TEAMS</i>				
FECHA:	<i>16/09/2025</i>	HORA INICIO:	<i>14:00 PM</i>	HORA FINAL:	<i>15:00 PM</i>

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Actualizar el cronograma de actividades en la ejecución del contrato “**ADQUIRIR INSTALAR Y PONER EN SERVICIO LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RADIOS TX Y RX DE LA SERIE EU4200 Y SU4200 PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA Y GUAYMARAL**”

Relacionar y establecer la prórroga del contrato debido a los problemas que surgen en la entrega de la estación radar de Leticia debido al contrato en ejecución de instalación del radar.

Establecer la entrega de la torre que soportará las Antenas de VHF, de común acuerdo con supervisor del contrato del radar de Leticia, el contratista INDRA y el personal técnico de la estación Leticia

III. AGENDA:

Orden del Día:

- Verificación del estado y los avances del aeropuerto de Guaymaral.
- Establecer en el cronograma el desarrollo de las actividades de los aeropuertos de Neiva y Leticia, teniendo en cuenta las visitas efectuadas por los supervisores del contrato en la semana del 8 al 12 de septiembre.
- Establecer la solicitud de prórroga para este contrato debido a demoras en la entrega de la estación radar de Leticia por la instalación del radar.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA

Clave: ESTR-3.0-12-005

Versión: 5


Fecha de aprobación: 01/04/2022

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- Estado avances actividad contrato manto VHF Base Guaymaral


El Ing. Walter Rodriguez en calidad de contratista, efectúa la descripción de las tareas que se prevén para la consecución de los trabajos e indica que se dan continuidad con la implementación y restablecimiento de:

- Adecuación de Patch panel en áreas de alambrado con sistema VHF instalados en la sala de equipos ubicados en la administración y torre de control.
- Adecuación de acometidas de alimentación en DC para equipos VHF instalados en sala técnica de equipos de la torre (sw atn-Mux rad-VHF).
- Adecuación de la fibra óptica reubicación ODF radar- atn.
- Actualización al licenciamiento de los radios VHF Tx y Rx en VoIP
- Reubicación de los radios programados con las frecuencias 129.30 MHz Y 129.55 MHz instalados en la sala de equipos de la torre de control.
- Reinstalación de la antena látigo, del radio variable VHF ubicada en la terraza de la torre de control.
- Actualización del cronograma de actividades Bases Neiva y Leticia.

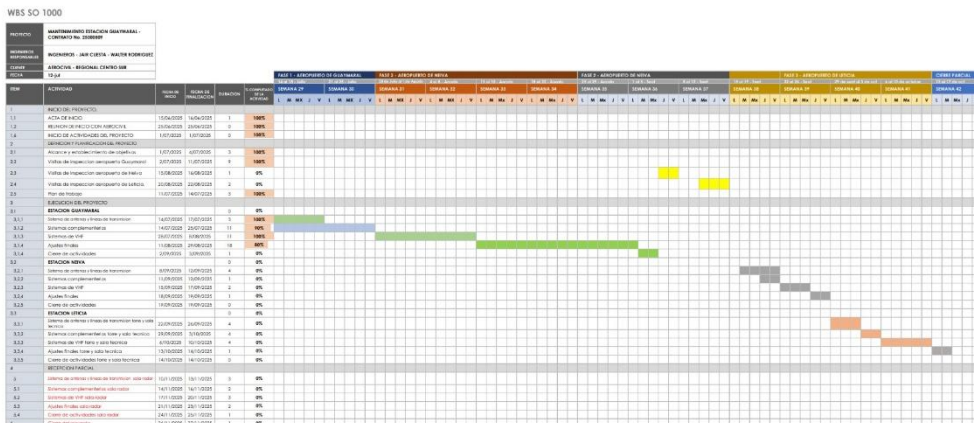

Se realiza el ajuste al cronograma así:

- GUAYMARAL – del 18 al 30 septiembre de 2025, para dar continuidad y entrega de los trabajos programados.
- Se solicita apoyo del técnico para la instalación de la fibra óptica por parte de Aerocivil, para la adecuación de los equipos ubicados en la Torre de control, y se programaría el inicio de esta actividad el día 18 de septiembre a cargo del funcionario Fredy Ortiz.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

- NEIVA- del 17 AL 26 septiembre se iniciarían las actividades.
- LETICIA – Se relaciona propuesta de la ejecución de actividades en esta sede, debido a las demoras presentadas por parte del contrato de instalación del radar de Leticia:

Fase 1 : Torre de Control y Sala Técnica: 1 al 14 de octubre

Fase 2: Torre de Radar y Sala Radar: 10 al 24 de noviembre

El desarrollo de la fase 1 estará sujeta a la entrega de la torre auto soportada, instalada en el sitio indicado al contratista INDRA. La entrega estaría prevista para el día 26 de septiembre. El Ing. Henry Cordoba supervisor del contrato, solicita se realice una reunión con el Ing Mario Rosas y el personal ATSEP de la estación de Leticia, para precisar la entrega de la torre auto soportada.

Se realiza llamada con el Ing Mario Rosas vía WhatsApp, estableciendo, además, contacto con Tatiana Torres de la firma INDRA, Julio Sandoval y Bruno Sinisterra personal técnico de la estación de Leticia, llegando a un acuerdo en la Instalación de PLACA CIMENTADA en zona de antenas para ANTENA VSAT y CIMENTACION de Torre Auto soportada que será reubicada en el área de Antenas para el VHF.


Se requiere la entrega a INDRA del HERRAJE para el montaje de la Antena VSAT, por parte del contratista Rohde & Schwartz Ing. Walter Rodriguez.

- Reporte necesidad prorroga vigencia Contrato

Teniendo en cuenta la ejecución vigente del contrato cuyo vencimiento sería el próximo 16 de octubre, se requiere que se efectúe una PRORROGA para finalizar este contrato para el próximo 15 de diciembre de 2025, debido a motivos ajenos en ejecución actual. Esta solicitud sería elevada al área jurídica de la regional centro sur para la respectiva aprobación y trámite.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):


No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Reunión Aerocivil supervisor INDRA , Contratista INDRA y ATSEP Leticia - Precisar instalación torre autor soportada VHF área Antenas Terminal Leticia	William Fonseca	18 Septiembre 2025
2	Solicitud Prorroga del contrato Vigencia al 15 de diciembre de 2025	Supervisores Wilfredo Leon Henry Cordoba	24 Septiembre 2025

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

3	Verificación y Aprobación Cronograma actualizado de labores en contrato	Supervisores Wilfredo Leon Henry Cordoba	19 Septiembre 2025
----------	---	--	--------------------

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 16 días del mes de septiembre del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
HENRY ANDRES CORDOBA	COORDINADOR MANTENIMIENTO DRCS Y SUPERVISOR CONTRATO	
WILFREDO LEON MONTERO	APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO	
WILLIAM ORLANDO FONSECA	LIDER GRUPO COMUNICACIONES DRCS	
WALTER RODRIGUEZ	ING CONTRATISTA FIRMA RODHE & SCHWARZ	
