

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número __1__	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.601-2025	
Nombre del contratista: ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: 901370333-2	
Nombre (s) del supervisor (es): Nicolas Suarez Vallejo – Subsecretaria para el Manejo de Desastres - Secretario de Despacho encargado.	
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	No. Teléfono: 6533801 - 8899832
Objeto de la Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.601-2025: Adquirir e instalar sensor de nivel de río tipo radar para integrarlo al Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias, ampliando la preparación para la respuesta a emergencias en Santiago de Cali.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
27/OCT/2025	27/DIC/2025
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$24.348.000) M/CTE. incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos.	
Adición: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 24.348.000	\$ 24.348.000	\$0	\$0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de diciembre de 2025 expedida por la señora ALEXANDRA CORREA CAMACHO identificada con la cédula de ciudadanía número 1.233.891.832 y portadora de la tarjeta profesional 339189-T expedida por la Junta Central de Contadores y en calidad de contadora de la empresa, donde certifica que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden al Sistema de Seguridad Social y salarios, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar desde los últimos seis (6) meses a la fecha.

PERSONA JURIDICA:

Datos Certificación o Planilla de Pago

No. Planilla: 9495750195

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1971048398

Operador: Aportes en línea

Fecha de Pago: 01 de diciembre de 2025

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Para Pensiones: Noviembre de 2025

Para Salud: Diciembre de 2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



Ecologic Ingeniería S.A.S.
NIT 901370333-2



Bogotá, Colombia, 05 de Diciembre de 2025

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICADO

Que **ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.**, con NIT 901.370.333-2

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y salarios, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar desde los últimos seis meses a la fecha.

Dado en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de Diciembre de 2025.

Actuando en calidad de:


Alexandra Correa Camacho
Contadora Pública
TP 339189-T

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	di	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico NENA e COP	
NIT 901370333-2	2	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	8 - MUNICIPIO DE SAN GILBERTO	ECOLOGIC	TP 224 519 - 44	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	7141818	10	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Depto. Mora	Valor			
2025-11	1001-11	11744488	2025-11-09	2025-11-09	FRANCO SANTANDER	\$1,462,300			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	COGISO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	\$6,842,200	\$0	\$0	\$6,842,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
COMPENSO	25-14	900,336,004	7	3	\$1,111,600	\$0	\$0	\$1,111,600	
COMPRENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,823,900	\$0	\$0	\$2,823,900	
PROTECCION	230301	800,229,739	0	5	\$2,236,700	\$0	\$0	\$2,236,700	
AFIL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$2,890,100	\$0	\$0	\$2,890,100	
COLMENA	14-25	800,228,175	3	21	\$1,840,700	\$0	\$0	\$1,840,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,840,700	\$0	\$0	\$1,840,700	
COMPRENIR	CCF24	800,206,942	7	21	\$1,840,700	\$0	\$0	\$1,840,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				21	\$1,840,700	\$0	\$0	\$1,840,700	
COMPRENIR	EP5008	800,206,942	7	4	\$980,300	\$0	\$0	\$980,300	
FAMISANAR	EP5017	800,203,364	7	3	\$224,400	\$0	\$0	\$224,400	
NUOVA E.P.S.	EP5037	800,196,284	2	5	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	800,196,284	2	2	\$70,300	\$0	\$0	\$70,300	
SALUD TOTAL	EP5002	800,190,907	4	1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	6	\$444,900	\$0	\$0	\$444,900	
TOTAL				21	\$12,853,700	\$0	\$0	\$12,853,700	

Página 2 de 2

2025/12/01 09:58 AM

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4163.001.26.1.601-2025 y que a continuación se describen:

NOTA: Cada información gestionada en este informe, fue validada a través de la Plataforma SECOP II No. Proceso 4163.001.32.1.601-2025

Vigilancia Técnica de la Supervisión:

A continuación, se describen cada una de las obligaciones supervisadas con sus respectivas evidencias:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

- Participar en todos los espacios de reunión que se convoquen y que tengan relación con la ejecución del contrato en cuestión.

El día 04 de noviembre se realizó la reunión de planeación para definir temas de instalación del equipo. Esta actividad se soporta bajo el acta de reunión No. 4163.020.14.12.12, cuyo objetivo fue Desarrollar reunión de seguimiento al proceso contractual No.4163.001.32.1.601-2025, donde como conclusión se define la instalación de equipos para el día 4 de diciembre.

- Visita técnica al lugar donde se realizará la instalación del equipo.

El día 11 de noviembre el contratista realizó recorrido de campo para visitar el lugar donde se evalúa la posibilidad de instalación del sensor de nivel, actividad que está soportada bajo el acta No. 4163.020.14.12.13 del día 12 de noviembre.

En esta jornada se visitó la Estación de Monitoreo en Pueblo Pance, Corregimiento de Pance, con coordenadas: Latitud 3.329980, Longitud -76.634754.

- Cronograma de actividades, y si es el caso ajustar de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría.

El contratista dio cumplimiento a la obligación correspondiente, aportando el respectivo cronograma de actividades. Se precisa que dicho cronograma fue remitido a la Secretaría el día cinco (5) de noviembre de 2025, vía correo electrónico, desde la cuenta jhony.c@ecologicingenieria.com, a las direcciones electrónicas del supervisor del contrato y de los apoyos técnicos. Como se observa a continuación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002

Jhony Cifuentes <jhony.c@ecologicingenieria.com>

para Camilo, Hernan, Oscar, Gustavo, Nicolas, mí, Juan, carlos.arellano.sgr ▾

Buenas tardes, estimado Gustavo!

Cordial saludo,

En archivo adjunto remito lo solicitado. La visita técnica se realizará en la semana del 10 al 14 de noviembre.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Saludos!

--

Cordialmente | Kind Regards

ING. JHONY SEBASTIAN CIFUENTES CIFUENTES

Ingeniero de Proyectos y Ventas | Project and Sales Engineer

Ecologic Ingeniería | Colombia

+57 316 018 3570

jhony.c@ecologicingenieria.com

www.ecologicingenieria.com

TV 22A # 59 - 44 Primer Piso


[Contactar via WhatsApp](#)

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

PY | CONTRATO No. 4163.001.32.1.601-2025

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Duración	Estado	Predecesor
		10/27/2025	36d		
1	☐ Acto administrativo	10/27/2025	3d		
1.1	Firma y legalización del contrato	10/27/2025	3d	● En progreso	
2	Compras Internacionales	10/30/2025	30d	● En progreso	1
3	Visita Técnica	11/10/2025	5d	● Abierto	
4	Instalación	12/04/2025	2d	● Abierto	2, 3
5	Entrega Final	12/06/2025	1d	● Abierto	4

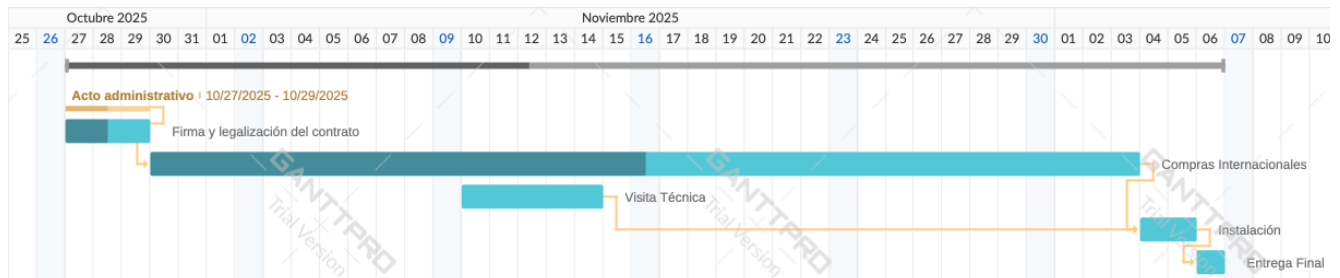


- Adquirir, instalar y poner en operación sensor de nivel – tipo radar, de alta precisión que incluya: tecnología radar FMCW de banda V no menor de 60 GHz, con detección mínima de 08 metros de distancia, compatible con datalogger Iris270, funcionamiento de bajo consumo, configuración wifi, precisión de +/- 3 mm, rango IP68, interfaces de datos: SDI-12 o Modbus y el cable que se pueda requerir.


La instalación de los equipos se realizó en el día 4 de diciembre de 2025, como se soporta en el acta de reunión No. 4163.001.26.1.41, cuyo objetivo fue: Desarrollar visita de campo para verificar y recibir la instalación del equipo en el marco de la ejecución del contrato No.4163.001.32.1. 601 - 2025. Los resultados del recorrido se resumen en la siguiente tabla:

Lugar	Coordenadas	Estado	Fotografía
-------	-------------	--------	------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

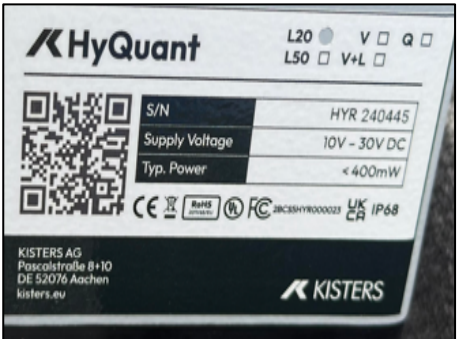Estación de Monitoreo en Pueblo Pance, Corregimiento de Pance.	Latitud 3.329980, Longitud 76.634754	-	Equipo instalado, operando, cumple con lo establecido en el contrato	
Estación de Monitoreo en Pueblo Pance, Corregimiento de Pance.	Latitud 3.329980, Longitud 76.634754	-	Equipo instalado, operando, cumple con lo establecido en el contrato	
Estación de Monitoreo en Pueblo Pance, Corregimiento de Pance.	Latitud 3.329980, Longitud 76.634754	-	Equipo instalado, operando, cumple con lo establecido en el contrato	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002

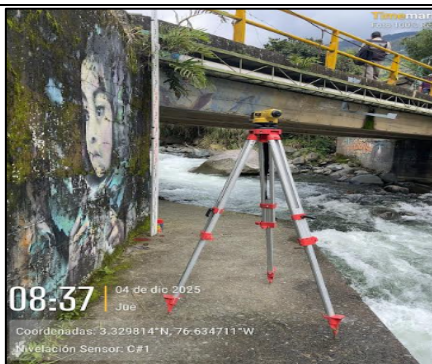

Registro fotográfico de calibración y transmisión de datos– Tomada el día 04/12/2025. Por el apoyo técnico de la supervisión

✓ TRANSMISIÓN DE DATOS

- Realizar las pruebas necesarias para calibrar y afinar el óptimo funcionamiento del equipo y transmisión de datos.

Las actividades ejecutadas por el contratista y verificadas por parte del apoyo técnico de la supervisión, se relacionan a continuación:

✓ Calibración del Sensor (Ajuste del "Punto Cero" o Referencia):

Acción: se utilizó valor topográfico (cota absoluta) para configurar el nivel de referencia interno del sensor.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Prueba: Al ingresar este dato en el software HyComm, se calibró la relación entre la distancia medida por el radar y el valor de nivel de agua en una escala de elevación real (metros sobre el nivel del mar). Calibración fundamental para que el dato sea válido y útil hidrológicamente.

✓ **Afinamiento del Funcionamiento del Equipo (Configuración y Verificación):**

Acción: Verificar orientación, alineación y parámetros del sensor (como se ve en la Imagen 1 del informe con los ángulos X/Y y la calidad de señal).

Prueba: Se configuraron los parámetros y se verificó la orientación. La captura de pantalla de HyComm muestra el monitoreo en tiempo real de la calidad de la señal (Nivel SNR: -44 dB), la distancia y los ángulos, lo que demuestra un proceso de afinamiento para optimizar la lectura.


✓ **Prueba de Transmisión de Datos (Comunicación y Verificación Final):**

Acción: Configurar la comunicación SDI-12 en el datalogger IRIS 270 y verificar que las lecturas reportadas fueran coherentes.


Prueba: Se efectuó la configuración en el IRIS 270, habilitando la nueva variable (nivel) verificando la comunicación SDI-12 y confirmando que las lecturas reportadas fueran coherentes con la altura tomada por el topógrafo. Lo anterior permitió verificar que el sistema completo (sensor + transmisión + datalogger) funciona y entrega datos correctos.

Imagen No 1. Dato de altura sensor, lectura del radar y nivel calculado.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	002

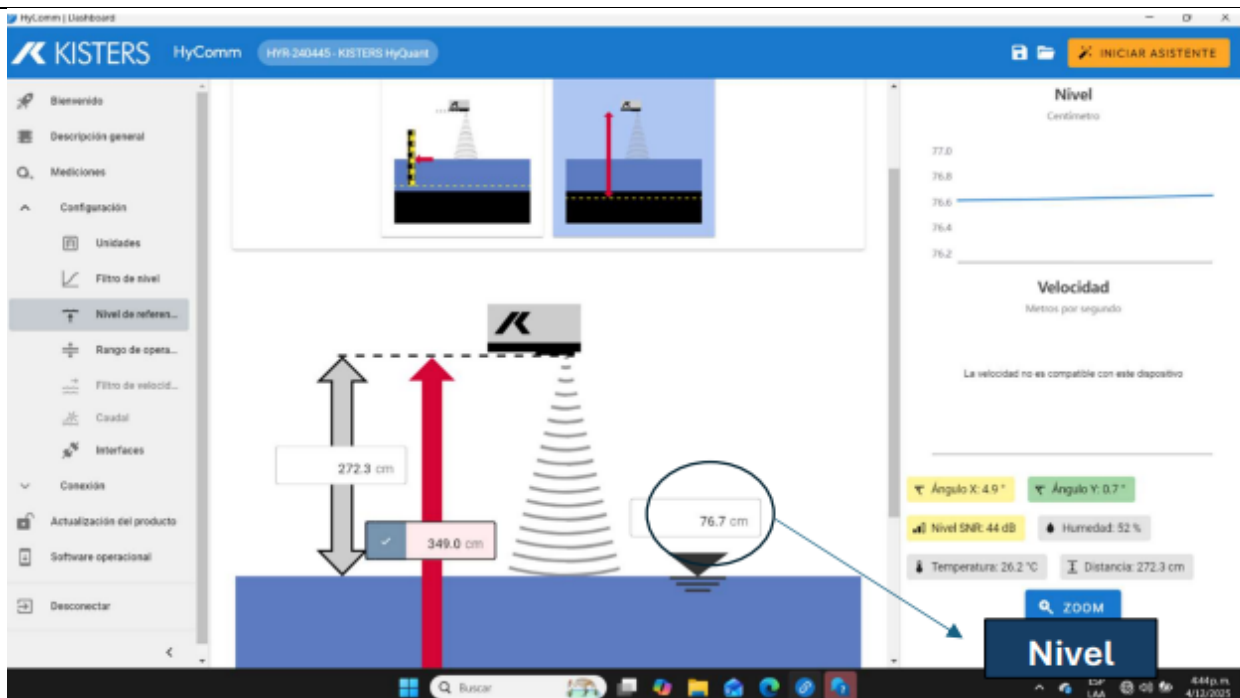

Fuente: Informe técnico de ejecución presentado por el contratista.

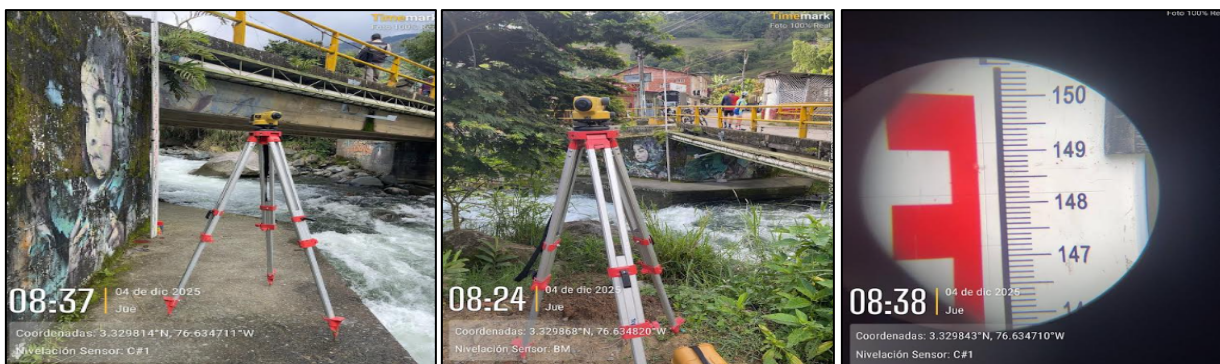

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

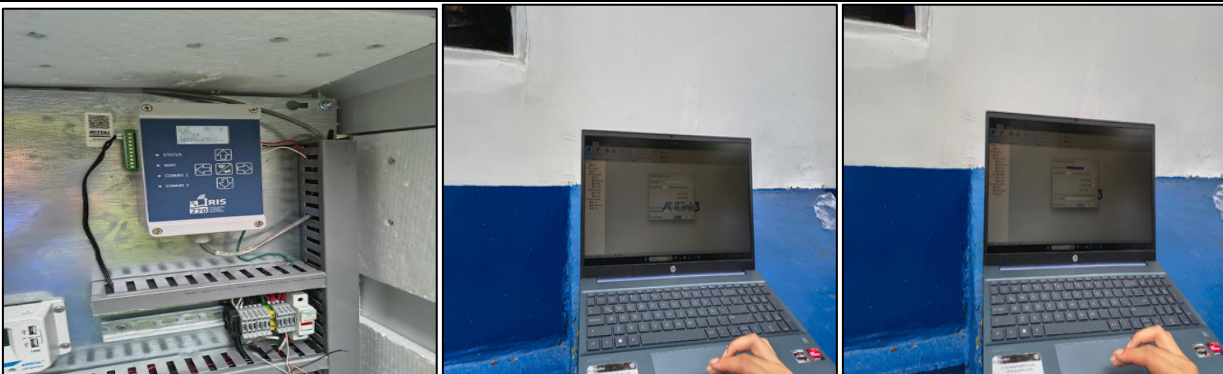

Registro fotográfico de calibración y transmisión de datos– Tomada el día 04/12/2025. Por el apoyo técnico de la supervisión

- Las características técnicas del producto descrito se deben poder verificar en el manual o ficha técnica del equipo que deberá ser entregado por parte del contratista en medio físico y magnético (pdf). Al igual que manual de operación, funcionamiento, mantenimiento y programación.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003
	VERSIÓN	002



Sensor de Radar de Nivel de Agua

Nivel del Agua | Hidrología

Descripción General

HyQuant L es uno de los sensores de radar sin contacto más versátiles y fiables que se adaptan a las condiciones de monitoreo locales para proporcionar datos precisos y estables, sea cual sea la aplicación.

Adecuado para aplicaciones en cuerpos de agua abiertos, se encuentra disponible en dos rangos de medición para el monitoreo de nivel de agua:

- HyQuant L20: 0.1 m - 20 m
- HyQuant L50: 0.15 m - 50 m

Sus rangos de medición seleccionados, su fiabilidad probada en campo, su electrónica de radar de primer nivel, su robusta carcasa con adaptador flexible y su software de configuración con filtros ajustables, hacen del HyQuant L una solución de detección de nivel de agua ideal para diversos escenarios de monitoreo.

Diáfano de costos operativos reducidos: excelente relación precio-rendimiento, funcionamiento estable con fácil instalación y cero mantenimientos.

Aplicaciones

- Hidrología y gestión de agua superficial en ríos, arroyos, canales abiertos, lagos, embalses, vías navegables, pozos reguladores.
- Gestión de riesgos: alertas tempranas y prevención, inundación, cuencas de retención de lluvias.
- Agricultura: riego, estaciones de bombeo
- Aplicaciones industriales: Energía hidráulica, minería
- Investigación

Características Principales

Mediciones confiables e integridad del equipo también en inundaciones:

- Pt88, carcasa robusta, resistente a la intemperie

Alta resolución y precisión en todo el rango de medición:

- Independiente del entorno, condiciones de instalación y del sitio.
- Filtros fáciles de usar y configurar para adaptación a las condiciones locales y garantizar la calidad de los datos.

Mayor flexibilidad en el despliegue:

- Diseño ligero y pequeño permite una amplia gama de aplicaciones.
- Soporte de montaje inclinable (eje vertical) y giratorio (eje horizontal) incluido.
- Gineceo integrado facilita correcta alineación con la superficie del agua, para óptima calidad de datos.
- Fácil instalación en diversas estructuras (puentes, brazos, estabilizadores, otras)
- Bajo consumo de energía y diseño discreto enfundado para aplicaciones remotas y urbanas.
- Configuración flexible con ajuste del punto de referencia para datos reales del nivel.

El ángulo del haz de 8° x 8° genera un punto claramente definido en la superficie del agua, para medir adecuadamente cuerpos de agua anchos y estrechos.

Integración, comunicación & configuración sencillas

- Conexión Wi-Fi, SDI-12, Modbus y PC
- Adaptador de interfaz o ajuste por Wi-Fi y PC a través del software HyComm con controles visuales y con mouse.
- Actualización de firmware automática
- Unidades imperiales y métricas





Especificaciones Técnicas

Tipo de radar/Frecuencia de banda	FMCW 60 GHz Banda V Sensor de Radar de Nivel
Rango de medición	HyQuant L20: 0.1 ... 20 m HyQuant L50: 0.15 ... 50 m
Tasa de salida	1 Hz (1 medición/segundo)
Precisión	±2 mm
Resolución	1 mm
Tensión de alimentación (rango)	10 ... 30 VDC
Consumo de energía a 12 V	Típico < 15 mA, con Wi-Fi activado < 80 mA
Ángulo del haz	8° x 8° (acimut por elevación)
Protección contra penetración	IP68
Comunicación e interfaces	SDI-12, Modbus, Wi-Fi
Temperatura de funcionamiento	-40° ... +80 °C
Rango de humedad	0 ... 100 % HR sin condensación
Dimensiones y peso	HyQuant con placa posterior: LxWxH: 160 x 97x 91 mm, 135 kg Dimensiones del embalaje: LxWxH: 300 x 300 x 187 mm, 2.5 kg
Conector de señal	M12 8-Pin
Materiales	Carcasa: aluminio con pintura electrostática y panel frontal/radoma HDPE
Alcance de suministro	HyQuant L, soporte de montaje, cable de 10 m, Tornx
Conformidad	CE, FCC Clase B, UL, RoHS, información adicional disponible en la página web

Accesorios

IRIS 270 y UnderCover: Registradores de datos de KISTERS con interface SDI-12.

Adaptador de SDI-12 a USB

Estructura del brazo/dispensador en función de las diferentes condiciones del sitio.

Soporte de montaje en poste: soporte de montaje en poste opcional para diámetros de poste de 20 mm a 60 mm.

[Solicite más detalles.](#)





Distritales

KISTERS Latino América | latam@kisters-lotam.com | kisters-lotam.com | kisters.es
KISTERS Iberica | info@kisters.es | kisters.es




- Realizar las acciones necesarias para que el sensor de nivel transmita los datos al datalogger Iris.

Posterior a la instalación del sensor de nivel en la estación hidrológica del Río Pance, se verifico la transmisión del sensor de nivel al datalogger de la estación, el cual se encuentra funcionando correctamente.

Verificación de transmisión al datalogger:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

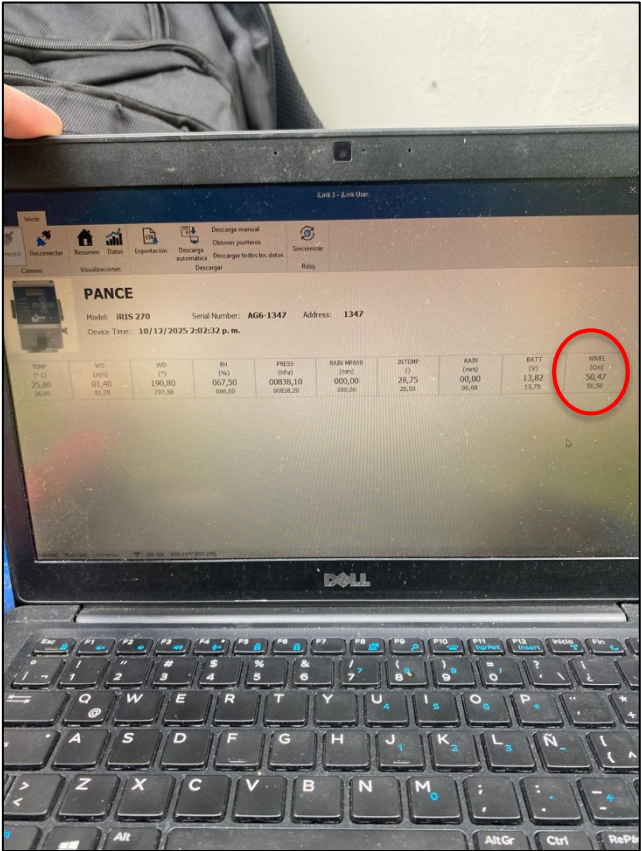

Verificación manual del nivel:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



Vigilancia Jurídica de la Supervisión

Los Supervisores verificaron el cumplimiento de los aspectos legales y se realizaron las coordinaciones tendientes a minimizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución del Contrato.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con el contrato de oferta, así:

- Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento.

En el transcurso del presente proceso contractual no se identificaron situaciones donde el equipo tuviese que informar al Ordenador del Gasto, que pudiesen afectar el cumplimiento del objeto contractual, o incumplimientos a las especificaciones de los requisitos exigibles.

- Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias.

Durante la ejecución del presente contrato, no se presentaron situaciones que justificaran la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o cualquier otra modificación contractual.

- Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento.

Dando cumplimiento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgo del proceso de contratación pública y matriz de riesgo del presente contrato, no se evidenció materialización de alguno de los riesgos que den paso a corrupción en el presente contrato, por lo contrario, se ha realizado seguimiento, control y manejo a las situaciones presentadas, sin salirse de los parámetros establecidos y sin afectar la operatividad del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, con los soportes correspondientes.

Dado a la publicación realizada en los tiempos establecidos de la ejecución contractual en el SECOP II, el proceso ha mostrado y dejado evidencia de la transparencia aplicada, según Ley 1712 / 2014 – Ley Transparencia y acceso a la información pública, fortaleciendo de esta manera la imagen del servidor público y el buen servicio que este ofrece (políticas de calidad), frente a la importancia y evaluación de necesidades de la comunidad.

- Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, incluidas las garantías contractuales.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Se realiza el cumplimiento de los requisitos expuestos en los estudios previos y Contrato, dejando evidencia de situaciones puntuales tratadas en el presente contrato, cuyo registro de seguimiento y control, muestra la transparencia con que se ha tomado decisiones, a su vez, que se cuenta con la siguiente documentación:

- Póliza – Seguros del estado

 NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES VA REGIMEN COMÚN AUTOPREVEDORES		Código de Seguridad: UFZPMdhw4HGDcZx1c/SW==		COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2000000059-0001	
No. PÓLIZA NB-100408243	No. ANEXO 3	No. CERTIFICADO 72680848	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/11/2025	SUC. EXPEDIDORA BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 27/10/2025	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 27/12/2028	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A	
TOMADOR ECOLOGIC INGENIERIA SAS			No. DOC. IDENTIDAD 901.370.333-2		
DIRECCIÓN CL 9 C BIS 68 G 29 TO 5 OF 303 EN BOGOTÁ.			TELÉFONO 3166585191		
ASEGURADO DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y			No. DOC. IDENTIDAD 890.399.011-3		
DIRECCIÓN AV 2 NTE # 10 - 70 SANTIAGO DE CALI			TELÉFONO 6533801		
BENEFICIARIO DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y			No. DOC. IDENTIDAD 890.399.011-3		
DIRECCIÓN AV 2 NTE # 10 - 70 SANTIAGO DE CALI			TELÉFONO 6533801		
OBJETO DE CONTRATO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL CONTRATO (ACEPTACION DE OFERTA) ES 4163.001.26.1.601-2025. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4163.001.32.1.601-2025, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR E INSTALAR SENSOR DE NIVEL DE RÍO TIPO RADAR PARA INTEGRARLO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS INTELIGENTES Y COMUNITARIAS, AMPLIANDO LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI, SEGÚN FICHA EBI - BP26005482. ASEGURADO/BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NIT: 890399011-3					
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS	
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 27/12/2026	2.434.800,00	0,00	
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 27/12/2028	1.217.400,00	0,00	
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 27/12/2026	2.434.800,00	0,00	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 27/12/2026	2.434.800,00	0,00	
TOTAL ASEGURADO			\$ 8.521.800,00		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



NIT 860.037.013-6
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XecF1qN30e1S1BFXL054xg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 12 Y 3 - BOGOTÁ
 TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

 ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
 VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR00000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100107458	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72680879	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del		27/10/2025		24:00 Horas Del	27/12/2025	N/A		
					N/A	N/A		
TOMADOR	ECOLOGIC INGENIERIA SAS						No. DOC. IDENTIDAD	901.370.333-2
DIRECCIÓN	CL 9 C BIS 68 G 29 TO 5 OF 303 EN BOGOTÁ.						TELÉFONO	3166585191
ASEGURADO	ECOLOGIC INGENIERIA SAS						No. DOC. IDENTIDAD	901.370.333-2
DIRECCIÓN	CL 9 C BIS 68 G 29 TO 5 OF 303 EN BOGOTÁ.						TELÉFONO	3166585191
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS						No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN							TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL CONTRATO (ACEPTACION DE OFERTA) ES 4163.001.26.1.601-2025. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4163.001.32.1.601-2025 , CUYO OBJETO ES ADQUIRIR E INSTALAR SENSOR DE NIVEL DE RÍO TIPO RADAR PARA INTEGRARLO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS INTELIGENTES Y COMUNITARIAS, AMPLIANDO LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI, SEGÚN FICHA EBI - BP26005482.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 284.700.000,00	

- Verificación de la póliza

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

MODULO DE CLIENTE

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT
☒ Cumplimiento
☐ Judiciales
☐ Arrendamiento
☐ Otros Ramos

Certificado No.

72680879


El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

Consultar

Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	XecF1qN30eISIBFXLD54xg==	Número de anexo	5
Número de póliza	100107458	Fecha de expedición	25/11/2025
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fin de vigencia Global	27/12/2025
Inicio de vigencia Global	27/10/2025	Valor asegurado	284.700.000,00
Tomador	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Asegurado	ECOLOGIC INGENIERIA SAS		

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4163.001.32.1.601-2025 , CUYO OBJETO ES ADQUIRIR E INSTALAR SENSOR DE NIVEL DE RÍO TIPO RADAR PARA INTEGRARLO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS INTELIGENTES Y COMUNITARIAS, AMPLIANDO LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI, SEGÚN FICHA EBI - BP26005482.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES) COMO ASEGURADO ADICIONAL. SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2025	\$ 284.700.000,00	\$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2025	\$ 284.700.000,00	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2025	\$ 284.700.000,00	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2025	\$ 284.700.000,00	\$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 18 de 25

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.
72680848

 El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot
 reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Servicio. [Términos y Condiciones](#)
 reCAPTCHA
 Privacidad • Configuración

[Consultar](#) [Regresar](#)

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	UFZPMdhw4hHGdBCzxc/sw==		
Número de póliza	100408243	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	25/11/2025
Inicio de vigencia Global	27/10/2025	Fin de vigencia Global	27/12/2028
Tomador	ECOLOGIC INGENIERIA SAS		
Asegurado	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTION DEL	Valor asegurado	8.521.800,00
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

EN SANTIAGO DE CALI, SEGUN FICHA EBI - BP26005482.

Objeto de póliza
 ASEGURADO/BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NIT: 890399011-3
 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL CONTRATO (ACEPTACION DE OFERTA) ES 4163.001.26.1.601-2025. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

Amparos				Suma Asegurada	Valor Prima
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta			
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2026		\$ 2.424.800,00	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2028		\$ 1.217.400,00	\$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2026		\$ 2.424.800,00	\$ 0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 27/12/2026		\$ 2.424.800,00	\$ 0,00

[Imprimir](#)

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
 Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

- Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.

Se tuvo en cuenta que el documento de la póliza cubriera según el tiempo establecido de duración del contrato hasta el **16 de diciembre de 2025**, lo cual se cumple siendo que la póliza de cumplimiento del contrato cumple con los términos requeridos respectivamente

Vigilancia Financiera, Presupuestal y Contable

Se verificó dentro la ejecución contractual, que el presente proceso contará con su respectivo Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) y la planeación de los desembolsos previstos, validando en el SECOP II, la publicación realizada por el equipo de contratación pública de la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres evidenciando la publicación del RPC

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "CDP" 3600011916	10 de septiembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO "RPC" 4500388217	27 de Octubre de 2025

CDP: 3600011916, Contabilizado el 10 de septiembre de 2025, por valor de \$28.738.737 respectivamente en los cuales se evidencia la aprobación por parte del Ordenador del Gasto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Secretaría de Gestión del Riesgo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro: 3600011916	Fecha de Contabilización: 10.09.2025
Fecha de Impresión: 10.09.2025	Fecha Venc CDP: 31.12.2025
Estado de Liberación: Contabilizado	Página: 1 de 1
Dcto de Bloqueo:	

Descripción: ADQUIRIR E INSTALAR SENSOR DE NIVEL DE RÍO TIPO RADAR PARA INTEGRARLO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS INTELIGENTES Y COMUNITARIAS, AMPLIANDO LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI.
ADQUIRIR INSTALAR SENSOR NIVEL RÍO TIPO RADAR INTE

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:


Item: 1 Valor: 28.738.737 COP
Apropiación: 41.63/1.2.3.2.00.26/2.3.2.01.01.003.03.02/62020020014/BP260054821030114 Secretaría de Gestión del Riesgo/R.B.C.M.FondoGRED/CuentasMaestFondoGRED/Sistema de Alertas Tempra/Adquirir equipos t
Proyecto: BP-26005482/103/01/14 Adquirir equipos tecnológicos de visuali

Historial de Documento:				
Documento	Posición	Clase Importe	Fecha Act.	Importe
3600011916	00001	Original	10.09.2025	28.738.737,00
Total:				28.738.737 COP

Importe Total: La Suma de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Valor: 28.738.737 COP


Nombre y Firma Solicitante


Hanz Marcon


Nombre y Firma Aprobador

El presente contrato cuenta con su correspondiente Ficha Técnica de Impuestos, la cual cuenta con los respectivos ítem de información y se encuentra debidamente cargada en el expediente electrónico:



- ✓ Datos generales
- ✓ Deducciones y retenciones con los códigos SAP-SGFT
- ✓ Condiciones del contrato y contabilización

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION DE GARANTIAS INICIO.pdf	APROBACION DE GARANTIAS INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ APROBACION DE GARANTIAS.pdf	APROBACION DE GARANTIAS.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ FICHA TECNICA - ECOLOGIC INGENIERIA SAS - SENSOR.pdf	FICHA TECNICA - ECOLOGIC INGENIERIA SAS - SENSOR.pdf	Comprador Descargar Detalle

RPC: 4500388217, contabilizada el 27 de octubre de 2025, cuyo beneficiario es ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S–NIT 9005307994, en el cual se evidencia la aprobación por parte del Ordenador del Gasto Maria Alexandra Pacheco Muñoz, Solicitante, Nicolas Suarez Vallejo, quien a su vez es supervisor del presente contrato.

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Secretaría de Gestión del Riesgo Registro Presupuestal de Compromiso		
RPC No. 4500388217 Beneficiario: 9013703332 ECOLOGIC INGENIERIA SAS Contrato: 26.16.01.25	Fecha de Contabilización: 27.10.2025 Fecha Impresión: 27.10.2025 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1	
Plazo del contrato EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, O LA NORMA QUE LO ADICIONE O LO MODIFIQUE. NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali" y se Dictan otras disposiciones#		
Descripción ADQUIRIR E INSTALAR SENSOR DE NIVEL DE RIO TIPO RADAR PARA INTEGRARLO AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS INTELIGENTES Y COMUNITARIAS, AMPLIANDO LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI		
Item 1 Apropiación: 4163/1.3.3.2.00.26/2.3.2.01.01.003.03.02/62020020014/BP260054821030114 Secretaría de Gestión del Riesgo/R.B.C.M.FondoGRED(CuentasMaestFondoGRED)/Sistema de Alertas Tempra/Adquirir equipos tecnológicos de visuali Valor: 24.348.000 COP Proyecto: BP-260054821/03/01/14 Adquirir equipos tecnológicos de visuali CDP Asociados: 3600011916 Programación PAC OCT: 24.348.000		
Importe total: La suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS Valor: 24.348.000 COP		
 Nombre y Firma Solicitante	Elaboró: PI  Nicolas Suarez Vallejo	 Nombre y Firma Aprobador

El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBSERVACIÓN
Certificación bancaria	01/10/2025	Cuenta de Ahorros No. 462600067211 Davivienda
Certificación suscrita por la contadora pública Alexandra Correa Camacho, donde se indica estar a paz y salvo con pagos de seguridad social y parafiscales	05/12/2025	Planilla No. 9495750195 pagado el 2025/12/01 periodo Salud Diciembre, periodo Pensión Noviembre.
Factura de venta – N° FVEI 465	Fecha de emisión del 10/12/2025	Por valor de \$24.348.000 Vence el 09/01/2026
RUT	Generada el 24/11/2025	Copia certificada.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

		ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S NIT 901.370.333-2 TV 524.8 58.44 Tel: 3162823483 Bogotá - Colombia facturacion@ecologicingenieria.com www.ecologicingenieria.com		No. FVEI 465	
Socios: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		Fecha y hora comprobante: 2025-12-05		Fecha de Vencimiento: 2026-01-04	
NIT	890.399.011-3	Teléfono	(602) 6531063 - Ext. 000		
Dirección	AV 2 NORTE 13 70	Ciudad	Cali - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vl. Total	Vendedor
1	Adquirir e instalar sensor de nivel de río tipo radar para integrarlo al Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993	1.00	20,460,504.20	20,460,504.20	19 %	3,887,495.80	24,348,000.00	JHONY SEBASTIAN CIFUENTES CIFUENTES

Total Items: 1		Total Bruto	20,460,504.20
Valor en Letras: Veinticuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte		Iva 19%	3,887,495.80
Forma de pago: Crédito		Total a Pagar	24,348,000.00

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-04 por \$ 24,348,000.00

Observaciones:
CONTRATO 4163.001.26.1.601-2025

"Según la Ley 1231 de 2008 y la Ley 1676 de 2013, la Empresa aceptará la factura a los 3 días hábiles, salvo rechazo electrónico. El pago se hará al tenedor legítimo en la fecha de vencimiento, después de los descuentos aplicables."

Consignar a nombre de ECOLOGIC INGENIERIA SAS NIT: 901370333-2 a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda 462600067211.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Se hace entrega adjunto al presente informe los siguientes documentos.

- ✓ Cédula del representante legal
- ✓ Contrato
- ✓ RPC
- ✓ Cámara de Comercio
- ✓ RUT
- ✓ Factura electrónica de venta No. FVEI 465
- ✓ Certificado de soporte parafiscales
- ✓ Planilla de pago de los aportes al Sistema Integral en Salud
- ✓ Certificación Bancaria
- ✓ Informe de supervisión.

Se realiza informe de supervisión con fecha de elaboración de 12 de diciembre de 2025.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

BALANCE FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$24.348.000
VALOR A CANCELAR CON EL PRESENTE INFORME	\$24.348.000
SALDO	\$0

Se verificó el ingreso al almacén del equipo sensor de nivel tipo radar, marca KISTERS, modelo HyQuant L20, lo cual consta debidamente en el expediente correspondiente.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones para este periodo.


7. FIRMAS RESPONSABLES



NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO
Supervisor



JUAN JOSÉ SANTANDER BECERRA
Apoyo a la Supervisión – Contratista SGRED



WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA
Apoyo a la Supervisión – Contratista SGRED

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 15 de diciembre de 2025
