

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COD: AJC-HSEQ-FO-43
		FECHA: 01/01/2024
	CORRESPONDENCIA	VERSION :01
		Página 1 de 1

Tauramena Casanare, 26 de Diciembre de 2025

SEÑORES:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Calle 5 No. 14-34, piso 2 Centro Administrativo Municipal de Tauramena

Ref: Entrega Informe de Ejecución no.1.

Cordial saludo,



Por medio de la presente hago entrega del Informe de Ejecución No. 1 del CONVENIO SOLIDARIO No. 039 DE 2025 que tiene por objeto **“OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA”**, se radica;

a) INFORME DE EJECUCIÓN No.1

Agradezco de antemano su atención,

Cordialmente,

HENRY PAUL ALFONSO


Representante legal ASOJUNTAS

NIT. No. 900.002.220-8

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 1 de 29

INFORME DE EJECUCIÓN No. 1

CONVENIO SOLIDARIO No. 039 DE 2025 “OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA”

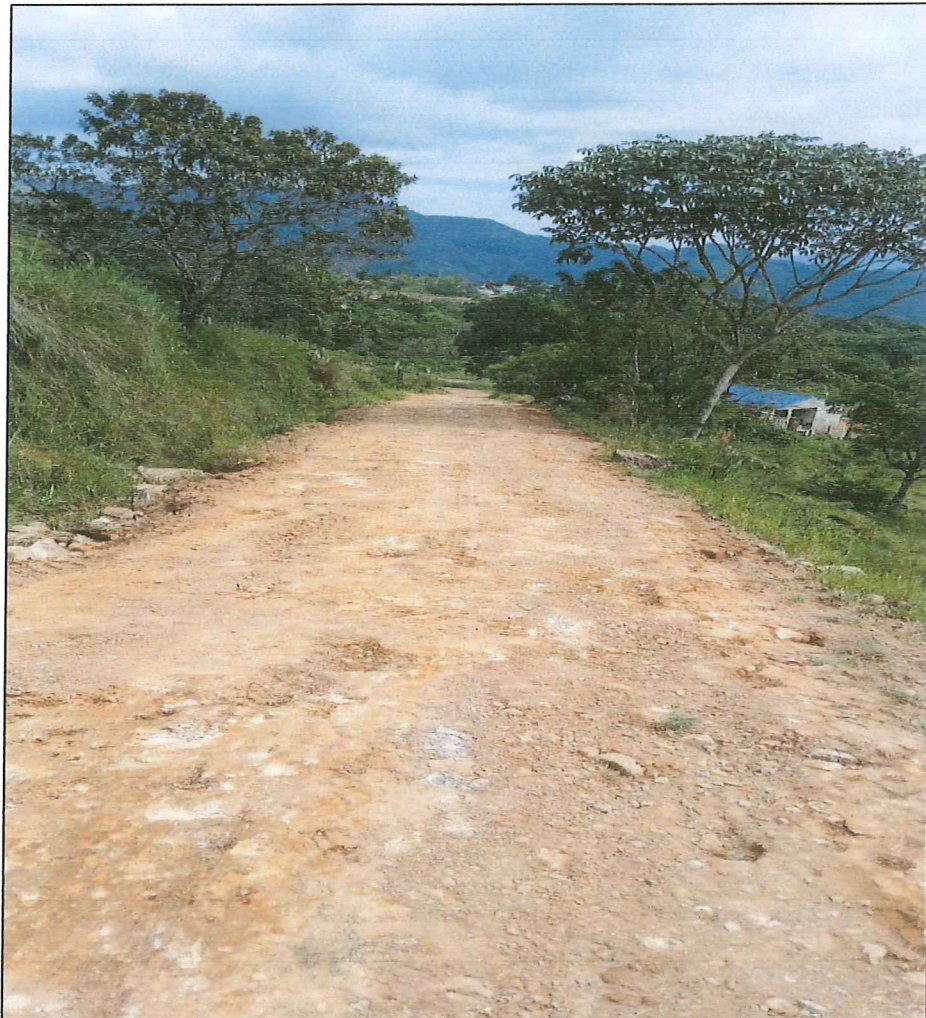

EJECUTOR: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA “ASOJUNTAS”

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE

01 DE DICIEMBRE DE 2025 A 25 DE DICIEMBRE DE 2025

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 2 de 30

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-063-2025 que tiene por objeto "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" durante el período de ejecución del convenio y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó conforme al cumplimiento de los estatutos de La Asociación en él, *Artículo 20, numeral 26, según naturaleza de los contratos o Convenios, ítem 2, "Junta Directiva: desde (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un peso (\$1,00) hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.* La Junta Directiva autoriza para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio cuyo objeto es: "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$432.910.365) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, , elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vías terciarias tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales, para el presente convenio y empleando la maquinaria amarilla de propiedad del Municipio, Asojuntas deberá adelantar los trabajos de conformación de cada uno de los sitios y vías que estén definidos previamente, a través de la Secretaría de Infraestructura, para lo cual se realizará el traslado de la maquinaria, de los operadores y del personal profesional vinculados en el convenio y se adelantarán las labores principales que son: reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar, a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, entre otras.

Bajo el conocimiento de lo anterior, el municipio de Tauramena aprobó el Plan de Desarrollo 2024-2027, en su línea estratégica: "Tauramena Es Conectividad Territorial Para El Desarrollo", Sector de inversión: "TRANSPORTE" con el objetivo priorizado: "Fortalecer la infraestructura de servicios para impulsar la conectividad física y digital, de la población del municipio, como soporte del desarrollo integral de territorio", Programa: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, Subprograma: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE, teniendo como una de sus metas de producto la "VIA TERCIARIA MEJORADA". Todo lo anterior, En general, las actividades que se van a desarrollar para la ejecución del presente convenio solidario corresponden a la conformación de la subrasante mejorada que incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar 135 Kms de vías terciarias a nivel de destapada del Municipio de Tauramena.

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 3 de 26

BENEFICIARIOS. Habitantes Municipio de Tauramena.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CINCO (05) MESES Y ONCE (11) DIAS.

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA APORTE MUNICIPIO: 18.32%

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA APORTE ASOJUNTAS: 16.13%

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a \$ 432.910.365 (Aporte del Municipio: \$389.318.940 y Aporte de la asociación \$ 43.591.425)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	R.P. No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2024854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	\$62.291.030	1130 07/11/2025	1.3.3.11.08.02 R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- REGALIAS SISTEMA ANTERIOR
		\$327.027.910		1.2.4.3.03 SGP- PROPÓSITO GENERAL – LIBRE INVERSIÓN
VALOR TOTAL		\$389.318.940		

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 4 de 29

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	039 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y ONCE (11) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$432.910.365)
VALOR APOORTE DEL MUNICIPIO	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$389.318.940)
VALOR APOORTE DE LA ASOCIACIÓN	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$43.591.425)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 5 de 29

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA ACTA DE INICIO
VALOR APOORTE DEL MUNICIPIO	\$389.318.940	01/12/2025
APOORTE DE LA ASOCIACIÓN	\$ 43.591.425	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$432.910.365

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BY-100058677	CUMPLIMIENTO	10%	SEGUROS MUNDIAL	\$ 86.582.073	07/11/2025	28/08/2026
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	SEGUROS MUNDIAL	\$ 43.291.036	07/11/2025	28/04/2029
BY-100009531	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	\$ 284.700.000	07/11/2025	28/04/2026

ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO.



- Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria e Inspector SST para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir en Vereda El Oso, Vereda Guichire y Vía Alterna Monterrey del Municipio de Tauramena. así mismo se realizó inspección de las condiciones de la maquinaria amarilla de acuerdo al formato preoperacional de cada equipo por cada semana.
- La inspectora SST se verificaron las afiliaciones al SGSS, Planilla de pagos SGSS, se organizó un cronograma de actividades y charlas al SST, actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, inspección de seguridad, registro de asistencia y estadísticas de accidentalidad. (se anexa informe de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo);
- Se realizó visita técnica de supervisión por parte de la ingeniera Residente de Obra, Coordinador de maquinaria y el Inspector SST para hacer el recorrido de los kilómetros intervenidos y terminados.

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 6 de 26

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA POR CUMPLIMIENTO DE KILOMETRAJE;

VOLQUETA AUMAN BJ1226;

Se realizó el mantenimiento por cumplimiento de kilometraje de la Volqueta OSE966, se realizó el cambio de filtros y cambio de aceite el fin de evitar obstrucciones y así mantener en buenas condiciones la maquina y prolongar su vida útil.

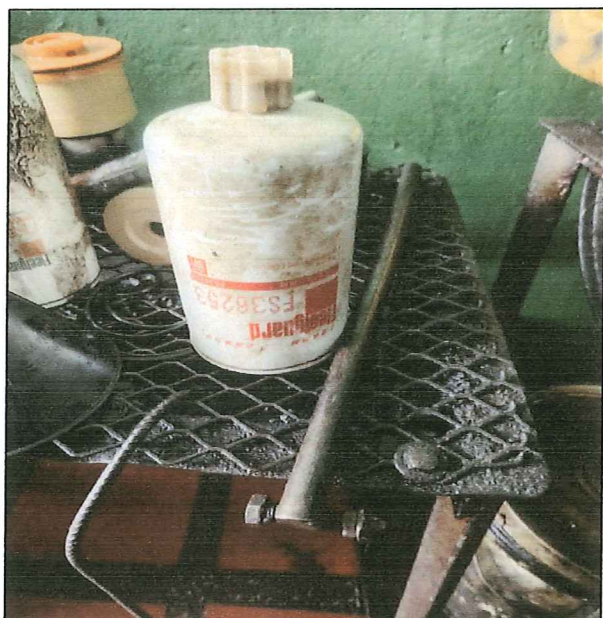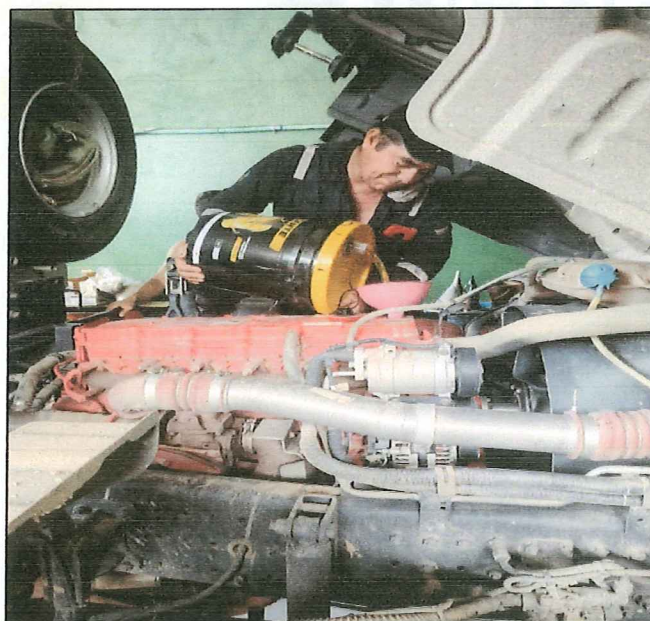

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 7 de 26

EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades del Municipio de Tauramena;

AVANCE DE EJECUCIÓN - APOORTE MUNICIPIO

ITEM 1. Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar.). (las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo) 135 km.

Se adelantaron actividades de reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, mediante las siguientes actividades:

Se adelantaron actividades de reconfiguración y recuperación de la banca, mediante el empleo de la maquinaria amarilla, la motoniveladora inicio su operación de escarificación ubicándose en uno de los extremos del área donde baja los escarificadores hasta ponerlos en contacto con el material. Iniciaré su maniobra lentamente hasta lograr penetrarlos a una profundidad adecuada de acuerdo con el tipo de material en tratamiento hasta llegar al extremo opuesto donde se da la vuelta y se regresa cubriendo la franja continua. Este proceso se repite hasta lograr cubrir toda el área.

Una vez se escarifico, la motoniveladora repitió la operación similar a la del escarificado, pero con la cuchilla ligeramente sesgada con el fin de acordonar el material a lo largo del área en tratamiento.

El Vibrocompactador inicio su maniobra de compactación previa preparación del área con la motoniveladora. Se ubicó en uno de los extremos de la vía hacia el borde y comenzó a desplazarse lentamente hasta llegar al otro extremo en donde se gira y se devuelve, este proceso se repite las veces que sea necesario hasta que se obtiene el grado de compactación adecuado.

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 8 de 26

Para el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2025, se obtuvo un avance del 18,32% evidenciado en 24,73 km intervenidos.

- A continuación, se encuentra el mapeo y registro fotográfico de los tramos intervenidos.
- Vereda El Oso, Vereda El Guichire y Via Alternativa del Municipio de Tauramena.



**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"**
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8



DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	0,80	km	1/12/2025	10,39	EL OSO
2	1,12	km	2/12/2025		
3	1,34	km	3/12/2025		
4	1,40	km	4/12/2025		
5	1,50	km	5/12/2025		
6	1,90	km	6/12/2025		
DESCANSO			7/12/2025	12,34	GUICHIRE
7	1,79	km	8/12/2025		
8	0,54	km	9/12/2025		
9	1,58	km	10/12/2025		
10	1,95	km	11/12/2025		
11	1,96	km	12/12/2025		
12	1,85	km	13/12/2025	2,00	ALTERNA
DESCANSO			14/12/2025		
13	1,85	km	15/12/2025		
14	1,74	km	16/12/2025		
15	0,52	km	17/12/2025		
16	0,89	km	18/12/2025		
17	0,10	km	19/12/2025	2,00	ALTERNA
18	0,25	km	20/12/2025		
DESCANSO			21/12/2025		
19	0,36	km	22/12/2025		
20	0,52	km	23/12/2025		
21	0,77	km	24/12/2025		
DESCANSO			25/12/2025		
TOTAL	24,73	km			

Bernabe


BERNABE VIVAS BAUTISTA

Coordinador de Maquinaria

C.S. 039/2025

	INFORME DE EJECUCION		COD: AJC-HSEQ-FO-16
			01/10/2024
			Versión: 00
	SISTEMA DE GESTION HSEQ		PAGINA 1 DE 1

Fig. 1 intervención municipio tauramena, Vereda El Oso, se Intervinieron 10,39 kms.

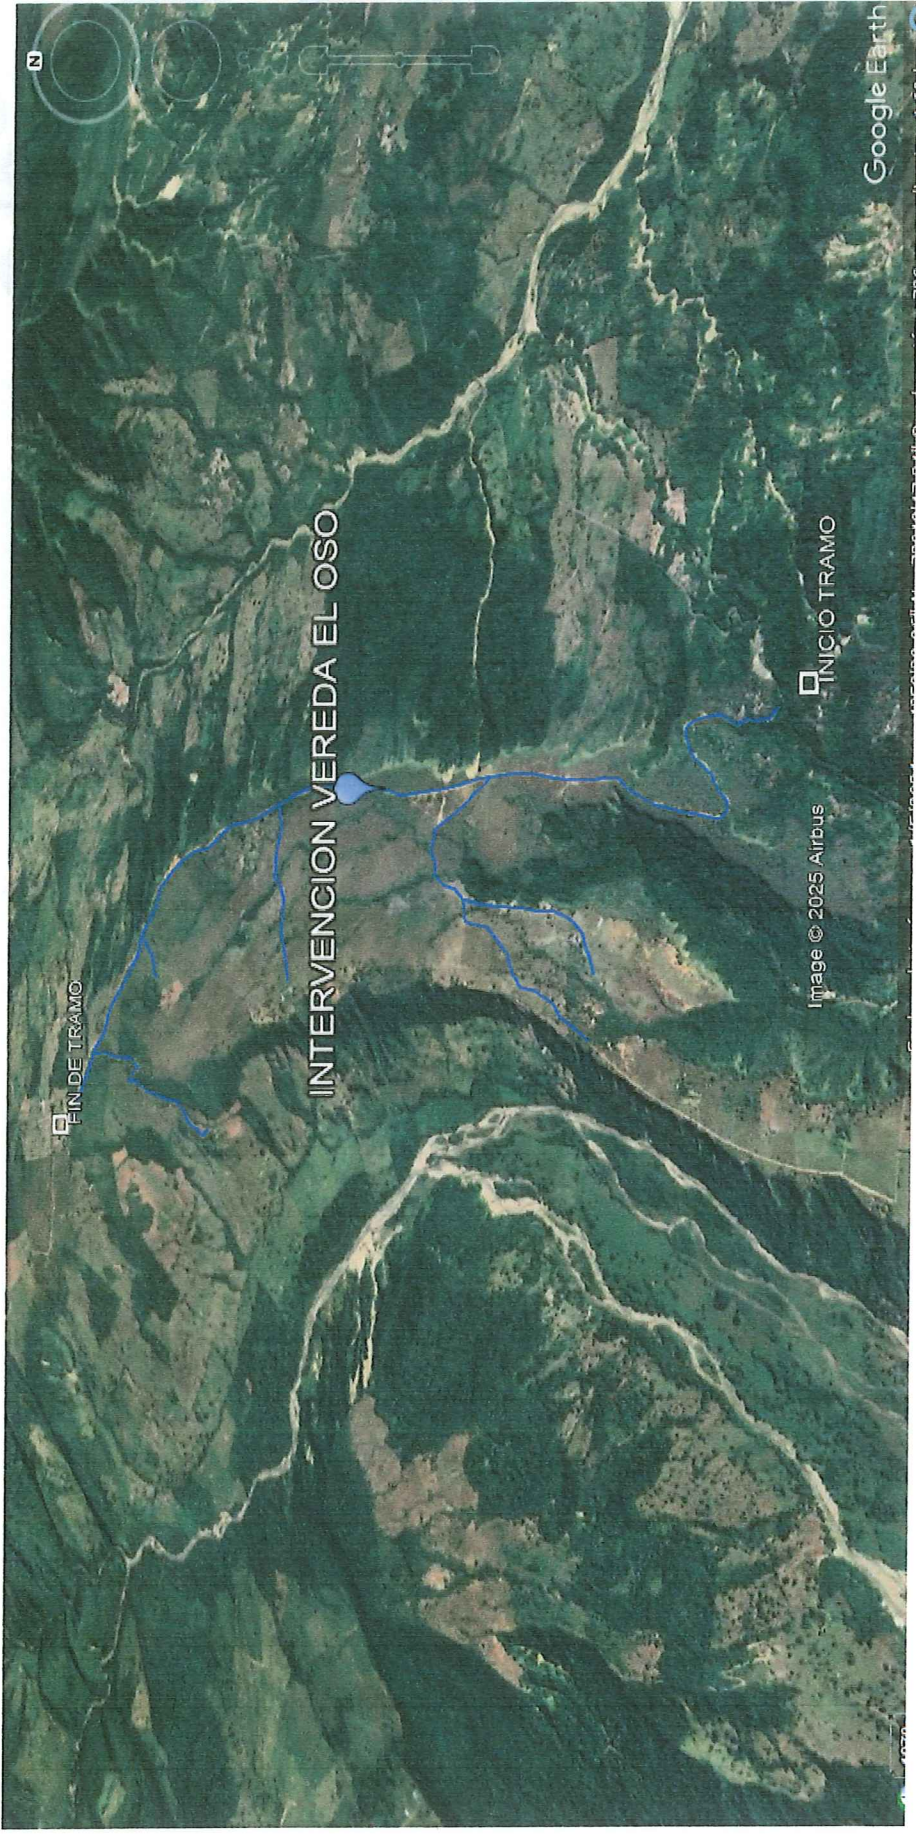


Fuente: Google Earth

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntatauramena@gmail.com
“Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario”

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 13 de 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA EI OSO - ANTES

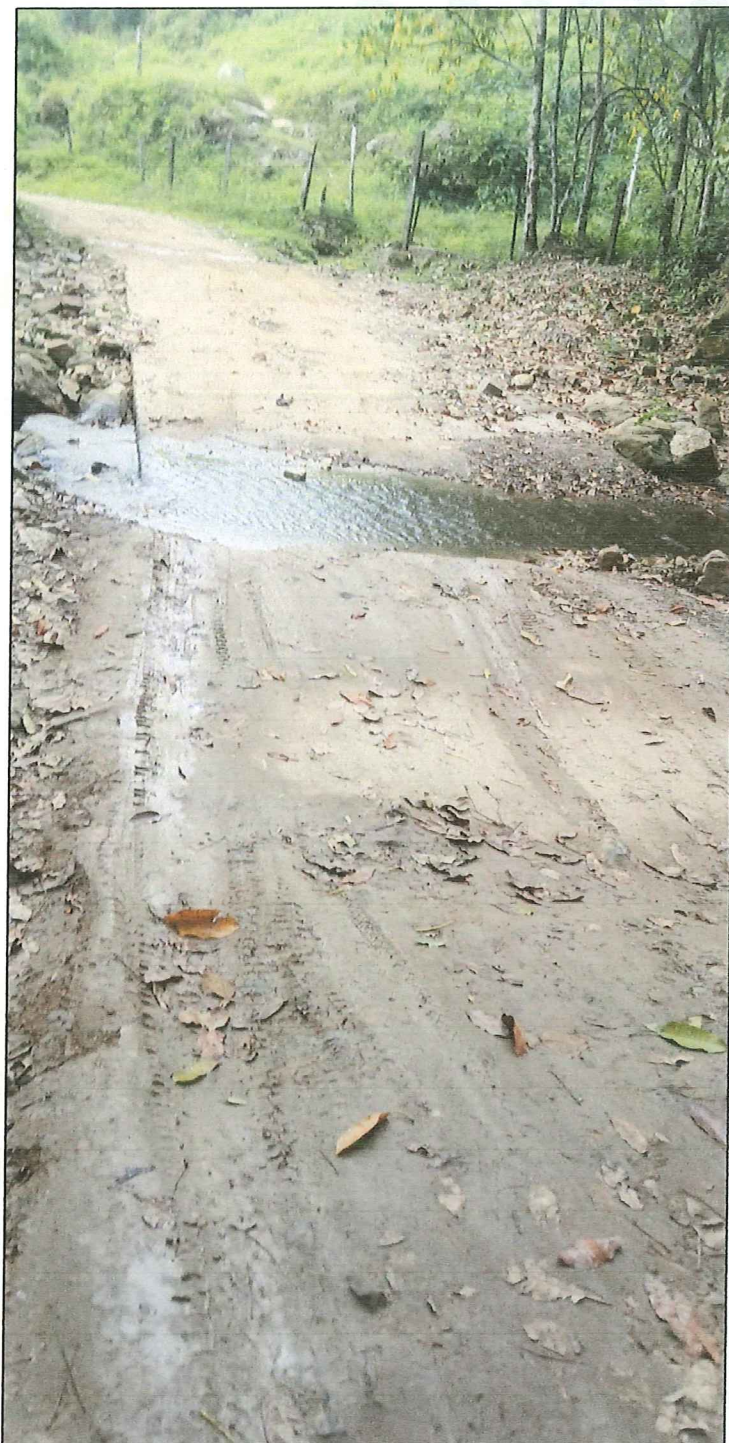


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 14 de 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA EI OSO - DURANTE





	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 15 de 29

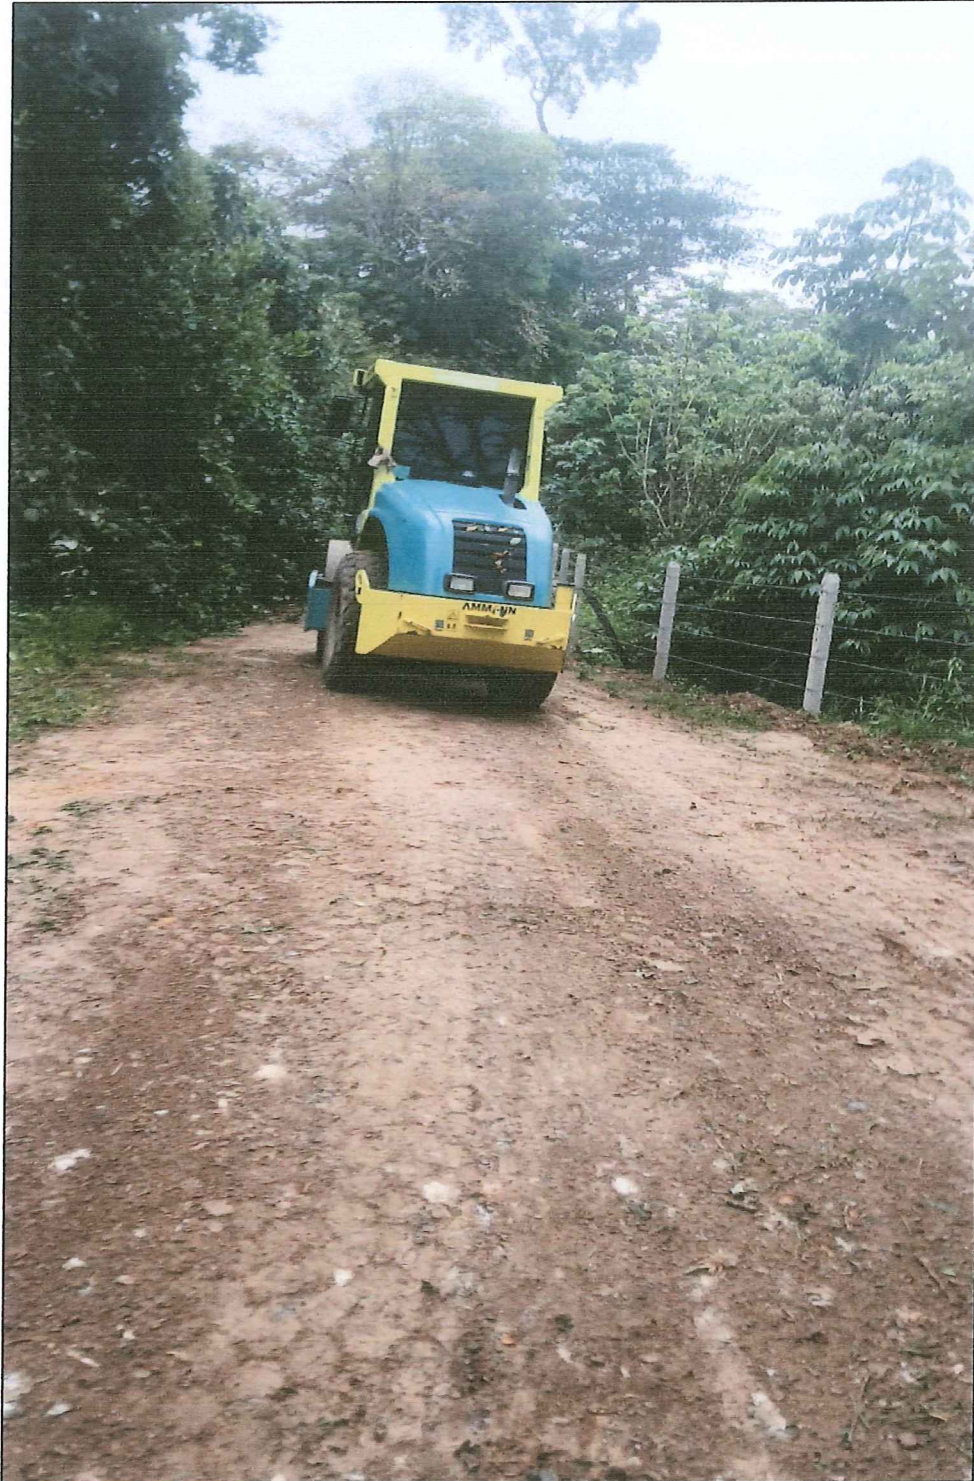

409


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 16 de 29

FOTOGRAFICO INTERVENCIÓN VEREDA EI OSO – DESPUÉS

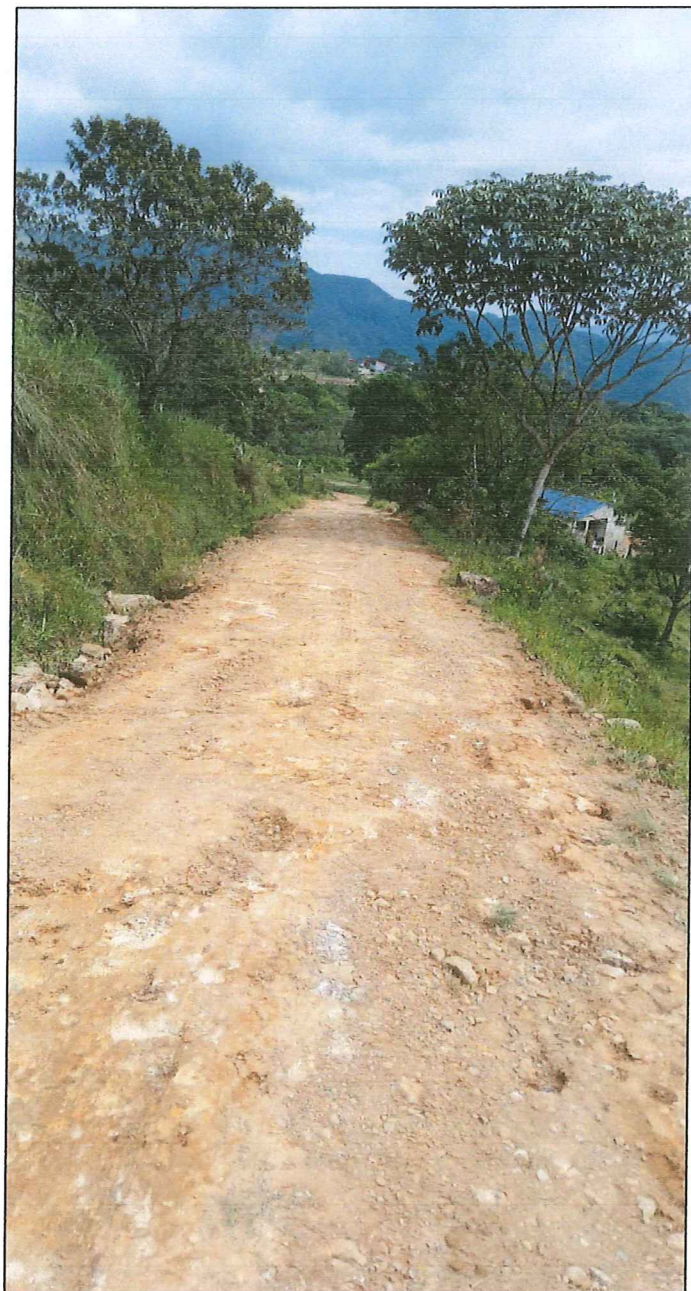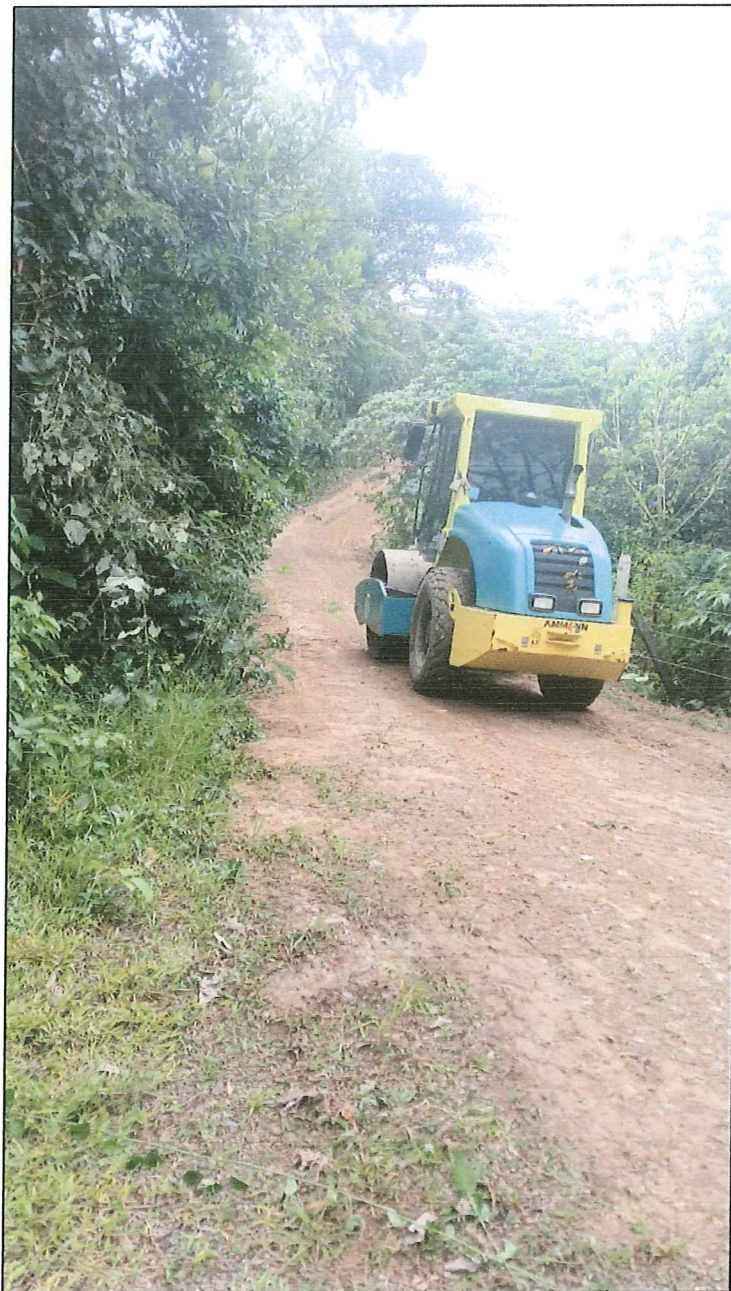

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
SISTEMA DE GESTION HSEQ		Versión: 00
		PAGINA 1 DE 1

Fig. 2 intervención municipio tauramena, Vereda Guichire, se Intervinieron 12,34 kms.

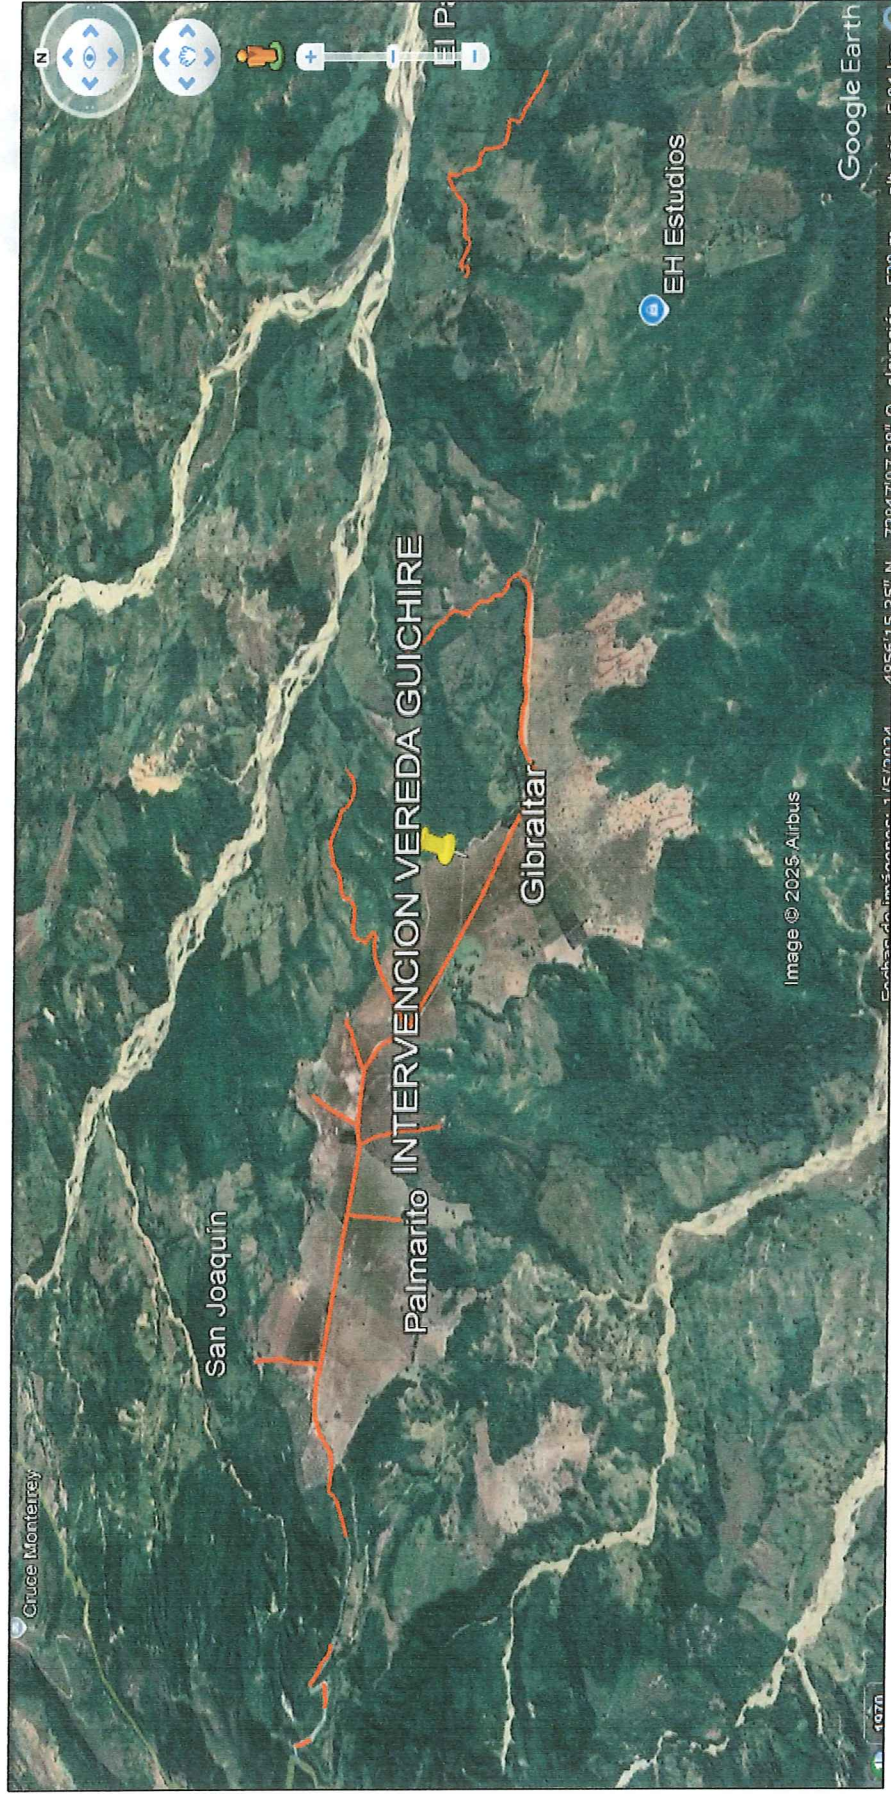


Fuente: Google Earth


Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
 Email: presidente.asojuntatauramena@gmail.com
 “Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario”

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 17 de 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA GUICHIRE – ANTES

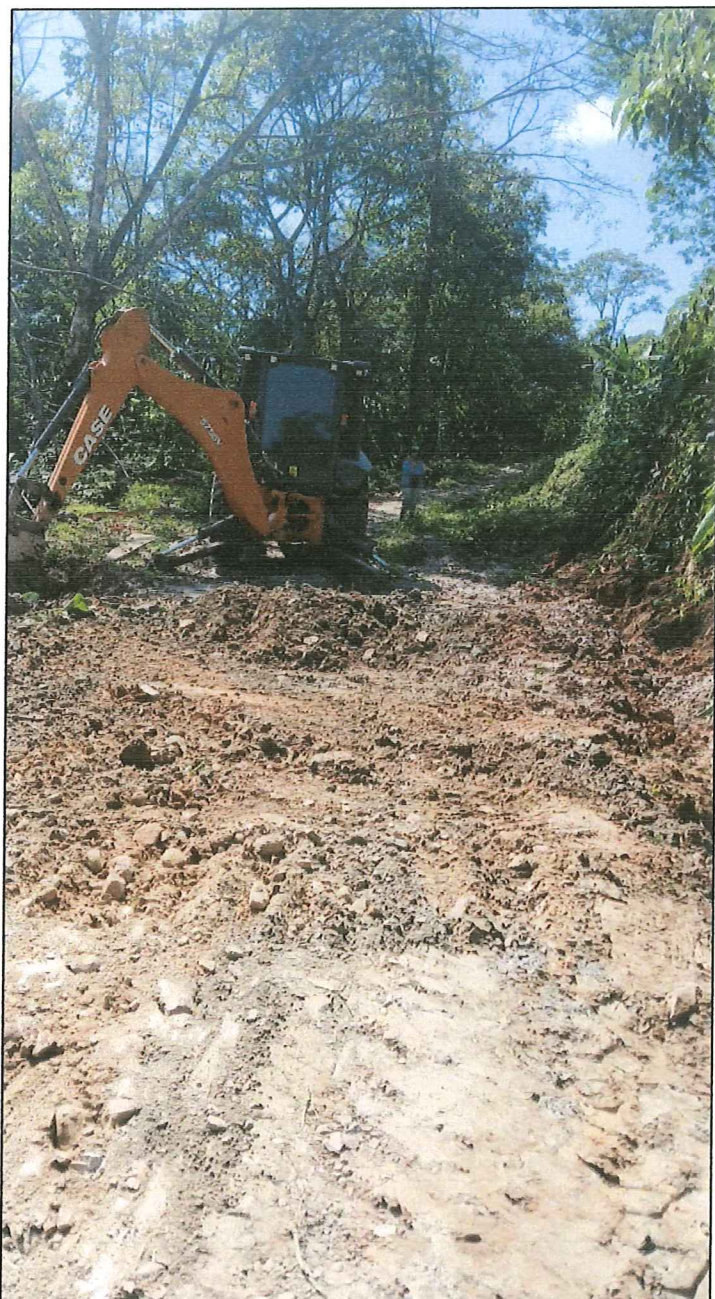

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 18 de 29

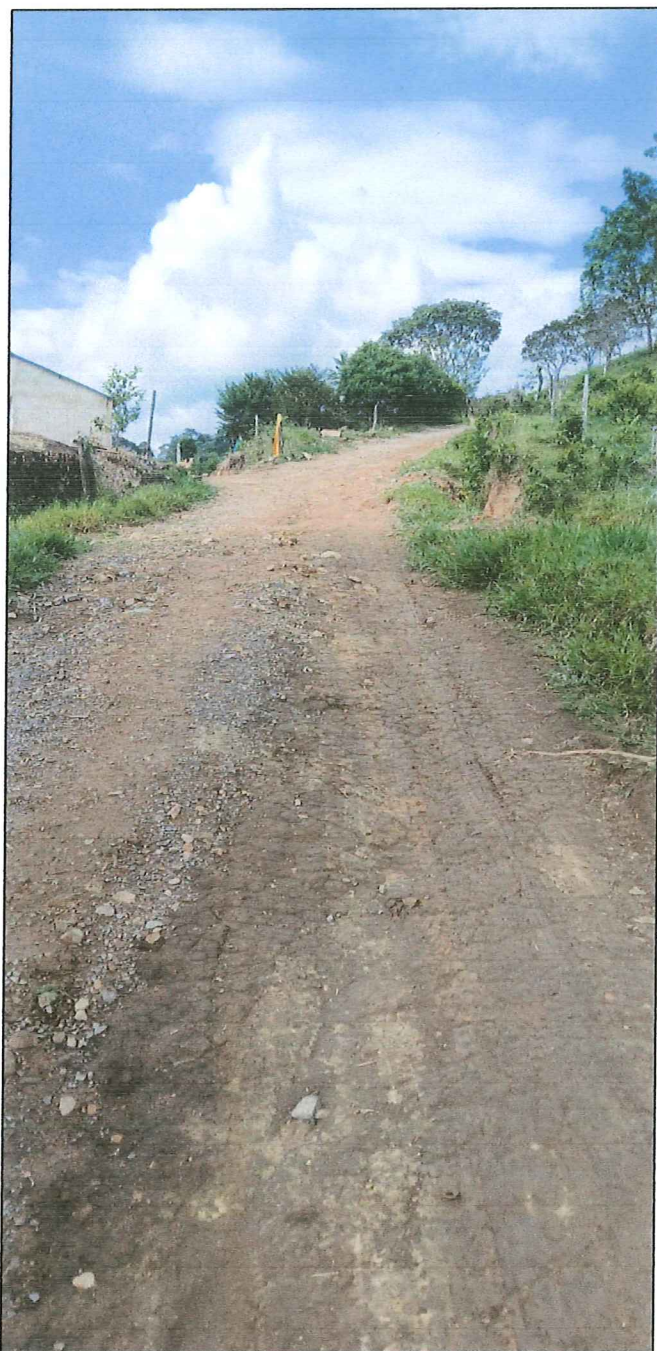


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 19 de 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA GUICHIRE – DURANTE




	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 20 de 29

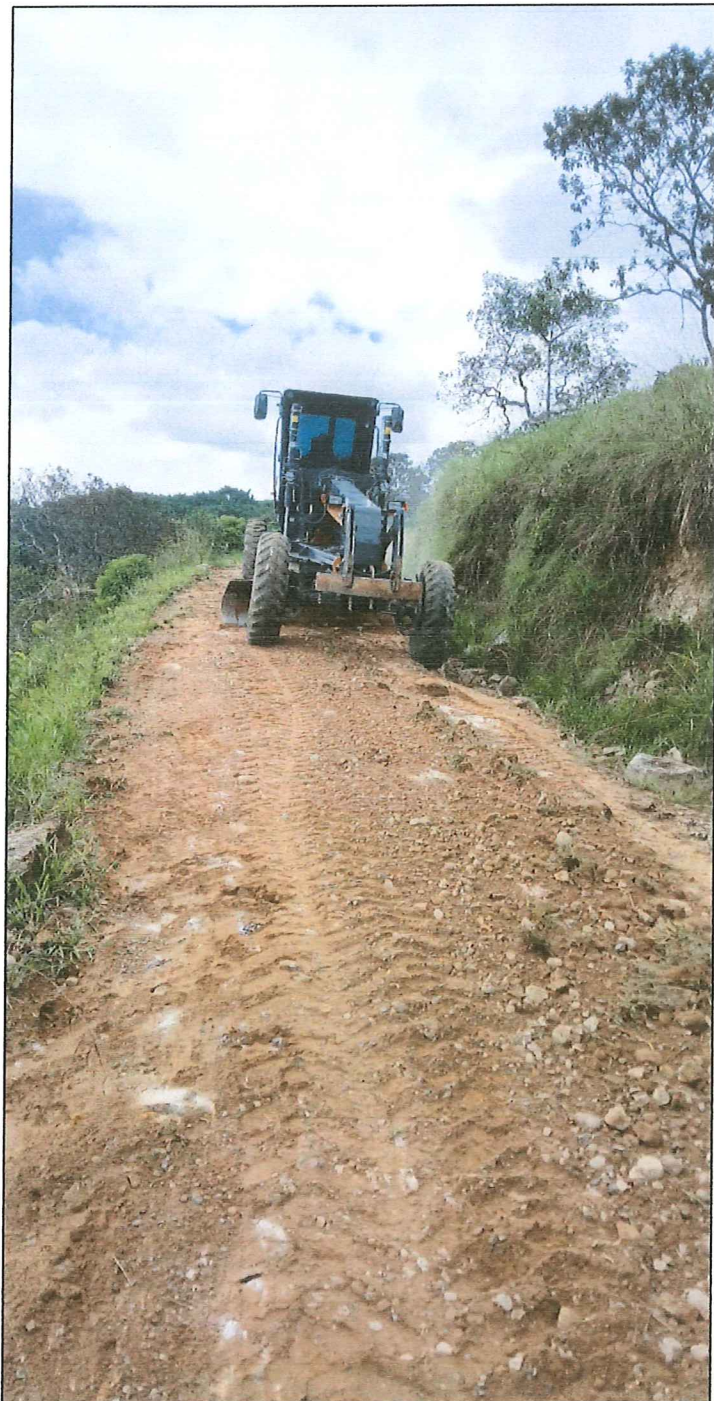


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 21 de 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA GUICHIRE – DESPUÉS

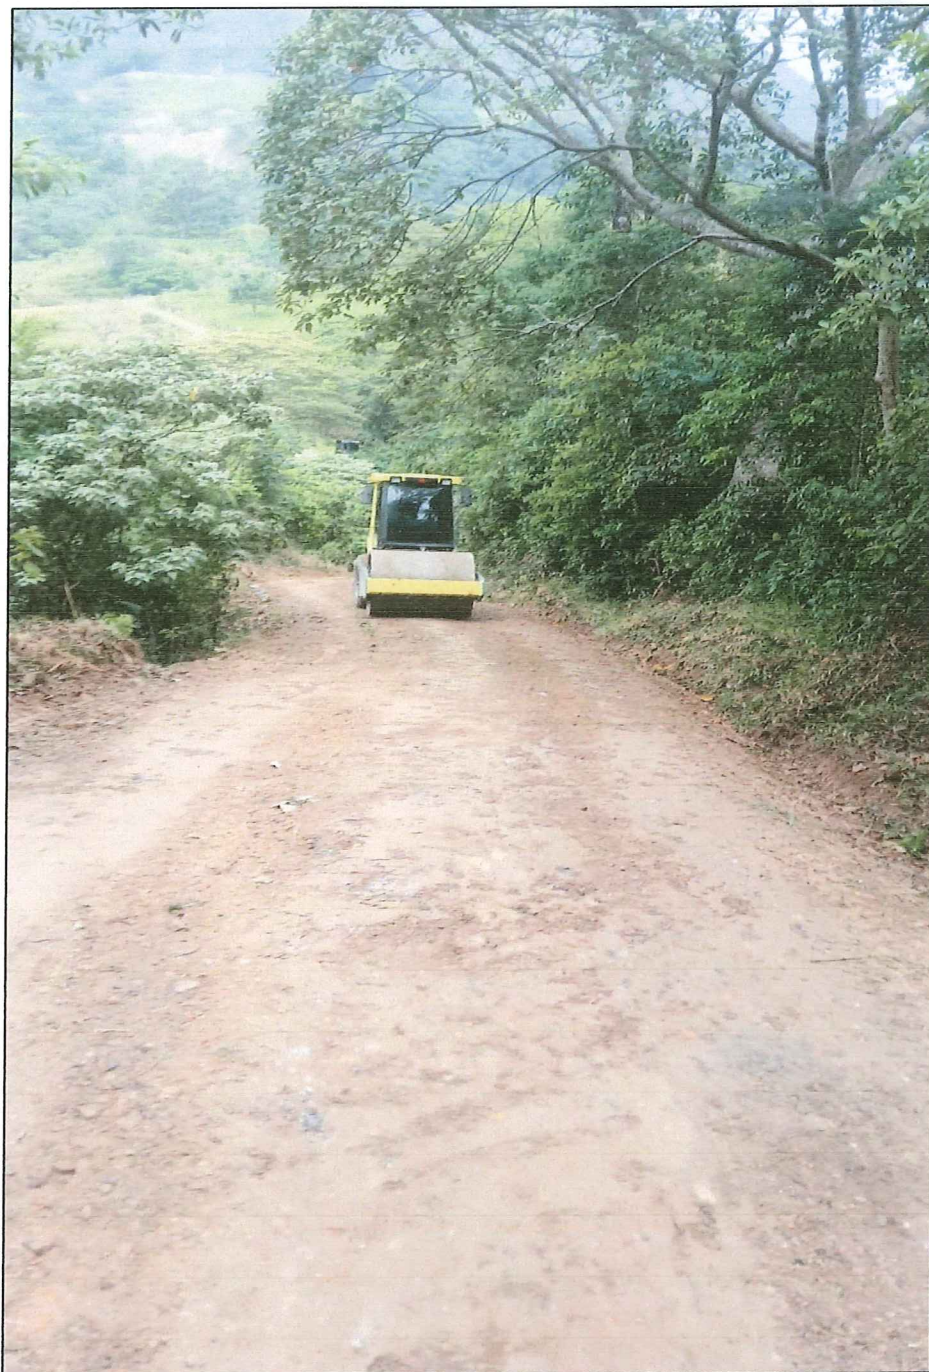

	INFORME DE EJECUCION		COD: AJC-HSEQ-FO-16
			01/10/2024
			Versión: 00
	SISTEMA DE GESTION HSEQ		PAGINA 1 DE 1

gFig. 3 intervención municipio tauramena, Via Alterna Monterrey, se Intervinieron 2 kms.

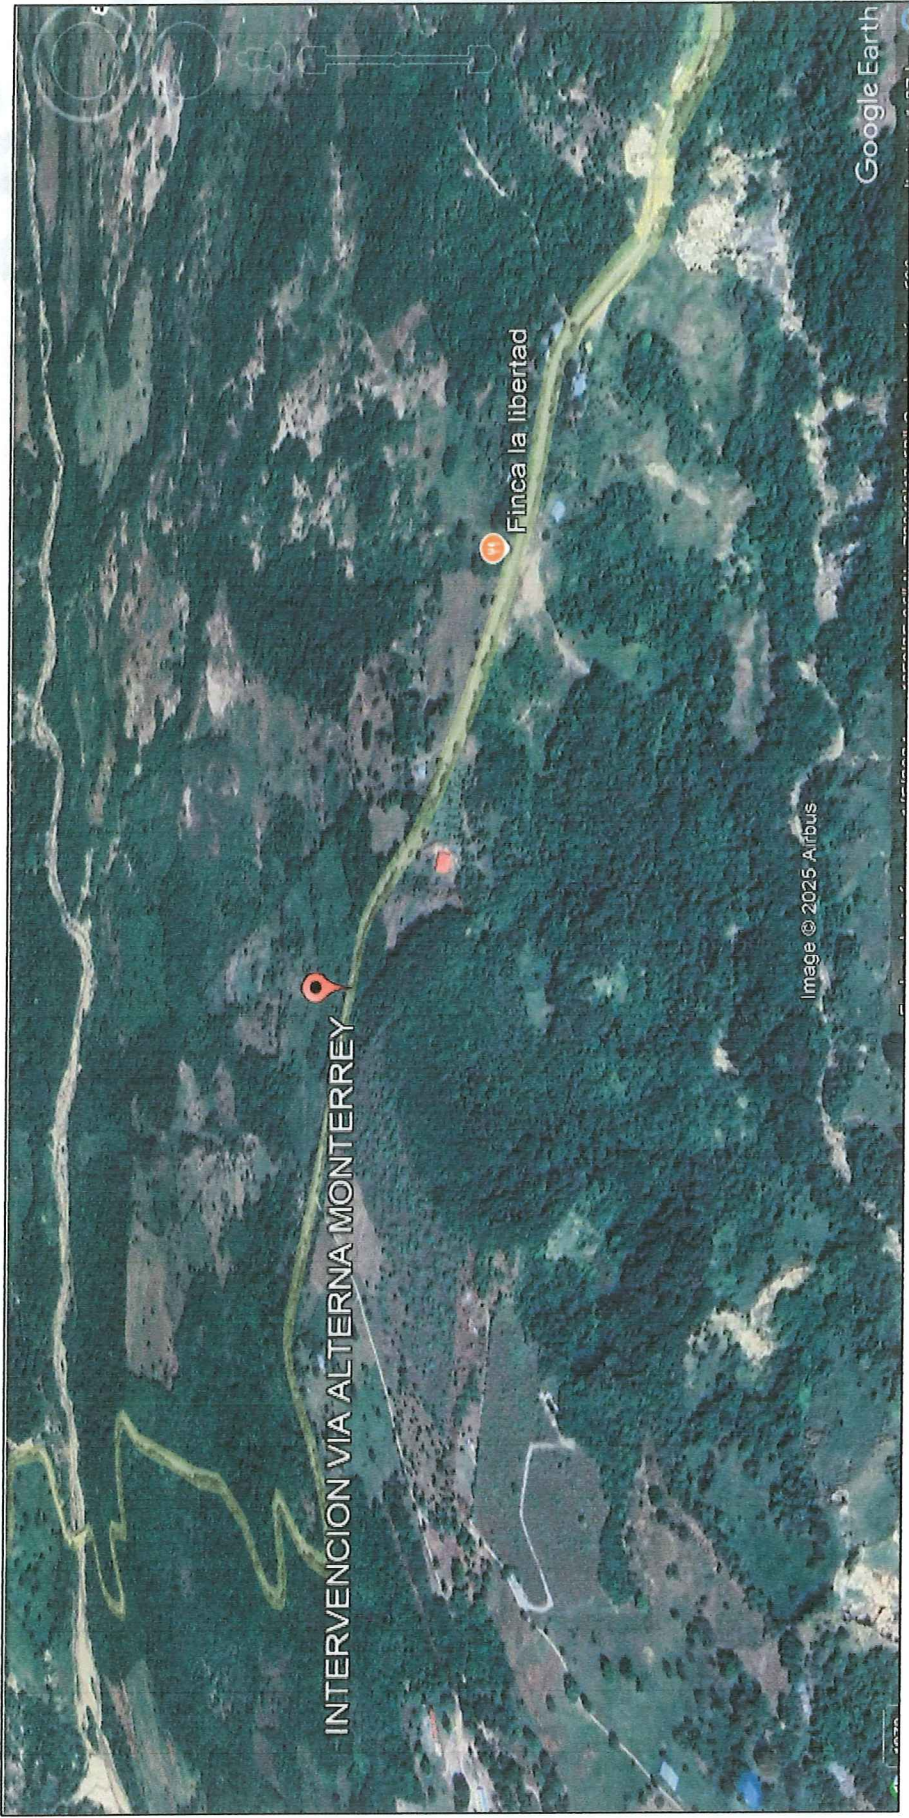



Fuente: Google Earth

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntatauramena@gmail.com
“Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario”

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 22 de 30

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VIA ALTERNA MONTERREY

Se ejecutaron actividades conjuntas de retiro de tierra, limpieza de las zonas, construcción de muros de contención y estabilización del terreno en la vía alterna de Monterrey, en donde se presentaron derrumbes y deslizamientos. El área de trabajo aproximadamente fue de 2 km en relación con los días y horas trabajadas.

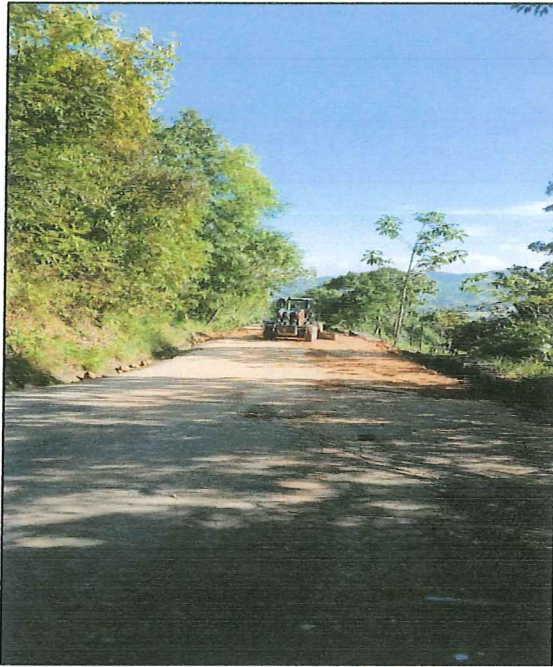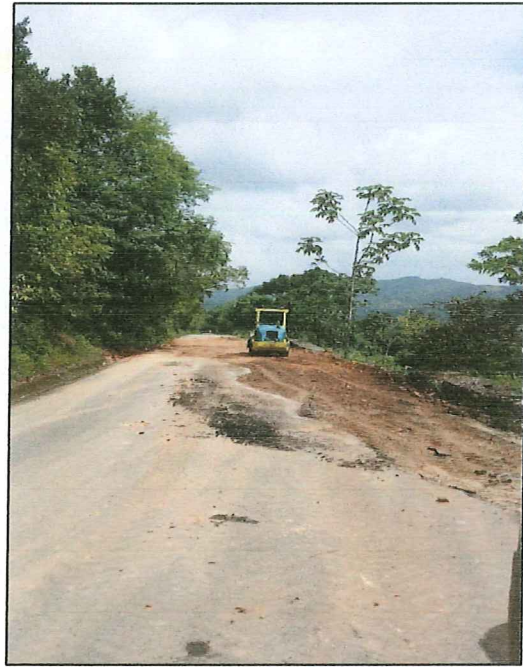

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 24 de 30

INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

La ejecución de los ítems contractuales del presente Convenio ha sido favorable gracias a las condiciones climáticas, el avance en kilometraje para el periodo comprendido desde el 01 de Diciembre de 2025 al 25 de Diciembre de 2025, mostró un mayor rendimiento en el avance de kilometraje.

	INFORME DE EJECUCION		COD: AJC-HSEQ-FO-16
			01/10/2024
			Versión: 00
	SISTEMA DE GESTION HSEQ		PAGINA 1 DE 1


AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

El presente Convenio Solidario No. 039 del 07 de Noviembre de 2025, presenta el siguiente avance de ejecución:

Para el periodo comprendido entre el **01 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2025:**



- **Aporte Municipio** se obtuvo un avance del **18.32%** evidenciado en **24.73 kms** intervenidos.
- **Aporte Asojuntas Tauramena** se obtuvo un avance del **16.13%** evidenciado en **5 kms** intervenidos.

AVANCE DE EJECUCIÓN APOORTE
MUNICIPIO

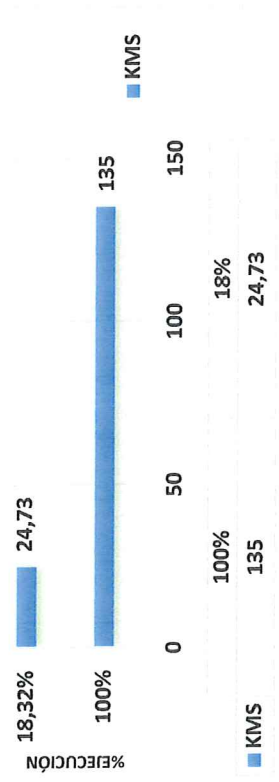

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

AVANCE DE EJECUCIÓN APOORTE
ASOJUNTAS

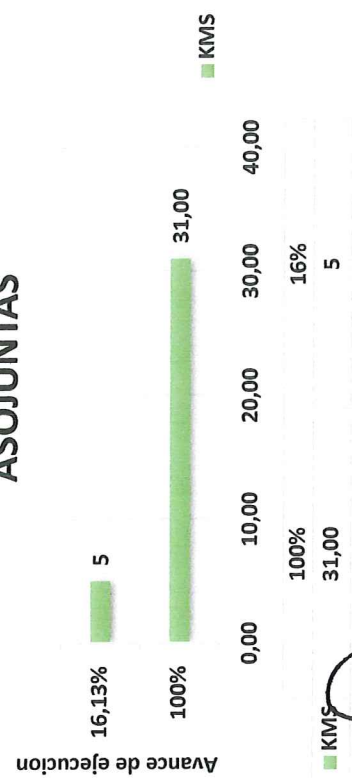

ANGIE LORENA GONZALEZ
Ing. Residente
C.S. 039/2025

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		PAGINA 1 DE 1

ANEXO No. 1

BITÁCORA

421

BIACORA

CONVENIO SOLIDARIO NO. 039

DE 2025.

"OBRAS DE CONFORMACIÓN DE

SUBRASANTE PARA LA RED VIAL

TECUELA, VIGENCIA FUTURA

2025 - 2026, MUNICIPIO DE

TAURAMENA"

01-12-2025

clima mañana: Soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se lleven a cabo actividades de

eridificación, comparación, im-

pieza al lado y lado de la

vía en la Vereda El oso en el

cuál se intensivo 0,80 Km.
Responsable: ~~Juan Luis~~ Lgm

02/12/2025

Clima: mañana: soleado
Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magualla

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de encartación, compactación en 1,12 Km de la Vereda El Oro del municipio de Tauramã.

Responsable: ~~Juan Luis~~ Lgm

03/12/2025

Clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magualla

Se llevan a cabo actividades de encartación, compactación y compactación en 1,34 Km en la Vereda El Oro del Municipio de Tauramã.

Responsable: ~~Juan Luis~~ Lgm

~~Juan Luis~~ Lgm

04/12/2025

Clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magualla

Se llevan a cabo actividades de compactación, compactación, compactación en la Vereda El Oro, Se realiza limpieza a

lado y lado de la vía en
1,40 km

Responsable: ~~Inspector SST~~ Lgm
Tq. Pendiente

05/12/2025

Clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magnitud

Se llevan a cabo actividades de
escantificación, disgregación y com-
pactación en 1,40 km de la
vereda El Oso.

Responsable: ~~Inspector SST~~ Lgm
Tq. Pendiente

05/12/2025

Clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magnitud

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
disgregación, compactación en
1,40 km de la vereda El Oso.

Responsable: ~~Inspector SST~~ Lgm
Tq. Pendiente

08/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador magnitud

Se llevan a cabo actividades de
escantificación y compactación en
1,40 km de la vereda El Oso.

Responsable: ~~Inspector SST~~ Lgm
Tq. Pendiente

09/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

Se efectúan actividades de excavación, dragageo y compactación en 0,54 km de la Vareda el oso.

Responsable:

~~Inspector SST~~
Inspector SST

10/12/2025

Clima: mañana: nublado

Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Personal: Arbolador

Se llevan a cabo actividades de dragageo, compactación y excavación en 0,58 km en la Vareda Guadalupe.

Responsable:

~~Inspector SST~~
Inspector SST

11/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

Se llevan a cabo actividades de excavación, dragageo en 1,05 km de la Vareda Guadalupe.

Responsable:

~~Inspector SST~~
Inspector SST

12/12/2025

clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador máquina

Se llevan a cabo actividades de
eificación y comparación en
1,96 km de la Vereda Guachine.

Responsable:

~~Inspector SST~~
Ing. ~~Felipe~~

13/12/2025

clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador máquina

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
disgregación, eificación y

Comparación en 1,85 km

en la Vereda Chiquitá

Responsable:

~~Inspector SST~~
Ing. ~~Felipe~~

15/12/2025

clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maq.

Se llevan a cabo actividades
de disgregación, eificación
Comparación en 1,85 km de
la Vereda Guachine.

Responsable:

~~Inspector SST~~
Ing. ~~Felipe~~

16/12/2025

clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de excavación, dragado y compactación en 1,44 km de la Vereda Guichile

Responsable: ~~Guichile~~ Lgm
Jef. Residente

11/12/2025

Clima: nublado - Soleado

Tiempo: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se ejecutan actividades de excavación, compactación y limpieza a lado y lado de la vía en

0,57 km de la Vereda

Guichile

Responsable:

~~Guichile~~ Lgm
Jef. Residente

18/12/2025

Clima: nublado - Soleado

Tiempo: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

Se ejecutan actividades de limpieza a lado y lado de la vía, se excava y compacta en 0,84 km de la Vereda

Guichile

Responsable:

~~Guichile~~ Lgm
Jef. Residente

19/12/2025

Clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
 excavación, compactación, dis-
 gregación en 0,10 km de la
 Vereda Vía Altana Monterrey.

Responsable:



~~Ing. Beltrán~~

20/12/2025

Clima: mañana: soleado

Tarde: soleado


personal: 4 operadores

1 coordinador maq.

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
 disgregación, excavación y com-
 pactación en 0,25 km en la
 Vía Altana Monterrey.

Responsable:



~~Ing. Beltrán~~

22/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado


personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se ejecutan actividades de dis-
 gregación, compactación y excava-
 ción en 0,36 km de la
 Vía Altana Monterrey.

Responsable:



~~Ing. Beltrán~~

23/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
escaificación y limpieza a lado y
lado de la vía en 0,52 Km de
la Vía Alternativa Monterrey.

Responsable:

~~Julio Lgm.~~
~~J. L. L.~~ ~~Presidente~~

24/12/2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de
escaificación y compactación en
0,47 Km de la Vía Alternativa Monterrey.

Responsable:

~~Julio Lgm.~~
~~J. L. L.~~ ~~Presidente~~



INFORME DE EJECUCION

429
COD: AJC-HSEQ-FO-16

01/10/2024

Versión: 00

SISTEMA DE GESTION HSEQ

PAGINA 1 DE 1

ANEXO No.2

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900002220	8	ASO JUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 17 n 4 12	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1962571019	949596631	E	2025/12/04	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	\$5,427,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No	Identificación	Nombre	in	re	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta</

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$692,500	\$0	\$0	\$692,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,260,300	\$0	\$0	\$1,260,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$849,600	\$0	\$0	\$849,600
COLMEHA	14-25	800,226,175	3	6	\$849,600	\$0	\$0	\$849,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$488,400	\$0	\$0	\$488,400
COMFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$488,400	\$0	\$0	\$488,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,525,700	\$0	\$0	\$1,525,700
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$541,000	\$0	\$0	\$541,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	4	\$984,700	\$0	\$0	\$984,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$366,400	\$0	\$0	\$366,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$366,400	\$0	\$0	\$366,400
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$244,200	\$0	\$0	\$244,200
SEHA	PASEHA	899,999,034	1	6	\$244,200	\$0	\$0	\$244,200
TOTAL				6	\$5,427,100	\$0	\$0	\$5,427,100
