



INFORME DE SUPERVISION No.1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Veinticuatro (24) de septiembre hasta el Veintinueve (29) de diciembre de 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%
INFORME	Informe número 1.	
Datos del supervisor		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FARID JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ	
DEPENDENCIA	Secretaria de Planeación e Infraestructura	
CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Datos del contrato supervisado		
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA N° MP-MC-035-2025	
OBJETO: “SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN ARAS DEL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”.		
CONTRATISTA:	ANA PAULINA LOZADA DE PLATA	
NIT:	57.300.574 de Pivijay, Magdalena	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.00) MCTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que impartirá el Secretario de Planeación e Infraestructura de Pivijay Magdalena, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta de su liquidación.	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera. 1- UN ANTICIPO; equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, previa constitución y aprobación de las pólizas de garantías. Y el otro cincuenta por ciento (50%) por medio de actas parciales, previa certificación del supervisor del cumplimiento de los servicios	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



	registrados en las actas, y recibo a satisfacción y verificación de los pagos de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Veinticuatro (24) de septiembre del 2025.

- **Pólizas:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO S.A”

POLIZA N.º: 85-44-101140663

FECHA DE EXPEDICION: 24 de septiembre de 2025.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	24/09/2025	30/04/2026	\$3.900.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24/09/2025	30/04/2026	\$19.500.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/09/2025	30/04/2026	\$3.900.000,00

Estado del contrato: En Ejecución.

NOTA:

- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**”
- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**” las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Acta de aprobación de póliza de fecha 24 de septiembre de 2025.

- **ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO.**



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



Los recursos que se destinarán la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIVIJAY MAGDALENA para la ejecución del proyecto por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.00) MCTE** cuyos desembolsos serán así:

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMA DO	FECHA DE DOCUMENTACION PARA PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO (ANTICIPO 50%)	\$ 19.500.000	30 - septiembre - 2025	\$ 19.500.000
SEGUNDO PAGO QUE EQUIVALE AL 100%	\$ 19.500.000		\$ 19.500.000
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			\$ 39.000.000

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% ENTREGADO
1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	1	100%
1,2	Gravilla 3/4"	M3	1	100%
1,3	Arena lavada	M3	1	100%
1,4	Varillas 1/2"	UND	1	N/P
1,5	Varillas 1/4"	UND	1	100%
1,6	Varillas 3/8"	UND	1	100%
1,7	Alambre quemado	KG	1	100%
1,8	Cajas de puntillas de 2-1/2"	UND	1	N/A
1,9	Cajas de puntillas de 3"	UND	1	100%
1,10	Cajas de puntillas de 4"	UND	1	100%
1,11	Tablas de 3m	UND	1	100%
1,12	Listones de 2x2	UND	1	N/A
1,13	Alfajia de Largo=4.5ML ,Ancho=0.1016ML, Alto=0.0508ML	UND	1	100%
1,14	Bloques de cemento No 10	UND	1	100%
1,15	Ladrillo común doble	UND	1	100%
1,16	Interruptor sencillo	UND	1	100%



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



1,17	Interruptor doble	UND	1	N/A
1,18	Toma corriente sencillo	UND	1	100%
1,19	Toma corriente doble	UND	1	100%
1,20	Cable No 12	UND	1	100%
1,21	Cable No 14	UND	1	N/A
1,22	Plafón de losa	UND	1	N/A
1,23	Bombillo led de 30w	UND	1	N/A
1,24	Tacos de 15 amperios	UND	1	100%
1,25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	1	100%
1,26	Teja ondula en fibrocemento No 6	UND	1	100%
1,27	Teja ondula en fibrocemento No 4	UND	1	100%
1,28	Caballote fijo 15G	UND	1	100%
1,29	Amarre de lamina	UND	1	100%
1,30	Puerta metalica 2x1 mts	UND	1	100%
1,31	puerta estamborada en madera de 2x0.90 mts	UND	1	N/A
1,32	Ventanas metálicas con vidrio de medidas 1x1 mts	UND	1	100%
1,33	Tubo conduit de 1/2"	UND	1	100%
1,34	Curva conduit de 1/2"	UND	1	100%
1,35	Caja eléctrica 4x2	UND	1	N/A
1,36	Caja electrica octagonal	UND	1	N/A
1,37	Varilla rocada 3/8	UND	1	100%
1,38	Pintura vinilo tipo 1	GALÓN	1	100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM 1,1 Cemento portland uso general x 50kg	ITEM 1,2 Gravilla 3/4"



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ITEM 1,3 Arena lavada





ITEM 1,5 Varillas 1/4"



ITEM 1,6 Varillas 3/8"



ITEM 1,7 Alambre quemado

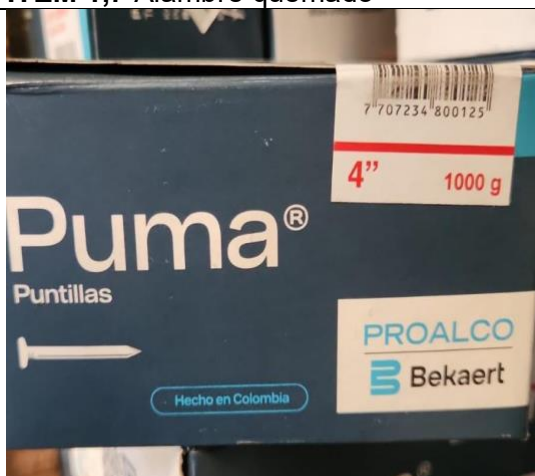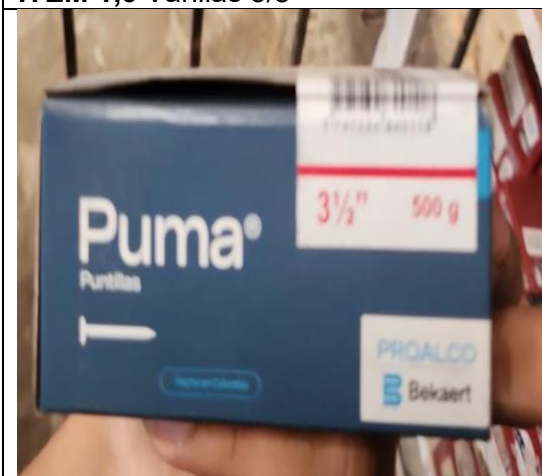

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ITEM 1,9 Cajas de puntillas de 3"	ITEM 1,10 Cajas de puntillas de 4"
	
ITEM 1,11 Tablas de 3m	ITEM 1,13 Alfajia de Largo=4.5ML ,Ancho=0.1016ML, Alto=0.0508ML
	
ITEM 1,14 Bloques de cemento No 10	ITEM 1,15 Ladrillo común doble



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ITEM 1,16 Interruptor sencillo	ITEM 1,19 Toma corriente doble
ITEM 1,20 Cable No 12	ITEM 1,25 Teja ondula en fibrocemento No 8





ITEM 1,26 Teja ondula en fibrocemento No 6



ITEM 1,28 Caballete fijo 15G



ITEM 1,29 Amarre de lamina



ITEM 1,30 Puerta metalica 2x1 mts



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ITEM 1,32 Ventanas metálicas con
vidrio de medidas 1x1 mts



ITEM 1,33 Tubo conduit de 1/2"



ITEM 1,34 Curva conduit de 1/2"



ITEM 1,37 Varilla rocada 3/8



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ACTAS DE ENTREGA

República de Colombia Departamento del Magdalena Municipio de Pivijay Secretaría de Planeación E Infraestructura			
Código: S.P.I. Año en Vigencia: 2025 Versión: 1 Página: 1 de 9			
Alcaldía de Pivijay Nit.: 891780050-7			
ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 1			
ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ		
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA MES AÑO
OBJETO:	"CONSTITUCIÓN DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY -MAGDALENA"		
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1.25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	11
1.25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	7
1.3	Arena lavada	M3	10
<i>Maria Teresa Bonett</i> ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			
QUIEN ENTREGA:		FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDOS			
FARID JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ		<i>Farid P.A.</i>	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			
QUIEN RECIBE RECIBE:		FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDOS			
Saul Hernández Silva		<i>Saul H.S.</i>	
C.C 9.876.775			
DIRECCIÓN: CRA 15 #12			
Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co pivijay-magdalena.gov.co			



Nit.: 891780050-7

Secretaría de Planeación E
Infraestructura

Versión: 1
Página: 2 de 9

ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 2				
ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA	MES AÑO
OBJETO	"CONSTITUCION DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY -MAGDALENA"			
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			

ITE M	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDA D
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	30
1,2	Gravilla 3/4"	M3	8
1,3	Arena lavada	M3	10
1,15	Ladrillo común doble	UND	200
1,14	Bloques de cemento No 10	UND	350
1,13	Alfajía de Largo=4.5ML, Ancho=0.1016ML, Alto=0.0508ML	UND	4
1,9	Cajas de puntillas de 3"	UND	1
1,25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	6
1,26	Teja ondula en fibrocemento No 6	UND	4
1,29	Amarre de lamina	UND	30
1,31	puerta estamborada en madera de 2x0.90 mts	UND	1
1,32	Ventanas metálicas con vidrio de medidas 1x1 mts	UND	1
1,6	Varillas 3/8"	UND	16
1,5	Varillas 1/4"	UND	6
1,7	Alambre quemado	KG	4

ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT
APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Miguel Cantillo Ocasio C.C. 7.590.238.	
DIRECCION:	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
pivijay-magdalena.gov.co



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 3					
ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"CONSTITUCIÓN DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY -MAGDALENA"				
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	53
1,2	Gravilla 3/4"	M3	8
1,3	Arena lavada	M3	10
1,15	Ladrillo común doble	UND	500
1,14	Bloques de cemento No 10	UND	1300
1,37	Varilla rocada 3/8	UND	4
1,13	Alfaja de Largo=4.5ML, Ancho=0.1016ML, Alto=0.0506ML	UND	12
1,10	Cajas de puntillas de 4"	UND	1
1,25	Teja onduia en fibrocemento No 6	UND	22
1,6	Varillas 3/8"	UND	49
1,5	Varillas 1/4"	UND	28
1,29	Amarre de lamina	UND	66
1,20	Cable No 12	MT	200
1,33	Tubo conduit de 1/2"	UND	10
1,19	Toma corriente doble	UND	7
1,16	Interruptor sencillo	UND	3
1,11	Tablas de 3m	UND	8
1,7	Alambre quemado	KG	4

 Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
 secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
 pivijay-magdalena.gov.co



Alcaldía de
Pivijay

Nit.: 891780050-7

República de Colombia
Departamento del Magdalena
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA**

Código: S.P.I.
Año en Vigencia: 2025
Versión: 1
Página: 13 de 17

República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Pivijay
Secretaría de Planeación e
Infraestructura

Código: S.P.I.
Año en Vigencia: 2025
Versión: 1
Página: 4 de 9

Nit.: 891780050-7

1,31	Puerta metálica 2x1 mts	UND	3
1,32	Ventanas metálicas con vidrio de medidas 1x1 mts	UND	3

Maria Teresa Bonett
ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT
APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ	<i>Farid José Pérez Álvarez</i>
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Lacides Fonseca Ibáñez	
C.C 7.590.956	
DIRECCION: Calle 12 #25-47	

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
pivijay-magdalena.gov.co



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Pivijay
Secretaría de Planeación e
Infraestructura

Código: S.P.I.
Año en Vigencia: 2025
Versión: 1
Página: 7 de 9

Nit.: 891780050-7

ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 6

ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"CONSTITUCION DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY -MAGDALENA"				
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	35
1,2	Gravilla 3/4"	M3	3
1,3	Arena lavada	M3	10
1,14	Bloques de cemento No 10	UND	500
1,15	Ladrillo común doble	UND	150
1,13	Alfajia de Largo=4.5ML ,Ancho=0.1016ML, Alto=0.0508ML	UND	4
1,9	Cajas de puntillas de 3"	UND	1
1,25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	4
1,26	Teja ondula en fibrocemento No 6	UND	4
1,6	Varillas 3/8"	UND	23
1,37	Varilla rocada 3/8	UND	20
1,29	Amarre de lamina	UND	40
1,31	Puerta metálica 2x1 mts	UND	1
1,32	Ventanas metálicas con vidrio de medidas 1x1 mts	UND	1

ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT
APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ	
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Manuela de Jesús Cantillo Fontalvo	
C.C 57.302.798	
DIRECCION: Calle 4a - Cra 28 esquina	

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
pivijay-magdalena.gov.co



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Pivijay
Secretaría de Planeación e
Infraestructura

Código: S.P.I.
Año en Vigencia: 2025
Versión: 1
Página: 8 de 9

Nit.: 891780050-7

ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 7

ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"CONSTITUCIÓN DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY -MAGDALENA"				
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				

ITE M	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1.31	Puerta metálica 2x1 mts	UND	2
1.32	Ventanas metálicas con vidrio de medidas 1x1 mts	UND	3

Maria Teresa Bonett
ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT
APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ	<i>Farid P.A.</i>
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Maria Valencia Molina	<i>Maria</i>
C.C 26.719.811	
DIRECCION: Calle 24 cra24	

📍 Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
✉️ secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
🌐 pivijay-magdalena.gov.co



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Pivijay
Secretaría de Planeación E
Infraestructura
NIT.: 891780050-7

Código: S.P.I.
Año en Vigencia: 2025
Versión: 1
Página: 9 de 9

ACTA ENTREGA DE MATERIALES No. 8

ELABORADO POR:	FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"CONSTITUCIÓN DEL BANCO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA"				
LUGAR DE REUNIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1,25	Teja ondula en fibrocemento No 8	UND	12
1,26	Teja ondula en fibrocemento No 6	UND	8
1,13	Alfajía de Largo=4.5ML ,Ancho=0.1016ML, Alto=0.0508ML	UND	10
1,14	Bloques de cemento No 10	UND	300
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	5
1,6	Varillas 3/8"	UND	4
1,5	Varillas 1/4"	UND	2
1,29	Amarre de lamina	UND	32
1,28	Caballote fijo 15G	UND	4
1,9	Cajas de puntillas de 3"	UND	2

Maria Teresa Bonett
ELABORÓ: MARIA TERESA BONETT
APOYO PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ	<i>Farid RA</i>
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Angelica Orozco Cantillo	<i>ANGELICA OROZCO</i>
C.C 53.308.920	
DIRECCION: Calle 23/CRA 17.	

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
 secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co
 pivijay-magdalena.gov.co



CONCLUSIÓN

De acuerdo con la supervisión realizada al contrato de suministro, todas las actividades y entregas correspondientes al suministro de materiales fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas. Las actividades alcanzaron un avance físico y financiero del 100%, evidenciando el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual por parte del contratista.

FARID PEREZ ALVAREZ

Secretario de Planeación E Infraestructura



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co
