



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TORRE DE CONTROL. Nivelación manual del suelo, mediante rastrillado y redistribución del material para obtener la cota y planitud requerida.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Vaciado extendido y compactación de material de recebo en bloque técnico.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Medición de la resistencia eléctrica del suelo como parte del proceso de verificación del Sistema de Puesta a Tierra y apantallamiento.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Instalación del cableado del sistema de puesta a tierra y apantallamiento.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



Descripción: SSEI. Relleno con material de recebo en las zanjas previamente excavadas para la instalación del cable de cobre de puesta a tierra y fundición del solado sobre dichas canalizaciones.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: SSEI. Medición de la resistencia eléctrica del suelo como parte del proceso de verificación del Sistema de Puesta a Tierra y apantallamiento.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: SSEI. Corte en solado para la instalación de redes sanitarias, mediante apertura de regatas.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de la primera, segunda y tercera capa de material de mejoramiento en la esquina del costado oriental, mediante extendido, nivelación y compactación de cada capa.



Descripción: PLATAFORMA. Instalación de 3 líneas de geotextil de 60m x 3.85m en el costado oriental.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de material de mejoramiento sobre el geotextil previamente instalado en el costado oriental.



Descripción: VÍA EJE LA-07. Conformación de la primera capa de material de mejoramiento, mediante extendido, nivelación y compactación entre las abscisas K0+060 y K0+120.



Descripción: VÍA EJE LA-07. Conformación de la primera capa de material de mejoramiento, mediante extendido, nivelación y compactación entre las abscisas K0+120 y K0+160.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7



15:13

17 de nov 2025
Lun

Aeropuerto San Luis, 524547 Aldana
Empresa: consorcio Aeroipiales 2025
Nombre:

Descripción: OTROS. Toma de densidades para liberación de segunda y tercera capa de material de mejoramiento en el costado oriental de plataforma



09:55

20 de nov 2025
Jue

Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana,
Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño
Empresa: consorcio Aeroipiales 2025
Nombre:

Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, mediante el ensayo del cono y arena en plataforma sur oriental para la liberación de la cuarta capa de material de mejoramiento.


REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TERMINAL. Se realizó el cubrimiento del material granular



Descripción: TERMINAL. Se ejecutaron actividades de extendido, nivelación y compactación de la cuarta capa bloque 3, comprendida entre los ejes horizontales G-L y los ejes verticales 0-6

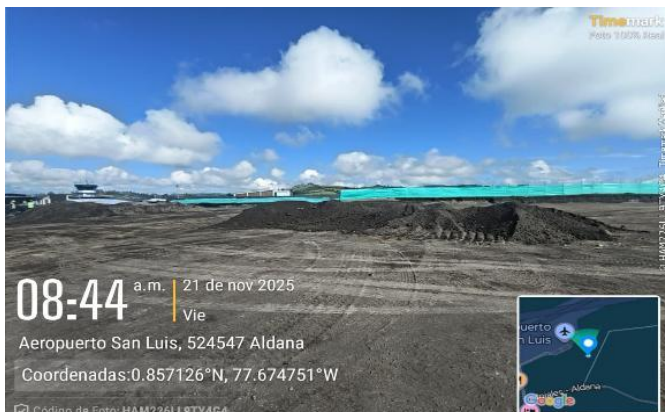

Descripción: TERMINAL. Se continuo actividades de extendido, nivelación y compactación de la cuarta capa bloque 3, comprendida entre los ejes horizontales G-L y los ejes verticales 0-6



Descripción: Eje vial LT-04. se dio continuidad a la prueba acordada entre la interventoría y el contratista para verificar comportamiento mecanico de materiales



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE


7



Descripción: Eje vial LT-04 mejoramiento con rajón en primera capa de bahía frente a terminal de la abscisa K0+140 a K0+240.




Descripción: Eje vial LT-04 desde la abscisa K0+000 hasta la K0+125, se efectuaron labores de limpieza

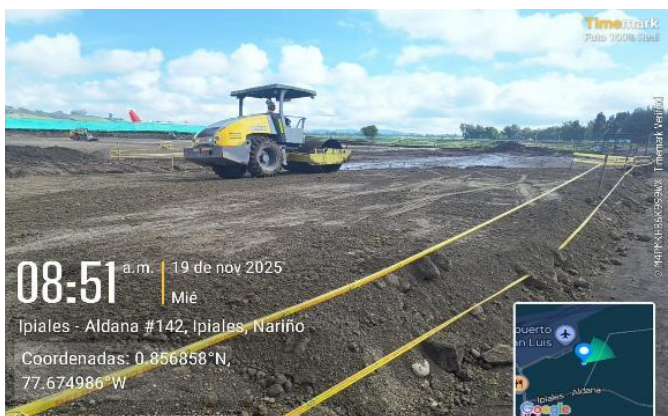

Descripción: Eje vial LT-04 Se realizo compactación y mejoramiento de via LT-04 en K0+170 a KO+200



Descripción: Eje vial LT-05 desplazamiento de la red electrica y fibra optica existente a la zona verde del CD (Glorieta) .

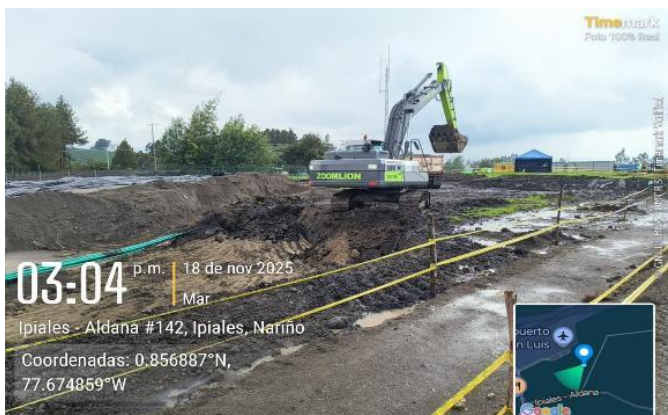

Descripción: Parqueadero usuarios .excavación en el sector de parqueaderos de usuarios paralelo al eje vial LT-04 desde la abscisa K0+220 a K0+200.



Descripción: Parqueadero usuarios . mejoramiento con rajón entre las abscisas K0+230 a K0+223 y su respectivo sello de rajón con un volumen 28 m3



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7



10:13 a.m. | 20 de nov 2025
Jue

Ipiales-Aldana, 524547 Aldana

Coordenadas: 0.857884°N, 77.675480°W

Código de Foto: M6DWG5YBGATMBW

Descripción: Parquedero usuarios • extensión y compactación de la primera capa entre las abscisas k0+047 y k0+125, con una longitud de 78 metros con un ancho de 13 metros y un espesor de 0.25 metros con un volumen 253.5 m3



08:47 a.m. | 18 de nov 2025
Mar

Aldana-Ipiales #9-25, Aldana, Caserio
San Marcos, Aldana, Nariño

Coordenadas: 0.856997°N,
77.676626°W

Código de Foto: X0P6THG1JWVWXR

Descripción: Eje vial LT-05 se ejecutaron labores de limpieza, retiro de material suelto y adecuación de la superficie.



08:59 a.m. | 18 de nov 2025
Mar

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.856350°N,
77.675088°W

Código de Foto: R6MWY0CIRP6T14

Descripción: OTROS instalación de alambre de púas en el cerramiento ubicado en el costado sur, colindante con el predio del señor Ignacio Benavides..



09:03 a.m. | 18 de nov 2025
Mar

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.856429°N,
77.674715°W

Código de Foto: C00CKWBA303333

Descripción: OTROS formateo, nivelación y disposición del refuerzo metálico correspondiente a la futura fundición de la viga de cerramiento del sector sur



09:00 a.m. | 18 de nov 2025
Mar

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.856359°N,
77.674996°W

Código de Foto: M33WAB0UPU6P6P

Descripción: OTROS fundición de la viga del cerramiento sector sur colindante al predio del señor Yuri Benavides.



04:13 p.m. | 19 de nov 2025
Jue

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.853092°N,
77.671671°W

Código de Foto: WCHX14973E61E04

Descripción: OTROS • Se instalo 30 metros de malla eslabonada y encauchetada en cerramiento oriental colindante al predio del señor yuri Benavides desde la abscisa K0+276 a K0+246



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

18 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

15/11/2025 - 21/11/2025

PÁGINA

1

DE

7



03:32

p.m. 19 de nov 2025

Mié

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.856701°N,
77.675462°W

Código de Foto: CFY9WUCR6EVL

Descripción: OTROS • desmote y demolición de la viga de cerramiento existente en el sector sur-occidental, ubicada en la parte posterior de los cuartos técnicos.



08:45

a.m. 20 de nov 2025

Jue

Aeropuerto San Luis, 524547 Aldana

Coordenadas: 0.857552°N, 77.675518°W

Código de Foto: K81M01BUT7662BMS

Descripción: OTROS • cerramiento existente, ubicada en el sector sur posterior a los cuartos técnicos, se llevaron a cabo labores de nivelación y compactación del terreno



04:21

p.m. 20 de nov 2025

Jue

Coordenadas: 0.856860°N, 77.677477°W

Código de Foto: RTPKAMRFBKUCM

Descripción: OTROS: Parqueadero capilla se realizaron obras de descapote, excavación extensión y mejoramiento con rajón



02:35

p.m. 21 de nov 2025

Vie

Aeropuerto San Luis, 524547 Aldana

Coordenadas: 0.856907°N, 77.676981°W

Código de Foto: 2WCKEAAVY168AKM

Descripción: OTROS: Parqueadero capilla se realizaron obras de compactación del mejoramiento de rajón



03:56

p.m. 21 de nov 2025

Vie

Ipiales - Aldana #142, Ipiales, Nariño

Coordenadas: 0.856688°N, 77.671706°W

Descripción: OTROS: nivelación y excavación y adecuación del terreno para la futura instalación del cerramiento sur occidental colindante a predio COMODATO 1
