



I. INFORMACIÓN GENERAL	
------------------------	--

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretenden realizar: MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad de desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias tales como Actualización de estudios y diseños, Limpieza de la zona del muelle (incluye remoción de escombros y de basura), Rocería de la vegetación en la zona del muelle, Demolición de estructuras en concreto (incluye cargue, transporte y disposición final de escombros), Suministro e instalación de barandas metálicas perimetrales de protección con una altura libre de 0.90 m. Entre otras actividades.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	392.462.540,00	90,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	392.462.540,00	90,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	11.793.316,00	2,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.793.316,00	2,73%

SI	NO
	X

[illegible]

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	\$ -

Meta Física Programada %	90,85%	Avance o Atraso Físico %	90,85%	MAQUINARIA Y EQUIPO
Meta Física Ejecutada %	90,85%			

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
-----------------------	---

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
Ocupación de cauces:	X	NO	N/A
VERTIENTES:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES:	
----------------	--

[illegible]

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En el periodo en mención no aplica


TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:	N/A	ESTIMACIÓN DE PRECIO A ADQUIRIR POR UNIDAD DE MEDIDA: \$1.000.000,00
------------------------------------	-----	--

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE MEJORAMIENTO NO APLICA LA COMPRA DE PREDIOS N/A

Se continua con la fundicion de losas de las escalas y de acceso, instalacion, demolicion de estructuras existentes, instalacion de acero de refuerzo de las losas

Se continua con la fundicion de losas de las escalas y de acceso, instalacion, demolicion de estructuras existentes, instalacion de acero de refuerzo de las losas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

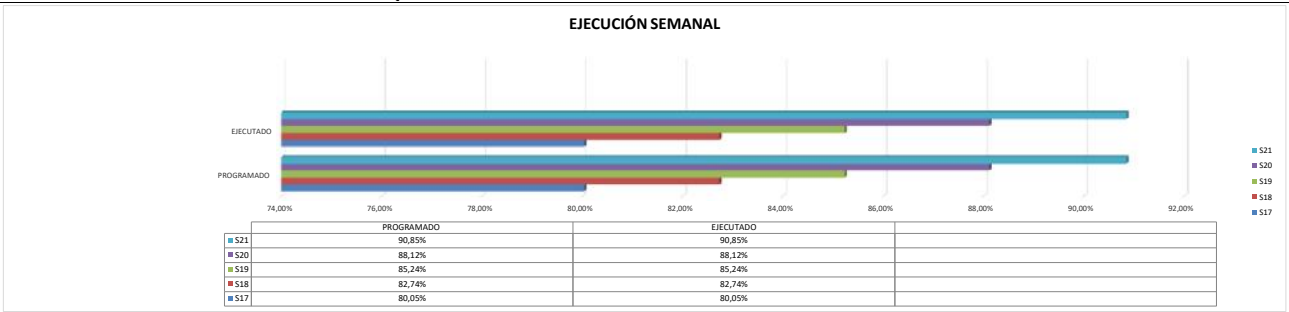

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se avanza con lo correspondiente a la actualización de diseños

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

REINALDO BERMUDEZ

2220-2417 (2010)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.
