

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

INFORME DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL No. 06 DE OBRA
Acta parcial No. 06 de obra | Del 01/FEBRERO/2026 Al 6/MARZO/2026


CONTRATO DE OBRA No. HMM-CO-01-2025
CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ –
BOYACÁ”

CONTRATISTA: CONSORCIO E.S.E. MONGUÍ 2025
Rep. Legal: DANILO PINEDA CHAPARRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No HMM-CO-02-2025
CUYO OBJETO ES “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL
MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ.”

CONTRATISTA: CONBASES S.A.S.
Rep. Legal: CLARA EDITH LOSADA GUAYARA

MONGUI, MARZO DE 2026

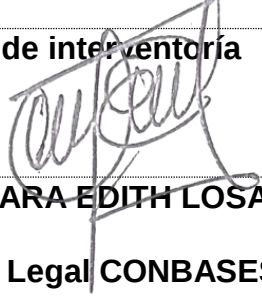Contratista de interventoría	Vo. Bo. Supervisor
Firma: 	Firma:
Nombre: CLARA EDITH LOSADA GUAYARA	Nombre: ADRIANA MILENA NOVA VARGAS
Cargo: Rep. Legal CONBASES S.A.S.	Cargo: GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	INFORME EJECUTIVO DEL	5
2.1.	INFORMACIÓN GENERAL	5
2.2.	ESTADO DE PERMISOS, LICENCIAS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS.....	5
2.3.	INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	6
2.4.	CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	6
2.5.	CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA	11
2.6.	CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	11
2.7.	CONTROL LEGAL DEL CONTRATO	12
2.7.1.	POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO	12
2.7.2.	POLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Y REINICIO No. 01	13
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	14
3.1.	LOCALIZACIÓN	14
3.2.	CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	15
4.	CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA	16
4.1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	16
4.2.	NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.....	17
4.3.	SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.....	17
4.3.1.	POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO	17
4.3.2.	POLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Y REINICIO No. 01	18
4.4.	CONTROL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO	19
4.5.	IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 01.....	20
4.6.	IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS – MODIFICATORIO No. 02....	25
4.7.	IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 03.....	26
4.8.	IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 04.....	30
4.9.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.....	35
4.10.	CONTROL DE PERSONAL.....	37

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrcecedes.gov.co E-Mail: eselasmrcecedes@yahoo.es

Código postal: 152201

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

4.11.	VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	39
4.12.	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.....	41
4.13.	CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.....	42
4.14.	CONTROL DE CALIDAD	42
4.15.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	45
4.16.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	45
4.17.	COMITÉS DE SEGUIMIENTO.....	46
4.18.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	47
4.19.	CONCLUSIONES – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	48
4.20.	CONCLUSIONES – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).....	49
4.20.1.	3. CONCLUSIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA	50
4.21.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	51

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información técnica correspondiente al seguimiento técnico, administrativa, financiera y contable en la ejecución del contrato de obra No. HMM-CO-01-2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ” en el periodo comprendido desde 01 de febrero 2026 a 6 de marzo de 2026

El informe describe detalladamente las actividades realizadas para el cumplimiento de las metas del objeto del contrato cumpliendo así el objetivo de informar la entidad contratante supervisora sobre el estado de la obra con relación a los aspectos generales y particulares en la ejecución del proyecto.

“Atención con Calidez, Bienestar para todos”

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

2. INFORME EJECUTIVO DEL

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	6 de marzo de 2026	INFORME No.	Acta parcial 06 de obra
---------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

PERIODO No.	06	DEL:	1 de febrero de 2026	AL:	6 de marzo de 2026
--------------------	----	-------------	-----------------------------	------------	---------------------------

NUMERO DEL CONTRATO:	HMM-CO-02-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ.”
CONTRATISTA:	CONBASES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (\$ 646.119.306) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 MESES
FECHA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 01	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO No. 01	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION	VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 2027

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MONGUI-BOYACA, DIVINA MISERICORDIA, Cra. 5 # 7-00
-----------------------------------	---

2.2. ESTADO DE PERMISOS, LICENCIAS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

Permiso, Licencia o Autorización	Numero	Fecha	Observaciones
AUTORIZACION DE LA DISPOSICIÓN DE RCD (RESIDUOS DE	01	JUNIO - 2025	La disposición de los escombros y tierra negra de la demolición y excavación

“Atención con Calidez, Bienestar para todos”

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Permiso, Licencia o Autorización	Numero	Fecha	Observaciones
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN)			se hizo en predios autorizados por la alcaldía municipal
SOLICITUD DE PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA	SPI-0538-2025	17 - SEPTIEMBRE - 2025	Primera fundida de concreto de cimentación de sótano planta baja.
SOLICITUD DE PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA	SPI-0576-2025	01 - OCTUBRE - 2025	Segunda parte de fundida de concreto de cimentación de sótano planta baja.
SOLICITUD DE PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA	No Aplica	17 - OCTUBRE - 2025	Descargue de formaleta. Carga pesada
SOLICITUD DE PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA	SPI-0602-2025	21 - OCTUBRE - 2025	Fundida de 14 columnas internas.
SOLICITUD DE PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA	SPI-0617-2025	27 - OCTUBRE - 2025	Fundida de primera pantalla de muro de contención del sótano.

2.3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	Valor Programado Aprobado	Valor Invertido con Soportes	Saldo por Invertir
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SEGUIMIENTO A RUTA CRÍTICA		PROGRAMADO			EJECUTADO					OBSERVACIONES
Item	Descripción Actividades	Duración (Días)	Inicio	Fin	Inicio Real	Fin Real	Duración Real o A la Fecha	% Ejecución	Días de (+) Avance / (-) Retraso	
Inicio	ACTA DE INICIO	609	22/05/2025	21/01/2027						
1	PRELIMINARES	400	8/05/2025	12/06/2026						
	FASE 1	400	8/05/2025	12/06/2026						
1.01	CAMPAMENTO 36 M2	10	22/05/2026	1/06/2026				0%		
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	213	27/05/2025	26/12/2025	23/07/2025	24/07/2025	2	81%		

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ							Código: GAF-F-019	
	MACROPROCESO: DE APOYO							Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							Fecha: 05/06/2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA								

1.03	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	8	3/06/2025	11/06/2025	-	-	-	-		
1.04	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM)DISTANCIA DE 1 A 5 KM	13	1/07/2025	14/07/2025	24/07/2025	30/09/2025	69	0%		
1.05	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO	12	30/05/2025	11/06/2025	19/06/2025	21/06/2025	3	74%		
1.06	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA DE BARRO	12	26/06/2025	8/07/2025	26/06/2025	28/06/2025	3	66%		
1.07	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	5	30/05/2025	4/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	2	59%		
1.08	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	11	26/06/2025	7/07/2025	28/06/2025	28/06/2025	1	14%		
1.09	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	9	3/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	12/07/2025	1	24%		
1.10	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	13	30/05/2025	12/06/2025	12/07/2025	12/07/2025	1	60%		
1.11	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO)	13	22/05/2025	4/06/2025	12/07/2025	12/07/2025	1	37%		
1.12	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E =0.15 mts.	13	17/07/2025	30/07/2025	7/07/2025	11/07/2025	5	64%		
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETES	11	8/05/2025	19/05/2025				-		
1.14	DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO	13	8/05/2025	21/05/2025				-		
1.15	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	7	11/06/2025	18/06/2025	1/07/2025	3/07/2025	3	5%		
1.16	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	13	20/06/2025	3/07/2025	14/07/2025	16/07/2025	3	53%		
1.17	DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO	11	3/07/2025	14/07/2025	7/07/2025	11/07/2025	5	41%		
1.18	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	4	4/08/2025	8/08/2025	4/07/2025	5/07/2025	2	55%		
1.19	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 25cm- 35cm	11	17/07/2025	28/07/2025				-		
2	CIMENTACIÓN	317	20/08/2025	3/07/2026						
	FASE 1	286	20/08/2025	2/06/2026						
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	175	20/08/2025	11/02/2026	12/08/2025	10/09/2025	30	5%		
2.02	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	153	17/09/2025	17/02/2026	17/09/2025	6/10/2025	20	59%		
2.03	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	152	18/09/2025	17/02/2026	17/09/2025	6/10/2025	20	63%		
2.04	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)	147	9/09/2025	3/02/2026	29/08/2025	30/09/2025	33	79%		
2.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	84	10/03/2026	2/06/2026				-		
2.06	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	83	26/11/2025	17/02/2026	26/11/2025		EN EJECUCION	29%		
3	ESTRUCTURAS	533	2/09/2025	17/02/2027						
	FASE 1	533	2/09/2025	17/02/2027						

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ							Código: GAF-F-019	
	MACROPROCESO: DE APOYO							Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							Fecha: 05/06/2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA								

3.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	139	1/10/2026	17/02/2027				-		
3.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M.	142	1/09/2026	21/01/2027	29/11/2025		EN EJECUCION	1%		
3.03	ESCALERAS MACIZA 28 MPa - (4000 PSI) M3	57	1/03/2026	27/04/2026						
3.04	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	15	24/11/2026	9/12/2026						
3.05	PLACA ENTREPISO IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.50 mts. 28 MPa - (4000 PSI)	80	17/02/2026	8/05/2026	30/01/2026		EN EJECUCION			Este item no cumple con lo solicitado en planos estructurales ya se proyectó el modificadorio a un item acorde por ahora se mide en este item el seguimiento de programacion
3.06	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.5 MPa - (3500 PSI)	16	14/07/2026	30/07/2026						
3.07	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA METALICA	239	23/09/2025	20/05/2026	20/10/2025	22/10/2025	3	37%		
3.08	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	15	24/03/2026	8/04/2026						
3.09	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	44	23/03/2026	6/05/2026						
3.10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	183	2/09/2025	4/03/2026	29/08/2025	20/10/2025	53	56%		
3.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa	28	24/11/2026	22/12/2026				-		
3.12	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H=3,5 MTS	23	27/10/2026	19/11/2026	29/10/2025	29/11/2025	32	-		
22	ITEMS NO PREVISTOS	622	15/05/2025	27/01/2027						
	FASE 1	0								
22.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	47	16/05/2025	2/07/2025	16/06/2025	17/06/2025	2	70%		
22.02	DESMONTE DE LAVAMANOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS	18	16/06/2025	4/07/2025	16/06/2025	17/06/2025	2	74%		
22.03	DESMONTE DE DUCHAS	17	16/06/2025	3/07/2025	16/06/2025	17/06/2025	2	80%		
22.04	DESMONTE DE POCETAS EN ACERO INOXIDABLE	7	18/06/2025	25/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1	64%		
22.05	DESMONTE REJA METÁLICA	14	11/06/2025	25/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	1	81%		
22.06	DESMONTE DE VIDRIOS.	16	9/06/2025	25/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1	54%		
22.07	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	15	18/06/2025	3/07/2025	18/06/2025	18/06/2025	1	58%		
22.08	DESMONTE DE FAROLES DECORATIVOS	14	11/06/2025	25/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	1	100%		
22.09	DESMONTE DE BARANDAS EN TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2"	17	9/06/2025	26/06/2025	9/06/2025	11/06/2025	3	70%		

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ							Código: GAF-F-019		
	MACROPROCESO: DE APOYO							Versión: 01		
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							Fecha: 05/06/2025		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA									

22.10	DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES (INCLUYE BREAKERS, CABLEADO)	17	15/07/2025	1/08/2025	18/06/2025	18/06/2025	1	45%		
22.11	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA (ARMARIOS)	15	9/07/2025	24/07/2025	18/06/2025	18/06/2025	1	83%		
22.12	DESMONTE DE GUARDACAMILLAS	24	15/07/2025	8/08/2025	18/06/2025	18/06/2025	1	100%		
22.13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	14	15/07/2025	29/07/2025	1/07/2025	3/07/2025	3	100%		
22.14	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	16	15/07/2025	31/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	2	41%		
22.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	20	15/07/2025	4/08/2025	25/07/2025	1/08/2025	8	80%		
22.16	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	17	25/07/2025	11/08/2025	25/07/2025	1/08/2025	8	100%		
22.17	RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM DE DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M	14	25/07/2025	8/08/2025	17/07/2025	22/07/2025	6	77%		
22.18	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	0								
22.19	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TEJA DE ZINC H = 2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	17	15/07/2025	1/08/2025	12/06/2025	14/06/2025	3	63%		
22.20	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI)	14	15/07/2025	29/07/2025						
22.21	MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA	16	15/07/2025	31/07/2025						
22.22	SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 1) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7'; H < = 1.90 M. (INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLÁSTICA)	21	15/07/2025	5/08/2025						
22.23	DEMOLICIÓN DE ROCA UTILIZANDO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO PARA POZOS, ZANJAS PRINCIPALES Y DESCARGAS (CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5KM)				9/09/2025	22/09/2025		69%		
22.24	LOSA MACIZA PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21Mpa (3000PSI) H= 15CM.	257	15/05/2026	27/01/2027						
22.25	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	86	14/07/2026	8/10/2026	12/11/2025	27/01/2026		100%		
22.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 8 PARA SEPARACIÓN	28	14/04/2026	12/05/2026	2/12/2025		EN EJECUCION	15%		

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ							Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO							Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA							

	SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES										
22.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V=0.15	19	29/11/2025	18/12/2025	26/12/2025	26/12/2025		61%			
22.28	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa - (4000PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	13	10/12/2025	23/12/2025	5/11/2025		EN EJECUCION	80%			
22.29	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	3	24/01/2026	27/01/2026	28/11/2025		EN EJECUCION	100%			
22.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	325	2/12/2025	23/10/2026	3/12/2025	11/12/2025		100%			
22.31	DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA).	21	27/11/2025	18/12/2025	3/12/2025	11/12/2025		100%			
22.32	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON SISTEMA ASFALTICO PARA IMPERMEABILIZAR ESTRUCTURAS ENTERRADAS (DOS MANOS)	21	27/11/2025	18/12/2025	1/12/2025	4/12/2025		100%			
Fin				20/05/2026							
TOTALES		18332	22/05/2025	31/07/2075			358		0		

Tiempo de Ejecución Contractual (en Días):	609
Tiempo de Ejecución a la Fecha (en Días)	256
Tiempo por Ejecutar (en Días):	353

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

2.5. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Inicial	\$11,966,541,300.00				
Valor Adicional					
Anticipo XX%					
Valor Acta Parcial No. 1		\$ 318.549.891.00	N/A	\$ 318.549.891.00	2.66%
Valor Acta Parcial No. 2		\$ 316.096.135.00	N/A	\$ 316.096.135.00	2.64%
Valor Acta Parcial No. 3		\$ 467,094,527.00	N/A	\$ 467,094,527.00	3.90%
Valor Acta Parcial No. 4		\$ 410,512,679.00	N/A	\$ 410,512,679.00	3.43%
Valor Acta Parcial No. 5		\$ 424,094,633.00	N/A	\$ 424,094,633.00	3.54%
Valor Acta Liquidación Final					
Valor Ejecutado		\$ 1,936,347,865.00		\$ 1,936,347,865.00	16.18%
Valor Por Ejecutar		\$10,030,193,435.00		\$10,030,193,435.00	83.82%
Valor No Ejecutado					
SUMAS IGUALES	\$11,966,541,300.00	\$11,966,541,300.00		\$11,966,541,300.00	100%

2.6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Inicial	\$ 646,119,306.00				
Valor Adicional					
Anticipo XX%					

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Acta Parcial No. 1		\$ 129,223,861.00	N/A	\$ 129,223,861.00	20.00%
Valor Acta Parcial No. 2		\$ 64,611,931.00	N/A	\$ 64,611,931.00	10.00%
Valor Acta Parcial No. 3					
Valor Acta Liquidación Final					
Valor Ejecutado		\$ 193,835,792.00		\$ 193,835,792.00	30%
Valor Por Ejecutar		\$ 452,283,514.00		\$ 452,283,514.00	70%
Valor No Ejecutado					
SUMAS IGUALES	\$ 646,119,306.00	\$ 646,119,306.00		\$ 646,119,306.00	100%

2.7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

2.7.1. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	86871	0	SERIEDAD DE LA OFERTA	25/02/2025	05/07/2025	\$ 1.196.687.894,00
Observaciones:						

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	89722	1	Cumplimiento	22/05/2025	21/05/2027	\$ 1.196.654.130,00
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	22/05/2025	21/01/2030	\$ 1.196.654.130,00
			Estabilidad y calidad de la Obra	21/01/2027	21/01/2032	\$ 1.196.654.130,00

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/05/2025	21/05/2027	\$ 1.196.654.130,00
	25868	1	Responsabilidad Civil Extracontractual	22/05/2025	21/01/2027	\$ 711.750.000,00
Observaciones:						

2.7.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Y REINICIO No. 01

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	89722	2	Cumplimiento	22/05/2025	21/06/2027	\$ 1.196.654.130,00
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	22/05/2025	21/02/2030	\$ 1.196.654.130,00
			Estabilidad y calidad de la Obra	21/02/2027	21/02/2032	\$ 1.196.654.130,00
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/05/2025	21/06/2027	\$ 1.196.654.130,00
	25868	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	22/05/2025	21/02/2027	\$ 711.750.000,00
Observaciones:						

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238



Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN

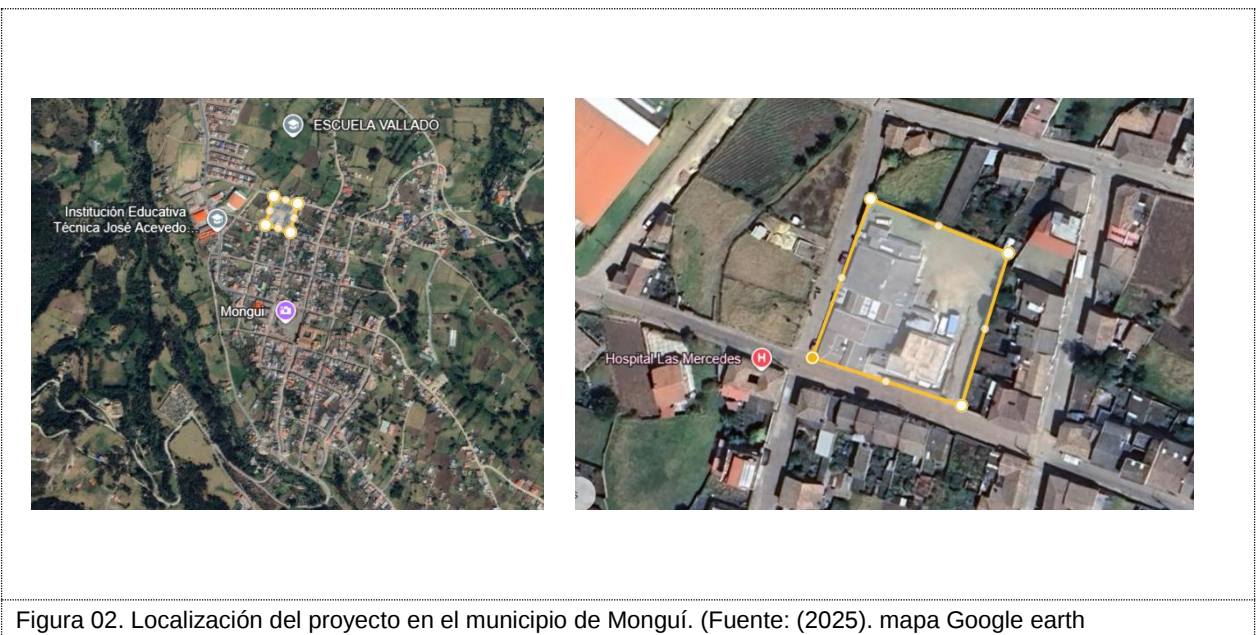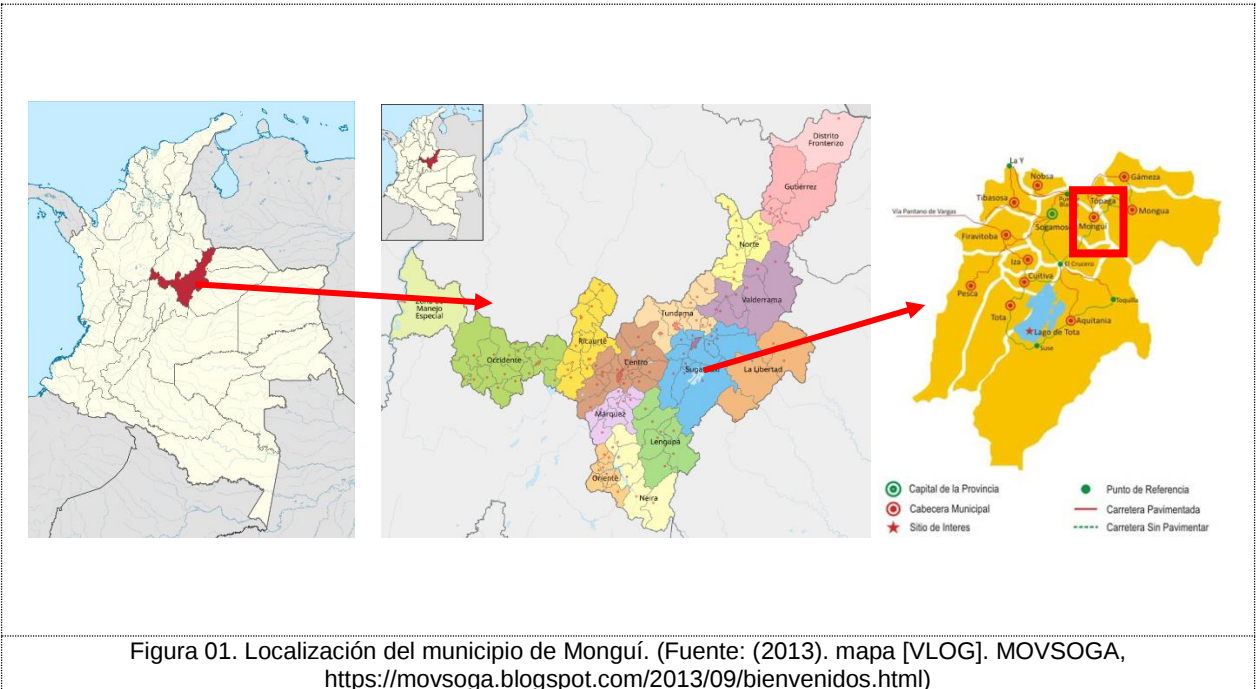

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

A continuación se presenta un listado de los capítulos que componen las actividades a ejecutar para la finalización.

DESCRIPCIÓN:	
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	ESTRUCTURAS
4	MAMPOSTERIA
5	PAÑETES
6	INSTALACIONES E HIDRAULICAS, SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS
7	ESTUCCO Y PINTURA
8	ENCHAPES
9	PISOS
10	CUBIERTAS
11	CARPINTERIA ALUMINIO
12	CARPINTERIA METALICA
13	CARPINTERIA MADERA
14	CIELO RASO
15	APARATOS SANITARIOS
16	VIDRIOS Y CERRADURAS
17	RED GAS
18	INSTALACIONES ELECTRICAS
19	GASES MEDICINALES
20	OTROS: ESCUDO Y LETRAS Y ASEO GENERAL
21	EQUIPOS
22	ITEMS NO PREVISTOS

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

4. CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	HMM-CO-01-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO E.S.E. MONGUÍ 2025
PLAZO INICIAL:	20 MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2027
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	20 MESES
SUSPENSIÓN 01:	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01:	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 2027
PLAZO TRANSCURRIDO:	8 MESES y 16 DIAS
VALOR INICIAL:	ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 11.966.541.300) M/CTE
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	N/A
VALOR PAGADO:	\$ 1,936,347,865.00
VALOR POR PAGAR:	\$ 10,030,193,435.00

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrcecedes.gov.co E-Mail: eselasmrcecedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

4.2. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:		Desde	Hasta
	Suspensión No. 1	24 DE DICIEMBRE DE 2025	24 DE ENERO DE 2026
	Prórroga a la Suspensión No. 1	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	25 DE ENERO DE 2026	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	32 DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
	N/A	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
	N/A	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

4.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

4.3.1. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	86871	0	SERIEDAD DE LA OFERTA	25/02/2025	05/07/2025	\$ 1.196.687.894,00
Observaciones:						

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	89722	1	Cumplimiento	22/05/2025	21/05/2027	\$ 1.196.654.130,00
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	22/05/2025	21/01/2030	\$ 1.196.654.130,00
			Estabilidad y calidad de la Obra	21/01/2027	21/01/2032	\$ 1.196.654.130,00
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/05/2025	21/05/2027	\$ 1.196.654.130,00
	25868	1	Responsabilidad Civil Extracontractual	22/05/2025	21/01/2027	\$ 711.750.000,00
Observaciones:						

4.3.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Y REINICIO No. 01

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
Berkley International Seguros Colombia S. A	89722	2	Cumplimiento	22/05/2025	21/06/2027	\$ 1.196.654.130,00
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	22/05/2025	21/02/2030	\$ 1.196.654.130,00
			Estabilidad y calidad de la Obra	21/01/2027	21/02/2032	\$ 1.196.654.130,00
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/05/2025	21/02/2027	\$ 1.196.654.130,00
	25868	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	22/05/2025	21/02/2027	\$ 711.750.000,00
Observaciones:						

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

4.4. CONTROL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

2. CIMENTACION		
Ítem	Detalle Actividades Realizada	Evidencias o Soportes
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	REGISTRO FOTOGRAFICO
2.02	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	REGISTRO FOTOGRAFICO
2.03	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	REGISTRO FOTOGRAFICO
2.04	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	REGISTRO FOTOGRAFICO

3. CIMENTACION		
Ítem	Detalle Actividades Realizada	Evidencias o Soportes
3.07	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA METALICA	REGISTRO FOTOGRAFICO
3.10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	REGISTRO FOTOGRAFICO

22. ITEMS NUEVOS NO PREVITOS		
Ítem	Detalle Actividades Realizada	Evidencias o Soportes
22.25	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	REGISTRO FOTOGRAFICO
22.28	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
22.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKAPVC. V = 0.22	REGISTRO FOTOGRAFICO

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"


Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		

AVANCE DEL CONTRATO

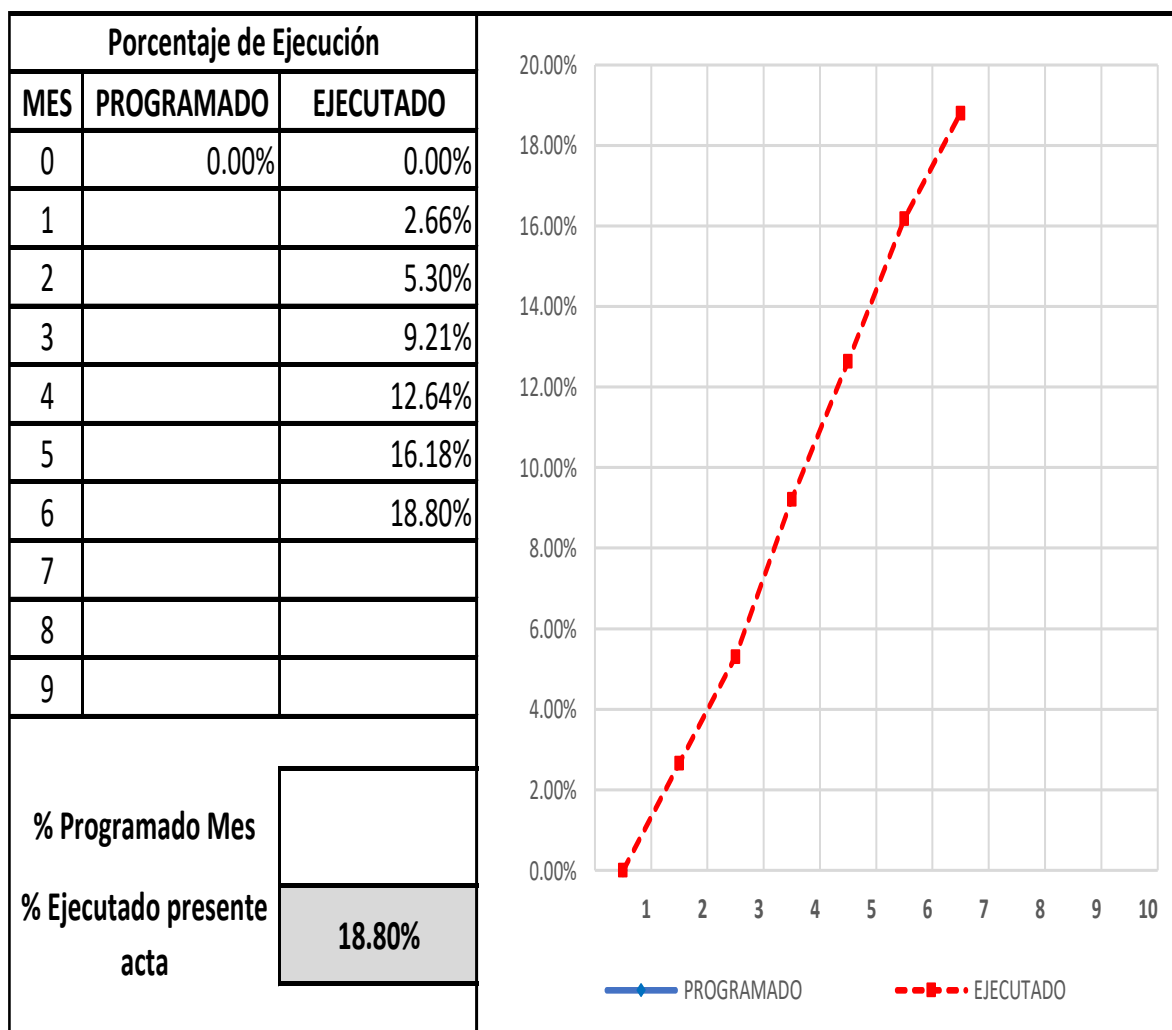

4.5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 01

ÍTEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	und	20.00	\$ 283,720.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.02	DESMONTE DE LAVAMANOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS	und	23.00	\$ 164,956.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.03	DESMONTE DE DUCHAS	und	5.00	\$ 188,500.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.04	DESMONTE DE POCETAS EN ACERO INOXIDABLE	und	14.00	\$ 211,120.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.05	DESMONTE REJA METÁLICA	m2	53.97	\$ 856,288.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.06	DESMONTE DE VIDRIOS.	m2	218.76	\$ 828,444.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.07	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m2	30.22	\$ 1,116,810.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para la posterior demolición de la edificación antigua.
22.08	DESMONTE DE FAROLES DECORATIVOS	und	6.00	\$ 154,308.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.09	DESMONTE DE BARANDAS EN TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2"	ml	76.20	\$ 1,514,323.00	demolición de la edificación antigua. Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.10	DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE BREAKERS, CABLEADO)	und	11.00	\$ 540,078.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.11	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA (ARMARIOS)	und	6.00	\$ 92,058.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.12	DESMONTE DE GUARDACAMILLAS	ml	29.62	\$ 194,781.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m2	596.42	\$ 5,936,765.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para desmontes y posterior demolición de la edificación antigua.
22.14	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m3	63.70	\$ 11,666,846.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para la posterior demolición de la edificación antigua.
22.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y	m3	3,417.84	\$ 92,127,877.00	Para la ejecución se requiere de esta

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
	CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)				actividad para la posterior demolición de la edificación antigua.
22.16	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m3	2,102.14	\$209,293,263.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para la posterior demolición de la edificación antigua.
22.17	RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM DE DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M	m3	3,261.12	\$ 6,652,685.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad para la posterior demolición de la edificación antigua.
22.18	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	m2	2,057.60	\$ 97,067,342.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad ya que por la profundidad del sótano y por las actividades a ejecutar en ese espacio por seguridad de los trabajadores y los predios colindantes se hace necesario una contención del terreno.
22.19	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TEJA DE ZINC H = 2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ml	179.00	\$ 15,959,067.00	En el presupuesto se encuentra aprobado el cerramiento en lona verde pero por la duración de la obra y por seguridad de la comunidad, de la construcción, materiales y seguridad del acceso

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
					y colindancia que se tiene con el edificio donde se esta prestando el servicio de salud, se llegó al acuerdo de reforzar el cerramiento y hacerlo en teja de zinc.
22.20	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI)	m2	200.26	\$ 28,877,492.00	Para el correcto funcionamiento de la edificación y en cumplimiento de las normas institucionales para salud y el fácil y seguro acceso de personas con movilidad reducida, el ingreso al sótano cuenta con rampa vehicular y es de las actividades iniciales se necesita incluir ya que también el plano arquitectónico aprobado las incluye.
22.21	"MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA	ml	395.79	\$ 40,326,093.00	Para el correcto funcionamiento de la edificación y en cumplimiento de las normas institucionales para salud, las cuales especifican que tienen espacios que son esterilizables y esto lo garantizan las mediacañas se generó la creación de este ítem.
22.22	SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO	ml	9.40	\$ 21,006,522.00	Al tener un sótano y niveles más bajos de

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
	ST - 1) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.90 M. (INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLÁSTICA)				construcción frente a las vías colindantes es necesario que en caso de lluvias se tenga sumideros en los puntos mas bajos que permitan la evacuación de estas aguas pluviales.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
3	ESTRUCTURAS				
3.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa	kg	-9,427.77	-\$57,858,253.51	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una menor cantidad del contractual para este ítem.

4.6. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS – MODIFICATORIO No. 02

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
3	ESTRUCTURAS				
22.23	DEMOLICION DE ROCA UTILIZANDO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAHULICO PARA POZOS, ZANJAS PRINCIPALES Y DESCARGAS (CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m3	200	44,412,400.00	Durante la excavación en roca se evidencio unas rocas de dimensiones mayores que no se podían movilizar o extraer de la cimentación por lo cual fue necesaria la demolición de estas

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
					para extraerlas en parte pequeñas.

4.7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 03

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.28	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	110.97	\$ 2,144,972.00	Para la ejecución se requiere de esta actividad ya que en las especificaciones estructurales los muros de contención de la planta baja debían ser de concretos impermeabilizados de resistencia a la compresión de 400 PSI.
22.29	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	25.07	\$155,519,356.00	Esta actividad fue incluida ya que para evitar filtraciones de agua en la planta baja fue necesario el sellado de los pases de las corbatas en los muros de contención.
22.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	385.00	\$ 18,429,465.00	Según planos sanitarios se planteaba un filtro en el perímetro exterior de la planta baja y por recomendación de estructural se planteó como filtro

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.31	DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA).	ML	110.00	\$ 3,867,949.00	francés el cual incluye geotextil. Según planos sanitarios se planteaba un filtro en el perímetro exterior de la planta baja y por recomendación de estructural se planteó como filtro francés el cual incluye tubería pvc 4" perforada y la piedra filtro que en este caso es la gravilla.
22.32	IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN CON SISTEMA ASFALTICO PARA IMPERMEABILIZAR ESTRUCTURAS ENTERRADAS (DOS MANOS)	M2	458.09	\$ 4,561,571.00	Esta actividad fue incluida ya que para evitar filtraciones de agua en la planta baja fue necesario impermeabilizar con el sistema asfaltico los muros de contención en el exterior ya que estos se encuentran rodeados por capas granulares que permiten la permeabilidad de agua.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
2	CIMENTACIÓN				
2.06	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	M3	1969.54	\$ 183,886,851.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
	Y/O VIBROCOMPACTADOR				la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
3	ESTRUCTURAS				
3.04	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	M2	- 826.43	- \$ 246,619,703.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una menor cantidad de la contractual para este ítem.
3.12	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H=3,5 MTS	M3	- 206.32	- \$ 238,115,975.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una menor cantidad de la contractual para este ítem.
6	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS				
6.06	GEODREN CON TUBERIA DE DRENAJE 100mm H=2.00m	MI	- 129.00	- \$ 19,283,049.00	En la revisión de los planos hidrosanitarios correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
6.07	GEODREN PLANAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	- 248.00	- \$ 22,003,056.00	En la revisión de los planos hidrosanitarios correspondientes a la construcción de la

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
					nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
22	ITEMS NO PREVISTOS				
22.16	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	229.00	\$ 22,799,698.00	En la revisión de los planos estructurales y del terreno donde esta ubicado el tanque y durante la excavación mecánica se identificaron en su mayoría roca de tamaños grandes fue necesaria una mayor cantidad.
22.25	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	55.13	\$ 63,777,973.00	En la revisión de los planos estructurales donde está ubicado el tanque subterráneo fue necesaria una mayor cantidad
22.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 8 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	M2	1797.90	\$ 8,262,897.00	Esta actividad fue incluida ya que para evitar filtraciones de agua en la planta baja fue necesario impermeabilizar con el sistema asfaltico los muros de contención en el exterior ya que estos se encuentran rodeados por capas granulares que permiten la permeabilidad de agua. Por esto es mayor cantidad.

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

4.8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES – MODIFICATORIO No. 04

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
22.33	PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.40 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	M2	1,545.46	\$387,818,102.00	Para la ejecución de las placas de entepiso fue necesario cambiar el ítem contractual 3.05 PLACA ENTREPIZO IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.50 mts. 28 MPa - (4000 PSI) ya que en las especificaciones estructurales las placas de entepiso tienen un espesor de 40 cm y el concreto corresponde a una resistencia a la compresión de 21 Mpa (3000 PSI) y el ítem no correspondía a estas especificaciones del diseño estructural.
22.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.22	MI	46.33	\$ 4,457,103.00	La instalación de cinta de sellado tipo PVC V-22 en la construcción de tanques subterráneos responde a la necesidad de asegurar la impermeabilidad de las juntas de construcción y de dilatación presentes

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ITEMS NO PREVISTOS					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	Justificación
					en las estructuras de concreto hidráulico ya que están permanentemente sometidos a presión hidrostática interna o externa.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
2	CIMENTACIÓN				
2.04	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)	M2	62.81	\$ 2,239,975.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
2.06	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	4254.40	\$ 397,213,673.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
3	ESTRUCTURAS				
3.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	- 248.78	- \$ 257,347,040.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
					ninguna actividad contractual.
3.04	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	M2	- 320.98	- \$ 95,785,478.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a ninguna actividad contractual.
3.05	PLACA ENTREPISO IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.50 mts. 28 MPa - (4000 PSI)	M2	- 1875.3	- \$ 604,755,670.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a ninguna actividad contractual.
3.08	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	3497.30	\$ 26,472,707.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
3.09	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	- 4471.30	- \$ 34,029,589.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una menor cantidad de la contractual para este ítem.
3.10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE	Kg	52968.26	\$ 382,010,269.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
	DE ACERO 60000 PSI 420 MPa				correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
3.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa	kg	- 547.93	- \$ 3,463,526.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a ninguna actividad contractual.
3.12	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H=3,5 MTS	M3	- 152.18	- \$ 175,632,460.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a ninguna actividad contractual.
22	ITEMS NO PREVISTOS				
22.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	743.83	\$ 20,049,938.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
22.25	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	- 53.04	- \$ 61,360,125.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad (+) Mayor (-) Menor	Valor (+) Mayor (-) Menor	Justificación
					infraestructura se calculó una menor cantidad de la contractual para este ítem.
22.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.15	MI	- 47.42	- \$ 2,144,972.00	En la revisión de los planos estructurales correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura este ítem no correspondía a ninguna actividad contractual.
22.28	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	22.50	\$ 31,532,716.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una mayor cantidad de la contractual para este ítem.
22.29	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	- 23.50	- \$ 17,275,326.00	En la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos correspondientes a la construcción de la nueva infraestructura se calculó una menor cantidad de la contractual para este ítem.

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

4.9. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Inicial	\$11,966,541,300.00				
Valor Adicional					
Anticipo XX%					
Valor Acta Parcial No. 1		\$ 318.549.891.00	N/A	\$ 318.549.891.00	2.66%
Valor Acta Parcial No. 2		\$ 316.096.135.00	N/A	\$ 316.096.135.00	2.64%
Valor Acta Parcial No. 3		\$ 467,094,527.00	N/A	\$ 467,094,527.00	3.90%
Valor Acta Parcial No. 4		\$ 410,512,679.00	N/A	\$ 410,512,679.00	3.43%
Valor Acta Parcial No. 5		\$ 424,094,633.00	N/A	\$ 424,094,633.00	3.54%
Valor Acta Liquidación Final					
Valor Ejecutado		\$ 1,936,347,865.00		\$ 1,936,347,865.00	16.18%
Valor Por Ejecutar		\$10,030,193,435.00		\$10,030,193,435.00	83.82%
Valor No Ejecutado					
SUMAS IGUALES	\$11,966,541,300.00	\$11,966,541,300.00		\$11,966,541,300.00	100%

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"


Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ESTADO FINANCIERO Vs PLANEACION

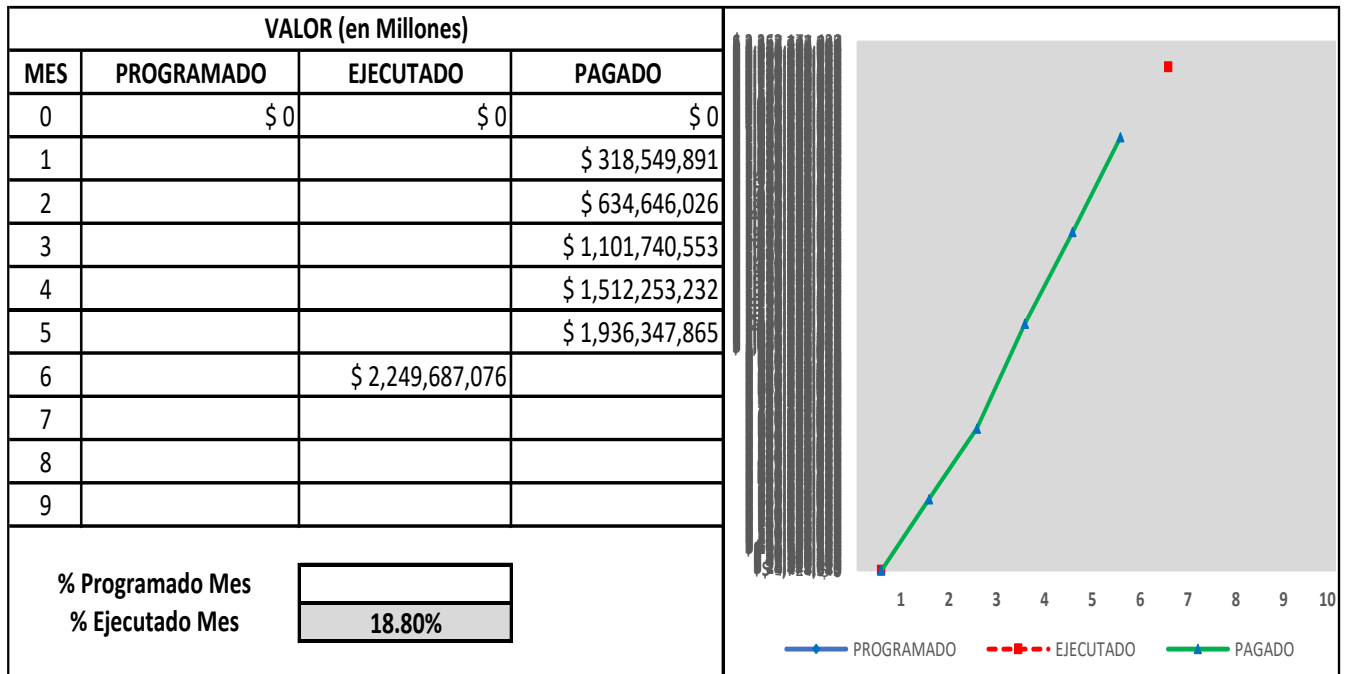

PLAN FINANCIERO COFINANCIACIÓN				
Usos			Fuentes de Cofinanciación	
CAPITULO	Descripción	Valor	GOBERNACION DE BOYACA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
1	PRELIMINARES	263.367.510,00	203.512.000,00	59.855.510,00
2	CIMENTACION	453.315.686,00		453.315.686,00
3	ESTRUCTURAS	3.001.067.274,00	1.153.233.539,00	1.847.833.735,00
4	MAMPOSTERIA	297.926.504,00		297.926.504,00
5	PAÑETES	253.698.848,00		253.698.848,00
6	INSTALACION HIDRAULICAS, SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS	667.695.329,00		667.695.329,00
7	ESTUCO Y PINTURA	138.808.163,00		138.808.163,00
8	ENCHAPES	113.253.061,00		113.253.061,00
9	PISOS	989.441.453,00		989.441.453,00
10	CUBIERTAS	969.341.528,00		969.341.528,00
11	CARPINTERIA ALUMINIO	229.704.227,00		229.704.227,00

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

PLAN FINANCIERO COFINANCIACIÓN				
Usos			Fuentes de Cofinanciación	
CAPITULO	Descripción	Valor	GOBERNACION DE BOYACA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
12	CARPINTERIA METALICA	126.378.637,00		126.378.637,00
13	CARPINTERIA MADERA	236.548.578,00		236.548.578,00
14	CIELO RASO	185.911.859,00		185.911.859,00
15	APARATOS SANITARIOS	66.900.537,00		66.900.537,00
16	VIDRIO Y CERRADURAS	17.693.514,00		17.693.514,00
17	RED GAS	5.463.762,00		5.463.762,00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS	459.585.455,00		459.585.455,00
19	GASES MEDICINALES	155.301.902,00		155.301.902,00
20	OTROS	42.360.255,00		42.360.255,00
21	EQUIPOS	558.097.170,00		558.097.170,00
SUBTOTAL				
22	AIU	2.602.129.224,00		2.602.129.224,00
23	CERTIFICACION RETIE	12.750.000,00		12.750.000,00
24	CERTIFICACION RETILAP	14.100.000,00		14.100.000,00
25	INTERVENTORIA	646.230.288,00		646.230.288,00
26	IVA EQUIPOS	106.038.462,00		106.038.462,00
TOTAL PROYECTO		12.613.109.226,00		
TOTAL APORTADO POR COFINANCIADOR			1.356.745.539	11.256.363.687,00

4.10. CONTROL DE PERSONAL

CONTRATISTA DE OBRA

Ítem	Nombre y Apellido	C.C. No.	Cargo	Fecha Afiliación	RETIRO
1	ANDRÉS HERNÁN AVELLA NOSSA	9.529.885	DIRECTOR DE OBRA	22/05/2025	NO
2	LUIS ANDRÉS PEDRAZA CHAPARRO	74.186.667	RESIDENTE DE OBRA	22/05/2025	NO
3	JORGE EDUARDO LEGUIZAMÓN	74.182.281	ASESOR SISOMA	22/05/2025	NO
4	JUAN PABLO BARACALDO GRANADOS	1.052.398.144	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	12/09/2025	NO
5	HILDA LUZ CARDENAS ALBARRACIN	1.054.121.169	AUXILIAR SISO	14/08/2025	NO

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Ítem	Nombre y Apellido	C.C. No.	Cargo	Fecha Afiliación	RETIRO
6	JOSE ARTEMIO DUEÑAS BARRERA	4.168.696	MAESTRO GENERAL	01/08/2025	NO
7	PABLO ANTONIO ALARCON DUEÑAS	1.054.120.238	AYUDANTE DE OBRA	01/08/2025	NO
8	JHON ALEXANDER DUEÑAS SIERRA	1.054.121.014	AYUDANTE DE OBRA	01/08/2025	NO
9	JOSE MORENO	6.009.389	HERRERO	02/09/2025	SI
10	HECTOR TORRES	1.010.082.806	MAESTRO HERRERO	02/09/2025	NO
11	EDILBERTO HURTADO	74.362.296	AYUDANTE DE OBRA	02/09/2025	SI
12	JOSE GILBERTO DUEÑAS	4.168.545	AYUDANTE DE OBRA	11/09/2025	NO
13	FABIO ORLANDO DUEÑAS GOMEZ	4.168.833	AYUDANTE DE OBRA	06/02/2026	NO
14	MARLON JULIÁN CRUZ RODRÍGUEZ	1.192.731.421	HERRERO	04/11/2025	SI
15	DEIVY ENRIQUE PABON LOPEZ	1.094.169.208	HERRERO	04/11/2025	NO
16	ARMANDO SIABATTO	4.168.852	AYUDANTE DE OBRA	04/11/2025	NO
17	LUIS FERNANDO MONTAÑEZ ALARCÓN	1.054.121.330	AYUDANTE DE OBRA	06/02/2026	NO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Ítem	Nombre y Apellido	C.C. No.	Cargo	Fecha Afiliación	RETIRO
1	RAFAEL FORERO	9.531.341	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	22/05/2025	NO
2	CARLOS JULIAN TORREZ ALVAREZ	1.057.587.935	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	22/05/2025	NO
3	FREDY GIOVANNY BARRIOS GONZALES	1.049.603.578	ASESOR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	22/05/2025	NO
4	MARIA JOSE MERCHAN ZAMBRANO	1.018.483.285	AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORIA	22/05/2025	NO

Ítem	Descripción de Personal	Cantidad
1	Profesionales	9
2	Técnicos / Tecnólogos	1
3	Mano de Obra Calificada	3
4	Mano de Obra No Calificada	6
5	Mujeres	2
6	Hombres	12
7	Población Vulnerable	
8	Población en Estado de Discapacidad	
9	Personal de la Región	6

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Ítem	Descripción de Personal	Cantidad
10	Personal Fuera de la Región	7

4.11. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ENERO

Personal de Nomina							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	IBC	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA/ ICBF
1	36172310	2026-01	JOSE ARTEMIO DUEÑAS BARRERA	4.168.696	408.545	16.400	16.400
2	36172310	2026-01	PABLO ANTONIO ALARCON DUEÑAS	1.054.120.238	408.545	16.400	16.400
3	36172310	2026-01	JHON ALEXANDER DUEÑAS SIERRA	1.054.121.014	408.545	16.400	16.400
4	36172310	2026-01	SIABATO HURTADO JOSE ARMANDO	4.168.852	408.545	16.400	16.400
5	36172310	2026-01	HECTOR TORRES	1.010.082.806	408.545	16.400	16.400
6	36172310	2026-01	EDILBERTO HURTADO	74.362.296	408.545	16.400	16.400
7	36172310	2026-01	JOSE GILBERTO DUEÑAS	4.168.545	408.545	16.400	16.400
8	36172310	2026-01	HILDA LUZ CARDENAS ALBARRACIN	1.054.121.169	291.818	11.700	11.700
9	36172310	2026-01	MARLON JULIÁN CRUZ RODRÍGUEZ	1.192.731.421	408.545	16.400	16.400
10	36172310	2026-01	DEIBY ENRIQUE PABON LOPEZ	1.094.169.208	408.545	16.400	16.400

Personal Contratista							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	Valor Contrato	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA/ ICBF
1	36510680	2026-01	AVELLA NOSSA	9529885	291.818	11.700	11.700

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Personal Contratista							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	Valor Contrato	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA/ ICBF
			ANDRES HERNAN				
2	36510680	2026-01	PEDRAZA CHAPARR O LUIS ANDRES	74186667	291.818	11.700	11.700
3	36510680	2026-01	BARACAL DO GRANADO S JUAN PABLO	1.052.398.144	291.818	11.700	11.700

FEBRERO

Personal de Nomina							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	IBC	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA /ICBF
1	36172310	2026-02	JOSE ARTEMIO DUEÑAS BARRERA	4.168.696	1.750.905	70.100	70.100
2	36172310	2026-02	PABLO ANTONIO ALARCON DUEÑAS	1.054.120.238	1.750.905	70.100	70.100
3	36172310	2026-02	JHON ALEXANDER DUEÑAS SIERRA	1.054.121.014	1.750.905	70.100	70.100
4	36172310	2026-02	SIABATO HURTADO JOSE ARMANDO	4.168.852	1.750.905	70.100	70.100
5	36172310	2026-02	HECTOR TORRES	1.010.082.806	1.750.905	70.100	70.100
6	36172310	2026-02	EDILBERTO HURTADO	74.362.296	291.818	11.700	14.400
7	36172310	2026-02	JOSE GILBERTO DUEÑAS	4.168.545	1.750.905	70.100	70.100
8	36172310	2026-02	HILDA LUZ CARDENAS ALBARRACIN	1.054.121.169	1.750.905	70.100	70.100
9	36172310	2026-02	MARLON JULIÁN CRUZ RODRÍGUEZ	1.192.731.421	992.180	39.700	49.800

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI – BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Personal de Nomina							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	IBC	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA/ ICBF
10	36172310	2026-02	DEIBY ENRIQUE PABON LOPEZ	1.094.169.208	1.750.905	70.100	70.100
11	36172310	2026-02	DUEÑAS GOMEZ FABIO ORLANDO	4.168.833	1.459.088	58.400	58.400
12	36172310	2026-02	MONTAÑEZ ALARCON LUIS FERNANDO	1.054.121.330	1.459.088	58.400	58.400

Personal Contratista							
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	Nombre y Apellido	C.C. No.	Valor Contrato	Valor Pagado a	
						EPS/AFP/ ARL	CCF/SENA/ ICBF
1	36510660	2026-02	AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN	9529885	1.750.905	70.100	70.100
2	36510660	2026-02	PEDRAZA CHAPARR O LUIS ANDRES	74186667	1.750.905	70.100	70.100
3	36510660	2026-02	BARACAL DO GRANADO S JUAN PABLO	1.052.398.144	1.750.905	70.100	70.100

4.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONTROL DE MAQUINARIA					
Ítem	Maquinaria en obra	Cantidad	Activo	En Reparación	Inactivo
1	RETROEXCAVADORA PAJARITA	1			X
2	VOLQUETAS SENCILLA	3	X		
3	MEZCLADORA	1	X		
4	SIERRA CIRCULAR	1	X		
5	MIXER	4			X

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

CONTROL DE MAQUINARIA					
6	AUTOBOMBA	1			X
7	VIBRADOR DE CONCRETO	1			X
8	TALADRO	1	X		
9	ANDAMIOS	6			X
10	TRONZADORA	1	X		
11	VIBROCOMPACTADOR	1			X
12	CANGURO	1			X

4.13. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Permiso, Licencia o Autorización	Numero	Fecha	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

4.14. CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS REALIZADOS					
Ítem	Fecha	Norma, Protocolo o Requisito Aplicable	Nombre de la Norma, Protocolo o Requisito Aplicable	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Resultado del Ensayo
1	17/SEP/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	No realizo	No realizo
	17/SEP/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	20.5 Mpa
2	07/OCT/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	3.840 PSI
	07/OCT/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	27.1 Mpa 27.1 Mpa 25.7 Mpa
3	22/OCT/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE	(CONTRATISTA DE OBRA)	3.190 PSI

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ENSAYOS REALIZADOS					
			ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	
	22/OCT/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	36.4 Mpa 37.9 Mpa 38.0 Mpa
4	29/10/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	3.990 PSI
	29/10/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	41.5 Mpa 42.3 Mpa 42.2 Mpa
5	5/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	3.860 PSI
	5/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	38.6 Mpa 39.7 Mpa 39.0 Mpa
6	12/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	4.310 PSI
	12/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	37.8 Mpa 37.0 Mpa 38.0 Mpa
7	24/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	4.910 PSI
	24/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	32.9 Mpa 31.1 Mpa

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI – BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

ENSAYOS REALIZADOS					
8	28/11/2025	NTC - 673	CILINDRICO DE CONCRETO ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	4.550 PSI
	28/11/2025	NTC - 673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	30.1 Mpa 28.7 Mpa
9	21/01/2025	NTC-673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	37.5 Mpa
	21/01/2025	NTC-673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	39.2 Mpa
	21/01/2025	NTC-673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	COLCONCRETOS (PROVEEDOR)	37.4 Mpa
10	27/01/2026	NTC-673	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICO DE CONCRETO	(CONTRATISTA DE OBRA) INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S	4660 PSI

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN EL PERIODO					
Ítem	No. Certificado o Sello de Calidad	Vigencia del Certificado o Sello de Calidad Fecha de pedido	Certificador (entidad acreditada para expedir certificado o sello)	Proveedor	Este sello o certificado ampara los siguientes entregables del contrato
1	B64316-25	24/07/2025	PAZ DEL RIO	GRUPO SIDERURGICO REYNA	TZDI TY7A-TY49 TY5A

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN EL PERIODO					
2	C60998-25	18/07/2025	PAZ DEL RIO	GRUPO SIDERURGICO REYNA	TY5C TZDT

4.15. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES 9 – FEBRERO 2026

No. Días Laborados	Jornada Laborada	Horas de Lluvia	Horas Clima Seco	Horas con Suspensión de Actividades
24	Mañana		30	30
	Tarde	24		10

MES 10 – MARZO 2026

No. Días Laborados	Jornada Laborada	Horas de Lluvia	Horas Clima Seco	Horas con Suspensión de Actividades
6	Mañana	10	15	
	Tarde	8	12	

4.16. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

DESCRIPCIÓN:	
1	Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción
2	Manejo y disposición final de residuos sólidos, ordinarios, convencionales, especiales y peligrosos
3	Manejo ambiental del recurso atmosférico
4	Manejo Integral de materiales de construcción
5	Señalización Interna y control perimetral
6	Orden y limpieza de la obra
7	Desmantelamiento y cierre

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

4.17. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

MES 9 – FEBRERO 2026

Acta No.	Fecha	Asistentes	Temas	Compromisos
30	03/02/2026	Gerente ESE, Apoyo contratista, Auxiliar residente interventoría, Auxiliar SST, Secretario de planeación, Apoyo Gerencia	1. Visita de obra 2. Porcentajes de avance de obra 3. Reporte de actividades ejecutadas. 4. Control seguridad y salud en el trabajo. 5. Seguimiento a programación.	- Informes de gobernación - Apertura de frentes de obra - Entrega copia de junta directiva cambio de representante legal
31	11/02/2026	Gerente ESE, Apoyo técnico ESE, Auxiliar Residente interventoría, Encargado SST, Auxiliar residente de obra, Residente de obra, Residente interventoría	1. Visita de obra y sesión del Consejo de Monguí. 2. Objetivos del comité. 3. Avance de obra y actividades principales. 4. Programación, porcentajes y plazos. 5. Recursos, pagos y estampilla. 6. Estudios y diseños, controles institucionales.	
32	18/02/2026	Gerente ESE, Apoyo técnico ESE, Auxiliar residente interventoría, Encargada SST, Auxiliar residente de obra, Residente interventoría, Residente de obra, Secretario de planeación, Representante legal contratista, Apoyo eléctrico contratista	1. Resumen del avance y programación 2. Trabajos constructivos y especificaciones técnicas 3. Riesgos y limitaciones identificadas 4. Financiación, modificatorios y gestión administrativa 5. Decisiones y acciones acordadas 6. Puntos pendientes para resolución	-

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrceades.gov.co E-Mail: eselasmrceades@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

Acta No.	Fecha	Asistentes	Temas	Compromisos
33	25/02/2026	Gerente ESE, apoyo técnico ESE, Auxiliar residente interventoría, Encargada SST, Auxiliar residente obra, Residente interventoría, Residente obra, Representante legal contratista, secretario de planeación	1. Visita de obra 2. Porcentajes de avance de obra. 3. Reporte de actividades ejecutadas 4. Seguimiento a programación	- Informe de gobernación - 3 marzo instalación casetón casetón - 15 marzo fundida placa entepiso - 3 marzo Fundida muros tanque

4.18. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

MES 9 – FEBRERO 2026

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Ítem	Fecha Radicado	Destinatario	Tema Tratado
44	03/02/2026	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	APROBACION INTERVENTORIA DE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 05 (CORREGIDA) Y DOCUMENTOS ANEXOS.
45	04/02/2026	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 08 (INCLUYE ANEXOS E INFORME SST) E INFORME DE INTERVENTORIA No. 08 (INCLUYE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACION).
46	24/02/2026	CONSORCIO ESE MONGUI 2025	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
47	25/02/2026	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ CONSORCIO ESE MONGUI 2025	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPPS

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Ítem	Fecha Radicado	Destinatario	Tema Tratado
48	27/02/2026	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	ACTUALIZACIÓN PLANIMETRÍA

4.19. CONCLUSIONES – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1. Se evidenció que el contratista de obra cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado, alineado con la licencia ambiental o instrumento equivalente, el cual ha sido implementado de manera general; no obstante, la Interventoría concluye que su aplicación presenta debilidades en el control, seguimiento y registro sistemático de las actividades ejecutadas, lo cual limita la trazabilidad de las acciones ambientales desarrolladas en obra.
2. Durante las visitas de seguimiento, se verificó el cumplimiento parcial de las medidas de manejo ambiental asociadas al control de material particulado, manejo de residuos sólidos de construcción y demolición (RCD), control de ruido y protección de cuerpos de agua y suelos, concluyéndose que, si bien las acciones se ejecutan, no siempre se encuentran debidamente soportadas mediante registros, actas o evidencias fotográficas, incumpliendo los principios de control y verificación exigidos contractualmente.
3. La Interventoría concluye que el manejo de residuos peligrosos y especiales (aceites, envases contaminados, elementos impregnados) requiere fortalecimiento, particularmente en lo referente a su almacenamiento temporal, rotulación, segregación y entrega a gestor autorizado, con el fin de evitar riesgos de contaminación ambiental y sanciones por parte de la autoridad competente.
4. Se evidenció la necesidad de reforzar las medidas de control de escorrentías, lodos y sedimentos, especialmente durante eventos de precipitación, concluyéndose que la ausencia de sistemas provisionales suficientes puede generar impactos negativos sobre el entorno inmediato del proyecto, situación que debe corregirse de manera preventiva.
5. La Interventoría concluye que el PMA debe transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo y de mejora continua, garantizando la actualización permanente del plan, la capacitación del personal y la asignación efectiva de responsables ambientales en obra, conforme a la normatividad ambiental vigente.

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrcecedes.gov.co E-Mail: eselasmrcecedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUI - BOYACA "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

4.20. CONCLUSIONES – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

1. Se concluye que el contratista de obra ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la normatividad vigente; sin embargo, la Interventoría identifica brechas en la aplicación operativa y en el control permanente de las condiciones de trabajo, particularmente en frentes activos de obra.
2. Durante las inspecciones realizadas, se evidenció uso parcial e intermitente de los Elementos de Protección Personal (EPP), especialmente en actividades de alto riesgo, lo cual representa un incumplimiento a los procedimientos establecidos y un aumento significativo del riesgo de accidentalidad, concluyéndose que los controles administrativos deben fortalecerse.
3. La Interventoría concluye que los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y permisos de trabajo no siempre se encuentran debidamente diligenciados o socializados antes del inicio de actividades críticas, situación que limita la identificación oportuna de peligros y la implementación efectiva de controles.
4. Se identificó la necesidad de mejorar la señalización de seguridad, orden y aseo (5S) en zonas de circulación, acopios y áreas de trabajo, toda vez que se presentan condiciones que pueden derivar en incidentes, especialmente considerando la naturaleza hospitalaria del proyecto y su futura operación.
5. La Interventoría concluye que los registros de capacitación, inducción y reinducción en SST requieren mayor rigor y continuidad, garantizando que todo el personal que ingresa a la obra conozca los riesgos asociados, los procedimientos de emergencia y las medidas de control establecidas.

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmrcecedes.gov.co E-Mail: eselasmrcecedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos"	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

4.20.1. 3. CONCLUSIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

1. Con base en el seguimiento realizado, la Interventoría concluye que, si bien el contratista de obra **ha dispuesto los instrumentos de gestión ambiental y de SST exigidos contractualmente, es necesario fortalecer de manera inmediata el control, la supervisión interna y la documentación de las actividades ejecutadas**, a fin de garantizar el cumplimiento integral de la normatividad vigente, prevenir impactos ambientales, minimizar riesgos laborales y asegurar que la obra se ejecute bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y responsabilidad social.
2. La Interventoría continuará ejerciendo control estricto y permanente, y realizará las observaciones y requerimientos necesarios hasta tanto se evidencie el cumplimiento pleno y verificable de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 05/06/2025

4.21. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Foto 2. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
Foto 3. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)	Foto 4. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		



**Foto 5. SUMINISTRO FIGURADA Y
AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa**



**Foto 6. SUMINISTRO FIGURADA Y
AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa**



**Foto 7. SUMINISTRO FIGURADA Y
AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa**



**Foto 8. SUMINISTRO FIGURADA Y
AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa**

	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ	Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO	Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	



Foto 9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.22

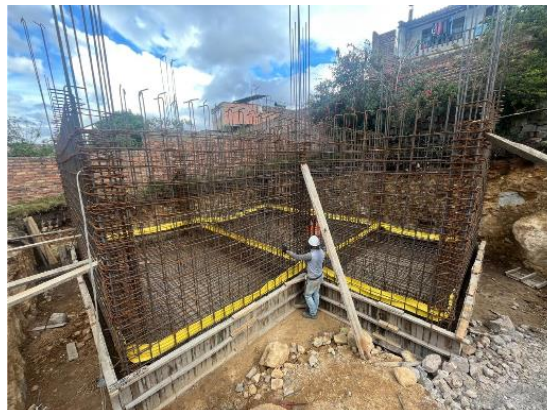


Foto 10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.22

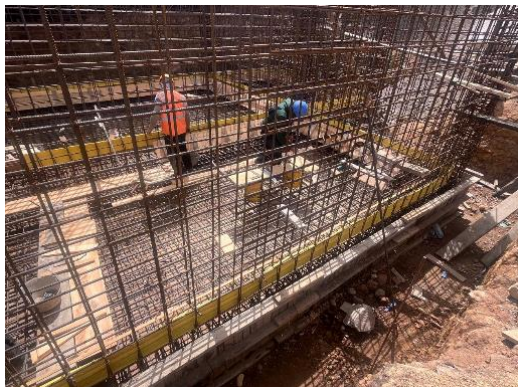


Foto 11. ENCOFRADO DE MUROS DE ARRANQUE DE TANQUE



Foto 12. ENCOFRADO DE MUROS DE ARRANQUE DE TANQUE

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025



Foto 13. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS



Foto 14. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS



Foto 15. CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA



Foto 16. CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA



Foto 17. COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA METALICA



Foto 18. COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA METALICA

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025



Foto 19. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 20. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 21. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 22. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 23. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 24. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025



Foto 25. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 26. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



Foto 27. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)



Foto 28. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)

"Atención con Calidez, Bienestar para todos"

Dirección: Carrera 5ª N° 7 - 00. Tel: 3143187238

Pág. Web: www.eselasmercedes.gov.co E-Mail: eselasmercedes@yahoo.es

Código postal: 152201

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		



**Foto 29. SOLADO CONCRETO ESPESOR
E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)**



**Foto 30. SOLADO CONCRETO ESPESOR
E=0.0 5MTS 14MPa (2000PSI)**



**Foto 31. ENCOFRADO MUROS TANQUE
SUBTERRANEO**



**Foto 32. ENCOFRADO MUROS TANQUE
SUBTERRANEO**

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		



Foto 33. ENCOFRADO MUROS TANQUE SUBTERRANEO



Foto 34. ENCOFRADO MUROS TANQUE SUBTERRANEO

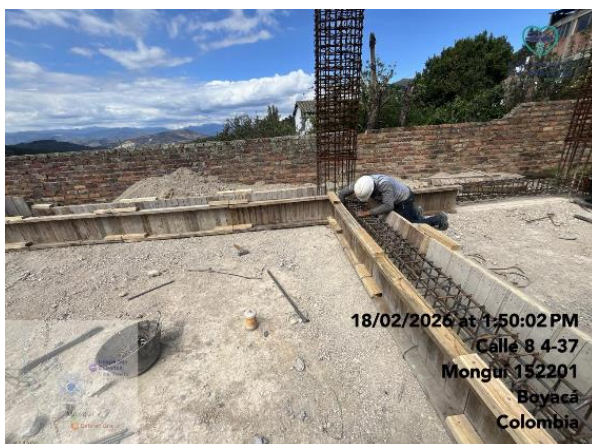


Foto 35. ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION



Foto 36. ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		



Foto 37. ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION



Foto 38. ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION



Foto 38. CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

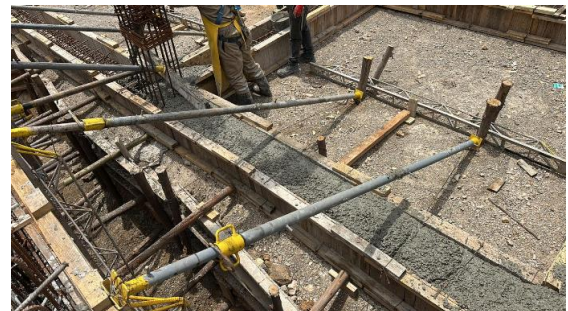


Foto 40. CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ "Atención con Calidez, Bienestar para Todos."	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha: 05/06/2025
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		



Foto 41. CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR



Foto 42. CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR



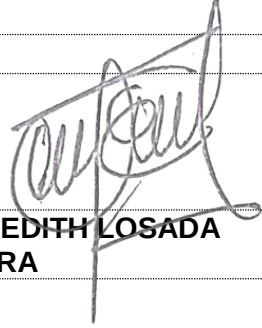
Foto 43. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS



Foto 44. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

 E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES MONGUÍ - BOYACÁ <i>"Atención con Calidez, Bienestar para Todos."</i>	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ		Código: GAF-F-019
	MACROPROCESO: DE APOYO		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		Fecha: 05/06/2025

	
Foto 45. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Foto 46. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

	Elaboró:	Aprobó:
Firma:		
Nombre:	CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ	CLARA EDITH LOSADA GUAYARA
