



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE OBRA CIVIL

CONTRATO DE OBRA SMC 053 DE 2025.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO

Ubicación: Municipio de Giraldo Antioquia, Veredas, Sierrita, Sierra y Ciénaga.

Contratista: Consultoría en ingeniería, Interventoría y construcción de obras Civiles Samuel Barrera – CIICOCOSAB S.A.S

Responsable: Samuel Barrera Caballero – Representante Legal

Periodo del Informe: Del 01 de diciembre al 28 de Febrero del 2026

Email: Ciicocsabsas@gmail.com

Cel: 313 446 4892



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	LOCALIZACIÓN	5
2.1	Ubicación de vía la sierrita.....	6
2.2	Ubicación de Vía la Sierra.	7
2.3	Ubicación de vía Ciénaga	7
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	8
3.1	Problemática actual	8
3.2	Impactos sociales	8
3.3	Valor estratégico y urbano	9
4.	ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	10
5.	ANEXOS FOTOGRÁFICOS.....	11
5.1	Conformación y mejoramiento calzada existente (V. Sierrita).....	11
5.2	Suministro, transporte, instalación y compactación de sub base (V. Sierrita)	12
5.3	Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa (Grado 60) (V. Sierrita).....	14
5.4	Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso (V. Sierrita)	16
5.5	Fabricación de concreto G ciclópeo de resistencia de 17 MPa (2500 PSI) (V. Sierrita).....	18
5.6	Conformación y mejoramiento calzada existente (V. Sierra).....	20
5.7	Suministro, transporte, instalación y compactación de sub base (V. Sierra)	21
5.8	Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa (Grado 60) (V. Sierra)	22
5.9	Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso (V. Sierra)	23
5.10	Fabricación de concreto G ciclópeo de resistencia de 17 MPa (2500 PSI) (V. Sierrita).....	24



5.11	Conformación y mejoramiento calzada existente (V. Cienaga)	25
5.12	Conformación y mejoramiento calzada existente (V. Cienaga)	26
5.13	Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa (Grado 60) (V. Cienaga)	27
5.14	Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso (V. Cienaga)	28
5.15	Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso (V. Cienaga)	29




1. INTRODUCCIÓN

En base a la necesidad de mejorar la infraestructura vial del área rural en el municipio de Giraldo, se procede con el análisis de Proyecto de pavimentación en placa huellas en las veredas, Sierrita, Sierra y Ciénaga, con el fin de mejorar los accesos a estas localidades para sus actividades diarias así como impulsar y mejorar sus condiciones para sus actividades económicas, de las cuales dependen las mayorías de las familias de estas comunidades.




2. LOCALIZACIÓN.

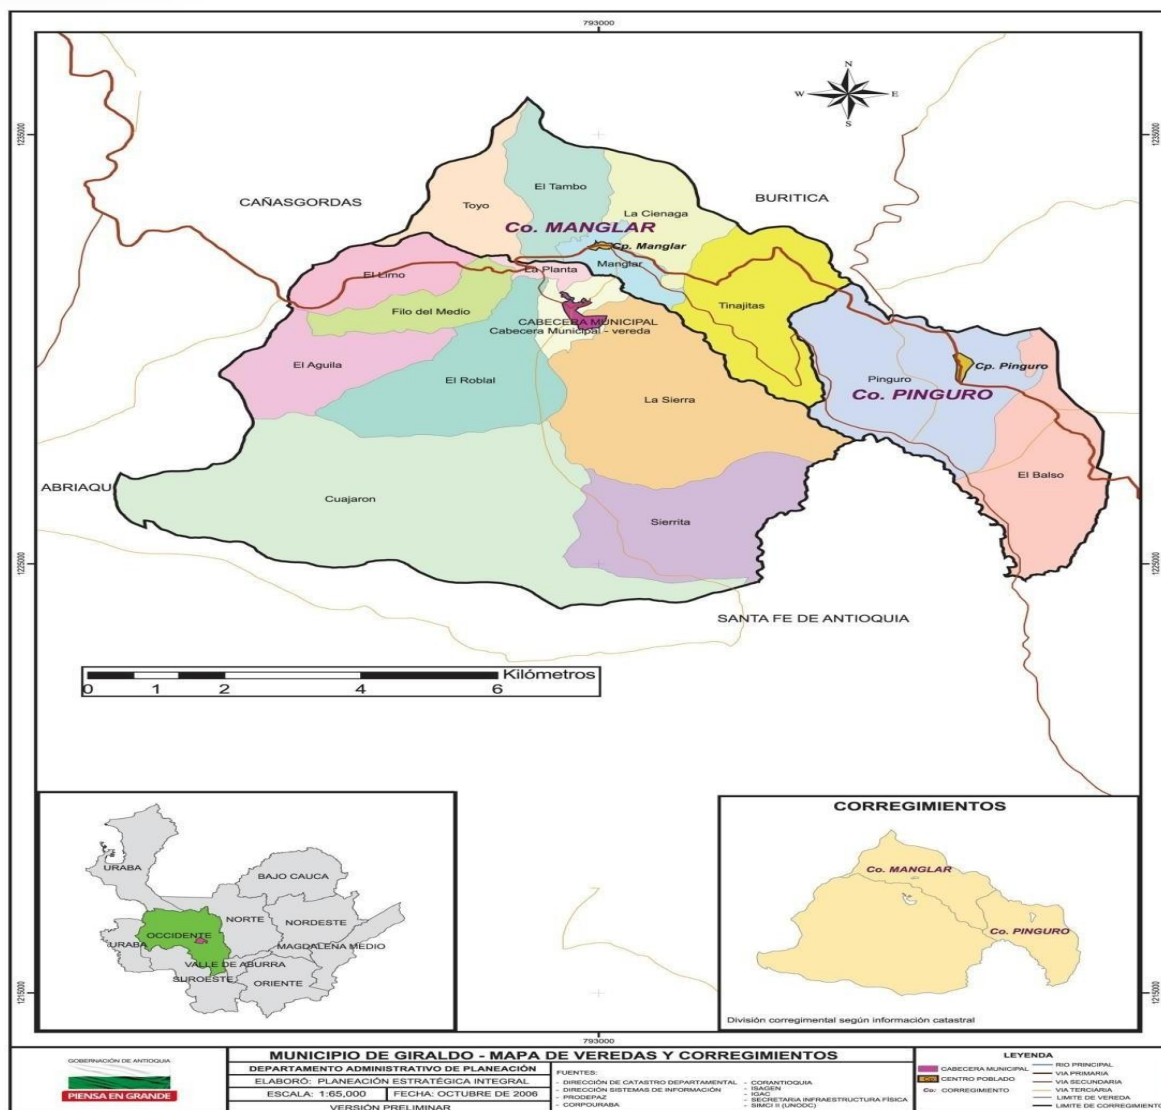



2121 Ubicación de placa huella en vereda la Sierrita

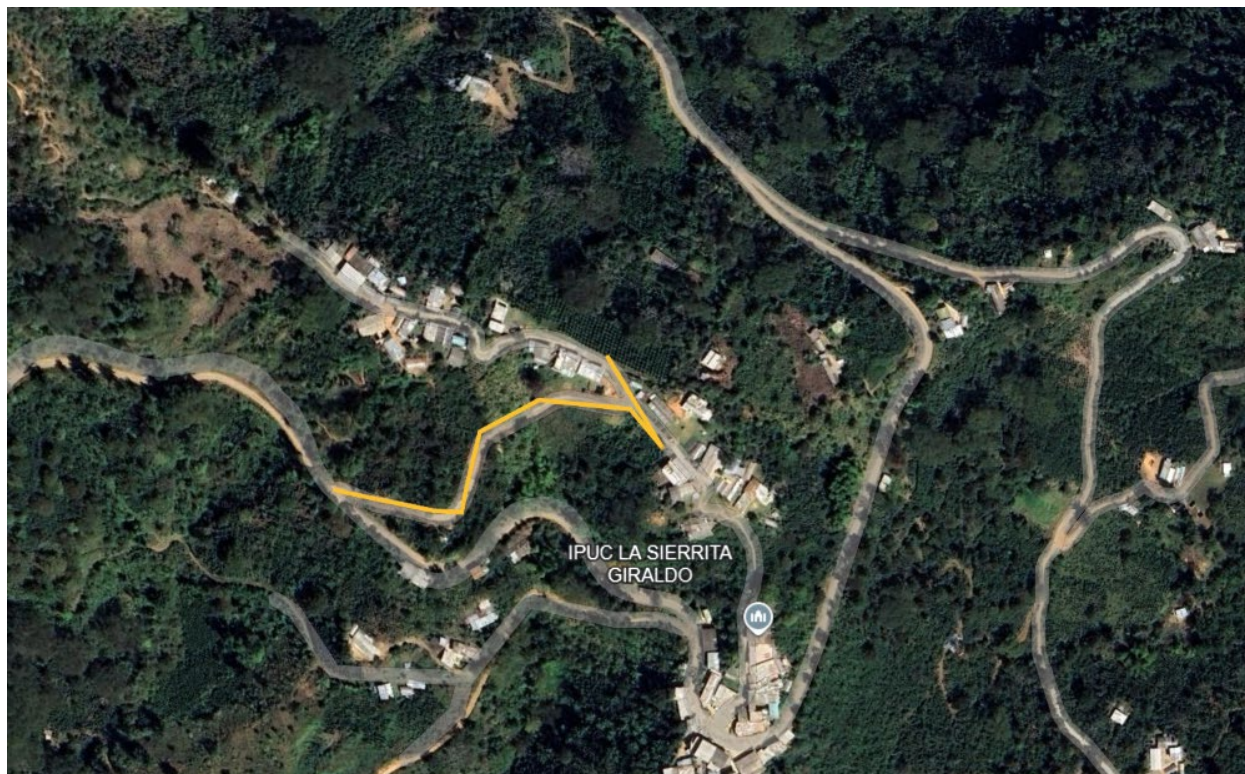




2.2 Ubicación de placa huella en vereda la Sierra



2.3 Ubicación de placa huella Vereda Ciénaga sector Bonanza

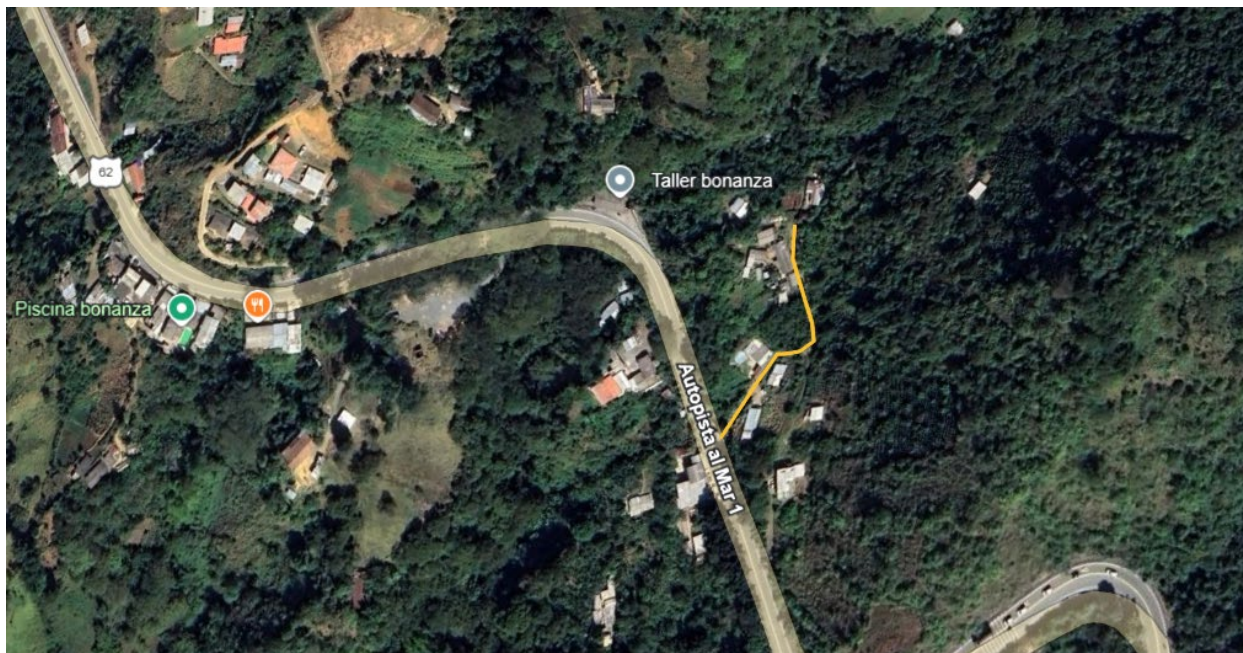

Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las vías objeto de construcción corresponden a una calle establecida en proximidad con la plazuela de la Vereda Sierrita, otra ubicada a lado de la placa deportiva de la Vereda la Sierra y por último una calle ubicada en el sector Bonanza de la Vereda Cienaga, quienes enfrentan serias dificultades de movilidad y seguridad, especialmente en épocas de invierno para sus actividades económicas.

3.1 Problemática actual

- Las vías, al estar sin pavimentar presentan un acelerado deterioro en su superficie de rodadura producto del escurrimiento de aguas lluvias, generando cárcavas y erosión que ponen en riesgo tanto la infraestructura como la seguridad de los habitantes.
- El tránsito de vehículos livianos y mototaxis se ve imposibilitado durante lluvias, lo cual afecta directamente la movilidad de los residentes hacia sus lugares de trabajo, estudio o atención médica.
- Los menores que asisten a instituciones educativas enfrentan obstáculos peligrosos para trasladarse, lo que compromete su derecho al acceso seguro de la educación.

3.2 Impactos sociales

- Las condiciones actuales de la vía afectan negativamente la calidad de vida de la comunidad, obstaculizando la integración rural y el desarrollo socioeconómico del sector.
- La falta de infraestructura adecuada limita la circulación, genera aislamiento y pone en riesgo la seguridad física y emocional de los residentes, especialmente niños y adultos mayores.



3.3 Valor estratégico y rural

Las calles se encuentran en proximidad con plazuela de la sierrita, en la entrada a vereda La Sierra y el sector de Bonanza de la vereda La Ciénaga, lo que confiere un alto valor rural y potencial comercial, por ello la pavimentación contribuirá al embellecimiento del entorno y revitalización de los espacios públicos. La ejecución de esta obra constituye un paso decisivo hacia la consolidación de un entorno rural seguro, resiliente y con condiciones dignas para la comunidad de estas veredas.

Su implementación no solo es técnicamente viable, sino que a su vez dada la especialización de producción de café y todos los productos que estas veredas producen, especialmente en periodos de invierno, cuando la movilidad y seguridad se ven gravemente comprometidas, fortaleciera así sus actividades económicas.

Por otro lado, estas calles sin pavimentar generan afectaciones, poniendo en grave riesgo la infraestructura vial, comprometiendo de forma significativa el tránsito de vehículos, peatones y el acceso seguro de la comunidad al resto del territorio. La naturaleza de esta emergencia exige una atención inminente, ya que el colapso parcial de las vías podría derivar en el aislamiento de las comunidades, la interrupción de servicios esenciales y un incremento en el riesgo de accidentes viales.

Dicha intervención no solo garantizará la seguridad de quienes transitan por las vías, sino también la continuidad del desarrollo social y económico del sector. Esta situación debe ser abordada con la construcción de las vías para evitar una mayor afectación y proteger la integridad de la comunidad.



4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE MODIFICACION PARA ACTA No 1										
SMC 053-2025										
OBJETO: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO"										
FECHA: NOVIEMBRE 27 DEL 2025										
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA - EDURHA DABEIBA. NIT. 901.809.163-4										
CONTRATISTA: CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S NIT. 901.794.123-9										
INTERVENTOR:										
CONDICIONES INICIALES						PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2	VEREDA LA SIERRITA				\$ 104.669.227,00			\$ 2.100.078,00		\$ 106.769.306,00
2.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	170,00	\$ 4.151,00	\$ 705.670,00	+	16,75	\$ 69.529,00	186,75	\$ 775.199,00
2.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	109,65	\$ 126.220,00	\$ 13.840.023,00	-	-22,11	-\$ 2.790.725,00	87,54	\$ 11.049.299,00
2.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	4.855,08	\$ 6.013,00	\$ 29.193.596,00	+	706,86	\$ 4.250.349,00	5.561,94	\$ 33.443.945,00
2.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	111,13	\$ 469.105,00	\$ 52.131.639,00	+	0,25	\$ 117.276,00	111,38	\$ 52.248.915,00
2.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	21,14	\$ 416.192,00	\$ 8.798.299,00	+	1,09	\$ 453.649,00	22,23	\$ 9.251.948,00
3	VEREDA LA SIERRA				\$ 123.181.469,00			\$ 6.351.390,00		\$ 129.532.858,00
3.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	200,00	\$ 4.151,00	\$ 830.200,00	+	56,50	\$ 234.532,00	256,50	\$ 1.064.732,00
3.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	129,00	\$ 126.220,00	\$ 16.282.380,00	-	-21,11	-\$ 2.664.299,00	107,89	\$ 13.618.081,00
3.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	5.701,34	\$ 6.013,00	\$ 34.282.157,00	+	625,98	\$ 3.764.018,00	6.327,32	\$ 38.046.175,00
3.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	130,92	\$ 469.105,00	\$ 61.415.227,00	+	6,96	\$ 3.264.971,00	137,88	\$ 64.680.197,00
3.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	24,92	\$ 416.192,00	\$ 10.371.505,00	+	4,21	\$ 1.752.168,00	29,13	\$ 12.123.673,00
4	VEREDA CIENAGA				\$ 80.148.293,00			-\$ 8.451.468,00		\$ 71.696.825,00
4.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	130,00	\$ 4.151,00	\$ 539.630,00	+	21,90	\$ 90.907,00	151,90	\$ 630.537,00
4.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	83,85	\$ 126.220,00	\$ 10.583.547,00	-	-19,00	-\$ 2.398.180,00	64,85	\$ 8.185.367,00
4.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.731,32	\$ 6.013,00	\$ 22.436.427,00	-	-164,49	-\$ 989.078,00	3.566,83	\$ 21.447.349,00
4.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	85,03	\$ 469.105,00	\$ 39.887.998,00	-	-11,77	-\$ 5.521.366,00	73,26	\$ 34.366.632,00
4.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	16,10	\$ 416.192,00	\$ 6.700.691,00	+	0,88	\$ 366.249,00	16,98	\$ 7.066.940,00
SUB TOTAL					\$ 307.998.989,00			\$ -		\$ 307.998.989,00
ADMINISTRACION 25,00%					\$ 76.999.747,00			\$ -		\$ 76.999.747,00
UTILIDAD 5%					\$ 15.399.949,00			\$ -		\$ 15.399.949,00
TOTAL AIU 30,00%					\$ 92.399.696,00			\$ -		\$ 92.399.696,00
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 400.398.685,00			\$ -		\$ 400.398.685,00


Email: ciicocsabsas@gmail.com

Cel: 313 446 4892




5. ANEXOS FOTOGRÁFICOS

5.1 Conformación y mejoramiento de calzada existente (V. Sierrita)

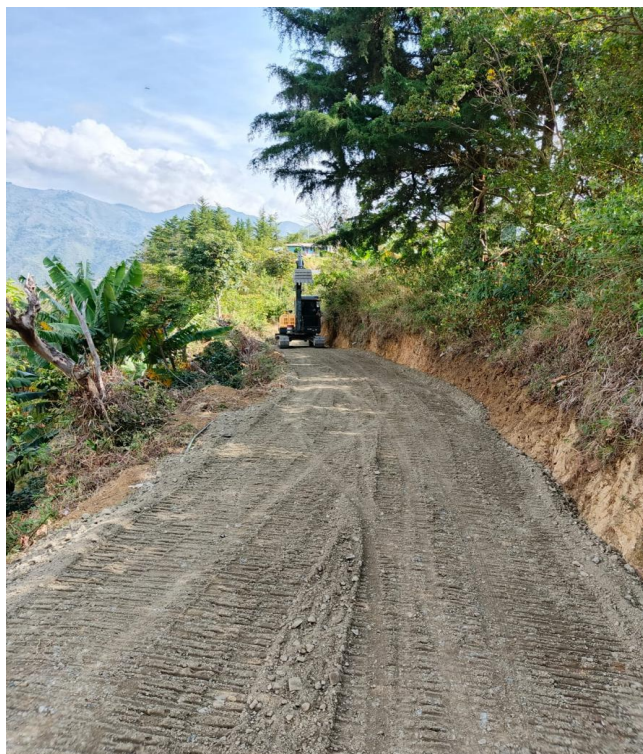

CAMON 30 5G •

23mm f/1.88 1/214s ISO50

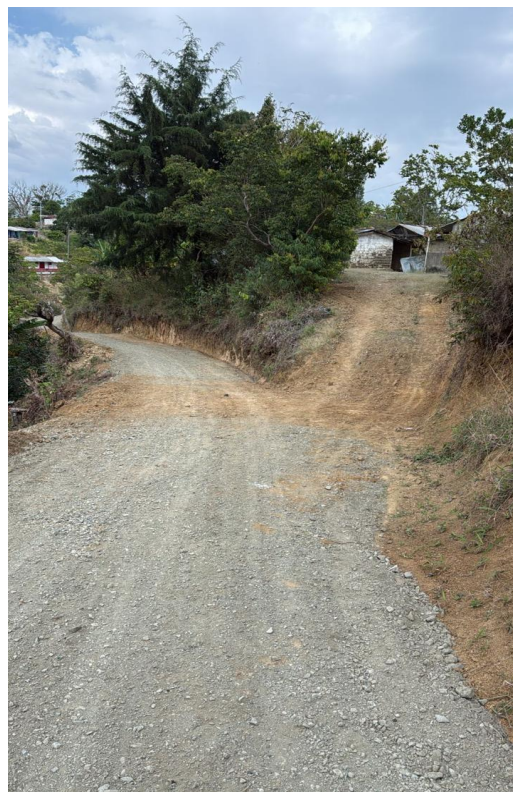

Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.2 Suministro, transporte, instalación y compactación de sub base granular tipo C (V. Sierrita)



CAMON 30 5G

23mm f/1.88 1/187s ISO50



Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



CAMON 30 5G

23mm f/1.88 1/324s ISO50

Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.3 Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa (Grado 60) (V. Sierrita)





Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.4 Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso. (V. Sierrita)





Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.5 Fabricacion de concreto G ciclopeo de resistencia de 17 MPa (2500 PSI) (V. Sierrita)





Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.6 Conformación y mejoramiento de calzada existente (V. Sierra)



CAMON 30 5G

23mm f/1.88 1/214s ISO50

Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.7 Suministro, transporte, instalación y compactación de sub base granular tipo C (V. Sierra)



CAMON 30 5G

23mm f/1.88 1/324s ISO50



Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.8 Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy= 420 MPa (Grado 60)





5.9 Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso.





5.10 Fabricacion de concreto G ciclopeo de resistencia de 17 MPa (2500 PSI)





5.11 Conformación y mejoramiento de calzada existente (V. Ciénaga)





5.12 Suministro, transporte, instalación y compactación de sub base granular tipo C (V. Ciénaga)



5.13 Transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y = 420$ MPa (Grado 60)





5.14 Fabricación de concreto D de resistencia de 21 MPa (3000 PSI) para placa huella, cuneta, riostras y rampas de acceso.



Email: Ciicocsabsas@gmail.com
Cel: 313 446 4892



5.15 Fabricacion de concreto G ciclopeo de resistencia de 17 MPa (2500 PSI)



SAMUEL BARRERA CABALLERO

T.P. 68202-328667 STD

CIICOCOSAB S.A.S

Email: Ciicocsabsas@gmail.com

Cel: 313 446 4892

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
6	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	2.1	ml	16,75

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
REAJUSTE DE CANTIDAD EN CONFORMACION POR MAYOR CANTIDAD	1,00	1,00	16,75	1,00	1,00	16,75
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 6						16,75





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCION	ITEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
7	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	2.2	M3	-22,11

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
REAJUSTE DE CANTIDAD DE SUB BASE POR AJUSTE EN MODIFICATORIA 1	1,00	1,00	-34,28	4,30	0,15	-22,11
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 7						-22,11





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

#¡REF!

MEMORIAS DE OBRA

#iREF!

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
9	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	2.4	M3	0,25

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
REAJUSTE DE CANTIDAD DE CONCRETO POR MAYOR CANTIDAD	1,00	2,00	0,83	1,00	0,15	0,25
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 9						0,25





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
 T.P. 68202-328667 STD
 Contratista

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
10	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	2.5	M3	1,09

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL
REAJUSTE DE CONCRETO CICLOPEO POR MAYOR CANTIDAD	1,00	1,00	8,07	0,90	0,15	1,09
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 10						1,09




 Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
 T.P. 68202-328667 STD
 Contratista

#¡REF!

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
11	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	3.1	ml	56,50

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
REAJUSTE PARA ACTA	1,00	1,00	56,50	1,00	1,00	56,50
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 11						56,50





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
 T.P. 68202-328667 STD
 Contratista

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
12	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	3.2	M3	-21,11

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
Sub base granular	1,00	1,00	14.528.764,63	3,25	0,15	-21,11
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 12						-21,11





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

#IREFI

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES

CIICOCSAB SAS
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO

MEMORIAS DE OBRA



No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
13	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa (Grado 60)	3.3	Kg	625,98

DETALLE	LONG TRASLAPO	CANT TRASLAPOS	LONGITUD	CANT VARILLAS	PESO (Kg/MI)	TOTAL
REAJUSTE DE ACERO INSTALADO	0,54	22,00	127,85	8,00	0,56	625,98
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 13						625,98

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 13	625,98
--------------------------------	--------



Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO

T.P. 68202-328667 STD

Contratista

#REF!

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
14	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, ríostros y rampas de accesos	3.4	M3	6,96

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
rieles de concreto	1,00	2,00	23,20	1,00	0,15	6,96
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 14						6,96




 Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
 T.P. 68202-328667 STD
 Contratista

#IREFI

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
15	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	3.5	M3	4,21

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL
REAJUSTE DE CANTIDADES EN CONCRETO CICLOPEO	1,00	1,00	31,19	0,90	0,15	4,21
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 15						4,21





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

#¡REF!

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
16	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	4.1	ml	151,90

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
Conformacion de via VEREDA CIENAGA SECTOR BONANZA	1,00	1,00	139,50	1,00	1,00	139,50
Conformacion de via VEREDA CIENAGA SECTOR BONANZA via nueva	1,00	1,00	12,40	1,00	1,00	12,40
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 16						151,90





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
17	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	4.2	M3	64,85

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
Sub base granular INICIO PLACAHUELLA	1,00	1,00	7,80	5,65	0,15	6,61
Sub base granular PLACAHUELLA	1,00	1,00	127,20	3,30	0,15	62,96
Sub base granular VIA NUEVA SOBREALANCHO	1,00	1,00	1,00	11,85	0,15	1,78
Sub base granular VIA NUEVA ENTRADA ANCHA	1,00	1,00	5,40	4,40	0,15	3,56
Sub base granular VIA NUEVA ENTRADA X 2M	1,00	1,00	6,00	2,00	0,15	1,80
Sub base granular FINAL RAMPA ACCESO	1,00	1,00	4,50	4,65	0,15	3,14
Sub base granular FINAL RAMPA ACCESO	-1,00	1,00	25,00	4,00	0,15	-15,00
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 17						64,85





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

#REF1

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO		
DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
18	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	4.3	Kg	3.566,83

DETALLE	LONG TRASLAPO	CANT TRASLAPOS	LONGITUD	CANT VARILLAS	PESO (Kg/Ml)	TOTAL
Refuerzo de acero LONGITUDINAL SOBREALCHO IZQUIERDO INICIO	0,54	0,00	3,40	9,00	0,56	17,14
Refuerzo de acero TRANSVERSAL SOBREALCHO IZQUIERDO INICIO	0,54	0,00	0,75	18,00	0,56	7,56
Refuerzo de acero LONGITUDINAL SOBREALCHO DERECHO INICIO	0,54	0,00	3,90	17,00	0,56	37,13
Refuerzo de acero TRANSVERSAL SOBREALCHO DERECHO INICIO	0,54	0,00	1,60	21,00	0,56	18,82
Refuerzo de acero LONGITUDINAL RAMPA INICIO	0,54	0,00	1,00	18,00	0,56	10,08
Refuerzo de acero TRANSVERSAL RAMPA INICIO	0,54	0,00	3,30	6,00	0,56	11,09
Refuerzo de acero LONGITUDINAL RAMPA K0+023	0,54	0,00	1,00	15,00	0,56	8,40
Refuerzo de acero TRANSVERSAL RAMPA K0+023	0,54	0,00	2,80	6,00	0,56	9,41
Refuerzo de acero LONGITUDINAL SOBREALCHO K0+070	0,54	3,00	11,85	6,00	0,56	45,26
Refuerzo de acero TRANSVERSAL SOBREALCHO K0+070	0,54	0,00	1,00	60,00	0,56	33,60
Refuerzo de acero LONGITUDINAL TRANSICION ANCHA ENTRADA K0+070	0,54	0,00	5,40	23,00	0,56	69,55
Refuerzo de acero TRANSVERSAL TRANSICION ANCHA ENTRADA K0+070	0,54	0,00	4,40	28,00	0,56	68,99
Refuerzo de acero LONGITUDINAL ENTRADA A VIA NUEVA K0+070	0,54	0,00	6,00	11,00	0,56	36,96
Refuerzo de acero TRANSVERSAL ENTRADA A VIA NUEVA K0+070	0,54	0,00	2,00	31,00	0,56	34,72
Refuerzo de acero LONGITUDINAL EN VIGAS RIOSTRAS x46	0,54	0,00	3,25	184,00	0,56	334,88
Refuerzo de acero TRANSVERSAL EN VIGAS RIOSTRAS x46	0,54	0,00	0,90	782,00	0,56	394,13
Refuerzo de acero LONGITUDINAL EN CORDONERIA	0,54	24,00	135,00	6,00	0,56	497,15
Refuerzo de acero TRANSVERSAL EN CORDONERIA	0,54	0,00	0,25	1.352,00	0,56	189,28
Refuerzo de acero LONGITUDINAL EN RIEL	0,54	24,00	135,00	10,00	0,56	828,58
Refuerzo de acero TRANSVERSAL EN RIEL	0,54	0,00	1,00	1.352,00	0,56	757,12
Refuerzo de acero LONGITUDINAL RAMPA K0+135	0,54	0,00	4,50	24,00	0,56	60,48
Refuerzo de acero TRANSVERSAL RAMPA K0+135	0,54	0,00	4,63	24,00	0,56	62,23
Refuerzo de acero LONGITUDINAL LLAVE PARA RAMPA K0+139,5	0,54	0,00	6,00	4,00	0,56	13,44
Refuerzo de acero TRANSVERSAL LLAVE PARA RAMPA K0+139,5	0,54	0,00	1,20	31,00	0,56	20,83
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 18						3.566,83





Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO

T.P. 68202-328667 STD

Contratista

#IREF1

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
19	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	4.4	M3	73,26

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPOSOR	TOTAL
CONCRETO PARA SOBREALCHO IZQUIERDO INICIO	1,00	1,00	3,40	0,75	0,15	0,38
CONCRETO PARA SOBREALCHO DERECHO INICIO	1,00	1,00	3,90	1,60	0,15	0,94
CONCRETO PARA RAMPA INICIO	1,00	1,00	1,00	3,30	0,15	0,50
CONCRETO PARA ENTRADA K0+023	1,00	1,00	1,00	2,80	0,15	0,42
CONCRETO PARA SOBREALCHO ENTRADA K0+0.70	1,00	1,00	1,00	11,85	0,15	1,78
CONCRETO TRANSICION ANCHA ENTRADA K0+070	1,00	1,00	5,40	4,40	0,15	3,56
CONCRETO ENTRADA A VIA NUEVA K0+070	1,00	1,00	6,00	2,00	0,15	1,80
CONCRETO PARA VIGAS RIOSTRAS	1,00	46,00	3,25	0,20	0,25	7,48
CONCRETO PARA CORDONERIA PLACAHUELLA	1,00	2,00	135,00	0,15	0,30	12,15
CONCRETO PARA RIELES PLACAHUELLA	1,00	2,00	135,00	1,00	0,15	40,50
CONCRETO RAMPA ACCESO FINAL K0+135	1,00	1,00	4,50	4,63	0,15	3,13
CONCRETO LLAVE PARA RAMPA ACCESO FINAL K0+139,5	1,00	1,00	6,00	0,30	0,35	0,63
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 19						73,26




 Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
 T.P. 68202-328667 STD
 Contratista

#IREF!

CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS		
CIVILES		
CIICOC SAB SAS		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO		
MEMORIAS DE OBRA		

No.	DESCRIPCIÓN	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD
20	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	4.5	M3	16,98

DETALLE	FACTOR	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TOTAL
Ciclopeo central	1,00	1,00	125,80	0,90	0,15	16,98
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD No 20						16,98






Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

#¡REF!

ACTA DE MODIFICACION PARA ACTA No 3													
SMC 053-2025													
OBJETO: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS, EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO"													
FECHA: NOVIEMBRE 27 DEL 2025													
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA - EDURHA DABEIBA. NIT. 901.809.163-4													
CONTRATISTA: CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S NIT. 901.794.100-3													
INTERVENTOR:													
	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ANTERIORES		PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
2	VEREDA LA SIERRITA				\$ 104.669.227,00		\$ 104.669.227,00			\$ 2.100.078,00		\$ 106.769.306,00	
2.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	170,00	\$ 4.151,00	\$ 705.670,00	170,00	\$ 705.670,00	+	16,75	\$ 69.529,00	186,75	\$ 775.199,00	
2.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	109,65	\$ 126.220,00	\$ 13.840.023,00	109,65	\$ 13.840.023,00	-	-22,11	-\$ 2.790.725,00	87,54	\$ 11.049.299,00	
2.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	4.855,08	\$ 6.013,00	\$ 29.193.596,00	4855,08	\$ 29.193.596,00	+	706,86	\$ 4.250.349,00	5.561,94	\$ 33.443.945,00	
2.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	111,13	\$ 469.105,00	\$ 52.131.639,00	111,13	\$ 52.131.639,00	+	0,25	\$ 117.276,00	111,38	\$ 52.248.915,00	
2.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	21,14	\$ 416.192,00	\$ 8.798.299,00	21,14	\$ 8.798.299,00	+	1,09	\$ 453.649,00	22,23	\$ 9.251.948,00	
3	VEREDA LA SIERRA				\$ 123.181.469,00		\$ 123.181.469,00			\$ 6.351.390,00		\$ 129.532.858,00	
3.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	200,00	\$ 4.151,00	\$ 830.200,00	200,00	\$ 830.200,00	+	56,50	\$ 234.532,00	256,50	\$ 1.064.732,00	
3.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	129,00	\$ 126.220,00	\$ 16.282.380,00	129,00	\$ 16.282.380,00	-	-21,11	-\$ 2.664.299,00	107,89	\$ 13.618.081,00	
3.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	5.701,34	\$ 6.013,00	\$ 34.282.157,00	5701,34	\$ 34.282.157,00	+	625,98	\$ 3.764.018,00	6.327,32	\$ 38.046.175,00	
3.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	130,92	\$ 469.105,00	\$ 61.415.227,00	130,92	\$ 61.415.227,00	+	6,96	\$ 3.264.971,00	137,88	\$ 64.680.197,00	
3.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	24,92	\$ 416.192,00	\$ 10.371.505,00	24,92	\$ 10.371.505,00	+	4,21	\$ 1.752.168,00	29,13	\$ 12.123.673,00	
4	VEREDA CIENAGA				\$ 80.148.293,00		\$ 80.148.293,00			-\$ 8.451.468,00		\$ 71.696.825,00	
4.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	130,00	\$ 4.151,00	\$ 539.630,00	130,00	\$ 539.630,00	+	21,90	\$ 90.907,00	151,90	\$ 630.537,00	
4.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	83,85	\$ 126.220,00	\$ 10.583.547,00	83,85	\$ 10.583.547,00	-	-19,00	-\$ 2.398.180,00	64,85	\$ 8.185.367,00	
4.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.731,32	\$ 6.013,00	\$ 22.436.427,00	3731,32	\$ 22.436.427,00	-	-164,49	-\$ 989.078,00	3.566,83	\$ 21.447.349,00	
4.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	85,03	\$ 469.105,00	\$ 39.887.998,00	85,03	\$ 39.887.998,00	-	-11,77	-\$ 5.521.366,00	73,26	\$ 34.366.632,00	
4.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	16,10	\$ 416.192,00	\$ 6.700.691,00	16,10	\$ 6.700.691,00	+	0,88	\$ 366.249,00	16,98	\$ 7.066.940,00	
SUB TOTAL					\$ 307.998.989,00	SUB TOTAL	\$ 307.998.989,00			\$ -		\$ 307.998.989,00	
ADMINISTRACION 25,00%					\$ 76.999.747,00	25%	\$ 76.999.747,00			\$ -		\$ 76.999.747,00	
UTILIDAD 5%					\$ 15.399.949,00	5%	\$ 15.399.949,00			\$ -		\$ 15.399.949,00	
TOTAL AIU 30,00%					\$ 92.399.696,00	30%	\$ 92.399.696,00			\$ -		\$ 92.399.696,00	
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 400.398.685,00	ST OBRAS	\$ 400.398.685,00			\$ -		\$ 400.398.685,00	




 Samuel Barrera Caballero
 Representante Legal
 Contratista


 Henry Johan Cumpido Sepulveda
 Secretario de planeacion
 T.P. 013597-0547312 ANT



CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S

CIICOC SAB S.A.S

NIT. 901.794.100 - 3

ACTA PARCIAL DE COBRO No 001 CONTRATO SMC 053 DE 2025



CONTRACTUAL						ACTA MODIFICATORIA 1		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
2	VEREDA LA SIERRITA														
2.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	170,0	\$ 4.151,00	\$ 705.670,00	186,75	\$ 775.199,00	170,00	\$ 705.670,00	-	\$ 0,00	16,75	\$ 69.529,25	186,75	\$ 775.199,00
2.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M³	109,7	\$ 126.220,00	\$ 13.840.023,00	87,54	\$ 11.049.299,00	109,65	\$ 13.840.023,00	-	\$ 0,00	-22,11	-\$ 2.790.724,20	87,54	\$ 11.049.299,00
2.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	M³	4.855,1	\$ 6.013,00	\$ 29.193.596,00	5561,94	\$ 33.443.945,00	4855,08	\$ 29.193.596,00	-	\$ 0,00	706,86	\$ 4.250.349,18	5.561,94	\$ 33.443.945,00
2.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M³	111,1	\$ 469.105,00	\$ 52.131.639,00	111,38	\$ 52.248.915,00	111,13	\$ 52.131.639,00	-	\$ 0,00	0,25	\$ 117.276,25	111,38	\$ 52.248.915,00
2.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M³	21,14	\$ 416.192,00	\$ 8.798.299,00	22,23	\$ 9.251.948,00	21,14	\$ 8.798.299,00	-	\$ 0,00	1,09	\$ 453.649,28	22,23	\$ 9.251.948,00
Subtotal					\$ 104.669.227,00	Subtotal	\$ 106.769.306,00	Subtotal	\$ 104.669.227,00	Subtotal	\$ 0,00	Subtotal	\$ 2.100.079,76	Subtotal	\$ 106.769.306,00
3	VEREDA LA SIERRA														
3.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	200,00	\$ 4.151,00	\$ 830.200,00	256,50	\$ 1.064.732,00	-	\$ 0,00	200,00	\$ 830.200,00	56,50	\$ 234.531,50	256,50	\$ 1.064.732,00
3.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	129,00	\$ 126.220,00	\$ 16.282.380,00	107,89	\$ 13.618.081,00	-	\$ 0,00	129,00	\$ 16.282.380,00	-21,11	-\$ 2.664.298,54	107,89	\$ 13.618.081,00
3.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	5.701,34	\$ 6.013,00	\$ 34.282.157,00	6327,32	\$ 38.046.175,00	-	\$ 0,00	5.701,34	\$ 34.282.157,00	625,98	\$ 3.764.017,74	6.327,32	\$ 38.046.175,00
3.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	130,92	\$ 469.105,00	\$ 61.415.227,00	137,88	\$ 64.680.197,00	-	\$ 0,00	130,92	\$ 61.415.227,00	6,96	\$ 3.264.970,80	137,88	\$ 64.680.197,00
3.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	24,92	\$ 416.192,00	\$ 10.371.505,00	29,13	\$ 12.123.673,00	-	\$ 0,00	24,92	\$ 10.371.505,00	4,21	\$ 1.752.168,32	29,13	\$ 12.123.673,00
Subtotal					\$ 123.181.469,00	Subtotal	\$ 129.532.858,00	Subtotal	\$ 0,00	Subtotal	\$ 123.181.469,00	Subtotal	\$ 6.351.389,82	Subtotal	\$ 129.532.858,00
4	VEREDA CIENAGA														
4.1	Conformacion y mejoramiento de calzada existente	ml	130,00	\$ 4.151,00	\$ 539.630,00	151,90	\$ 630.537,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	151,90	\$ 630.536,90	151,90	\$ 630.537,00
4.2	Suministro, transporte, instalacion y compactacion de subbase granular tipo C	M3	83,85	\$ 126.220,00	\$ 10.583.547,00	64,85	\$ 8.185.367,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	64,85	\$ 8.185.367,00	64,85	\$ 8.185.367,00
4.3	transporte interno (Trasciego) y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.731,32	\$ 6.013,00	\$ 22.436.427,00	3566,83	\$ 21.447.349,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	3.566,83	\$ 21.447.348,79	3.566,83	\$ 21.447.349,00
4.4	Fabricacion de Concreto D de resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) para placahuella, cuneta, riostras y rampas de accesos	M3	85,03	\$ 469.105,00	\$ 39.887.998,00	73,26	\$ 34.366.632,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	73,26	\$ 34.366.632,30	73,26	\$ 34.366.632,00
4.5	Fabricacion de Concreto G ciclopeo de resistencia de 17 Mpa (2500 PSI)	M3	16,10	\$ 416.192,00	\$ 6.700.691,00	16,98	\$ 7.066.940,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	16,98	\$ 7.066.940,16	16,98	\$ 7.066.940,00
Subtotal					\$ 80.148.293,00	Subtotal	\$ 71.696.825,00	Subtotal	\$ 0,00	Subtotal	\$ 0,00	Subtotal	\$ 71.696.825,15	Subtotal	\$ 71.696.825,00
Subtotal Obra					\$ 307.998.989,00	Subtotal Obra	\$ 307.998.989,00	Subtotal Obra	\$ 104.669.227,00	Subtotal Obra	\$ 123.181.469,00	Subtotal Obra	\$ 80.148.294,00	Subtotal Obra	\$ 307.998.989,00
Administración					25,00%	\$ 76.999.747,00		25,00%	\$ 76.999.747,00		\$ 30.795.367,00		\$ 20.037.074,00		\$ 76.999.747,00
Utilidad					5,00%	\$ 15.399.949,00		5,00%	\$ 15.399.949,00		\$ 5.233.461,00		\$ 6.159.073,00		\$ 15.399.949,00
AIU					30,00%	\$ 92.399.696,00		30,00%	\$ 92.399.696,00		\$ 31.400.768,00		\$ 36.954.440,00		\$ 92.399.696,00
TOTAL OBRAS					\$ 400.398.685,00	TTAL OBRAS	\$ 400.398.685,00					\$ 160.135.909,00	\$ 104.192.783,00		\$ 400.398.685,00

100,00%

Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
07781f089e548cdde6307012da9d28bd8e1f47c90a8b02ef781d77b0e29fd193aef2a1e189b7339e7d4832b5785522bf

Número de Factura: FE-3

Fecha de Emisión: 25/03/2026

Fecha de Vencimiento: 09/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido: 3

Fecha de orden de pedido: 25/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CIICOC SAB S.A.S

Nombre Comercial: CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CIICOC SAB S.A.S

Nit del Emisor: 901794100

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Giraldo

Dirección: CL 10 A 11 A 19 URB HORIZONTES

Teléfono / Móvil: 3134464892

Correo: CIICOC SABSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIQUOIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901809163

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Dabeiba

Dirección: CRA MURILLOTORO

Teléfono / Móvil: 3196825069

Correo: andreyquque1979@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	ACTA NRO 03 COBRO FINAL CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS EN DIFERENTES VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	NIU	1,00	\$ 80.148.294,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 80.148.294,00
2	02	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 20.037.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 20.037.074,00
3	3	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 3.367.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 639.839,44	19.00			\$ 3.367.576,00

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2026 11:42:48
Documento validado por la
DIAN:
25/03/2026 11:42:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	103552944
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	103552944
IVA	639839.44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	639839.44
Total neto factura (=)	104192783.44
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 104192783.44

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	103.552.944,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	103.552.944,00
IVA	639.839,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	639.839,44
Total neto factura (=)	104.192.783,44
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$104.192.783,44

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103286422 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-17

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794100	3	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CHICOCASAB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 # 1D- 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134464892	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	167700011	9502139104	E	2026/03/03	2026/03/25	BANCOLOMBIA		\$4,401,000

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	e	td	p	vs	p	co	r	vs	t	sl	n	lige	lm	a	va	c	av	p	vc	t	vi	p	Codig	o	Dias	IBC	Aporte	Codig	o	Dias	IBC	Aporte	Codig	o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC 1020409460	CASTRILLON MONTOYA GUILLERMO LEON																											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
2	CC 8329757	CONDE NARVAEZ LUIS ALBERTO																											230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
3	CC 1046526834	CORDOBA SALAZAR KEVIN ESTIVEN																											230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF04	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	6.960%	\$4,100	1	\$0	\$0	Si	\$18,300
4	CC 1007821583	ESTRADA RAMOS LUIS DEIMER																											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
5	CC 1128388347	GARCES HIGUITA JUAN MANUEL																											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS040	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
6	CC 1026061439	LIZ TAMAYO JHONATAN DAVID																											25-14	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC24	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700
7	CC 16835919	LIZ ROGELIO																											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
8	CC 70471472	MOLINA ALVAREZ LUIS ANGEL																											230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF04	3	\$175,091	\$7,100	14-11	3	\$175,091	6.960%	\$12,200	3	\$0	\$0	Si	\$54,500
9	CC 1041177452	SALAS CARDONA YOHIN FABER																											230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
10	CC 1033655697	SANCHEZ ECHEVERRI DIEGO ALEXANDER																											230201	2	\$116,727	\$18,700	ESSC24	2	\$116,727	\$4,700	CCF04	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	6.960%	\$8,200	2	\$0	\$0	Si	\$36,300
11	CC 1039023771	SERNA CORREA CRISTIAN ALFREDO																											230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS040	2	\$116,727	\$4,700	CCF04	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	6.960%	\$8,200	2	\$0	\$0	Si	\$36,300
12	CC 1041177263	TUBERQUIA LOPEZ DUBAN ESTIVEN																											230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
Total Afiliados(12)																				\$14,007,241	\$2,241,800			\$14,007,241	\$561,000			\$14,007,241	\$561,000			\$14,007,241	\$975,400			\$0	\$0		\$4,339,200											

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,241,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$205,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,177,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$859,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$975,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$975,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$561,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	\$561,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$561,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$266,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$149,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$144,900
TOTAL				12	\$4,339,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794100	3	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CHICOCASAB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 # 1D- 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134464892	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	167722794	9499860061	E	2026/03/03	2026/03/25	BANCOLOMBIA		\$435,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No .	Identificación	Nombre	in g	re t	ta e	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lge	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13571105	BARRERA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
Total Afiliados(1)																																			\$429,600				

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,200
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	1	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$70,100
COMFAMA	CCF04		890,900,841	9	1	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	1	\$70,100
TOTAL					1	\$429,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794100	3	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CHICOCASAB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 # 1D- 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134464892	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	167673503	9502138572	E	2026/02/03	2026/03/25	BANCOLOMBIA		\$4,049,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	in g	re t	ta e	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lge	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC 1000099354	CAMPO MANCO ALEJANDRO	X	X													230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF04	3	\$175,091	\$7,100	14-11	3	\$175,091	6.960%	\$12,200	3	\$0	\$0	Si	\$54,500				
2	CC 1001744142	CAMPO HIGUITA ROBINSON FERNEY	X	X													230301	3	\$175,091	\$28,100	ESSC24	3	\$175,091	\$7,100	CCF04	3	\$175,091	\$7,100	14-11	3	\$175,091	6.960%	\$12,200	3	\$0	\$0	Si	\$54,500				
3	CC 1020409460	CASTRILLON MONTOYA GUILLERMO LEON	X														230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS037	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
4	CC 8329757	CONDE NARVAEZ LUIS ALBERTO	X														230201	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS037	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
5	CC 1046526834	CORDOBA SALAZAR KEVIN ESTIVEN	X														230301	16	\$933,816	\$149,500	EPS037	16	\$933,816	\$37,400	CCF04	16	\$933,816	\$37,400	14-11	16	\$933,816	6.960%	\$65,000	16	\$0	\$0	Si	\$289,300				
6	CC 1129534175	DOMINGUEZ GARCIA JAVIER JOSE	X	X													230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS041	3	\$175,091	\$7,100	CCF04	3	\$175,091	\$7,100	14-11	3	\$175,091	6.960%	\$12,200	3	\$0	\$0	Si	\$54,500				
7	CC 1007821583	ESTRADA RAMOS LIS DEIMER	X														230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS040	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
8	CC 1026061439	LIZ TAMAYO JHONATAN DAVID	X														25-14	16	\$933,816	\$149,500	ESSC24	16	\$933,816	\$37,400	CCF04	16	\$933,816	\$37,400	14-11	16	\$933,816	6.960%	\$65,000	16	\$0	\$0	Si	\$289,300				
9	CC 16835919	LIZ ROGELIO	X														230301	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC24	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
10	CC 70471472	MOLINA ALVAREZ LUIS ANGEL	X														230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS037	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
11	CC 1041177452	SALAS CARDONA YOHN FABER	X														230201	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC24	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
12	CC 1033655697	SANCHEZ ECHEVERRI DIEGO ALEXANDER	X														230201	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC24	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
13	CC 1039023771	SERNA CORREA CRISTIAN ALFREDO	X														230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS040	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF04	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700				
Total Afiliados(13)																	\$12,664,881				\$2,027,300					\$12,664,881	\$507,300					\$12,664,881	\$507,300					\$12,664,881	\$881,800	\$0	\$0	\$3,923,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,027,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$149,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,233,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$644,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$881,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$881,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$507,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	\$507,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$507,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$198,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$198,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$7,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$102,800
TOTAL				13	\$3,923,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794100	3	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA - CHICOCASAB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 # 1D- 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134464892	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	167712086	9498401897	E	2026/02/03	2026/03/25	BANCOLOMBIA		\$443,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No .	Identificación	Nombre	in g	re t	ta e	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lige	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13571105	BARRERA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
Total Afiliados(1)																																					\$429,600		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600



**CERTIFICACIÓN PARAFISCALES Y ESTADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST)**

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y Estado de
implementación del SG SST (No necesita autenticación
notarial)

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAD DEL MUNICIPIO DE DABEIBA - EDURHA
DABEIBA**

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y estado del SG SST.

El suscrito revisor fiscal de **CONSULTORIA EN INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA – CIICOC SAB SAS**, certifica que a la fecha de presentación (28 de Febrero de 2026), se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Se certifica que el estado actual de implementación de los principales elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 es el siguiente:

#	REQUISITO	Implementado	
		SI	NO*
1	¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la normatividad vigente en riesgos laborales que debe cumplir la organización incluyendo estándares mínimos?	X	
2	¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles incluye todos los centros de trabajo, procesos, actividades rutinarias y no rutinarias y el número total de expuestos; y tiene en consideración los cambios en la organización y sus procesos o la ocurrencia de accidentes?	X	
3	¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control sugeridos y de evaluación de la efectividad de las medidas implementadas?	X	
4	¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de accidentalidad?	X	
5	¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de enfermedad laboral?	X	
6	¿Se cuenta con registro y seguimiento de los indicadores del SG SST y sus resultados?	X	

#	REQUISITO	Implementado	
		SI	NO*
7	¿Se cuenta con la descripción sociodemográfica de los trabajadores y caracterización de las condiciones de salud?	X	
8	¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de puestos de trabajo dentro de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológico?	X	


9	¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de capacitación y de los procesos de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo que cubre a todos los trabajadores e incluye la descripción de las actividades a realizar, información de la identificación de riesgo, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles para prevención de los ATEL (accidentes de trabajo y enfermedades laborales)?	X	
10	¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos y amenazas de la empresa en cuanto a emergencias?	X	

Cordialmente,



SAMUEL BARRERA CABALLERO
C.C. 13.189.546
Representante Legal
Cel 313 446 4892
CIICOC SAB S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA


Cliete: CIICOC SAB S.A.S
Obra: Giraldo, Antioquia
Dirección:
Teléfonos:
N.I.T.#: 901.794.100-3
Dirección de la Obra: V. - Ciénaga Giraldo, Antioquia

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 18 de marzo de 2026
Contacto:
Factor de Proyección. 7 días:
Factor de Proyección. 14 días:
Factor de Proyección. 28 días:


CILINDRO No	LOCALIZACIÓN	Fecha (día /mes/año)		EDAD (DIAS)	ELEMENTO	LONGITUD DEL EJE MAYOR (mm)	LONGITUD DEL EJE MENOR (mm)	ESPESOR DE CILINDRO (mm)	MODULO DE ROTURA (Mpa)	MODULO DE ROTURA (Kg/cm2)
		VACIADO	PRUEBA							
1	K0+000 – K0+100	04-Feb-26	11-Feb-26	7	V. RIOSTRA	300	150	150	13.47	137.38
2	K0+000 – K0+100	05-Feb-26	12-Feb-26	7	RIEL	300	150	150	13.02	132.74
3	K0+000 – K0+100	06-Feb-26	13-Feb-26	7	CORDON	300	150	150	13.27	135.27
4	K0+000 – K0+100	04-Feb-26	18-Feb-26	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.82	181.74
5	K0+000 – K0+100	05-Feb-26	19-Feb-26	14	RIEL	300	150	150	17.24	175.83
6	K0+000 – K0+100	06-Feb-26	20-Feb-26	14	CORDON	300	150	150	18.02	183.71
7	K0+000 – K0+100	04-Feb-26	04-Mar-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	21.82	222.52
8	K0+000 – K0+100	05-Feb-26	05-Mar-26	28	RIEL	300	150	150	21.53	219.56
9	K0+000 – K0+100	06-Feb-26	06-Mar-26	28	CORDON	300	150	150	22.88	233.27
10	K0+100 – K0+190	16-Feb-26	23-Feb-26	7	V. RIOSTRA	300	150	150	13.61	138.78
11	K0+100 – K0+190	17-Feb-26	24-Feb-26	7	RIEL	300	150	150	14.79	150.81
12	K0+100 – K0+190	18-Feb-26	25-Feb-26	7	CORDON	300	150	150	14.01	142.86
13	K0+100 – K0+190	16-Feb-26	02-Mar-26	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.82	181.67
14	K0+100 – K0+190	17-Feb-26	03-Mar-26	14	RIEL	300	150	150	19.12	194.96
15	K0+100 – K0+190	18-Feb-26	04-Mar-26	14	CORDON	300	150	150	18.24	186.03

ENSAYADO POR:


Fabio Jaramillo Cardona
 Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: ING. JHON EDILBERTO MUNERA
 M.P. 0520207546 ANT.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA

16	K0+100 – K0+190	16-Feb-26	16-Mar-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	22.93	233.84
17	K0+100 – K0+190	17-Feb-26	17-Mar-26	28	RIEL	300	150	150	24.21	246.91
18	K0+100 – K0+190	18-Feb-26	18-Mar-26	28	CORDON	300	150	150	23.10	235.59

ENSAYADO POR:




Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



REVISADO POR: ING. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520207546 ANT.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO

Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CIICOCSAB S.A.S
Obra: Giraldo, Antioquia

Dirección: _____
Teléfonos: _____
N.I.T.#: 901.794.100-3
Dirección de la Obra: V. -sierrita Giraldo, Antioquia

Características: _____
Agregado Fino: _____
Agregado Grueso: _____


Cemento: _____
Dosificación: _____
Interventor: _____

Fecha de Informe: 12 de enero de 2026
Contacto: _____

Factor de Proyección. 7 días: _____
Factor de Proyección. 14 días: _____
Factor de Proyección. 28 días: _____

CILINDRO No	LOCALIZACIÓN	Fecha (día /mes/año)		EDAD (DIAS)	ELEMENTO	LONGITUD DEL EJE MAYOR (mm)	LONGITUD DEL EJE MENOR (mm)	ESPESOR DE CILINDRO (mm)	MODULO DE ROTURA (Mpa)	MODULO DE ROTURA (Kg/cm2)
		VACIADO	PRUEBA							
1	K0+000 – K0+100	03-Dic-25	10-Dic-25	7	V. RIOSTRA	300	150	150	12.61	128.66
2	K0+000 – K0+100	04-Dic-25	11-Dic-25	7	RIEL	300	150	150	12.91	131.68
3	K0+000 – K0+100	05-Dic-25	12-Dic-25	7	CUNETAS	300	150	150	12.54	127.89
4	K0+000 – K0+100	06-Dic-25	13-Dic-25	7	CORDON	300	150	150	12.79	130.42
5	K0+000 – K0+100	03-Dic-25	17-Dic-25	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.74	180.90
6	K0+000 – K0+100	04-Dic-25	18-Dic-25	14	RIEL	300	150	150	17.73	180.76
7	K0+000 – K0+100	05-Dic-25	19-Dic-25	14	CUNETAS	300	150	150	18.40	187.65
8	K0+000 – K0+100	06-Dic-25	20-Dic-25	14	CORDON	300	150	150	18.14	185.04
9	K0+000 – K0+100	03-Dic-25	30-Dic-25	28	V. RIOSTRA	300	150	150	21.07	214.92
10	K0+000 – K0+100	04-Dic-25	30-Dic-25	28	RIEL	300	150	150	22.23	226.67
11	K0+000 – K0+100	05-Dic-25	30-Dic-25	28	CUNETAS	300	150	150	22.90	233.48
12	K0+000 – K0+100	06-Dic-25	30-Dic-25	28	CORDON	300	150	150	22.07	225.05
13	K0+100 – K0+190	12-Dic-25	19-Dic-25	7	V. RIOSTRA	300	150	150	13.47	137.31
14	K0+100 – K0+190	13-Dic-25	20-Dic-25	7	RIEL	300	150	150	13.04	133.02
15	K0+100 – K0+190	14-Dic-25	21-Dic-25	7	CUNETAS	300	150	150	12.88	131.33


ENSAYADO POR:


Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



REVISADO POR: **ING. JHON EDILBERTO MUNERA**
M.P. 0520207546 ANT.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA

16	K0+100 – K0+190	15-Dic-25	21-Dic-25	7	CORDON	300	150	150	13.11	133.72
17	K0+100 – K0+190	12-Dic-25	26-Dic-25	14	V. RIOSTRA	300	150	150	18.91	192.85
18	K0+100 – K0+190	13-Dic-25	27-Dic-25	14	RIEL	300	150	150	19.52	199.04
19	K0+100 – K0+190	14-Dic-25	28-Dic-25	14	CUNETA	300	150	150	18.79	191.58
20	K0+100 – K0+190	15-Dic-25	29-Dic-25	14	CORDON	300	150	150	19.15	195.31
21	K0+100 – K0+190	12-Dic-25	09-Ene-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	22.28	227.23
22	K0+100 – K0+190	13-Dic-25	10-Ene-26	28	RIEL	300	150	150	22.04	224.77
23	K0+100 – K0+190	14-Dic-25	11-Ene-26	28	CUNETA	300	150	150	22.99	234.47
24	K0+100 – K0+190	15-Dic-25	12-Ene-26	28	CORDON	300	150	150	21.32	217.39

ENSAYADO POR:




Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



REVISADO POR: ING. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520207546 ANT.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CIICOCSAB S.A.S
Obra: Giraldo, Antioquia

Dirección:
Teléfonos:
N.I.T.#: 901.794.100-3
Dirección de la Obra: V. -sierra Giraldo, Antioquia

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:

Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 12 de febrero de 2026
Contacto:

Factor de Proyección. 7 días:
Factor de Proyección. 14 días:
Factor de Proyección. 28 días:


CILINDRO No	LOCALIZACIÓN	Fecha (día /mes/año)		EDAD (DIAS)	ELEMENTO	LONGITUD DEL EJE MAYOR (mm)	LONGITUD DEL EJE MENOR (mm)	ESPESOR DE CILINDRO (mm)	MODULO DE ROTURA (Mpa)	MODULO DE ROTURA (Kg/cm2)
		VACIADO	PRUEBA							
1	K0+000 – K0+100	22-Dic-25	29-Dic-25	7	V. RIOSTRA	300	150	150	13.46	137.24
2	K0+000 – K0+100	23-Dic-25	30-Dic-25	7	RIEL	300	150	150	13.09	133.44
3	K0+000 – K0+100	24-Dic-25	31-Dic-25	7	CORDON	300	150	150	11.89	121.21
4	K0+000 – K0+100	22-Dic-25	05-Ene-26	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.66	180.12
5	K0+000 – K0+100	23-Dic-25	06-Ene-26	14	RIEL	300	150	150	18.15	185.04
6	K0+000 – K0+100	24-Dic-25	07-Ene-26	14	CORDON	300	150	150	17.16	174.99
7	K0+000 – K0+100	22-Dic-25	19-Ene-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	21.99	224.20
8	K0+000 – K0+100	23-Dic-25	20-Ene-26	28	RIEL	300	150	150	22.44	228.77
9	K0+000 – K0+100	24-Dic-25	21-Ene-26	28	CORDON	300	150	150	21.55	219.71
10	K0+100 – K0+200	03-Ene-26	10-Ene-26	7	V. RIOSTRA	300	150	150	12.58	128.31
11	K0+100 – K0+200	04-Ene-26	11-Ene-26	7	RIEL	300	150	150	13.32	135.83
12	K0+100 – K0+200	05-Ene-26	12-Ene-26	7	CORDON	300	150	150	13.22	134.85
13	K0+100 – K0+200	03-Ene-26	17-Ene-26	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.70	180.47
14	K0+100 – K0+200	04-Ene-26	18-Ene-26	14	RIEL	300	150	150	18.02	183.78
15	K0+100 – K0+200	05-Ene-26	19-Ene-26	14	CORDON	300	150	150	18.78	191.51

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

REVISADO POR: ING. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520207546 ANT.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA

16	K0+100 – K0+200	03-Ene-26	31-Ene-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	22.21	226.45
17	K0+100 – K0+200	04-Ene-26	01-Feb-26	28	RIEL	300	150	150	21.99	224.20
18	K0+100 – K0+200	05-Ene-26	02-Feb-26	28	CORDON	300	150	150	22.70	231.45
19	K0+200 – K0+230	12-Ene-26	19-Ene-26	7	V. RIOSTRA	300	150	150	13.60	138.71
20	K0+200 – K0+230	13-Ene-26	20-Ene-26	7	RIEL	300	150	150	13.82	140.96
21	K0+200 – K0+230	14-Ene-26	21-Ene-26	7	CORDON	300	150	150	13.39	136.53
22	K0+200 – K0+230	12-Ene-26	26-Ene-26	14	V. RIOSTRA	300	150	150	17.23	175.69
23	K0+200 – K0+230	13-Ene-26	27-Ene-26	14	RIEL	300	150	150	18.62	189.90
24	K0+200 – K0+230	14-Ene-26	28-Ene-26	14	CORDON	300	150	150	18.53	188.91
25	K0+200 – K0+230	12-Ene-26	09-Feb-26	28	V. RIOSTRA	300	150	150	21.75	221.74
26	K0+200 – K0+230	13-Ene-26	10-Feb-26	28	RIEL	300	150	150	23.59	240.59
27	K0+200 – K0+230	14-Ene-26	11-Feb-26	28	CORDON	300	150	150	22.66	231.02

ENSAYADO POR:



Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales



REVISADO POR: ING. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520207546 ANT.
