




[illegible]

Mod/Nombre de tarea de tarea		% completado	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
175	5.6.6 Acta de recibo de obra pública	0%	16/03/2027	16/03/2027	0 días	174FC+14 días
176	5.7 Cierre finalizado	0%	16/03/2027	16/03/2027	0 días	175
177	5.8 Ejecución S.E. HERNAN TORO AGUDELO finalizado	0%	16/03/2027	16/03/2027	0 días	176
178	6 S.E. RODRIGO LARA BONILLA	0%	1/03/2026	12/12/2027	651 días	
179	6.1 PRECONTRACTUAL OBRA	0%	1/03/2026	3/03/2026	2 días	
180	6.1.1 Elaboración Ficha Tecnica	0%	1/03/2026	3/03/2026	2 días	1FC+108 días
181	6.1.2 Comité de contratación	0%	3/03/2026	3/03/2026	0 días	180
182	6.2 CONTRATACIÓN	0%	3/03/2026	3/04/2026	31 días	1
183	6.2.1 Publicación de proceso	0%	3/03/2026	3/03/2026	0 días	181
184	6.2.2 Entrega de propuestas	0%	3/03/2026	8/03/2026	5 días	183
185	6.2.3 Evaluación	0%	9/03/2026	14/03/2026	5 días	184FC+1 día
186	6.2.4 Publicación y traslado informe preliminar	0%	14/03/2026	19/03/2026	5 días	185
187	6.2.5 Observaciones Informe Preliminar	0%	19/03/2026	22/03/2026	3 días	186
188	6.2.6 Respuesta observaciones	0%	22/03/2026	25/03/2026	3 días	187
189	6.2.7 Informe Definitivo y traslado	0%	25/03/2026	28/03/2026	3 días	188
190	6.2.8 Informe Final	0%	28/03/2026	31/03/2026	3 días	189
191	6.2.9 Aceptación de postura	0%	31/03/2026	3/04/2026	3 días	190
192	6.2.10 Adjudicación	0%	3/04/2026	3/04/2026	0 días	191
193	6.3 LEGALIZACIÓN Y PERMISOS	0%	3/04/2026	3/05/2026	30 días	
194	6.3.1 Celebración contrato (RUT+SEVEN)	0%	3/04/2026	18/04/2026	15 días	192
195	6.3.2 Formalización contrato (SECOP)	0%	18/04/2026	20/04/2026	2 días	194
196	6.3.3 Contrato Firmado	0%	20/04/2026	20/04/2026	0 días	195
197	6.3.4 Legalización contrato (Pólizas)	0%	20/04/2026	3/05/2026	13 días	196
198	6.3.5 Contratación finalizado	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	197
199	6.3.6 Permisos	0%	3/04/2026	3/05/2026	30 días	
200	6.3.6.1 PMT de obra	0%	3/04/2026	3/05/2026	30 días	
201	6.3.6.1.1 Elaboración PMT	0%	3/04/2026	18/04/2026	15 días	192
202	6.3.6.1.2 Trámite PMT	0%	18/04/2026	3/05/2026	15 días	201
203	6.3.6.2 PMT Aprobado	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	202
204	6.3.6.3 Permiso de Rotura	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	
205	6.3.6.3.1 Radicación	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	203
206	6.3.6.3.2 Trámite	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	205
207	6.3.6.4 Rotura Aprobado	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	206
208	6.3.7 Permisos finalizado	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	207
209	6.4 EJECUCIÓN OBRA - S.E. RODRIGO LARA BONILLA	0%	3/05/2026	30/11/2027	576 días	
210	6.4.1 Acta de inicio	0%	3/05/2026	3/05/2026	0 días	208
211	6.4.2 Ejecución	0%	3/05/2026	30/11/2027	576 días	210
212	6.5 Ejecución obra finalizado	0%	30/11/2027	30/11/2027	0 días	211
213	6.6 CIERRE - S.E. RODRIGO LARA BONILLA	0%	30/11/2027	12/12/2027	12 días	
214	6.6.1 Acta de terminación con pendientes	0%	30/11/2027	30/11/2027	0 días	212
215	6.6.2 Acta de terminación sin pendientes	0%	5/12/2027	5/12/2027	0 días	214FC+5 días
216	6.6.3 Acta de recibo material	0%	6/12/2027	6/12/2027	0 días	215FC+1 día
217	6.6.4 Recopilación y entrega de documentación	0%	5/12/2027	8/12/2027	3 días	215
218	6.6.5 Acta de recibo final a satisfacción	0%	8/12/2027	8/12/2027	0 días	217
219	6.6.6 Acta de recibo de obra pública	0%	12/12/2027	12/12/2027	0 días	218FC+4 días
220	6.7 Cierre finalizado	0%	12/12/2027	12/12/2027	0 días	219
221	6.8 Ejecución S.E. RODRIGO LARA BONILLA finalizado	0%	12/12/2027	12/12/2027	0 días	220
222	7 I.E. EL DIAMANTE	0%	6/11/2025	14/06/2027	585 días	
223	7.1 PRECONTRACTUAL OBRA	0%	6/11/2025	8/11/2025	2 días	
224	7.1.1 Elaboración Ficha Tecnica	0%	6/11/2025	8/11/2025	2 días	1FC-7 días
225	7.1.2 Comité de contratación	0%	8/11/2025	8/11/2025	0 días	224
226	7.2 CONTRATACIÓN	0%	8/11/2025	18/12/2025	40 días	
227	7.2.1 Publicación de proceso	0%	8/11/2025	8/11/2025	0 días	225
228	7.2.2 Entrega de propuestas	0%	8/11/2025	15/11/2025	7 días	227
229	7.2.3 Evaluación	0%	16/11/2025	23/11/2025	7 días	228FC+1 día
230	7.2.4 Publicación y traslado informe preliminar	0%	23/11/2025	30/11/2025	7 días	229
231	7.2.5 Observaciones Informe Preliminar	0%	30/11/2025	5/12/2025	5 días	230
232	7.2.6 Respuesta observaciones	0%	5/12/2025	9/12/2025	4 días	231
233	7.2.7 Informe Definitivo y traslado	0%	9/12/2025	12/12/2025	3 días	232
234	7.2.8 Informe Final	0%	12/12/2025	15/12/2025	3 días	233
235	7.2.9 Aceptación de postura	0%	15/12/2025	18/12/2025	3 días	234
236	7.2.10 Adjudicación	0%	18/12/2025	18/12/2025	0 días	235
237	7.3 LEGALIZACIÓN Y PERMISOS	0%	18/12/2025	16/02/2026	60 días	
238	7.3.1 Celebración contrato (RUT+SEVEN)	0%	18/12/2025	17/01/2026	30 días	236
239	7.3.2 Formalización contrato (SECOP)	0%	17/01/2026	30/01/2026	13 días	238
240	7.3.3 Contrato Firmado	0%	30/01/2026	30/01/2026	0 días	239
241	7.3.4 Legalización contrato (Pólizas)	0%	30/01/2026	16/02/2026	17 días	240
242	7.3.5 Contratación finalizado	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	241
243	7.3.6 Permisos	0%	4/01/2026	16/02/2026	43 días	
244	7.3.6.1 PMT de obra	0%	4/01/2026	16/02/2026	43 días	
245	7.3.6.1.1 Elaboración PMT	0%	4/01/2026	27/01/2026	23 días	236FC+17 días
246	7.3.6.1.2 Trámite PMT	0%	27/01/2026	16/02/2026	20 días	245
247	7.3.6.2 PMT Aprobado	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	246
248	7.3.6.3 Permiso de Rotura	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	
249	7.3.6.3.1 Radicación	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	247
250	7.3.6.3.2 Trámite	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	249
251	7.3.6.4 Rotura Aprobado	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	250
252	7.3.7 Permisos finalizado	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	251
253	7.4 EJECUCIÓN OBRA - I.E. EL DIAMANTE	0%	16/02/2026	16/04/2027	424 días	
254	7.4.1 Acta de inicio	0%	16/02/2026	16/02/2026	0 días	252
255	7.4.2 Ejecución	0%	16/02/2026	16/04/2027	424 días	254
256	7.5 Ejecución obra finalizado	0%	16/04/2027	16/04/2027	0 días	255
257	7.6 CIERRE - I.E. EL DIAMANTE	0%	16/04/2027	14/06/2027	59 días	
258	7.6.1 Acta de terminación con pendientes	0%	16/04/2027	16/04/2027	0 días	256
259	7.6.2 Acta de terminación sin pendientes	0%	16/05/2027	16/05/2027	0 días	258FC+30 días
260	7.6.3 Acta de recibo material	0%	30/05/2027	30/05/2027	0 días	259FC+14 días
261	7.6.4 Recopilación y entrega de documentación	0%	16/05/2027	31/05/2027	15 días	259
262	7.6.5 Acta de recibo final a satisfacción	0%	31/05/2027	31/05/2027	0 días	261

</

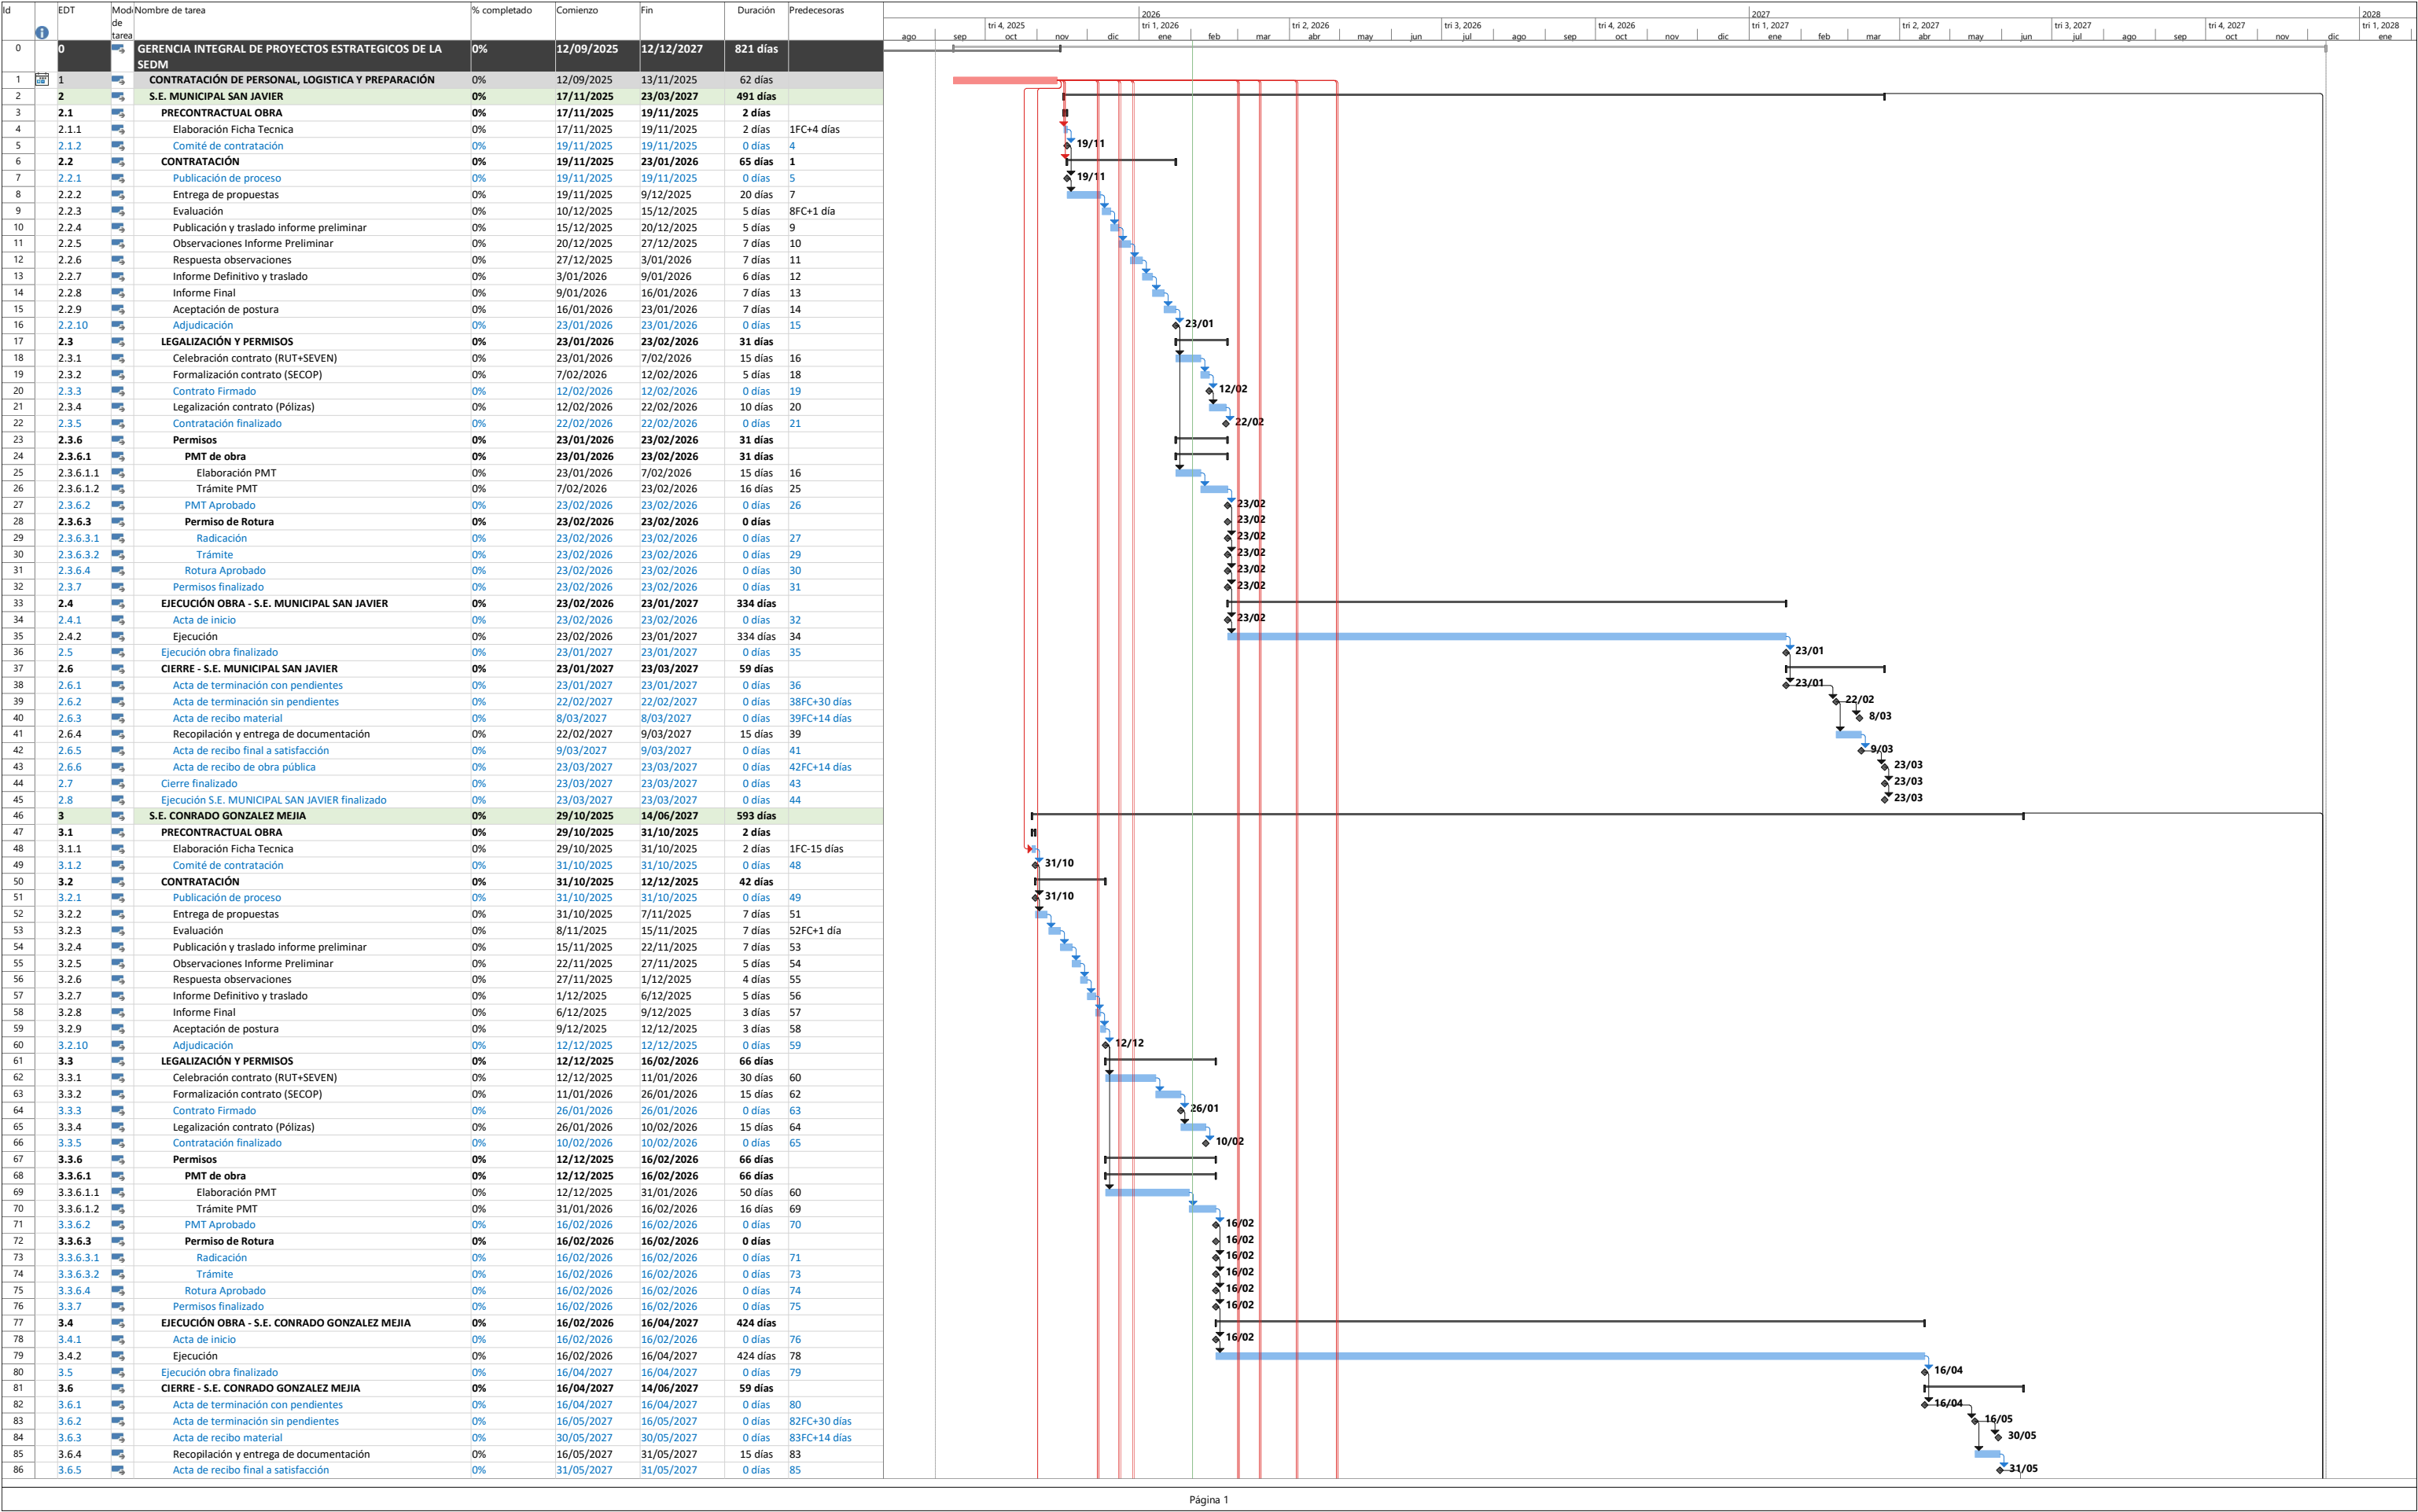
