



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

INFORME DE SEGUIMIENTO  
DEL CONSULTOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL \_\_\_\_\_ FINAL   X  

PERIODO DE 09/12/2025 A 27/02/2026

INFORME MENSUAL DEL CONTRATO No. C-093-2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de Méritos Abiertos

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : CM-004-2025

OBJETO : CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO DE SOLUCIONES, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, EN CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA  
PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA  
PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA

VALOR : TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$304.579.612)

PLAZO INICIAL : Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

GARANTÍA ÚNICA : 03 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO : 04 de diciembre de 2025

SUSPENSIÓN 01 : Desde el 19/12/2025 hasta el 18/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 31 de diciembre de 2025

FECHA DE REINICIO No 01 : 19 de enero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN

SUSPENSION Y REINICIO No 01 : 30 de enero de 2026

SUSPENSION 02 : 30 de enero de 2026

FECHA DE REINICIO 02 : 11 de febrero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN

SUSPENSION Y REINICIO No 02 : 12 de febrero de 2026

PRORROGA No 01 : 12 de febrero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN

PRORROGA 02 : 27 de febrero de 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025

NIT: 902007738-0

CONFORMADO POR:

CONSTRUIRE SAS

Participación: 40%

2L PROYECTOS S.A.S. BIC

Participación: 10%

CIGAN SAS

Participación: 50%

INTERVENTORÍA EXTERNA : MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S

SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

## 1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

### 1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

En el marco del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, suscrito entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y el CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025, se identifican las siguientes actuaciones contractuales relevantes, conforme a los estudios previos y al desarrollo del proceso de selección:

1. **Planeación y estructuración del proceso contractual:** La necesidad contractual se encuentra sustentada en los estudios previos elaborados por el Área Administrativa, en los cuales se definió la contratación de una consultoría especializada para el diagnóstico, diseño de soluciones, elaboración de presupuestos y documentación técnica para la optimización de redes eléctricas en sedes judiciales, en cumplimiento del RETIE y demás normativas aplicables.

Esta necesidad se enmarca en el proyecto de inversión denominado “*Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional*”, aprobado mediante Acuerdo PCSJA25-12251 del 24 de enero de 2025.

2. **Estudio del sector y determinación del presupuesto oficial:** La entidad adelantó el correspondiente estudio del sector, mediante solicitud y análisis de cotizaciones del mercado, estableciendo un presupuesto oficial estimado de \$307.013.123 M/cte, con base en promedios por sede (Cúcuta, Pamplona y Arauca).
3. **Modalidad de selección:** El proceso se adelantó bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, dada la naturaleza del contrato de consultoría.
4. **Publicación del proyecto de pliegos y pliegos definitivos:**
  - Publicación del proyecto de pliego: entre el 28 de agosto y el 04 de septiembre de 2025 en SECOP II.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

- Publicación de pliegos definitivos: 08 de septiembre de 2025.
- 5. **Apertura del proceso de selección:** Mediante Resolución No. DESAJCUR25-2841 del 10 de septiembre de 2025, se ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. CM-004-2025.
- 6. **Cierre del proceso y recepción de ofertas:** El proceso cerró el 15 de septiembre de 2025, con la recepción de cinco (5) propuestas de oferentes.
- 7. **Evaluación de propuestas:** El Comité Evaluador realizó la verificación de requisitos habilitantes y evaluación técnica, publicando los informes correspondientes y otorgando traslado para observaciones y subsanaciones, conforme a los principios de transparencia y selección objetiva. Mediante Acta No. 2-069 del 05 de noviembre de 2025, se consolidó la evaluación definitiva, estableciendo al CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025 en el primer orden de elegibilidad, al cumplir con los requisitos exigidos.
- 8. **Adjudicación del contrato:** A través de la Resolución No. DESAJCUR25-3150 del 05 de noviembre de 2025, se adjudicó el contrato al CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025 por un valor de \$304.579.612 M/cte.
- 9. **Suscripción del contrato:** El Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, se suscribió el 28 de noviembre de 2025, entre La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en calidad de entidad contratante, y el CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025, representado legalmente por el señor Renzo Pérez Maldonado; consorcio integrado por las empresas: Consultoría y Construcción Especializada S.A.S; 2L PROYECTOS S.A.S. BIC; y, Consultorías, Servicios, Obras y Suministros – CIGAN S.A.S. ZOMAC; con participación 40%, 10% y 50% respectivamente. El objeto de este contrato corresponde a la CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO DE SOLUCIONES, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, EN CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES.

- 10. Respaldo presupuestal:** El contrato cuenta con respaldo presupuestal mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), financiado con recursos de inversión de la vigencia 2025, en el marco del proyecto de modernización de infraestructura judicial.

**1.2. GARANTIAS**

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, el contratista CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025, identificado con NIT No. 902007738-0, constituyó la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, en cumplimiento de los amparos, valores asegurados y vigencias exigidos en la minuta contractual.

Dicha garantía ampara los riesgos asociados a la ejecución del contrato, incluyendo, entre otros, el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio, el pago de salarios y prestaciones sociales, así como la responsabilidad derivada de la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y los términos contractuales.

Durante el periodo objeto del presente informe, que contempla la ejecución total del contrato; y, en atención a las actuaciones contractuales adelantadas, se gestionaron las actualizaciones correspondientes a los amparos y sus vigencias, con el fin de mantener la cobertura de las garantías del contrato.

En este sentido, el contratista dio cumplimiento a la obligación de informar oportunamente a la compañía aseguradora sobre las modificaciones contractuales, realizando los ajustes necesarios en las pólizas, los cuales fueron debidamente revisados y aprobados por la Entidad y la Interventoría, garantizando la continuidad de la cobertura durante todo el periodo de ejecución.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**1.2.1. Constitución de Pólizas para Legalización del Contrato**

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, el contratista CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025, identificado con NIT No. 902007738-0, constituyó la garantía única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, en cumplimiento de los amparos, valores asegurados y vigencias exigidos en la minuta contractual.

Dichas garantías amparan los riesgos asociados a la ejecución del contrato, incluyendo, entre otros, el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio, el pago de salarios y prestaciones sociales, así como la responsabilidad derivada de la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y los términos contractuales

Las pólizas iniciales fueron emitidas el 29 de noviembre de 2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, designando como beneficiaria a la Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, conforme a lo establecido en la minuta contractual. En el siguiente cuadro se detalla la información de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, que, corresponden al anexo 0, con la cual se legaliza el contrato de consultoría C-093 de 2025.

| Anexo | FECHA<br>EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                 | ENTIDAD<br>ASEGURADORA            | NUMERO DE LA<br>POLIZA | VALOR<br>ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|
| 0     | 29/11/2025          | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000074823    | \$ 30,457,962.00   | 26/11/2025 | 30/06/2026 |
|       |                     | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES |                                   |                        | \$60,915,923.00    | 26/11/2025 | 31/12/2028 |
|       |                     | CALIDAD DEL SERVICIO                    |                                   |                        | \$60,915,923.00    | 26/11/2025 | 31/12/2026 |
|       |                     | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                                   | 475 74 994000013036    | \$284,700,000.00   | 26/11/2025 | 31/12/2025 |

**Nota:** Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual (anexo 0), hacen parte del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

1.2.1.1. Aprobación de Pólizas de Legalización del Contrato

Las pólizas iniciales fueron debidamente cargadas en el SECOP II, y aprobadas por la entidad contratante como se muestra en las siguientes imágenes.

Póliza de Cumplimiento

DETALLE DE LA GARANTÍA

incog

Aprobado por JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 12-03-2025 09:57

**Id de la garantía** CO1.WRT.18542028  
**Referencia de la garantía** 475 47 994000074823  
**Estado** Aceptado  
**Justificación**  
☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☒ Cumplimiento - Pago de salarios  
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio  
☐ Responsabilidad civil extracontractual  
**Tipo de garantía**  
☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria  
**Entidad aseguradora** ASEGURADORA SOLIDARIA  
**Número de póliza** 475 47 994000074823  
**Tomador** CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025  
**Beneficiario** RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

| Justificación                            | Valor del amor    | Vigencia                                                 |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 30.457.962,00 COP | 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 60.915.923,00 COP | 31/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 60.915.923,00 COP | 31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

|                           |                                    |                                 |                                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

Póliza de Responsabilidad Civil

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

incog

**Id de la garantía** CO1.WRT.18542306  
**Referencia de la garantía** 475 74 994000013036  
**Estado** Caducado  
**Justificación**  
☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☐ Cumplimiento - Pago de salarios  
☐ Cumplimiento - Calidad del servicio  
☒ Responsabilidad civil extracontractual  
**Tipo de garantía**  
☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria  
**Entidad aseguradora** ASEGURADORA SOLIDARIA  
**Número de póliza** 475 74 994000013036  
**Tomador** CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025  
**Beneficiario** RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

| Justificación                          | Valor del amor     | Vigencia                                                 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual | 284.700.000,00 COP | 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                                                       | Nombre del documento                     |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Poliza Responsabilidad Civil_Firmada.pdf | Poliza Responsabilidad Civil_Firmada.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

Creado por: RENZO PÉREZ MALDONADO 12/01/2025 17:38 (UTC -5 horas)

**1.2.2. Actualización de Pólizas Según Suspensión y Reinicio No 01**

Las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, fueron actualizadas según la suspensión y el reinicio No. 01 del contrato. Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, garantizando que las pólizas conserven su suficiencia, vigencia y cobertura durante todo el periodo de ejecución ajustado.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**

**Cúcuta-Norte de Santander**

| Anexo | FECHA<br>EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                 | ENTIDAD<br>ASEGURADORA            | NUMERO DE LA<br>POLIZA | VALOR<br>ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2     | 20/01/2026          | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000074823    | \$ 30,457,962.00   | 04/12/2025 | 08/08/2026 |
|       |                     | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES |                                   |                        | \$60,915,923.00    | 04/12/2025 | 08/02/2029 |
|       |                     | CALIDAD DEL SERVICIO                    |                                   |                        | \$60,915,923.00    | 04/12/2025 | 05/02/2027 |
|       |                     | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  | A                                 | 475 74<br>994000013036 | \$350,181,000.00   | 08/01/2026 | 08/02/2026 |

**Nota:** Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual (anexo 2), hacen parte del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes.

**1.2.2.1. Aprobación de Pólizas Según Suspensión y Reinicio No 01**

Las pólizas actualizadas según Suspensión y Reinicio No 01, fueron debidamente cargadas en el SECOP II, y aprobadas por la entidad contratante como se muestra en las siguientes imágenes.

**Póliza de Cumplimiento**

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

incógr

Aprobado por JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 29-01-2026 17:52

Id de la garantía CO1.WRT.19087997  
Referencia de la garantía 475 47 994000074823  
Estado Aceptado  
Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☒ Cumplimiento - Pago de salarios  
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio  
☐ Responsabilidad civil extracontractual  
Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria  
Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA  
Número de póliza 475 47 994000074823  
Tomador CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025  
Beneficiario RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

| Justificación                            | Valor del amor    | Vigencia                                                 |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 30.457.962,00 COP | 08/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 60.915.923,00 COP | 02/08/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 60.915.923,00 COP | 02/08/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Act  
Ve a

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**Póliza de Responsabilidad Civil**

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

incógn

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id de la garantía         | CO1.WRT.18584319                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencia de la garantía | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado                    | Caducado                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Justificación             | <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio<br><input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad civil extracontractual |
| Tipo de garantía          | <input checked="" type="radio"/> Contrato de seguro<br><input type="radio"/> Patrimonio autónomo<br><input type="radio"/> Garantía bancaria                                                                                                                                 |
| Entidad aseguradora       | ASEGURADORA SOLIDARIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de póliza          | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tomador                   | CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiario              | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA                                                                                                                                                                                      |

| Justificación                          | Valor del amor     | Vigencia                                                 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual | 284.700.000,00 COP | 01/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                             | Nombre del documento |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> RC FIRMADA.pdf | RC FIRMADA.pdf       |

[Descargar](#) [Detalle](#)

Creado por: RENZO PÉREZ MALDONADO 12/05/2025 15:18 (UTC -5 horas)

**1.2.3. Actualización de Pólizas Según Suspensión y Reinicio No 02; y Prorroga No 01**

Las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, fueron actualizadas según la suspensión y el reinicio No. 02 del contrato y la prórroga No 01. Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, garantizando que las pólizas conserven su suficiencia, vigencia y cobertura durante todo el periodo de ejecución ajustado.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, mediante el cual se soporta la legalización y actualización del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                 | ENTIDAD ASEGURADORA               | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|-------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
| 3     | 16/02/2026       | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000074823 | \$ 30,457,962.00 | 04/12/2025 | 24/08/2026 |
|       |                  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES |                                   |                     | \$60,915,923.00  | 04/12/2025 | 24/02/2029 |
|       |                  | CALIDAD DEL SERVICIO                    |                                   |                     | \$60,915,923.00  | 04/12/2025 | 24/02/2027 |

|                           |                                    |                                 |                                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

| Anexo | FECHA<br>EXPEDICIO<br>N | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                    | ENTIDAD<br>ASEGUR<br>ADORA                          | NUMERO DE LA<br>POLIZA  | VALOR<br>ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
|       |                         | RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRACONTRACTUAL  | A                                                   | 475 74<br>994000013036  | \$350,181,000.00   | 24/02/2026 | 16/02/2026 |
| 4     | 04/03/2026              | CUMPLIMIENTO DEL<br>CONTRATO               | ASEGUR<br>ADORA<br>SOLIDARI<br>A DE<br>COLOMBI<br>A | 475-47-<br>994000074823 | \$ 30,457,962.00   | 04/12/2025 | 08/09/2026 |
|       |                         | PAGO DE SALARIOS,<br>PRESTACIONES SOCIALES |                                                     |                         | \$60,915,923.00    | 04/12/2025 | 08/03/2029 |
|       |                         | CALIDAD DEL SERVICIO                       |                                                     |                         | \$60,915,923.00    | 04/12/2025 | 08/03/2027 |
|       |                         | RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRACONTRACTUAL  | A                                                   | 475 74<br>994000013036  | \$350,181,000.00   | 24/02/2026 | 08/03/2026 |

**Nota:** Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual (anexo 1), hacen parte del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes.

### 1.2.3.1. Aprobación de Pólizas Según Suspensión y Reinicio No 02

Las pólizas actualizadas según Suspensión y Reinicio No 02 y prórroga No 01, fueron debidamente cargadas en el SECOP II, y aprobadas por la entidad contratante como se muestra en las siguientes imágenes.

### Póliza de Cumplimiento

#### DETALLE DE LA GARANTÍA

incog

Id de la garantía CO1.WRT.19536961  
Referencia de la garantía 475 47 994000074823  
Estado Pendiente  
Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☒ Cumplimiento - Pago de salarios  
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio  
☐ Responsabilidad civil extracontractual  
Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria  
Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA  
Número de póliza 475 47 994000074823  
Tomador CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025  
Beneficiario RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION  
JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

| Justificación                            | Valor del amor    | Vigencia                                                 |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 30.457.962,00 COP | 09/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 60.915.923,00 COP | 03/08/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 60.915.923,00 COP | 03/08/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                                                  | Nombre del documento                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> POLIZA CUMP REINICIO 02_FIRMADA.pdf | POLIZA CUMP REINICIO 02_FIRMADA.pdf | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

|                    |                             |                          |                                      |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

## DETALLE DE LA GARANTÍA

incógn

Aprobado por JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 16-02-2026 14:19

Id de la garantía CO1.WRT.19444784

Referencia de la garantía 475 47 994000074823

Estado Aceptado

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☒ Cumplimiento - Pago de salarios  
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio  
☐ Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Número de póliza 475 47 994000074823

Tomador CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025

Beneficiario RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION  
JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

| Justificación                            | Valor del amor    | Vigencia                                                 |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 30.457.962,00 COP | 24/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 60.915.923,00 COP | 24/02/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 60.915.923,00 COP | 24/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Act  
Ve a

| Descripción                                              | Nombre del documento            |                           |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> POLIZA CUMPLIMIENTO FIRMADA.pdf | POLIZA CUMPLIMIENTO FIRMADA.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> 5. PRORROGA No.1 C-093-2025.pdf | 5. PRORROGA No.1 C-093-2025.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

Creado por: RENZO PÉREZ MALDONADO 16/02/2026 11:41 (UTC -5 horas)

Act  
Ve a

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**Póliza de Responsabilidad Civil**

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

incognit

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id de la garantía         | CO1.WRT.19674995                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencia de la garantía | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado                    | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Justificación             | <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio<br><input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad civil extracontractual |
| Tipo de garantía          | <input checked="" type="radio"/> Contrato de seguro<br><input type="radio"/> Patrimonio autónomo<br><input type="radio"/> Garantía bancaria                                                                                                                                 |
| Entidad aseguradora       | ASEGURADORA SOLIDARIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de póliza          | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tomador                   | CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiario              | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA                                                                                                                                                                                      |

| Justificación                          | Valor del amor     | Vigencia                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual | 350.181.000,00 COP | 27 días de tiempo transcurrido (8/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                                                 | Nombre del documento               |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> POLIZA REINICIO 02 RCE_FIRMADA.pdf | POLIZA REINICIO 02 RCE_FIRMADA.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

Creado por: RENZO PÉREZ MALDONADO 30/03/2026 17:57 (UTC -5 horas)

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

incógr

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia de la garantía | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado                    | Caducado                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Justificación             | <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios<br><input type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio<br><input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad civil extracontractual |
| Tipo de garantía          | <input checked="" type="radio"/> Contrato de seguro<br><input type="radio"/> Patrimonio autónomo<br><input type="radio"/> Garantía bancaria                                                                                                                                 |
| Entidad aseguradora       | ASEGURADORA SOLIDARIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de póliza          | 475 74 994000013036                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tomador                   | CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiario              | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA                                                                                                                                                                                      |

| Justificación                          | Valor del amor     | Vigencia                                                 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual | 350.181.000,00 COP | 24/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                                              | Nombre del documento            |                           |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5. PRORROGA No.1 C-093-2025.pdf | 5. PRORROGA No.1 C-093-2025.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> POLIZA RCE FIRMADA.pdf          | POLIZA RCE FIRMADA.pdf          | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

Creado por: RENZO PÉREZ MALDONADO 16/02/2026 11:44 (UTC -5 horas)

|                    |                             |                          |                                      |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO**

Durante el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, el equipo profesional del CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025, en cumplimiento del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, ejecutó las actividades orientadas a la optimización de los sistemas eléctricos en las sedes judiciales objeto del contrato, correspondientes a los Palacios de Justicia de Cúcuta, Pamplona y Arauca.

En desarrollo del contrato, el avance físico se estructuró en tres fases principales: Diagnóstico y Levantamiento Técnico, Diseño de Soluciones y Presupuesto y Documentación Final, las cuales fueron ejecutadas de manera progresiva y articulada, permitiendo la consolidación integral de los productos contractuales.

En la fase de Diagnóstico y Levantamiento Técnico, se realizó la inspección detallada de las instalaciones eléctricas existentes, la toma de mediciones, la evaluación de la capacidad instalada, la verificación del cumplimiento normativo (RETIE y normas complementarias), así como el levantamiento de diagramas unifilares y la identificación de condiciones de riesgo y deficiencias técnicas en cada una de las sedes.

Posteriormente, en la fase de Diseño de Soluciones, se formularon propuestas técnicas orientadas a la optimización de las redes eléctricas, incluyendo el desarrollo de planos eléctricos, memorias de cálculo, estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, especificaciones técnicas de materiales y equipos, así como la definición de soluciones ajustadas a las condiciones particulares de cada inmueble.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

Finalmente, en la fase de Presupuesto y Documentación Final, se consolidaron los componentes económicos y técnicos del proyecto, mediante la elaboración de presupuestos detallados, análisis de precios unitarios (APU), cuadros de cantidades de obra, estimación de costos indirectos y la estructuración de las especificaciones técnicas y lineamientos constructivos requeridos para la futura ejecución de las intervenciones.

Es importante señalar que, durante la ejecución del contrato, se presentaron situaciones que impactaron el ritmo de avance, tales como las suspensiones contractuales asociadas a la vacancia judicial y a la necesidad de calibración y certificación de equipos de medición especializada; no obstante, estas fueron debidamente gestionadas mediante los instrumentos contractuales correspondientes (suspensiones, reinicios y prórroga), permitiendo la continuidad y finalización de las actividades.

En términos generales, el contrato alcanzó un avance físico del 100% al cierre del periodo, evidenciando el cumplimiento total de las actividades programadas y la entrega completa de los productos establecidos en los términos de referencia, garantizando así un cierre técnico satisfactorio de la consultoría.

#### **2.1.1. Control y Seguimiento Curva S**

##### **2.1.1.1. Curva S Contrato de consultoría C-093 de 2025**

Tal como se muestra en la Figura 1, con corte al 27 de febrero de 2026, la ejecución real del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 alcanzó el 100% de avance acumulado, evidenciando el cumplimiento total de las actividades programadas en el marco del objeto contractual.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |




**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

Este comportamiento refleja la culminación de las fases de diagnóstico, diseño y estructuración de productos finales, incluyendo la entrega de los componentes asociados a Presupuesto y Documentación Final, conforme a los términos de referencia del contrato.

En términos generales, la curva S evidencia un cierre satisfactorio del contrato, con una ejecución alineada a los productos establecidos, garantizando la entrega completa de los estudios y diseños eléctricos requeridos para las sedes objeto de intervención.

Figura 1. Curva S - Ejecución Acumulada Contrato de Consultoría C-053 de 2025

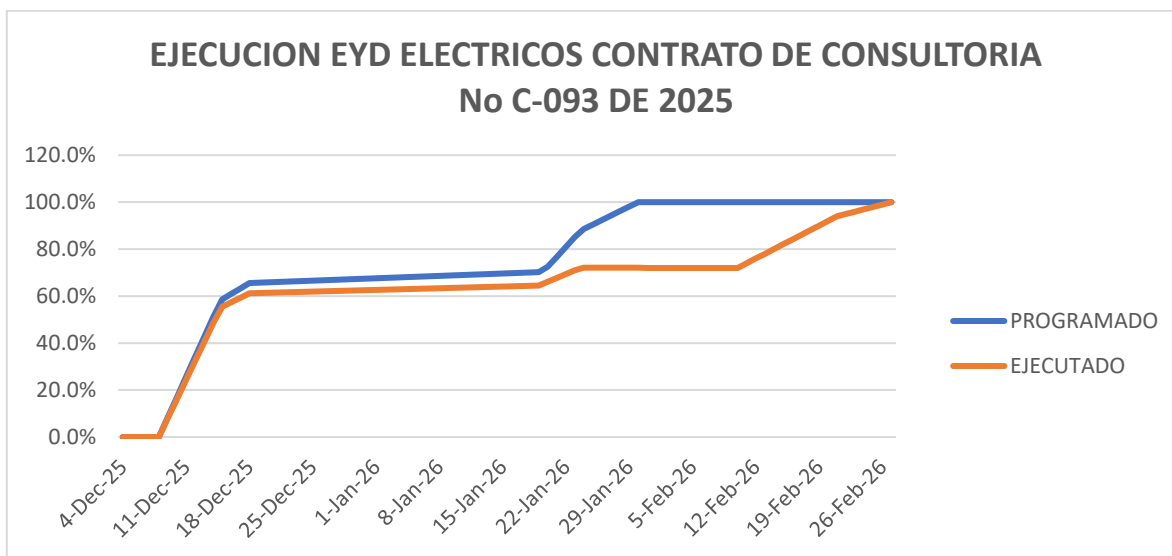

Tal como se muestra en la Figura 1, con corte al 27 de febrero de 2026, la ejecución real (línea naranja) del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 alcanza el 100% de avance acumulado, en concordancia con el cumplimiento total de las actividades contractuales. El comportamiento de la curva S evidencia tres momentos claramente diferenciados:

1. **Fase inicial (diciembre 2025):** Se observa un crecimiento acelerado tanto del avance programado como del ejecutado, alcanzando aproximadamente el 60%, asociado al desarrollo de las actividades de diagnóstico y levantamiento técnico.

|                           |                                    |                                 |                                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

2. **Fase de desaceleración (enero – primera semana de febrero de 2026):** Durante este periodo se presenta un estancamiento en la ejecución, mientras la programación continúa su crecimiento hasta el 100%. Este comportamiento se explica por la Suspensión No. 02 del contrato (30 de enero de 2026), derivada de la necesidad de adelantar procesos de calibración y certificación de equipos de medición especializados, indispensables para garantizar la calidad de los estudios eléctricos conforme al RETIE. El contrato fue reiniciado el 11 de febrero de 2026, lo cual permitió retomar las actividades técnicas.
3. **Fase de cierre (segunda quincena de febrero de 2026):** Posterior al reinicio contractual y en el marco de la Prórroga No. 01, con fecha de terminación ajustada al 27 de febrero de 2026, se evidencia una recuperación acelerada del avance ejecutado, permitiendo cerrar la brecha existente frente a la programación y alcanzar el 100% de ejecución.

En términos generales, la curva S refleja que, si bien el contrato presentó interrupciones temporales en su ejecución asociadas a causas técnicas y operativas debidamente justificadas, estas fueron gestionadas mediante los instrumentos contractuales correspondientes (suspensión, reinicio y prórroga), permitiendo finalmente cumplir en su totalidad con los productos establecidos.

Este comportamiento evidencia una adecuada capacidad de recuperación del cronograma por parte del contratista en la fase final, garantizando la entrega integral de los estudios y diseños eléctricos para las sedes objeto del contrato.

## 2.2. AVANCE FINANCIERO Y GASTO PRESUPUESTAL

Con base en la información consolidada del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, se observa que el valor total aprobado asciende a \$304.579.612, el cual se mantiene sin variaciones frente al costo estimado a la terminación del contrato.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

A la fecha de corte del presente informe, el contrato registra una ejecución financiera del 100%, correspondiente a un valor ejecutado de \$304.579.612, en concordancia con el avance físico alcanzado. En consecuencia, no se evidencian saldos pendientes por ejecutar, reflejando la total apropiación y utilización de los recursos asignados.

Este comportamiento financiero es consistente con la culminación de las actividades contractuales y la entrega de los productos finales, particularmente los asociados a la fase de Presupuesto y Documentación Final, lo que evidencia una adecuada planeación y control del gasto durante la ejecución del contrato.

Asimismo, no se identifican sobrecostos, adiciones presupuestales ni desviaciones financieras, manteniéndose el equilibrio entre el presupuesto aprobado y el costo final del contrato. En este sentido, la ejecución presupuestal se desarrolló conforme a las condiciones inicialmente establecidas, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En términos generales, el contrato presenta un cierre financiero satisfactorio, alineado con el cumplimiento total del objeto contractual y con los resultados técnicos obtenidos en el desarrollo de la consultoría.

**Situación Financiera Contrato de Consultoría C-093 de 2025**

| Total                      | Avance plan | Avance real | Presupuesto Aprobado Inicial | Costo estimado a la terminación | Ejecutado a la fecha | Por ejecutar |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| CONSULTORIA EYD ELECTRICOS | 100.0%      | 100.0%      | \$ 304,579,612               | \$ 304,579,612                  | \$ 304,579,612       | \$ -         |
| Costo total                |             |             | \$ 304,579,612               | \$ 304,579,612                  | \$ 304,579,612       | \$ -         |

**2.3. INVERSION DEL ANTICIPO**

El Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 no contempla la entrega de anticipo dentro de sus condiciones contractuales. En consecuencia, durante el periodo objeto del presente informe no se registran recursos girados por concepto de anticipo ni movimientos asociados a su administración o inversión.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

La ejecución financiera del contrato se realiza conforme a lo establecido en el clausulado contractual, mediante pagos contra entrega y aprobación de los productos y entregables correspondientes, previa verificación por parte de la interventoría y la supervisión del contrato. Por lo anterior, no aplica el seguimiento a la inversión del anticipo dentro del presente informe.

#### **2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

El Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 no contempla la entrega de anticipo dentro de sus condiciones contractuales. En consecuencia, no se constituyó fiducia, cuenta especial ni ningún mecanismo de administración de recursos asociado a anticipo, razón por la cual no se generan excedentes ni rendimientos financieros derivados de la gestión de recursos del contrato. Durante la ejecución contractual, no se registraron rendimientos financieros, toda vez que los pagos se realizaron contra la entrega y aprobación de los productos establecidos, conforme a lo definido en el contrato, previa verificación por parte de la Interventoría y la Supervisión. En este sentido, el manejo financiero del contrato se desarrolló bajo un esquema de pagos contra entrega, sin generación de recursos administrados que pudieran dar lugar a rendimientos financieros.

### **3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 – DISCAPACIDAD**

De acuerdo con la propuesta presentada dentro del proceso de selección CM-004 de 2025, la firma CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S., identificada con NIT 900597433-2, acreditó la vinculación de personal en condición de discapacidad dentro de su planta de personal, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 392 de 2018, el cual establece incentivos para los proponentes que promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para efectos de verificación, dicha condición se soporta mediante el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo, documento que acredita el número de trabajadores con discapacidad vinculados a la empresa y cuya vigencia se encontraba válida a la fecha de cierre del proceso de selección. Este documento fue aportado dentro de la propuesta presentada por

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

el proponente y constituye el soporte documental para la acreditación del requisito establecido en el pliego de condiciones.

#### 4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante la ejecución del contrato de consultoría C – 053 de 2025, no se registraron accidentes laborales, ni se presentaron reclamaciones laborales o solicitudes de pago relacionadas con conflictos laborales por parte del personal vinculado. En consecuencia, las actividades desarrolladas se llevaron a cabo con normalidad y sin reportes de incidentes en materia laboral.

#### 5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

Durante el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, el equipo profesional del **CONSORCIO ELÉCTRICO AJC 2025** desarrolló las actividades correspondientes a las fases de diagnóstico, diseño y estructuración final de productos, organizadas de la siguiente manera:

##### Semana 1 (09 al 15 de diciembre de 2025)

- Suscripción de acta de inicio y alistamiento técnico del contrato.
- Revisión documental inicial (planos existentes, información técnica disponible).
- Planeación de actividades de campo y definición de metodología de trabajo.
- Coordinación con las sedes judiciales para programación de visitas técnicas.

##### Semana 2 (16 al 22 de diciembre de 2025)

- Inicio de actividades de **diagnóstico y levantamiento técnico** en las sedes.
- Inspección general de las instalaciones eléctricas existentes.
- Identificación preliminar de riesgos y condiciones no conformes frente al RETIE.
- Levantamiento inicial de diagramas unifilares y reconocimiento de sistemas eléctricos.
- El 19 de diciembre de 2025, inicia la suspensión No 01, debido a vacancia judicial.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**Semana 3 (23 al 29 de diciembre de 2025)**

- Continuación de Suspensión No 01.

**Semana 4 (30 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026)**

- Continuación de Suspensión No 01.

**Semana 5 (06 al 12 de enero de 2026)**

- Continuación de Suspensión No 01.

**Semana 6 (13 al 19 de enero de 2026)**

- Continuación de Suspensión No 01.
- Reinicio No 01, el día 19 de enero de 2026.

**Semana 7 (20 al 26 de enero de 2026)**

- Consolidación de la fase de diagnóstico.
- Inicio de la fase de diseño de soluciones eléctricas.
- Desarrollo de diagramas unifilares actualizados y definición de criterios de diseño.
- Identificación de alternativas técnicas de intervención.

**Semana 8 (27 de enero al 02 de febrero de 2026)**

- Desarrollo de memorias de cálculo y estudios eléctricos (cortocircuito, protecciones, cargas).
- Estructuración de planos eléctricos optimizados.
- Definición de especificaciones técnicas preliminares.
- Suspensión 02, a partir del 30 enero de 2025 asociada a la necesidad de calibración y certificación de equipos de medición especializada.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**Semana 9 (03 al 09 de febrero de 2026)**

- Continuación de Suspensión 02.

**Semana 10 (10 al 16 de febrero de 2026)**

- Reinicio de actividades contractuales el 11 de febrero de 2026.
- Continuación del desarrollo de diseños eléctricos.
- Validación de resultados técnicos y ajustes a soluciones propuestas.

**Semana 11 (17 al 23 de febrero de 2026)**

- Desarrollo de la fase de Presupuesto y Documentación Final.
- Elaboración de análisis de precios unitarios (APU) y cuadros de cantidades de obra.
- Consolidación de especificaciones técnicas y criterios constructivos.

**Semana 12 (24 al 27 de febrero de 2026)**

- Integración final de los productos por sede.
- Revisión y ajuste de entregables conforme a observaciones de la Interventoría.
- Entrega definitiva de los productos del contrato.
- Cierre técnico de la consultoría.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron avanzar de manera progresiva desde la fase de diagnóstico hasta la entrega final de los productos, evidenciando el cumplimiento integral del objeto contractual.

## 6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Teniendo en cuenta que el Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 ha alcanzado el 100% de ejecución, no se identifican riesgos que puedan afectar el desarrollo contractual en su fase de ejecución. No obstante, se identifican riesgos asociados a la etapa posterior de implementación de las soluciones propuestas, los cuales podrían incidir en la materialización de los resultados del proyecto, tales como:

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

- Disponibilidad de recursos presupuestales para la ejecución de las obras derivadas de los estudios y diseños.
- Priorización institucional de las intervenciones propuestas en cada una de las sedes.
- Condiciones técnicas y operativas de los inmuebles que puedan requerir ajustes adicionales en la fase de ejecución.
- Cumplimiento de requisitos normativos y procesos contractuales para la ejecución de las obras.

En este sentido, se recomienda que la Entidad adelante las gestiones necesarias para mitigar estos riesgos en la fase de implementación, garantizando que los productos entregados en el marco de la consultoría sean efectivamente utilizados para la optimización de las redes eléctricas en las sedes judiciales.

## **7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL**

Teniendo en cuenta que el presente corresponde a un contrato de consultoría, el componente ambiental se relaciona principalmente con el uso racional y eficiente de los recursos, especialmente en lo referente al consumo de papelería, energía y agua en las actividades desarrolladas en oficina. Durante la ejecución del contrato de consultoría C-053 de 2025, el uso de papelería ha sido mínimo, dado que la mayor parte de los productos y avances del contrato se han gestionado en formato digital. Las impresiones de informes y planos se realizarán para la entrega final, únicamente en la cantidad que sea determinada por la entidad y la supervisión del contrato.

En cuanto al componente social, este se encuentra asociado a la interacción y coordinación con el cliente interno de la Rama Judicial en los diferentes inmuebles objeto de estudio e intervención. En este sentido, se ha mantenido durante la ejecución del contrato una comunicación permanente y un adecuado nivel de articulación con la supervisora del contrato, así como con el personal administrativo responsable de la administración y vigilancia de los edificios.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

El manejo adecuado de la información relacionada con el alcance del contrato y los objetivos de la consultoría ha permitido mantener una relación de colaboración y entendimiento con el personal de las diferentes dependencias, facilitando el desarrollo de las actividades técnicas previstas.

## 8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

En el marco del cierre del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, y considerando la entrega definitiva de los productos contractuales, se implementaron acciones orientadas a garantizar la calidad final, coherencia técnica y completitud documental de los entregables, conforme a los términos de referencia y a la normatividad vigente.

Estas acciones se enfocaron en asegurar que los productos finales constituyan un insumo técnico confiable, estructurado y aplicable para la futura implementación de las soluciones propuestas.

### Acciones de mejora

- Integración final de los productos por sede, garantizando la coherencia entre diagnóstico, diseño y presupuesto, y su adecuada articulación en cada documento entregado.
- Ajuste y depuración de los documentos técnicos para mejorar la claridad, consistencia y precisión de la información, facilitando su interpretación por parte de la Entidad.
- Homologación de criterios técnicos y de presentación en todos los entregables (informes, planos, memorias de cálculo y presupuestos), asegurando uniformidad en la documentación final.
- Incorporación de las observaciones finales de la Interventoría, fortaleciendo la calidad de los productos antes de su aprobación definitiva.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**Acciones preventivas**

- Verificación integral del cumplimiento normativo (RETIE, NTC 2050 y demás normas aplicables) en los productos finales entregados.
- Revisión cruzada de la consistencia técnica entre planos, memorias de cálculo, especificaciones y presupuesto, evitando discrepancias entre los diferentes componentes.
- Validación de la completitud de los entregables contractuales, asegurando que todos los productos definidos en los términos de referencia fueran desarrollados y entregados en su totalidad.
- Control de calidad previo a la entrega final, mediante revisiones internas del equipo consultor y validación técnica con la Interventoría.

**Acciones correctivas**

- Ajuste de los productos finales con base en las observaciones emitidas por la Interventoría durante la etapa de revisión final.
- Corrección de inconsistencias técnicas identificadas en planos, cálculos eléctricos, especificaciones y documentos presupuestales.
- Actualización de información técnica derivada de validaciones finales, garantizando su correspondencia con las condiciones reales de las sedes.
- Reentrega de productos ajustados, asegurando su conformidad con los requisitos contractuales, técnicos y normativos exigidos.

En términos generales, las acciones implementadas permitieron asegurar un cierre técnico satisfactorio del contrato, garantizando que los productos finales entregados cuentan con los estándares de calidad requeridos y constituyen una base sólida para la futura ejecución de las intervenciones en las sedes judiciales objeto del estudio.

| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

**9. OBSERVACIONES**

En el marco del cierre del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025, y considerando la entrega definitiva de los productos contractuales, se evidencian los siguientes aspectos relevantes asociados al resultado final de la consultoría:

En primer lugar, se observa que los productos entregados presentan un nivel adecuado de desarrollo técnico, integrando de manera estructurada los componentes de diagnóstico, diseño y presupuesto, lo que permite contar con un insumo completo para la formulación de proyectos de intervención en las sedes evaluadas.

No obstante, se identifica que, dada la naturaleza de los estudios y diseños, algunos aspectos técnicos deberán ser validados y ajustados en la etapa de ejecución de obra, particularmente en lo relacionado con condiciones específicas de campo, disponibilidad de espacios y compatibilidad con sistemas existentes, lo cual es propio de este tipo de consultorías.

De igual manera, se evidencia que los productos entregados contienen un alto nivel de detalle técnico (planos, memorias de cálculo, especificaciones y presupuestos), por lo que su adecuada utilización requerirá una gestión técnica organizada por parte de la Entidad, garantizando la correcta interpretación y aplicación de la información.

Adicionalmente, se observa que las soluciones propuestas responden a los requerimientos normativos vigentes; sin embargo, su implementación estará sujeta a la disponibilidad de recursos y a la priorización institucional, lo cual puede incidir en los tiempos de materialización de las intervenciones.

Por otra parte, se resalta que el contrato logró superar las situaciones que afectaron su ejecución durante fases intermedias (suspensiones y limitaciones operativas), alcanzando

|                           |                                    |                                 |                                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

finalmente el cumplimiento total de los productos contractuales, lo que evidencia una adecuada gestión técnica en la etapa final.

Finalmente, se concluye que la consultoría constituye un insumo técnico estratégico para la Entidad, que permitirá orientar futuras inversiones en infraestructura eléctrica; no obstante, su impacto dependerá de la adecuada implementación de las soluciones propuestas en las fases posteriores.

#### 10. RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

En el marco del cierre del Contrato de Consultoría No. C-093 de 2025 y considerando la entrega definitiva de los productos contractuales, la Interventoría emite las siguientes recomendaciones orientadas a garantizar la adecuada utilización, sostenibilidad y aplicación de los resultados obtenidos:

1. Adoptar formalmente los productos como insumo técnico institucional: Se recomienda que la Entidad oficialice los estudios y diseños entregados como base para la planeación y estructuración de futuros proyectos de intervención en las sedes evaluadas.
2. Priorizar la implementación de las soluciones propuestas: Se sugiere establecer un esquema de priorización basado en criterios de riesgo eléctrico, seguridad de las personas, cumplimiento normativo y continuidad del servicio, con el fin de orientar la ejecución de las obras.
3. Gestionar la asignación de recursos para la ejecución de obras: Se recomienda adelantar las gestiones presupuestales necesarias que permitan materializar las intervenciones propuestas, conforme a los costos estimados en los productos entregados.

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

4. Validar en campo previo a la ejecución de las intervenciones: Se sugiere realizar verificaciones técnicas en sitio antes del inicio de obras, con el fin de ajustar detalles específicos derivados de las condiciones reales de cada inmueble.
5. Utilizar integralmente los documentos técnicos entregados: Se recomienda que los procesos contractuales futuros incorporen la totalidad de los insumos generados (planos, memorias, especificaciones y presupuestos), garantizando la coherencia entre diseño y ejecución.
6. Fortalecer los mecanismos de supervisión en la fase de implementación: Se sugiere que, durante la ejecución de las obras, se cuente con un esquema de supervisión o interventoría que garantice el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos definidos en la consultoría.
7. Asegurar el cumplimiento normativo en la ejecución futura: Se recomienda que las intervenciones se desarrollen bajo estricto cumplimiento del RETIE, NTC 2050 y demás normas aplicables, garantizando condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
8. Establecer un sistema de seguimiento a la implementación de resultados: Se sugiere implementar un mecanismo de seguimiento institucional que permita evaluar el avance en la ejecución de las recomendaciones derivadas de la consultoría.
9. Fortalecer la gestión documental de los entregables: Se recomienda organizar, custodiar y mantener actualizada la documentación técnica generada, asegurando su disponibilidad para consultas y futuros procesos contractuales.
10. Aprovechar la metodología desarrollada en la consultoría: Se sugiere utilizar la metodología aplicada como referente técnico para el desarrollo de estudios y diseños en otras sedes de la Rama Judicial, promoviendo la estandarización de procesos.

|                           |                                    |                                 |                                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>F-MIF-51 | <b>ELABORÓ</b><br>LÍDER DE PROCESO | <b>REVISÓ</b><br>CENDOJ- SIGCMA | <b>APROBÓ</b><br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| <b>VERSIÓN</b><br>00      | <b>FECHA</b><br>18/05/2020         | <b>FECHA</b><br>22/07/2021      | <b>FECHA</b><br>29/07/2021                  |



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Cúcuta-Norte de Santander**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los 03 días, del mes de marzo de 2026.

RENZO PÉREZ MALDONADO  
Representante Legal  
CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025  
Contratista

| CÓDIGO<br>F-MIF-51 | ELABORÓ<br>LÍDER DE PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ- SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VERSIÓN<br>00      | FECHA<br>18/05/2020         | FECHA<br>22/07/2021      | FECHA<br>29/07/2021                  |
