



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de 04/10/2020

LAPSO del 03/09/2020 al 04/10/2020

CONTRATO	:	050-ARC-CBN2-2020
CONTRATISTA	:	SIKAMAR LTDA
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL A.R.C. "MÁLAGA", de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en el Anexo "A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 de Septiembre del 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	04 de Noviembre del 2020
VALOR INICIAL	:	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$784.199.053) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan
ADICIÓN (S)	:	05 DE JUNIO
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$799.999.689,00) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TK RAMIREZ DANIEL: INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR INICIAL	:	TK RAMIREZ RIVAS DANIEL
SUPERVISOR FINAL	:	TK RAMIREZ RIVAS DANIEL

En la ciudad de Buenaventura, Base Naval ARC "Málaga", a los cuatro (04) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 050-ARC-CBN2-2020 suscrito con la empresa SIKAMAR LTDA. NIT. 835.000.882-9, representada legalmente por sr. GIPIS SAAVEDRA ALEXANDER y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 2 de 7

entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL A.R.C. "MÁLAGA", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN	05 DE JUNIO	PONENCIA MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN) Y MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO - ECONÓMICO "A" DEL CONTRATO No. N° 050-ARC-CBN2-2020	N/A	\$15.800.636,00
PRORROGA	10 DE SEPTIEMBRE	PONENCIA MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 050-ARC-CBN2-2020	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO.	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	N/A	N/A	\$799.999.689,00

4. GARANTIAS



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 3 de 7

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. GU006207 DE FECHA 2020-04-24
FIANZAS S.A. "CONFIANZA".
2020-04-30

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	SI	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	N/A	30/04/2020	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI	N/A	30/04/2020	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	N/A	30/04/2020	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	N/A	30/04/2020	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	N/A	30/04/2020	N/A
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
N/A		DESDE	HASTA	N/A
		N/A	N/A	N/A

- Se está a la espera de la modificación de las pólizas teniendo en cuenta la Prorroga realizada.

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
			No.	FECHA	No.	FECHA		% EJECUCION CONTRACTUAL
Parciales	2020	\$453.571.464,00	57220	2020-09-10	258469020	2020-09-22	\$453.571.464,00	\$346.428.225,00

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LA BASE NAVAL A.R.C. "MÁLAGA", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	2020	No. 120 de fecha 03 de enero de 2020	\$799.999.689,00	N/A	N/A	N/A	No. 22320 de fecha 18 de abril del 2020	\$799.999.689,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 4 de 7

FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	Nº Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2020	servicio	\$453.571.464	000051 14/08/2020	\$453.571.464	Parcial Nº 1	\$453.571.464	5002445923 5002443055	08/09/20	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ITEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	%	CUANTIFICACION (Indicar tipo de moneda)	
1	PRELIMINARES			4%		
1.1	DESMONTE E IZADA DE DEFENSA. INCLUYE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN UN MUERTO DE CONCRETO BAJO AGUA. EL CONTRATISTA CON TRABAJOS DE BUCEO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR EL SISTEMA DE ANCLAJE, RETIRO DE PASADOR. EN CASO DE SER NECESARIO DEMOLER EL MUERTO EMBESADO EN CONCRETO DE LA BASE, Y TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. TODOS LOS ELEMENTOS DEMOLIDOS DEBEN SER RESTAURADOS UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO. LA IZADA, Y EL RETIRO DE ESTE ELEMENTO METÁLICO SE REALIZARÁ CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS EN EL MOVIMIENTO, A SU VEZ SE DEBE PREVER COSTOS ASOCIADOS A LA MANIOBRA.	08/005/2020	10/09/2020	100,00%	\$87.150.000	N/A
1.2	CORRECCIÓN DE TORSIÓN OCASIONADO POR IMPACTO EN ELEMENTO VERTICAL METÁLICO. INCLUYE, VERIFICACIÓN, Y ESTUDIO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA POSICIÓN DEL ELEMENTO VERTICAL, CON EL FIN QUE CUMPLA SU PRINCIPAL FUNCIÓN QUE ES LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO CON LAS EMBARCACIONES, SIN ALTERAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA DEFENSA.	08/005/2020	10/09/2020	100,00%	\$8.900.000	N/A
1.3	APLICACIÓN DE SAND BLASTING SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRASIVO (SP-5, TIPO METAL BLANCO) REALIZADO EN TIERRA, SE DEBE DISPONER DE UN LUGAR CERRADO LIBRE DEL CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, INCLUYE ALMACENAMIENTO DURANTE EL PROCESO.	08/005/2020	10/09/2020	100,00%	\$37.937.815	N/A
1.4	PROTECCIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA CON IMPRIMANTE EPOXICO ROJO TIPO 137008 DE Sika O SIMILAR. (PROCEDIMIENTO REALIZADO EN TIERRA, SE DEBE DISPONER DE UN LUGAR CERRADO LIBRE DEL CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, INCLUYE ALMACENAMIENTO DURANTE EL PROCESO)	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$14.527.424	N/A
1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE COATLAR EPOXICO REF. 734502 DE Sika O SIMILAR SOBRE SUPERFICIE METÁLICA. (PROCEDIMIENTO REALIZADO EN TIERRA, SE DEBE DISPONER DE UN LUGAR CERRADO LIBRE DEL CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, INCLUYE ALMACENAMIENTO DURANTE EL PROCESO)	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$13.365.570	N/A
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS Y TUERCAS DE 3" EN ACERO INOXIDABLE. (SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN EN SITO ANTES DE DISPONER EL ELEMENTO VERTICAL EN LA POSICIÓN FUA) LOS PERNOS PUEDEN SER NO TORNEADOS, TORNEADOS O NERVADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PERNOS GRADO A DE LA NORMA ASTM A1307.	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$11.383.680	N/A
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EN NEOPRENO LOCALIZADOS EN LA CARA EXTERNA DE LAS DEFENSAS DE 30 CM DE ANCHO POR 3" DE ESPESOR CON GRADO DE DUREZA 70" SHORE "A" +/-5" (ASTM D-2240)	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$62.250.000	N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 5 de 7

2	REEMPLAZO CABEZAL DE LAS DEFENSAS					
2.1	SUMINISTRO Y NACIONALIZACIÓN DE DEFENSA CONICA SCN 550 H; 4 ANCLAJES DE DEFENSA A MUELLE TIPO EC2 M21 Y SUS RESPECTIVAS ARANDELAS Y TUERCAS, EN CALIDAD ACERO INOXIDABLE 316; 4 TORNILLOS M21 Y SUS RESPECTIVAS ARANDELAS Y TUERCAS, EN CALIDAD ACERO INOXIDABLE 316, FLANGE CONEXIÓN ELEMENTO/PANTALLA, CON PINTURA PROYECTIVA Y RESINAS EPOXY PARA ANCLAJES.	08/005/2020	04/11/2020	0%		la actividad se encuentra en desarrollo
2.2	SUMINISTRO Y NACIONALIZACIÓN DE DEFENSA CONICA SCN 800 H; 8 ANCLAJES DE DEFENSA A MUELLE TIPO EC2 M21 Y SUS RESPECTIVAS ARANDELAS Y TUERCAS, EN CALIDAD ACERO INOXIDABLE 316; 8 TORNILLOS M21 Y SUS RESPECTIVAS ARANDELAS Y TUERCAS, EN CALIDAD ACERO INOXIDABLE 316, FLANGE CONEXIÓN ELEMENTO/PANTALLA, CON PINTURA PROYECTIVA Y RESINAS EPOXY PARA ANCLAJES.	08/005/2020	04/11/2020	0%		la actividad se encuentra en desarrollo
2.3	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS DEFENSAS MARINAS, INCLUYE: ACTIVIDADES DE BUQUE CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE CADA DEFENSA BAJO AGUA DE MAR Y EN CONDICIONES DE CORRIENTES FUERTES PRESENTES EN EL SITIO DE LA OBRA, LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, DE MANERA QUE PUEDAN SER INSTALADAS SIGUIENDO LOS PARÁMETROS DE ANCLAJE Y AMARRÉ QUE SE TENDRÁN AL MOMENTO DE SU RETIRO.	08/005/2020	04/11/2020	0%	\$29.650.000	la actividad se encuentra en desarrollo
2.4	MONTAJE DE CONOS CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS EN EL MOVIMIENTO, A SU VEZ SE DEBE PREVER COSTOS ASOCIADOS A LA MANO DE OBRA.	08/005/2020	04/11/2020	0%		la actividad se encuentra en desarrollo
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS Y ACCESORIOS PARA ASEGURAR ESTRUCTURA METÁLICA AL CONO.	08/005/2020	04/11/2020	0		la actividad se encuentra en desarrollo
2.6	ARREGLO DE DEFENSAS EN CHARLÁN AL CONO	08/005/2020	04/11/2020	0%	\$3.650.000	la actividad se encuentra en desarrollo
3	REPARACIÓN DE DUQUE DE ALBA (CONCRETOS DE REPARACIÓN)			54%		
3.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE B = 0,20M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$3.269.440	N/A
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1400 PARA PROTECCIÓN RELLENO CÁRCAMO DE SERVICIOS. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$1.251.900	N/A
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO CORRUGADO FY=420 MPA PARA REFUERZO DE PLACA, PARRILLA DOBLE EN 838" Y/O 1/2" @ 0.15 MT AMBOS SENTIDOS.	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$9.838.150	N/A
3.4	REPARACIÓN CON Sika GROUT 212 O PRODUCTO SIMILAR	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$74.650.498	N/A
3.5	REPARACIÓN CON SKATOP 122 O PRODUCTO SIMILAR	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$182.250	N/A
3.6	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$18.049.881	N/A
3.7	CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA FC=5000 PSI	08/005/2020	10/09/2020	100%	\$3.813.375	N/A

	VALOR COSTOS DIRECTOS	379.669.961
ADMINISTRACIÓN	23,00%	87.324.091
IMPREVISTOS	2,00%	7.593.399
UTILIDAD	5,00%	18.983.498
TOTAL APU	30,00%	113.900.988
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	3.606.865
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 497.177.814

62,15%

OBSERVACIONES:

1. La adquisición de amortiguadores se encuentra atrasada debido a pandemia COVID-19



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 6 de 7

2. El contratista se encuentra atrasado con la entrega de los informes semanales.
3. El contratista no ha entregado bitácora de obra para revisión.
4. El contratista no ha enviado dentro de sus obligaciones el reporte de la planilla de pago seguridad social y los parafiscales.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se realiza llamado por diferentes medios al señor representante legal, sin respuesta alguna por parte de la empresa.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

No es posible verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista SIKAMAR LTDA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, debido a que no ha entregado los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.



En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, debido a que no hay evidencia del suscrito por el Revisor Fiscal de la empresa SIKAMAR LTDA. En el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha vigente, el contratista no es posible verificar la planilla/certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato N°050-ARC-CBN2-2020, evidenciándose que Existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

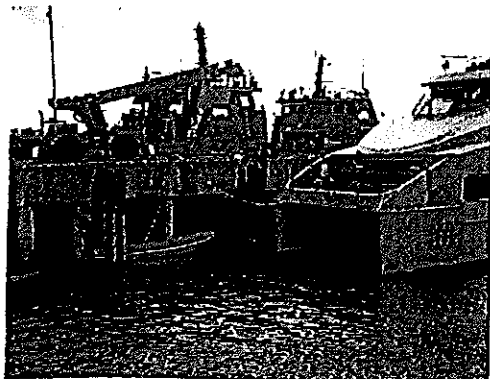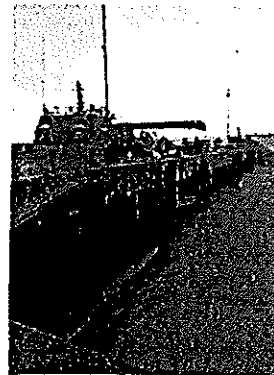

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 05/07/2020	Página 7 de 7




14. RELACIONAR INFORME FINAL:
N/A

15. REPORTE FINAL:
N/A

Atentamente,

Firma


TK RAMIREZ RIVAS, DANIEL EDUARDO
C.C. 1.044.922.354 de Cartagena
Base Naval ARC "Málaga"
Supervisor Contrato 050-ARC-CBN2-2020
Daniel.ramirez.ri@armada.mil.co

