

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 1 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P Y EL INSTITUTO DE DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)

### CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025 GRUPO 4 RENATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO

**OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CONEXOS EN PARQUES, JARDINES Y PISCINAS, ASÍ COMO REALIZAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ECOSISTÉMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA Y DE LOS POZOS PROFUNDOS, ADEMÁS EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, EL MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO, LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LAS ACTIVIDADES DE RENATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD INCLUYENDO LA SEDE ADMINISTRATIVA”.**







**INFORME MENSUAL No. 1. DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**VERSIÓN 3**

**BOGOTÁ D.C., ABRIL 2026**

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 2 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

### CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

| Versión                                                                                              | Fecha      | Páginas | Descripción de cambio                                                                                 | Copia controlada |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                                      |            |         |                                                                                                       | SÍ               | NO |
| 3                                                                                                    | Abril 2026 | 54      | Creación del documento                                                                                | X                |    |
| RESPONSABLES AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.                                                             |            |         |                                                                                                       |                  |    |
| Elaborado por:<br>  |            |         | Elaborado por:<br>  |                  |    |
| Arq. Juan Sebastián Vargas Caro<br>Profesional Arquitectura<br>CI IDRD-DG-CD-3799-2025               |            |         | Ing. Laura Milena Patiño Ortiz<br>Profesional Ambiental<br>CI IDRD-DG-CD-3799-2025                    |                  |    |
| Elaborado por:<br>  |            |         | Elaborado por:<br>  |                  |    |
| Yedmi Janeth Sierra Moreno<br>Profesional Social<br>CI IDRD-DG-CD-3799-2025                          |            |         | Ing. Óscar Alexander Peñaloza Mancilla<br>Profesional SST<br>CI IDRD-DG-CD-3799-2025                  |                  |    |
| Revisado por:<br> |            |         | Aprobado por:<br> |                  |    |
| Ing. Angie Alexandra Totaitive Beltrán<br>Coordinadora GAGR                                          |            |         | Ing. Julián Camilo Soto Parra<br>Gerente Agua y Gestión de Residuos                                   |                  |    |
| RESPONSABLES INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)                                      |            |         |                                                                                                       |                  |    |
| Supervisor del contrato: Subdirector Técnico de Parques, Rodrigo Alberto Manrique Forero.            |            |         |                                                                                                       |                  |    |
| Apoyo a la supervisión: Profesional Subdirección Técnica de Parques, Santiago Arango.                |            |         |                                                                                                       |                  |    |

### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

| Copia No.    | Entidad                                     | Fecha de Distribución |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1, Versión 1 | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.                 | Enero 2026            |
| 1, Versión 1 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Enero 2026            |
| 2, Versión 2 | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.                 | Febrero 2026          |
| 2, Versión 2 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Febrero 2026          |
| 3, Versión 3 | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.                 | Abril 2026            |
| 3, Versión 3 | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Abril 2026            |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 3 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                                                                                          | <b>6</b>  |
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                  | <b>8</b>  |
| <b>2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.....</b>                                                                                                                                     | <b>10</b> |
| 2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGA.....                                                                                                    | 10        |
| 2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.....                                                                                                                                         | 10        |
| <b>3. INFORMACIÓN TÉCNICA.....</b>                                                                                                                                                | <b>13</b> |
| 3.1. PARQUES INTERVENIDOS.....                                                                                                                                                    | 13        |
| 3.1.1. <b>Parque Estructurante San Cristóbal .....</b>                                                                                                                            | <b>13</b> |
| 3.1.1.1. Actividades realizadas .....                                                                                                                                             | 13        |
| 3.1.1.1.1. Trazado y preparación inicial de los puntos de plantación.....                                                                                                         | 14        |
| 3.1.1.1.2. Excavación manual de ahoyado.....                                                                                                                                      | 15        |
| 3.1.1.1.3. Adecuación, perfilamiento y señalización de ahoyados.....                                                                                                              | 17        |
| 3.1.1.1.4. Preparación del sustrato y manejo de materiales .....                                                                                                                  | 17        |
| 3.1.1.1.5. Acopio temporal de RCD .....                                                                                                                                           | 19        |
| 3.1.1.1.6. Preparación logística para la jornada de plantación.....                                                                                                               | 20        |
| 3.1.1.1.7. Jornada de plantación de árboles.....                                                                                                                                  | 22        |
| 3.1.1.1.8. Actividades de riego con comunidad.....                                                                                                                                | 24        |
| 3.1.1.2. Componente Social. ....                                                                                                                                                  | 25        |
| 3.1.1.2.1. Presentación de la actividad de plantación con actores institucionales (administrador del parque San Cristóbal) el día 19 de diciembre de 2025. ....                   | 25        |
| 3.1.1.2.2. Convocatoria a la actividad de plantación con actores vecinales.....                                                                                                   | 26        |
| 3.1.1.2.3. Actividad de plantación con comunidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres cuidadoras) el día 19 de diciembre de 2025.....                                             | 27        |
| 3.1.1.2.4. Actividad de riego con comunidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres cuidadoras) el día 29 de diciembre de 2025.....                                                  | 30        |
| 3.1.2. <b>Parque Deportivo Velódromo Primera de Mayo .....</b>                                                                                                                    | <b>32</b> |
| 3.1.2.1. Actividades realizadas .....                                                                                                                                             | 32        |
| 3.1.2.1.1. Trazado y preparación inicial de los puntos de plantación.....                                                                                                         | 32        |
| 3.1.2.2. Componente Social. ....                                                                                                                                                  | 33        |
| 3.1.3. <b>Parque Estructurante El Recreo .....</b>                                                                                                                                | <b>33</b> |
| 3.1.3.1. Actividades realizadas .....                                                                                                                                             | 34        |
| 3.1.3.1.1. Jornada de recorrido.....                                                                                                                                              | 34        |
| 3.1.3.1.2. Jornada de socialización con actores vecinales.....                                                                                                                    | 35        |
| <b>4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST.....</b>                                                                                                                                        | <b>38</b> |
| 4.1. INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS..... | 38        |
| 4.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN .....                                                                                                                                                | 38        |
| 4.1.1.1. Control de los peligros y riesgos.....                                                                                                                                   | 38        |
| 4.1.1.2. Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo – SST                                                                                                  | 39        |
| 4.1.1.3. Seguimiento médico .....                                                                                                                                                 | 41        |

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 4 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |                                                                                                                                |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.1.4.   | Gestión en salud.....                                                                                                          | 42        |
| 4.1.1.4.1. | Pausas activas: un compromiso con la salud y el bienestar .....                                                                | 42        |
| 4.1.1.5.   | Elementos de protección personal (EPP) .....                                                                                   | 43        |
| 4.1.1.6.   | Entrega de dotación .....                                                                                                      | 44        |
| 4.1.1.7.   | Seguimiento a Indicadores De Accidentalidad .....                                                                              | 45        |
| 4.1.1.8.   | Afiliaciones y Pagos del personal del Contrato Interadministrativo, al Sistema General De Seguridad Social Integral.....       | 45        |
| 4.1.1.9.   | Seguimiento a la gestión realizada por el contratista mediante indicadores de SST de acuerdo con la normatividad vigente. .... | 45        |
| <b>5.</b>  | <b>CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                      | <b>49</b> |
|            | <b>ANEXOS .....</b>                                                                                                            | <b>54</b> |

### LISTADO DE ILUSTRACIONES

|                |                                                  |    |
|----------------|--------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. | Mapa Parque San Cristóbal.....                   | 13 |
| Ilustración 2. | Mapa Parque Velódromo Primera de Mayo.....       | 32 |
| Ilustración 3. | Mapa Parque Estructurante El Recreo .....        | 34 |
| Ilustración 4. | Indicador de frecuencia de accidentalidad .....  | 46 |
| Ilustración 5. | Indicador de severidad de la accidentalidad..... | 47 |
| Ilustración 6. | Ausentismo por causa medica.....                 | 47 |

### LISTADO DE TABLAS

|           |                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Información general del proyecto .....                                           | 8  |
| Tabla 2.  | Ubicación de los tres Parques a intervenir.....                                  | 9  |
| Tabla 3.  | Pólizas por suscripción del contrato.....                                        | 10 |
| Tabla 4.  | Pólizas por acta de inicio del contrato .....                                    | 10 |
| Tabla 5.  | Balance Financiero.....                                                          | 10 |
| Tabla 6.  | Porcentaje de avance financiero y de tiempo de ejecución.....                    | 11 |
| Tabla 7.  | Registro fotográfico trazado de plantación.....                                  | 14 |
| Tabla 8.  | Registro fotográfico ahoyado .....                                               | 15 |
| Tabla 9.  | Registro fotográfico adecuación, perfilamiento y señalización de ahoyados.....   | 17 |
| Tabla 10. | Registro fotográfico preparación del sustrato y manejo de materiales .....       | 18 |
| Tabla 11. | Registro fotográfico gestión de residuos de obra .....                           | 20 |
| Tabla 12. | Especies arbóreas para el Parque Estructurante San Cristóbal.....                | 21 |
| Tabla 13. | Registro fotográfico preparación logística para plantación .....                 | 21 |
| Tabla 14. | Especies arbóreas plantadas en la Jornada .....                                  | 23 |
| Tabla 15. | Registro fotográfico jornada de plantación .....                                 | 23 |
| Tabla 16. | Registro fotográfico actividades de mantenimiento inicial y riego .....          | 24 |
| Tabla 17. | Registro fotográfico actividad de socialización de la jornada de plantación..... | 26 |
| Tabla 18. | Actores comunitarios institucionales .....                                       | 26 |
| Tabla 19. | Tabla Registro fotográfico convocatoria.....                                     | 26 |
| Tabla 20. | Registro fotográfico actividad de plantación de árboles.....                     | 28 |
| Tabla 21. | Actores comunitarios - Jornada de plantación.....                                | 29 |
| Tabla 22. | Registro fotográfico actividad de riego con la comunidad .....                   | 31 |

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 5 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 23. Actores comunitarios- Jornada de riego.....                                             | 31 |
| Tabla 24. Registro fotográfico actividades realizadas en el Parque Velódromo Primera de Mayo..... | 33 |
| Tabla 25. Registro fotográfico actividades realizadas en el Parque El Recreo .....                | 35 |
| Tabla 26. Registro fotográfico jornada de recorrido e identificación de actores.....              | 36 |
| Tabla 27. Actores comunitarios Parque Estructurante El Recreo .....                               | 37 |
| Tabla 28. Registro fotográfico actividades realizadas por los operarios .....                     | 38 |
| Tabla 29. Capacitaciones de SST.....                                                              | 40 |
| Tabla 30. Socialización consumo de SPA y alcohol.....                                             | 41 |
| Tabla 31. Registro fotográfico de pausas activas realizadas durante el periodo de diciembre ..... | 42 |
| Tabla 32. Cantidad de EPP entregados por trabajador.....                                          | 43 |
| Tabla 33. Elementos de Protección personal .....                                                  | 44 |
| Tabla 34. Entrega de dotación .....                                                               | 44 |
| Tabla 35. Accidentalidad mes diciembre 2025.....                                                  | 46 |
| Tabla 36. Ausentismo por causa medica mes diciembre 2025 .....                                    | 47 |

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 6 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## INTRODUCCIÓN

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión integral del agua, residuos y gestión ambiental; la cual realiza actividades de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación de zonas verdes, cuerpos de agua (lagos, humedales y fuentes), espacio público, infraestructura vial y mobiliario urbano.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la Entidad pública que tiene como misionalidad fomentar el bienestar integral de la ciudadanía a través de estrategias de actividad física, recreación, deporte, sostenibilidad de parques, escenarios y equipamientos deportivos, con el fin de impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y el tejido social de la ciudad de Bogotá D. C.

El IDRD se divide en tres áreas misionales, encargadas de operar los diferentes programas y recintos: la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, encargada de ejecutar y coordinar las actividades encaminadas al bienestar físico y mental de la ciudadanía; la Subdirección Técnica de Parques, a cargo de administrar y mantener la red de escenarios públicos de la ciudad; y la Subdirección Técnica de Construcciones, encargada de los nuevos proyectos y obras en parques ya establecidos.

A su vez, cuenta con la Subdirección de Contratación y la Subdirección Administrativa y Financiera, encargadas de los temas relacionados con las actividades contractuales y la administración de los recursos financieros de la Entidad, respectivamente.

El Instituto tiene a su cargo la administración del Sistema Distrital de Parques, a los cuales se les debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, conforme las disposiciones normativas previstas en el artículo segundo, numeral sexto, del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea y se faculta al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para el mantenimiento y administración de los Parques Distritales.

El Decreto Distrital 555 de 2021, a través del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece 2022-2035”, establece en su artículo 129 las *directrices para la renaturalización y el reverdecimiento* de los espacios públicos de la ciudad, definiendo la *renaturalización* como el proceso gradual de innovación que busca mejorar la funcionalidad ecológica de las áreas ya construidas o artificiales mediante intervenciones que adaptan la ciudad al ciclo hidrológico, y la reconversión de áreas endurecidas en blandas.

Asimismo, se define el *reverdecimiento* como el proceso que busca incrementar en cantidad y diversidad las coberturas vegetales, con el objeto de obtener mayores beneficios y servicios de la biodiversidad y los ecosistemas.

En tal sentido, a través de la norma *ibídem* se creó el “Programa conectividad ecosistémica, reverdecimiento y atención de la emergencia climática” (art. 566) y, en el marco de este, se creó el Subprograma No. 8 de renaturalización y/o reverdecimiento de los espacios públicos peatonales y para el encuentro, el cual busca cualificar las condiciones ambientales y de

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 7 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

confort de espacios públicos peatonales y para el encuentro que, para el caso específico, serán los Parques Distritales administrados por el IDRD.

El reverdecimiento y la renaturalización se implementarán mediante acciones y procesos de enriquecimiento vegetal a través de cerramientos con setos y/o enredados, plantación de nuevos individuos arbóreos, jardines polinizadores, implementación de prácticas de urbanismo sostenible, enriquecimiento de hábitats, elementos para facilitar procesos de separación en la fuente y manejo adecuado de residuos, apropiación social y estrategias de sostenibilidad.

En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar la ejecución integral de las actividades de renaturalización y reverdecimiento para mantener las condiciones ambientales, funcionales y paisajísticas de los parques y escenarios administrados por el IDRD, promoviendo espacios seguros, sostenibles y de calidad para los usuarios de estos.

En consecuencia, se suscribió el contrato interadministrativo IDRD-DG-CD-3799-2025 entre Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual tiene por objeto: *“Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa”*.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 8 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025 GRUPO 4: RENATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO

En relación con las actividades del Grupo 4, estas comprenden tres tipologías principales, como lo son:

- **Actividades de renaturalización y reverdecimiento:** Buscan la regeneración natural mediante la reintroducción de especies vegetales nativas, la rehabilitación de suelos, y la incorporación de infraestructura adaptable al ciclo hidrológico.
- **Actividades de reverdecimiento:** Por medio de estrategias se incrementen las zonas verdes, con el objeto de renaturalizar ciudades para mejorar la calidad de vida de la comunidad y mitigar los impactos del cambio climático.
- **Actividades de mantenimiento:** Las cuales comprenden el cuidado periódico de las zonas verdes y/o públicas, asegurando su conservación y sostenibilidad a largo plazo. Entre estas se incluyen la poda, apeo, riego eficiente, control de plagas, fertilización con productos ecológicos, y la gestión de subproductos o residuos derivados de estas.

Tabla 1. Información general del proyecto

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto del Contrato Interadministrativo</b> | Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa. |
| <b>Contratista</b>                             | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dirección</b>                               | Carrera 11 # 93 – 92 piso 3 Bogotá D.C. – Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Teléfono</b>                                | (1) 5553636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor del Contrato Interadministrativo</b>  | OCHENTA Y UN MIL SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$81.006.038.422,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Plazo</b>                                   | (26) Veintiséis meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Suscripción</b>                    | 27 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Acta de inicio</b>                 | 29 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de terminación inicial</b>            | 28 de diciembre de 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

En el presente contrato se adelantarán las actividades de renaturalización y reverdecimiento que hacen parte del Sistema Distrital de Parques, específicamente en tres Parques, relacionados a continuación:

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 9 de 54                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 2. Ubicación de los tres Parques a intervenir

| ÍTEM | PARQUE                    | DIRECCIÓN                        |
|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1    | San Cristóbal             | Calle 17 A Sur No. 2 A - 60 Este |
| 2    | Velódromo Primero de Mayo | Carrera 5 Bis No. 17 B - 14 Sur  |
| 3    | El Recreo                 | Carrera 102 con Calle 69 A Sur   |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

|                                                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 10 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

### 2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGA.

A continuación, se presenta la información de pólizas correspondientes al proyecto.

Tabla 3. Pólizas por suscripción del contrato

| NO. DE PÓLIZA   | AMPARO                | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG./ACTUAL.   |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 98508 - Anexo 0 | Cumplimiento          | 27/10/2025     | 30/06/2028     | \$ 16.201.297.684,40 |
| 98508 - Anexo 0 | Prestaciones Sociales | 27/10/2025     | 31/12/2030     | \$ 4.050.301.921,10  |
| 98508 - Anexo 0 | Calidad del servicio  | 27/10/2025     | 30/06/2028     | \$ 16.201.297.684,40 |
| 28379 - Anexo 0 | RCE                   | 27/10/2025     | 31/12/2027     | \$ 4.050.301.921,10  |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 4. Pólizas por acta de inicio del contrato

| NO. DE PÓLIZA   | AMPARO                | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG. /ACTUAL.  |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 98508 - Anexo 1 | Cumplimiento          | 29/10/2025     | 02/07/2028     | \$ 16.201.207.684,40 |
| 98508 - Anexo 1 | Prestaciones Sociales | 29/10/2025     | 02/01/2031     | \$ 4.050.301.921,10  |
| 98508 - Anexo 1 | Calidad del servicio  | 29/10/2025     | 02/07/2028     | \$ 16.201.207.684,40 |
| 28379 - Anexo 1 | RCE                   | 29/10/2025     | 02/01/2028     | \$ 4.050.301.921,10  |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información del balance financiero correspondiente al corte comprendido entre el 02 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, donde se evidencia la ejecución por el servicio de renaturalización y reverdecimiento en los Parque Estructurante San Cristóbal, Parque Deportivo Velódromo Primero de Mayo y Parque Metropolitano El Recreo.

Tabla 5. Balance Financiero

| PLANTACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |            |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|
| ÍTEM       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | CANTIDADES | VALOR TOTAL   |
| 1          | Plantación (sin incluir material vegetal) porte bajo (0,8 m y 1,5 m de altura), trazado, ahoyado de 1m X 1m X 1m (1 m3), sustrato (mezcla de tierra negra m3, Cal, cascarilla y demás), abono orgánico 8:1 (8 partes de tierra por 1 de cascarilla y/o cualquier otro, e hidrotenedores entre 5 y 15 gramos), tutorado (2,5 m de | UN               | \$ 551.327     | 43         | \$ 23.707.061 |

|                                                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 11 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----------------------|
|                                      | altura mínima x 0,03 x 0,03 m), riego de plantación, deshierbe, plateo, y cercamiento o elemento de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    |                      |
| 2                                    | Plantación (sin incluir material vegetal) porte medio (1,5 m y 2,5 m de altura), trazado, ahoyado de 1m X 1m X 1m (1 m3), sustrato (mezcla de tierra negra m3, Cal, cascarilla y demás), abono orgánico 8:1 (8 partes de tierra por 1 de cascarilla y/o cualquier otro, e hidro retenedores entre 5 y 15 gramos), tutorado (2,5 m de altura mínima x 0,03 x 0,03 m), riego de plantación, deshierbe, plateo, y cercamiento o elemento de protección. | UN | \$ 575.094   | 22 | \$ 12.652.077        |
| 3                                    | Plantación (sin incluir material vegetal) porte alto (mayor a 2 m de altura), trazado, ahoyado de 1m X 1m X 1m (1 m3), sustrato (mezcla de tierra negra m3, Cal, cascarilla y demás), abono orgánico 8:1 (8 partes de tierra por 1 de cascarilla y/o cualquier otro, e hidro retenedores entre 5 y 15 gramos), tutorado (2,5 m de altura mínima x 0,03 x 0,03 m), riego de plantación, deshierbe, plateo, y cercamiento o elemento de protección.    | UN | \$ 598.862   | 2  | \$ 1.197.724         |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    | <b>\$ 37.556.862</b> |
| <b>MATERIAL VEGETAL PORTE MEDIO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    |                      |
| 28                                   | Duraznillo ( <i>Abatia parviflora</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | \$ 37.433    | 7  | \$ 262.031           |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    | <b>\$ 262.031</b>    |
| <b>GESTIÓN SOCIAL / COMUNICACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    |                      |
| 3                                    | Refrigerios corresponden a porciones individuales de alimento y bebida suministradas durante las actividades de participación comunitaria, socialización, formación o jornadas de trabajo en campo. Para 15 personas por espacio, se proyecta 12 espacios por parque (espacios de socialización y estrategia de apropiación)                                                                                                                         | UN | \$ 14.579,5  | 48 | \$ 699.816           |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    | <b>\$ 699.816</b>    |
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    |                      |
| 1                                    | Profesional social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | \$ 6.475.918 | 2  | \$ 11.071.731        |
| 4                                    | Arquitecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | \$ 7.589.003 | 1  | \$ 7.344.196         |
| 5                                    | Ingeniero civil o estructural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | \$ 5.557.933 | 1  | \$ 5.378.645         |
| 10                                   | Coordinador del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | \$ 9.666.508 | 1  | \$ 9.354.685         |
| 11                                   | Coordinador administrativo y financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | \$ 9.666.508 | 1  | \$ 2.806.406         |
| 15                                   | Operario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | \$ 3.131.615 | 4  | \$ 8.990.766         |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    | <b>\$ 44.946.429</b> |
| <b>TOTAL A FACTURAR</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |    | <b>\$ 83.465.138</b> |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 6. Porcentaje de avance financiero y de tiempo de ejecución

| ÍTEM                   | No. FACTURA | PERIODO                           | VALOR FACTURA        |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1                      | FEV945      | Del 02 al 31 de diciembre de 2025 | \$ 83.475.388        |
| <b>Total Facturado</b> |             |                                   | <b>\$ 83.475.388</b> |

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.  
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - [www.aguasdebogotá.co](http://www.aguasdebogotá.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |  |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 12 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Valor Inicial del contrato | \$ 3.388.933.488 |
| Nuevo valor del contrato   | \$ 3.388.933.488 |
| % de ejecución financiera  | \$ 3.305.458.100 |
| % de ejecución física      | 2,46 %           |
| % de ejecución en tiempo   | 2,46 %           |
| Fecha inicio               | 14,59 %          |
| Fecha fin                  | 29/10/2025       |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |  |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 13 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

### 3. INFORMACIÓN TÉCNICA

#### 3.1. PARQUES INTERVENIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, se realizó el reconocimiento y diagnóstico de las zonas a intervenir en los tres Parques y escenarios administrados por el IDRD objeto del presente contrato, correspondientes al Grupo 4: Actividades de Renaturalización y Reverdecimiento.

En el marco de este periodo de ejecución, se adelantaron actividades como el reconocimiento en campo de los parques, el trazado del arbolado en dos de ellos, así como una jornada de plantación, entre otras acciones asociadas al desarrollo del contrato.

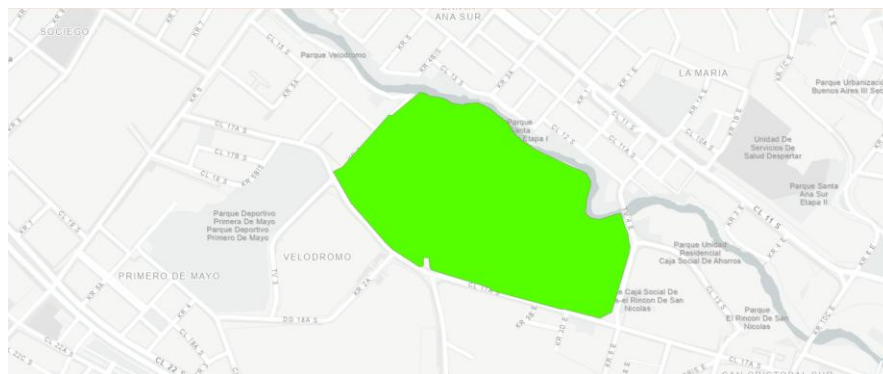
A continuación, se describen las actividades adelantadas en cada uno de los parques intervenidos.

##### 3.1.1. Parque Estructurante San Cristóbal

Las actividades en el Parque Estructurante San Cristóbal Sur se orientaron a la colocación de estacas por parte de Aguas de Bogotá, con acompañamiento del profesional del Jardín Botánico de Bogotá y profesionales del IDRD, quienes realizaron el trazado para la plantación de árboles como estrategia de reverdecimiento.

Asimismo, se ejecutaron intervenciones del componente social, una jornada de plantación y actividades de riego de los individuos arbóreos, tanto plantados como pendientes de siembra, con el propósito de promover acciones de corresponsabilidad y favorecer el adecuado establecimiento del material vegetal, conforme a los lineamientos técnicos establecidos para el mantenimiento de individuos arbóreos.

Ilustración 1. Mapa Parque San Cristóbal



Fuente: Mapas de Bogotá – Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 2026

##### 3.1.1.1. Actividades realizadas

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.  
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - [www.aguasdebogota.co](http://www.aguasdebogota.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 14 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

- Participación del comité técnico por parte del equipo de profesionales.
- Acompañamiento al trazado del diseño de 86 puntos para el arbolado.
- Ahoyado manual, mecanizado y adecuación de este (sustrato y fertilización) para los 86 puntos.
- Señalización preventiva con cinta de seguridad en las áreas intervenida.
- Almacenamiento de la tierra y cascarilla de arroz.
- Llenado con la tierra abonada de 67 ahoyados.
- Reunión virtual para la coordinación de actividad de plantación con el IDRD.
- Consolidación del documento ficha metodológica para la planeación de la jornada de plantación.
- Convocatoria presencial en organizaciones de la localidad para la jornada de plantación en el parque.
- Convocatoria a usuarios del parque para la actividad de plantación del 19 de diciembre de 2025.
- Jornada de plantación de 67 individuos arbóreos el 19 de diciembre de 2025.
- Consolidación del primer avance del documento diagnóstico del parque.
- Jornada de riego para los individuos plantados el 29 de diciembre de 2025.
- Acopio temporal de residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la adecuación del terreno.
- Traslado de cascarilla de arroz.

Las actividades anteriormente descritas se ejecutaron de manera progresiva y articulada, de acuerdo con la planeación técnica del Grupo 4: Actividades de Renaturalización y Reverdecimiento.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que evidencia el desarrollo de las labores arriba enlistadas:

#### 3.1.1.1.1. Trazado y preparación inicial de los puntos de plantación

Se realizó el trazado del diseño de plantación, definiendo en campo los 86 puntos destinados al establecimiento de individuos arbóreos, conforme la planificación técnica del proyecto. Esta actividad permitió organizar espacialmente la intervención, verificar condiciones del terreno y habilitar las áreas para el desarrollo de las labores posteriores de ahoyado, adecuación y plantación (ver Anexo 1\_ Anexo 1.2. 251203\_Trazado San Cristóbal).

Tabla 7. Registro fotográfico trazado de plantación

|                                                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 15 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Trazado de plantación                                                             |  |  |                                                                                    |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.2. Excavación manual de ahoyado

El 11 de diciembre de 2025 se dio inicio a la excavación de los 86 ahoyados en los puntos previamente definidos, actividad que se desarrolló con el apoyo de cuatro operarios en campo, empleando herramientas manuales como palas, palines y barras, así como apoyo de maquinaria tipo excavadora para optimizar tiempos y garantizar uniformidad en las dimensiones.

Cada ahoyado se ejecutó con dimensiones aproximadas de 1 m x 1 m x 1 m (1 m<sup>3</sup>), conforme los lineamientos técnicos establecidos para la plantación de individuos arbóreos. Durante el proceso se realizó la verificación de profundidad, estabilidad de paredes, retiro de material no apto y revisión de condiciones físicas del suelo, asegurando que el espacio estuviera debidamente habilitado para la incorporación de sustrato y posterior establecimiento del material vegetal (ver Anexo 6\_Anexo 6.5. Listados de asistencia y Anexo 6.6. Registro fotográfico).

Tabla 8. Registro fotográfico ahoyado

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Ahoyado manual                                                                      |  |  |                                                                                      |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ</b><br>S.A. ESP | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 16 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                             |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>15 dic 2025 7:17:44 a.m.<br/>4.57472N 74.086465W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p>                     |  |                                                        |  <p>15 dic 2025 8:27:01 a.m.<br/>4.574646666666666N 74.08649999999999W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p>           |
| Ahoyado manual                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>13 dic 2025 10:01:59 a.m.<br/>4.573458333333333N 74.08285333333333W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p> |  |                                                        |  <p>16 dic 2025 9:40:32 a.m.<br/>4.573998333333333N 74.08380333333334W<br/># 0-70 Calle 12 Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá, D.C.</p>  |
| Ahoyado con maquinaria                                                                                                                                                                                           |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>13 dic 2025 10:05:38 a.m.<br/>4.573503333333333N 74.082884W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p>        |  |                                                        |  <p>13 dic 2025 10:19:46 a.m.<br/>4.573503333333333N 74.082884W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p>                |
| Ahoyado con maquinaria revisión de las medidas                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>23 dic 2025 9:12:56 a.m.<br/>4.573270000000000N 74.08270833333333W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p> |  |                                                        |  <p>23 dic 2025 7:41:55 a.m.<br/>4.573350000000000N 74.08269833333334W<br/># 1-22 Calle 12 Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá, D.C.</p> |
| Ahoyado de árboles de los puntos reubicados                                                                                                                                                                      |  | Ahoyado de árboles de los puntos reubicados pendientes |                                                                                                                                                                                                                           |

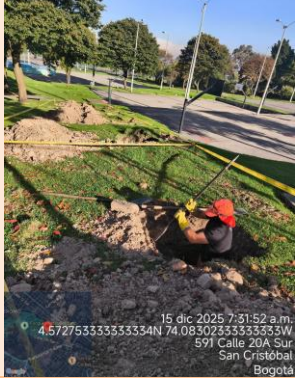
|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 17 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.3. Adecuación, perfilamiento y señalización de ahoyados

Posterior a la excavación, se realizaron labores de adecuación y perfilamiento de los ahoyados orientadas a mejorar las condiciones físicas del suelo y garantizar la estabilidad de los puntos de plantación. Estas actividades incluyeron el ajuste de bordes, retiro de material suelto y la señalización preventiva mediante cinta de seguridad, con el fin de reducir riesgos y facilitar el desarrollo seguro de las labores posteriores.

Tabla 9. Registro fotográfico adecuación, perfilamiento y señalización de ahoyados

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |   |  |
|                                                                                     |  |                                                                                      |  |
| Señalización cinta de seguridad de peligro no pase del ahoyado abierto              |  | Adecuación y perfilamiento del ahoyado abierto con la maquinaria                     |  |
|  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                      |  |
| Adecuación y perfilamiento del ahoyado abierto con la maquinaria                    |  | Revisión del ahoyado finalizado con las condiciones técnicas                         |  |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.4. Preparación del sustrato y manejo de materiales

Se adelantó la preparación del sustrato para el acondicionamiento de los puntos de plantación, mediante la mezcla de tierra negra con cascarilla de arroz en proporción aproximada 8:1 (ocho partes de tierra por una de cascarilla), conforme a los lineamientos técnicos establecidos. El sustrato utilizado presentó características de textura franca a franco-

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 18 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

arenosa, estructura granular, adecuado contenido de materia orgánica y libre de contaminantes, terrones o materiales extraños, favoreciendo condiciones de aireación, drenaje y retención de humedad en el sistema radicular (ver Anexo 6\_Anexo 6.1. *Ficha técnica cascarilla de arroz* y Anexo 6.3. *Ficha técnica tierra negra*).

Como parte del manejo técnico del sustrato, el llenado del ahoyado se realizó en dos etapas. En una primera capa, correspondiente aproximadamente a la mitad del volumen del hoyo, se empleó mezcla de tierra negra con cascarilla de arroz en proporción 8:1, favoreciendo condiciones adecuadas de aireación, drenaje y retención de humedad.

Posteriormente, para completar el volumen restante del ahoyado, se incorporó una segunda capa de sustrato compuesta por tierra negra mezclada con humus orgánico, aplicando aproximadamente 1 kg por individuo, integrado homogéneamente en la mezcla y evitando el contacto directo con el sistema radicular (ver Anexo 6\_Anexo 6.2. *Ficha técnica humus orgánico*).

Este aporte se complementó con la materia orgánica presente en la tierra abonada utilizada como base del sustrato, así como con las condiciones propias del suelo del sitio y la aplicación posterior de hidrotenedor, favoreciendo la retención de humedad y la disponibilidad gradual de nutrientes.

El material preparado fue utilizado progresivamente en el acondicionamiento de los ahoyados previo a la plantación, garantizando condiciones adecuadas de estructura del suelo, aireación, drenaje, retención hídrica y disponibilidad nutricional, favoreciendo el adecuado establecimiento y desarrollo del material vegetal.

Estas actividades -incluyendo tanto la preparación y mezcla del sustrato como el llenado del ahoyado con este- se efectuaron entre el 19 y 29 de diciembre de 2025, con el apoyo de cuatro operarios adscritos a Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. (ver Anexo 6\_Anexo 6.5. *Listados de asistencia* y Anexo 6.6. *Registro fotográfico*).

Tabla 10. Registro fotográfico preparación del sustrato y manejo de materiales

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| Ingreso de la tierra abonada en la zona A1                                          |  | Ingreso de la tierra abonada en la zona A5                                           |  |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 19 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |   |  |
| Mezcla manual de la tierra y la cascarilla de arroz                                |  | Mezcla con minicargador de la tierra y la cascarilla de arroz                       |  |
|  |  |  |  |
| Llenado manual del ahoyado                                                         |  | Llenado manual del ahoyado                                                          |  |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.5. Acopio temporal de RCD

El 16 de diciembre de 2025 se inició el acopio temporal de residuos de construcción y demolición (RCD), generados durante las actividades de ahoyado y adecuación del terreno.

La labor fue ejecutada por cuatro operarios, quienes realizaban la recolección manual con palas, depositaban el material en carretillas y posteriormente lo transportaban hasta el punto de acopio autorizado por la administración del parque para su almacenamiento provisional.

Estos residuos fueron almacenados temporalmente en dos áreas autorizadas por el administrador del Parque Estructurante de manera verbal, el señor Hawid Ladino, áreas que se ubicaron en cercanías a las entradas del Parque -tanto por la CR 9 F Este como por la CL 15 Sur, respectivamente-, donde se realizó el acopio aproximado de 86 m<sup>3</sup> de escombros, teniendo en cuenta que, a partir de la excavación de cada ahoyado se generaba en promedio 1 m<sup>3</sup> de escombros, atendiendo las directrices brindadas en la ficha técnica del Contrato Interadministrativo No. 3799-2025.

Es de precisar que, durante el mes de diciembre solo se efectuó el acopio temporal de RCD en los puntos señalados, con el objeto de evitar afectaciones al área de intervención y a los usuarios del Parque, en tanto se programa la recolección de estos por parte de un gestor autorizado para su transporte y disposición final en un sitio debidamente autorizado para tal fin, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente para el manejo de este tipo de residuos (ver Anexo 6\_Anexo 6.5. Listados de asistencia y Anexo 6.6. Registro fotográfico).

La actividad de recolección de residuos finalizó el 20 de enero de 2026, cumpliendo con la totalidad de los puntos definidos para intervención.

Tabla 11. Registro fotográfico gestión de residuos de obra

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>16 dic 2025 8:49:58 a.m.<br/>4.573121666666667N 74.0835W<br/>#12160 Transversal 3<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá, D.C.</p> |  <p>30 dic 2025 9:32:09 a.m.<br/>4.574671666666667N 74.08675W<br/>591 Calle 20A Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p> |
| Recolección de RCD con el minicargador para el almacenamiento temporal                                                                                                                                         | Recolección de RCD manual almacenamiento temporal                                                                                                                                                       |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.1.1.6. Preparación logística para la jornada de plantación

Previo a la jornada de plantación, se desarrollaron actividades de preparación logística orientadas a garantizar la adecuada ejecución de esta y el manejo del material vegetal, con el apoyo de cuatro operarios.

Es así como, 18 de diciembre de 2025 se realizó la recepción del material vegetal en el Parque Estructurante San Cristóbal, correspondiente a 85 plántulas de 15 especies, las cuales fueron almacenadas de manera temporal en un área previamente definida del parque, asegurando condiciones adecuadas de ventilación, protección frente a la radiación solar directa y conservación de la humedad del sustrato.

El 19 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la preparación del hidrogel, el cual fue previamente activado conforme las recomendaciones técnicas para su incorporación durante la plantación, con el fin de favorecer la retención de humedad en el sistema radicular de los individuos arbóreos y apoyar su establecimiento inicial (ver Anexo 6\_Anexo 6.4. Ficha técnica hidroretenedor).

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2025 se realizó la recepción de los tutores, los cuales fueron verificados y dispuestos para su instalación durante la jornada de plantación, garantizando el soporte y la estabilidad de los individuos arbóreos sembrados.

Estas actividades logísticas permitieron asegurar la disponibilidad oportuna de insumos, materiales y elementos técnicos necesarios para la ejecución de la jornada de plantación, optimizando el desarrollo de la actividad y el adecuado establecimiento del material vegetal (ver Anexo 6\_Anexo 6.5. Listados de asistencia y Anexo 6.6. Registro fotográfico).

Tabla 12. Especies arbóreas para el Parque Estructurante San Cristóbal

| No. DE ESPECIES | NOMBRE COMÚN          | NOMBRE CIENTÍFICO             | CANTIDAD  |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| 1               | Yarumo blanco         | <i>Cecropia telenitida</i>    | 2         |
| 2               | Nogal                 | <i>Juglans neotropica</i>     | 2         |
| 3               | Abutilon              | <i>Callianthe striata</i>     | 4         |
| 4               | Caballero de la noche | <i>Cestrum nocturnum</i>      | 10        |
| 5               | Fucsia arbustiva      | <i>Fuchsia paniculata</i>     | 7         |
| 6               | Lantana               | <i>Lantana camara</i>         | 5         |
| 7               | Salvia tortuosa       | <i>Salvia tortuosa</i>        | 6         |
| 8               | Mermelada             | <i>Streptosolen jamesonii</i> | 11        |
| 9               | Polígala              | <i>Polygala myrtifolia</i>    | 6         |
| 10              | Fucsia boliviana      | <i>Fuchsia corymbifolia</i>   | 6         |
| 11              | Sietecueros nazareno  | <i>Tibouchina urvilleana</i>  | 4         |
| 12              | Alcaparro doble       | <i>Senna viarum</i>           | 5         |
| 13              | Chicalá amarillo      | <i>Tecoma stans</i>           | 6         |
| 14              | Duraznillo            | <i>Abatia parviflora</i>      | 7         |
| 15              | Eucalipto pomarroso   | <i>Corymbia ficifolia</i>     | 4         |
| <b>Total</b>    |                       |                               | <b>85</b> |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 13. Registro fotográfico preparación logística para plantación

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                      |  |
| Recepción del material vegetal para las jornadas de plantación                      |  | Almacenamiento temporal del material vegetal                                         |  |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 22 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |   |  |
|                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| Llegada de tutores                                                                 |  | Descarga de tutores                                                                 |  |
|  |  |  |  |
|                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| Almacenamiento de tutores                                                          |  | Preparación del hidrogel para la jornada de plantación                              |  |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.7. Jornada de plantación de árboles

El 19 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la primera jornada de plantación de material vegetal arbóreo, previa realización del diagnóstico y la identificación de los sitios de siembra para los individuos establecidos, así como la planificación logística relacionada con la disponibilidad de árboles, abono e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad.

La jornada contó con una amplia participación comunitaria, promoviendo el trabajo en equipo entre personas mayores, madres comunitarias, niñas, niños, jóvenes y comunidad en general. Este ejercicio contribuyó al fortalecimiento del tejido social, generando espacios de encuentro e integración, además de propiciar procesos de sensibilización frente al sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente y del parque, logrando un impacto social significativo.

Con esta actividad se dio cumplimiento a la planeación establecida para la Zona 5. En el marco de la jornada se establecieron 67 individuos arbóreos, correspondientes a la fase inicial del proyecto, los cuales pertenecen a 12 especies diferentes. La caracterización de las especies y el número de individuos establecidos se presentan en la siguiente tabla.

|                                                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 23 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 14. Especies arbóreas plantadas en la Jornada

| ÍTEM         | NOMBRE COMÚN          | NOMBRE CIENTÍFICO             | CANTIDAD  |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| 1            | Caballero de la noche | <i>Cestrum nocturnum</i>      | 10        |
| 2            | Fucsia arbustiva      | <i>Fuchsia paniculata</i>     | 7         |
| 3            | Salvia tortuosa       | <i>Salvia tortuosa</i>        | 6         |
| 4            | Mermelada             | <i>Streptosolen jamesonii</i> | 11        |
| 5            | Polígala              | <i>Polygala myrtifolia</i>    | 6         |
| 6            | Abutilon              | <i>Callianthe striata</i>     | 3         |
| 7            | Alcaparro doble       | <i>Senna viarum</i>           | 5         |
| 8            | Chicalá amarillo      | <i>Tecoma stans</i>           | 6         |
| 9            | Duraznillo            | <i>Abatia parviflora</i>      | 5         |
| 10           | Eucalipto pomarroso   | <i>Corymbia ficifolia</i>     | 4         |
| 11           | Yarumo blanco         | <i>Cecropia telenitida</i>    | 2         |
| 12           | Arupo                 | <i>Chionanthus pubescens</i>  | 2         |
| <b>Total</b> |                       |                               | <b>67</b> |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 15. Registro fotográfico jornada de plantación

| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                |  |                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                                     |   |
| Actividad comunitaria de plantación                                                 |  | Actividad comunitaria de plantación |                                                                                      |
|  |  |                                     |  |
| Instalación de tutores de los árboles que se plantaron en la primera jornada        |  | Individuo arbóreo con tutor         |                                                                                      |

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 24 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| Plantación de árboles                                                             |  | Plantación de árboles                                                              |  |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.1.8. Actividades de riego con comunidad

Posterior a la jornada de plantación, el 29 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de riego para los 67 individuos plantados, la cual se desarrolló con la participación de la comunidad previamente vinculada al proceso de plantación de árboles, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la corresponsabilidad y la apropiación social del parque.

Si bien no se contó con la asistencia de la totalidad de las personas convocadas, la participación registrada fue representativa y la actividad se ejecutó de manera adecuada, cumpliendo con los objetivos previstos.

Durante esta actividad, se realizó el riego manual para los 67 individuos plantados, para lo cual se utilizaron baldes de pintura con una capacidad de 30 litros, los cuales fueron previamente lavados y limpiados con el objeto de prevenir cualquier contaminación del recurso hídrico empleado para la actividad.

El ejercicio consistió en depositar entre 20 y 30 litros de agua sobre la base de cada individuo, lo cual se realizó con recipientes de menor volumen, teniendo en cuenta que, si bien se contó con los baldes de pintura, la comunidad participante de la jornada fueron niñas y niños, haciendo más fácil el desarrollo de la actividad al reenvasar el agua en recipientes de menor tamaño. No obstante, se aclara que se garantizó permanentemente el riego de los 20-30 litros por cada individuo plantado.

La ejecución estuvo acompañada por el equipo profesional responsable, quienes orientaron la actividad y promovieron el compromiso comunitario frente al cuidado del arbolado.

Esta actividad se efectuó con el apoyo de cuatro operarios adscritos a Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. (ver Anexo 6\_Anexo 6.5. Listados de asistencia y Anexo 6.6. Registro fotográfico).

Tabla 16. Registro fotográfico actividades de mantenimiento inicial y riego

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 25 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| Actividad comunitaria de riego                                                    |  | Actividad comunitaria de riego                                                     |  |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.1.2. Componente Social.

En atención a las actividades comunitarias programadas para el mes de diciembre de 2025 en el parque, se realizaron reuniones previas lideradas por el área social, en articulación con el IDRD, mediante jornadas participativas orientadas a coordinar la convocatoria y socializar la actividad con la comunidad y la administración del parque.

Las actividades se desarrollaron en horas de la mañana, teniendo en cuenta la mayor afluencia de público en este horario. Se promovió la participación activa de la comunidad en general, incluyendo Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas y personal del IDRD, priorizando especialmente la vinculación de niños, jóvenes y personas mayores, conforme a lo programado en días anteriores.

De manera complementaria, se adelantó la formulación de la ficha metodológica y la definición de los lineamientos técnicos asociados a la actividad. Asimismo, se consolidó el primer avance del documento en cumplimiento de la guía de diagnóstico elaborada por el área correspondiente.

#### 3.1.1.2.1. *Presentación de la actividad de plantación con actores institucionales (administrador del parque San Cristóbal) el día 19 de diciembre de 2025.*

Con el fin de garantizar una adecuada articulación para la ejecución de la actividad de plantación, se llevó a cabo una reunión el 18 de diciembre de 2025, en la cual se socializaron los aspectos operativos de la jornada, tales como horarios, actores involucrados y zonas a intervenir, en coordinación con el administrador general del parque.

Esta gestión permitió evidenciar un avance significativo en la participación activa de la comunidad aledaña, reflejado en una mayor apropiación del parque por parte de los asistentes. Asimismo, la experiencia facilitó la identificación de aprendizajes relevantes para

|                                                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 26 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

futuras intervenciones y contribuyó al fortalecimiento del compromiso colectivo con el cuidado, seguimiento y sostenibilidad de las acciones desarrolladas en el parque.

Tabla 17. Registro fotográfico actividad de socialización de la jornada de plantación

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Reunión de socialización con administrador del parque                             | Convocatoria presencial a usuarios del parque                                      |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 18. Actores comunitarios institucionales

| ÍTEM | NOMBRE       | CARGO                              | ORGANIZACIÓN                       |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | Hawid Ladino | Administrador parque San Cristóbal | Parque San Cristóbal código 04-127 |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.


### 3.1.1.2.2. Convocatoria a la actividad de plantación con actores vecinales

El día 18 de diciembre de 2025 se realizó una convocatoria presencial en las instalaciones del Parque San Cristóbal, en la cual se socializó la actividad con actores vecinales, incluyendo usuarios de los espacios deportivos y transeúntes del parque. Durante este ejercicio se identificó un alto interés de la comunidad por participar en procesos de renaturalización, especialmente en actividades relacionadas con la plantación de árboles (ver Anexo 1\_Anexo 1.9. 251218\_Convocatoria Parque San Cristóbal).

Debido a que durante la convocatoria no se realizó el registro de datos de los participantes, se elaboró un acta de compromisos en la que se definieron acciones de apoyo a la difusión de la jornada de plantación, tales como la instalación de carteles informativos en puntos estratégicos del parque, la divulgación mediante voz a voz y el uso de piezas comunicativas comunitarias, entre otras estrategias orientadas a fortalecer la participación comunitaria, promoviendo la corresponsabilidad de los actores involucrados así como el seguimiento de la afectividad de las estrategias implementadas con el fin de garantizar una mayor convocatoria en la jornada programada.

Tabla 19. Tabla Registro fotográfico convocatoria

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 27 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Convocatoria presencial                                                           | Convocatoria presencial                                                            |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.1.2.3. Actividad de plantación con comunidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres cuidadoras) el día 19 de diciembre de 2025.

En cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica para la ejecución de actividades de desarrollo ambiental, en el marco de la estrategia de apropiación ambiental, se llevó a cabo una jornada comunitaria de plantación, durante la cual se establecieron 67 individuos arbóreos correspondientes a las especies previamente mencionadas (ver Anexo 1\_Anexo 1.1.1. 251219\_Primer jornada de plantación San Cristóbal).

La comunidad del Parque San Cristóbal participó activamente el 19 de diciembre en la jornada de plantación, la cual contó con la vinculación de integrantes de grupos deportivos del parque, mujeres cuidadoras asociadas a la estrategia Manzana del Cuidado, así como niños, niñas y jóvenes. Durante el desarrollo de la actividad, los participantes manifestaron su interés en fortalecer una red de apropiación en torno a temas y talleres ambientales en el parque, reconociendo que, en su calidad de usuarios permanentes del espacio, poseen un marcado sentido de pertenencia hacia el mismo.

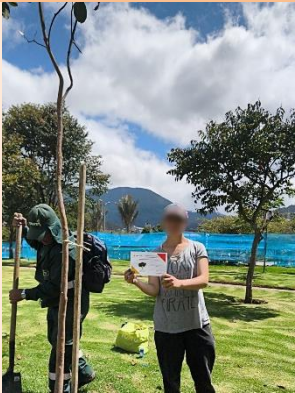
La jornada culminó con resultados altamente favorables, evidenciando un impacto social positivo y significativo en la comunidad. Se fortaleció el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad frente al cuidado del entorno, especialmente en relación con los árboles plantados, los cuales fueron asumidos simbólicamente como un compromiso colectivo de protección y seguimiento, en relación con el objetivo de la convocatoria orientada a promover la participación comunitaria en el proceso de renaturalización del parque se evidencio un alcance positivo reflejado en la asistencia y vinculación de los participantes durante la jornada se contó con la participación activa de ( 36 ) actores comunitarios del parque y población diversa la cual permitió fortalecer la apropiación social del espacio como resultado de la jornada de plantación se lograron impactos a nivel ambiental, social y pedagógico, así mismo se desarrolla acciones de sensibilización para la continuidad de acciones de mantenimiento y seguimiento tales como jornadas de riego y cuidado ,orientadas a garantizar la sostenibilidad de los individuos plantados.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 28 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 20. Registro fotográfico actividad de plantación de árboles

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |                                           |    |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  | Actividad social de plantación de árboles |                                                                                      |
|   |  |                                           |   |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  |                                           |                                                                                      |
|  |  |                                           |  |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  |                                           |                                                                                      |

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 29 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |    |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  |  |                                                                                      |
|   |  |  |   |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  |  |                                                                                      |
|  |  |  |  |
| Actividad social de plantación de árboles                                           |  |  |                                                                                      |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 21. Actores comunitarios - Jornada de plantación.

| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO | ORGANIZACIÓN |
|------|---------------------|--------------|--------------|
| 1    | Esteban Aro         | N/A          | Comunidad    |
| 2    | Sofia Solís         | N/A          | Centro amar  |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 30 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS      | No DOCUMENTO | ORGANIZACIÓN |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 3    | Johan Pabón              | N/A          | Centro amar  |
| 4    | Brandon hurtado          | N/A          | Centro amar  |
| 5    | Cristofer Vega           | N/A          | Centro amar  |
| 7    | María Cortes             | N/A          | Centro amar  |
| 8    | Laura Ultengo            | N/A          | Centro amar  |
| 9    | Estefanía Ultengo        | N/A          | Centro amar  |
| 10   | Leidy Catherine Corredor | N/A          | Comunidad    |
| 11   | Rosalba Méndez           | N/A          | Comunidad    |
|      | Judith Barrero           | N/A          | Comunidad    |
| 12   | Jenny Benavides          | N/A          | Patinaje     |
| 13   | Jerónimo Ardila          | N/A          | patinaje     |
| 14   | Allison Ardila           | N/A          | patinaje     |
| 15   | Sofia Benavides          | N/A          | patinaje     |
| 16   | Jasbleidy Benavides      | N/A          | patinaje     |
| 17   | Abigail Montero          | N/A          | comunidad    |
| 18   | Nancy Duarte             | N/A          | Comunidad    |
| 19   | Malory Parada            | N/A          | Comunidad    |
| 20   | Leidy Johana Parada      | N/A          | Comunidad    |
| 21   | Ana Mercedes Orafe       | N/A          | Comunidad    |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 3.1.1.2.4. Actividad de riego con comunidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres cuidadoras) el día 29 de diciembre de 2025.

Se llevó a cabo una jornada de riego de los árboles plantados en el Parque Estructurante San Cristobal, como actividad de seguimiento al proceso iniciado el 19 de diciembre de 2025 con la jornada de plantación. La actividad se desarrolló en el Parque, con el propósito de dar continuidad al proceso comunitario y fortalecer la corresponsabilidad y apropiación social del espacio.

Previamente, se realizó la convocatoria a las personas que participaron en la jornada de plantación, incluyendo mujeres cuidadoras, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mediante contacto directo y comunicación previa establecida durante el proceso comunitario. La jornada contó con la participación de integrantes de la comunidad y del equipo operador del proyecto.

Como soportes de la gestión realizada, se cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia, los cuales se anexan al presente informe (ver Anexo 1\_Anexo 1.13. 251229\_Jornada de riego).

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 31 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 22. Registro fotográfico actividad de riego con la comunidad

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |    |
| Actividad comunitaria de riego                                                      |  |  | Actividad comunitaria de riego                                                       |
|   |  |  |   |
| Actividad comunitaria de riego                                                      |  |  | Actividad comunitaria de riego                                                       |
|  |  |  |  |
| Actividad comunitaria de riego                                                      |  |  | Actividad comunitaria de riego                                                       |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 23. Actores comunitarios- Jornada de riego.

| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS     | No DOCUMENTO | BARRIO        | ORGANIZACIÓN |
|------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 1    | Abigail Montero         | N/A          | San Cristóbal | Comunidad    |
| 2    | Nancy duarte            | N/A          | San Cristóbal | Comunidad    |
| 3    | Leidy Catherin Corredor | N/A          | San Cristóbal | Comunidad    |
| 4    | Ana Mercedes Orafe      | N/A          | San Cristóbal | Comunidad    |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.2. Parque Deportivo Velódromo Primera de Mayo

Las actividades para el Parque Deportivo Velódromo Primera de Mayo se enfocaron en el trazado del diseño para la plantación de árboles como estrategia de reverdecimiento, junto con avances en el componente social.

Ilustración 2. Mapa Parque Velódromo Primera de Mayo



**Fuente:** Mapas de Bogotá

#### 3.1.2.1. Actividades realizadas

En el marco de la planeación técnica del Grupo 4: Actividades de Renaturalización y Reverdecimiento, el día 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el trazado del diseño del parque conforme a los lineamientos establecidos. De manera complementaria, se consolidó el primer avance del documento de diagnóstico, en cumplimiento de la guía metodológica elaborada por el área responsable. Estas actividades se ejecutaron de forma progresiva y articulada, garantizando coherencia técnica en su desarrollo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que evidencia las labores de trazado realizadas en el parque.

##### 3.1.2.1.1. Trazado y preparación inicial de los puntos de plantación

El día 11 de diciembre de 2025 se realizó el trazado del diseño de plantación y la definición preliminar de los 61 puntos para el establecimiento del arbolado. Cabe resaltar que, para este parque, no se dio inicio a la ejecución de actividades de campo, dado que se priorizó

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ</b><br>S.A. ESP | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 33 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

la implementación de las acciones en el Parque San Cristóbal (ver Anexo 1\_Anexo 1.7. 251211\_Trazado Parque Velódromo).

Tabla 24. Registro fotográfico actividades realizadas en el Parque Velódromo Primera de Mayo



**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.2.2. Componente Social.

Teniendo en cuenta las dinámicas propias del parque y las características de uso del espacio, durante el mes de diciembre se adelantaron diversas actividades de articulación y trabajo con la comunidad usuaria. Estas acciones permitieron recopilar información relevante sobre las percepciones, necesidades y prácticas de los actores que hacen uso frecuente del parque, aportando insumos clave para el proceso de intervención.

De manera paralela, y en cumplimiento de los lineamientos establecidos, se elaboró el documento de diagnóstico, siguiendo la guía metodológica diseñada por el área responsable. Dicho documento integró la información levantada durante las actividades comunitarias, así como los aspectos técnicos y sociales identificados, constituyéndose en una herramienta fundamental para orientar la planeación y ejecución de las acciones de renaturalización y reverdecimiento del parque.

Se anexan:

- Acta trazada del
- Documento diagnóstico

### 3.1.3. Parque Estructurante El Recreo

Las actividades programadas para el mes de diciembre en el Parque Estructurante El Recreo estuvieron enfocadas en el fortalecimiento del componente social del proyecto. En este contexto, se llevó a cabo una reunión virtual con el IDRD, orientada a la solicitud, verificación y recopilación de información relevante del parque, con el fin de consolidar insumos técnicos y administrativos necesarios para el proceso.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 34 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

De igual manera, se desarrolló un encuentro de articulación interinstitucional con la administración del Parque Estructurante El Recreo y el equipo de Aguas de Bogotá, con el propósito de coordinar acciones, unificar criterios de intervención y establecer canales de comunicación para el seguimiento de las actividades previstas.

Adicionalmente, se realizó una jornada de socialización dirigida a la comunidad usuaria del parque, en la cual se presentaron los objetivos de la intervención, se resolvieron inquietudes y se promovió la participación activa de los asistentes.

La ejecución de estas actividades estuvo a cargo de una profesional social y la coordinadora del Grupo 4, quienes lideraron los espacios de diálogo, articulación y participación comunitaria.

Ilustración 3. Mapa Parque Estructurante El Recreo



**Fuente:** Mapas de Bogotá

### 3.1.3.1. Actividades realizadas

Se realizaron reuniones virtuales para la solicitud de información de Parque Estructurante El Recreo con el IDRD.

#### 3.1.3.1.1. Jornada de recorrido

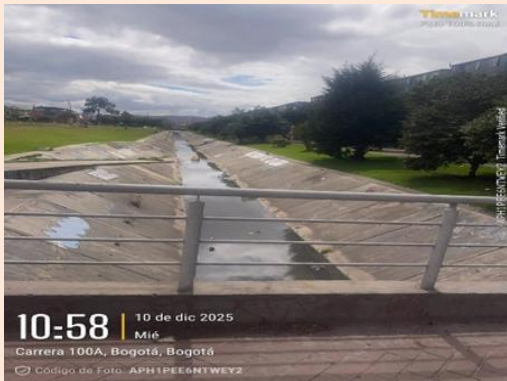
El día 10 de diciembre de 2025, la profesional social y la líder del equipo 4 realizaron un recorrido por el Parque Estructurante El Recreo, con el propósito de efectuar un primer acercamiento al espacio físico. Durante la visita se identificaron las principales problemáticas del parque y el estado de los árboles existentes, con el fin de fortalecer las nuevas plantaciones (ver Anexo 1\_Anexo 1.5. 251210\_Recorrido Parque El Recreo).

Asimismo, se planteó como estrategia comprometer a las instituciones educativas y a la comunidad para mantener el proceso de reverdecimiento que se implementará, promoviendo la sensibilización de los actores involucrados.

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 35 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Aunque en esta actividad no participaron actores comunitarios, sí se identificaron entidades cercanas que podrán ser focalizadas durante el mapeo de actores.

Tabla 25. Registro fotográfico actividades realizadas en el Parque El Recreo

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                   |                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Identificación de puntos críticos |   | Identificación de puntos críticos |
|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                   |
|  | Identificación de puntos críticos |  | Identificación de puntos críticos |
|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                   |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

### 3.1.3.1.2. Jornada de socialización con actores vecinales

El día 26 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de socialización del proyecto de Renaturalización y Reverdecimiento, así como de las actividades programadas a futuro, dirigida a los usuarios y transeúntes del parque. Durante esta actividad se realizó un acercamiento directo con la comunidad presente en el espacio, permitiendo informar sobre los objetivos del proyecto y promover la participación ciudadana en las acciones ambientales a desarrollar (ver Anexo 1\_Anexo 1.12. 251226\_Socialización Parque El Recreo).

En el marco de la socialización, se logró identificar la participación de diversos actores comunitarios, entre los cuales se destacan usuarios recurrentes de los espacios deportivos y

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 36 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

recreativos del parque, residentes de conjuntos residenciales aledaños, cuidadores y acompañantes de población infantil y adulta mayor, comerciantes informales del sector y transeúntes habituales. Asimismo, se evidenció interés por parte de líderes comunitarios y vecinos del entorno, quienes manifestaron su disposición para vincularse a futuras actividades.

Como resultado de la jornada, se evidenció un interés generalizado de la comunidad frente a las acciones de renaturalización y reverdecimiento, particularmente en actividades como jornadas de plantación, mantenimiento de zonas verdes, educación ambiental y manejo adecuado de residuos sólidos. Adicionalmente, se identificó una alta expectativa respecto al desarrollo de estrategias ambientales que contribuyan a mitigar las problemáticas socioambientales del sector, tales como la acumulación inadecuada de residuos, el deterioro de áreas verdes y la falta de apropiación del espacio público.

Los actores identificados durante esta actividad constituyen un insumo relevante para el mapeo de actores, permitiendo orientar futuras acciones de convocatoria, focalización comunitaria y fortalecimiento de procesos de participación y corresponsabilidad en el cuidado del parque. En este sentido se proyecta dar continuidad al proceso mediante la implementación de estrategias, de educación ambiental, la vinculación activa de los actores identificados y la generación de espacios de participación permanente. Así mismo se resalta la importancia de la articulación interinstitucional como un factor clave para garantizar la sostenibilidad de las acciones y el acompañamiento continuo a la comunidad.

Tabla 26. Registro fotográfico jornada de recorrido e identificación de actores

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| Socialización del Proyecto 3799- 2025                                               |  | Socialización del Proyecto 3799- 2025                                                |  |
|  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 37 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Identificación de espacios y actores relevantes del Territorio | Identificación de espacios y actores relevantes del Territorio |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 27. Actores comunitarios Parque Estructurante El Recreo

| ÍTEM | NOMBRE Y APELLIDOS   | No. DOCUMENTO | BARRIO    | ORGANIZACIÓN |
|------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| 1    | Gloria Toro          | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 2    | Ferney Gómez         | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 3    | Fraiy Fernández      | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 4    | Dayan Camacho Vargas | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 5    | Yaneth Vargas        | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 6    | Daniel Camacho       | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 7    | Sandra Rojas         | N/A           | El Recreo | deporte      |
| 8    | Mirian Echeverría    | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 9    | Margarita Gómez      | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 10   | Pedro Araque         | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 11   | Ángel Vidal          | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 12   | Jesica Ruiz López    | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 13   | Angelica Ruiz López  | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 14   | Andrés Boady         | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 15   | Claudia Gallego      | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 16   | Andrés Malaver       | N/A           | El Recreo | Comunidad    |
| 17   | Luz Moreno           | N/A           | El Recreo | Comunidad    |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Se anexan:

- Reunión con la administración del Parque Estructurante El Recreo y el equipo de Aguas de Bogotá.
- Socialización con comunidad del Parque Estructurante El Recreo.
- Consolidación del documento de avance del diagnóstico del parque.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 38 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

##### 4.1. INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.

Ver Anexo 4 Documentación SST (Listados de capacitación, entrega de EPP y dotación).

###### 4.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

###### 4.1.1.1. Control de los peligros y riesgos

La actividad de renaturalización y reverdecimiento que se lleva a cabo en este proyecto se clasifica con un nivel 3 de riesgo, catalogada como riesgo medio. Con base en esto se implementaron estrategias para identificar las fuentes de daño “peligros” y evaluar su probabilidad e impacto “riesgos”. Esto con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

El control de peligros y riesgos son pilares fundamentales dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST, como resultado para cumplir con los objetivos, estas medidas de seguridad se deben tomar de manera conjunta reconociendo todas las fuentes de peligro en el lugar de trabajo y su potencial para causar daño. Es por esto que se articulan todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo diario de las actividades.

Por parte del profesional de SST del proyecto desde su rol se hace necesario comprender las problemáticas que se encuentren en el desarrollo del mismo. Mediante la actividad de acompañamiento se identificaron las diferentes actividades realizadas por los operarios, la coordinación, el componente social y demás cargos, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad en el desarrollo de las labores durante la jornada, generando intervenciones que prevengan situaciones que afecten a los trabajadores.

A su vez se verificó el cumplimiento en el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal - EPP, así como el desarrollo seguro de las actividades operativas y de supervisión, con el propósito de valorar los riesgos y establecer los requisitos necesarios para mantener cada actividad bajo control. Por último, se ejecutaron medidas correctivas y preventivas para la prevención y control de peligros y riesgos que tengan potencial de causar accidentes de trabajo o enfermedades laborales durante el desarrollo del proyecto.

A continuación, se encuentra el registro fotográfico de algunas actividades realizadas por los operarios de mantenimiento (nivel 1) en el marco del proyecto de renaturalización y reverdecimiento 3799-2025.

Tabla 28. Registro fotográfico actividades realizadas por los operarios

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 39 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Actividad de acopio y disposición de Residuos de Construcción y Demolición - RCD's (tierra de relleno)<br/>Esta actividad consiste en recolectar los RCD's resultante del ahoyado y trasladarlo a un punto de acopio para su futura disposición final.</p> | <p>Actividad de riego de material vegetal nativo.<br/>Esta actividad consiste en el riego manual de agua para el material vegetal (plantas nativas de Bogotá).</p>                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| <p>Actividad de recolección de RCD's (tierra de relleno) Esta actividad consiste en la recolección de los escombros resultantes del ahoyado.</p>                                                                                                              | <p>Actividad de acopio y disposición de RCD's (tierra de relleno)<br/>Esta actividad consiste en recolectar el escombros resultante del ahoyado y trasladarlo a un punto de acopio para su futura disposición final.</p> |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Para dar cumplimiento con todo lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

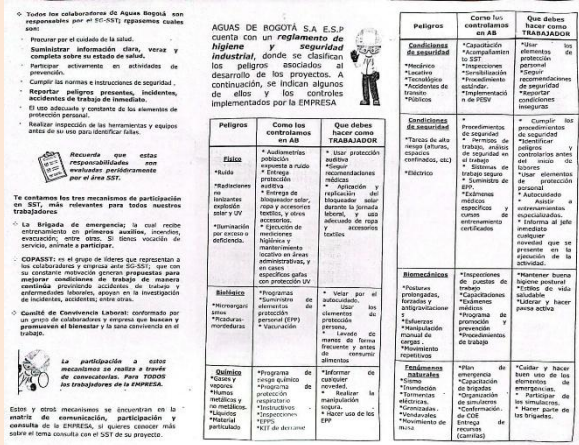
#### 4.1.1.2. Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo – SST

Las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST son componentes esenciales para la construcción de una cultura en seguridad enfocada en la reducción de accidentes y enfermedades laborales, es por esto que es de suma importancia transmitir estos conceptos teóricos y prácticos, para así lograr alinear todo el equipo de trabajo y generar una cultura de autocuidado y cumplimiento normativo.

Para esto se debe concientizar a cada trabajador del Grupo 4 Renaturalización y Reverdecimiento, resaltando que su seguridad depende de sus actos y condiciones inseguras, por eso mismo es necesario que cada trabajador sea consciente y responsable de la toma de decisiones y de sus acciones en el momento de desarrollar sus actividades laborales diarias.

A continuación, se presenta el listado de capacitaciones y socializaciones de SST realizadas durante el mes de diciembre (ver Anexo 4. Documentación SST).

Tabla 29. Capacitaciones de SST

| TEMA PRINCIPAL DE LA CAPACITACIÓN DE SST                                            |  | SUBTEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | <p>De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, el equipo de trabajo de SST de Aguas de Bogotá S.A ofrece a todo el personal del proyecto la inducción presencial en Seguridad y Salud en el Trabajo donde se exponen los aspectos generales y específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo esto incluye la identificación y control de peligros y riesgos en su medio de trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</p> <p>Los temas contemplados dentro de la inducción son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema general de seguridad social.</li> <li>2. Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST.</li> <li>3. Políticas y Objetivos del SGSST.</li> <li>4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.</li> <li>5. Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y del empleador.</li> <li>6. Conceptos de peligro, riesgo.</li> <li>7. Accidente de trabajo.</li> <li>8. Enfermedad laboral.</li> <li>9. Factores de riesgo.</li> <li>10. Medicina preventiva y del trabajo.</li> <li>11. EPP</li> <li>12. COPASST</li> <li>13. Comité de Convivencia Laboral</li> </ol> |
|  |  | <p>A continuación, se relacionan las fechas en la que ingreso personal al proyecto:</p> <p>El día 2/12/2025 ingresan las siguientes personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delgado Gutiérrez Enna – Profesional especializado (líder del proyecto)</li> <li>• Hernández Bocanegra Diego Alejandro - Profesional ingeniero civil</li> <li>• Vargas caro juan Sebastián - Profesional arquitecto</li> <li>• Diaz Daza Nidia Esther - Profesional social</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | <p>El día 09/12/2025 ingreso al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Molina Cardona Angie Laura - profesional social</li> </ul> <p>El día 09/12/2025 ingreso al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicente Adelis Pineda Calderón - operario nivel 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ</b><br>S.A. ESP | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 41 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TEMA PRINCIPAL DE LA CAPACITACIÓN DE SST | SUBTEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | (mantenimiento) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oscar Aníbal Rodríguez operario nivel 1 (mantenimiento)</li> <li>• Jesús Miguel Narváez Vega operario nivel 1 (mantenimiento)</li> <li>• Diana patricia Roa Ramírez - "profesional especializado (administrativo y financiero)"</li> <li>• Oscar Alexander Peñaloza Mancilla - profesional SST</li> <li>• Dago Leonardo Ávila Soler - operario nivel 1 (mantenimiento)</li> </ul> |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 30. Socialización consumo de SPA y alcohol

| TEMA PRINCIPAL DE LA CAPACITACIÓN DE SST                                           | SUBTEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Socialización sobre consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol</b></p> <p>Como una de las políticas principales de Aguas de Bogotá S.A, se destaca la Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas - SPA que busca la reducción de daños y el mantenimiento de espacios seguros por consumo de drogas y alcohol, se determinan diferentes lineamientos para prevenir la integridad física y mental de los trabajadores, por ello que se emprenden acciones de control, tanto en el consumo de SPA, alcohol y tabaco.</p> <p>En la socialización se integró medidas educativas y disciplinarias, con la finalidad de proteger la salud mental y física de todos los trabajadores del Grupo de Renaturalización y Reverdecimiento.</p> <p>Los temas contemplados dentro de la inducción fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prohibiciones y sanciones</li> <li>2. Daños en la salud</li> <li>3. Daños sociales</li> <li>4. Problemas en el entorno laboral</li> </ol> |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 4.1.1.3. Seguimiento médico

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 42 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Para el Contrato 3799 de 2025 entre el IDRD y Aguas de Bogotá S.A Grupo 4 Renaturalización y Reverdecimiento, en el mes de diciembre no se reportan casos de seguimiento médico ni situaciones asociadas a enfermedad laboral en el personal vinculado. Durante este periodo, no se identificaron trabajadores con restricciones, recomendaciones médicas o limitaciones derivadas de su estado de salud que afectaran el desarrollo de sus actividades laborales.

#### 4.1.1.4. Gestión en salud

##### 4.1.1.4.1. Pausas activas: un compromiso con la salud y el bienestar

Con el fin de prevenir enfermedades laborales causadas por fatiga, movimientos repetitivos y actividades de uso excesivo de fuerza, en AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en el marco del desarrollo del proyecto IDRD 3799 2025 Grupo 4 Renaturalización y Reverdecimiento, se realizan diferentes ejercicios de estiramiento y movilidad con el objetivo de promover la actividad física, como hábito de vida saludable, se impulsa de manera permanente la práctica de pausas activas durante la jornada laboral como una estrategia fundamental para la protección del bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores.

Las pausas activas consisten en breves interrupciones programadas durante la jornada laboral, contribuyen a que el trabajador recupere energía, mejore el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por posturas prolongadas y movimientos repetitivos. Además, sirven para estimular la circulación sanguínea, liberar tensiones musculares, prevenir sobrecargas físicas y facilitar la recuperación de la concentración.

Su aplicación durante la jornada laboral permite que el equipo se sienta con mayor energía, tenga un momento de descanso y relajación durante actividades monótonas, asimismo generando un mejor desempeño laboral.

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, se desarrollan pausas activas, diseñadas no solo para mitigar la fatiga física, sino también para integrar el equipo de trabajo, Estas actividades incluyen estiramientos, ejercicios de movilidad y dinámicas grupales que aportan energía, motivación y cohesión entre los trabajadores. Por eso mismo se continuará fortaleciendo estas iniciativas para el cumplimiento de los lineamientos en material de seguridad y salud en el trabajo.

A continuación, se presentan algunas evidencias fotográficas de las actividades realizadas:

Tabla 31. Registro fotográfico de pausas activas realizadas durante el periodo de diciembre



**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 4.1.1.5. Elementos de protección personal (EPP)

Para dar cumplimiento con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, proteger al trabajador en la labor de sus actividades diarias y reducir los índices de accidentalidad en el trabajo es necesario garantizar la entrega y la reposición de los Elementos de Protección Personal - EPP, es por esto que para el proyecto 3799-2025 Renaturalización y Reverdecimiento mediante el proceso de identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos se lograr reconocer los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades diarias, estos elementos deben cumplir con ciertas especificaciones técnicas, normativas y de calidad. Cabe resaltar que estos EPP son entregados a disposición del trabajador sin ningún costo.

De igual forma para que se pueda cumplir con los objetivos en materia en SST es se suma importancia socializar a todo el equipo de trabajo sobre el uso adecuado, cuidado y mantenimiento de estos elementos, además de hacer el seguimiento permanente del uso obligatorio de estos durante el desarrollo de las actividades. A continuación, se relacionan los elementos entregados:

Tabla 32. Cantidad de EPP entregados por trabajador

| ELEMENTO                     | CANTIDAD |
|------------------------------|----------|
| Tapabocas Desechables (caja) | 1        |
| Guante de caucho calibre 35  | 1        |

|                                                                                                                      |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.</b> | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                                                      | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                      | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 44 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ELEMENTO                | CANTIDAD |
|-------------------------|----------|
| Tapa oídos de inserción | 1        |
| Guantes vaqueta         | 1        |

**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

La entrega de los EPP se realiza conforme a las contrataciones y vinculaciones que se efectúan al proyecto. Ver anexo 4 documentacion sst

Tabla 33. Elementos de Protección personal



**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

#### 4.1.1.6. Entrega de dotación

En cumplimiento con la normatividad vigente y con el Decreto 1072 de 2015, para el inicio del grupo 4 Renaturalización y Reverdecimiento 3799-2025, a todos los empleados adjuntos a este se le hizo entrega de su dotación, para poder dar inicio a sus actividades de manera segura.

Esta dotación se entrega acorde a las actividades que cada uno de los trabajadores debe realizar en el marco del proyecto, estas dotaciones comprenden prendas como uniformes, calzado y demás elementos necesarios para la correcta presentación e identificación del personal, estas dotaciones no deben interferir con los elementos de protección personal.

Estas dotaciones deben ser renovadas 3 veces por año según lo determina la Ley, para esto se debe dejar constancia mediante formatos de entrega de dotación los cuales deben ser diligenciados y firmados por cada uno de los trabajadores del grupo. Así mismo es necesario hacer seguimiento y control del uso adecuado de estas dotaciones asegurando el compromiso de la seguridad y bienestar del trabajador.

Tabla 34. Entrega de dotación

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 45 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

#### 4.1.1.7. Seguimiento a Indicadores De Accidentalidad

El seguimiento a indicadores de accidentalidad es crucial para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ya que con este se puede tener una visión clara y un seguimiento enfocado en medir, controlar la frecuencia y gravedad de accidentes laborales durante las labores diarias de los trabajadores, con esto se busca reflejar la disminución de los Accidentes de Trabajo, de las Enfermedades Laborales y en general en el mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal que se adjunta a este proyecto. Es por esto que la empresa Aguas de Bogotá SA ESP, en el cumplimiento del marco normativo, del Decreto 1072 de 2015 define indicadores los cuales ayudan a evaluar y controlar los índices de accidentalidad y enfermedad que se ocurran durante el desarrollo del contrato interadministrativo No. 3799 de 2025, proyecto renaturalización y reverdecimiento.

#### 4.1.1.8. Afiliaciones y Pagos del personal del Contrato Interadministrativo, al Sistema General De Seguridad Social Integral.

La empresa Aguas de Bogotá SA ESP, en el cumplimiento del marco normativo de la Ley 100 de 1991 (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones) y el Decreto Ley 1295 de 1994 (por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales) y demás disposiciones legales que tienden a garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Por ende, para dar cumplimiento a las Obligaciones del Contratista en el Anexo de especificaciones técnicas del contrato interadministrativo 3799 del 2025 entre el IDRD y Aguas de Bogotá SA ESP se efectúan los respectivos aportes a la seguridad social y parafiscales. (Ver anexo 4 documentos sst\_seguridad social).

#### 4.1.1.9. Seguimiento a la gestión realizada por el contratista mediante indicadores de SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Durante el periodo comprendido entre el 02 y el 31 de diciembre de 2025, en el contrato interadministrativo No. 3799 de 2025, Grupo 4 de renaturalización y reverdecimiento, se registró 1 Accidente de Trabajo.

En las ausencias por causa médica, en el mes de diciembre, se presentaron 2 días de incapacidad.

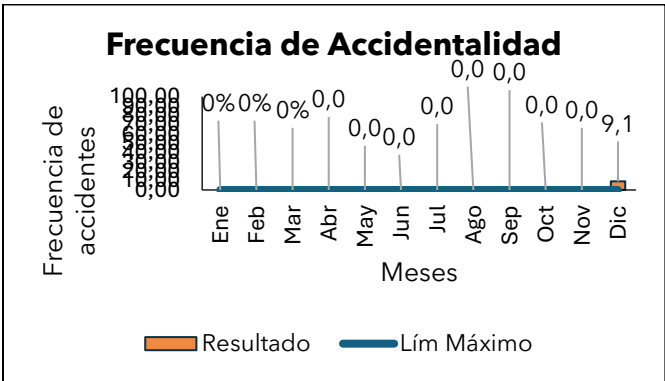
A continuación, se relacionan las tablas y los gráficos de accidentalidad acordes a los indicadores del proyecto: (ver anexo 4 documentación sst\_indicadores)

Tabla 35. Accidentalidad mes diciembre 2025

| N° ACCIDENTES |     |                 |               |                 |                 |         |       |                         |                |                       |                          |                     | INDICADORES |                       |                       |                      |                        |
|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| N°            | MES | N° TRABAJADORES | N° INCIDENTES | SIN INCAPACIDAD | CON INCAPACIDAD | FATALES | TOTAL | DÍAS INCAPACIDAD POR AT | PORCENTAJE PCL | DÍAS PERDIDOS POR PCL | DÍAS CARGADOS POR MUERTE | TOTAL DÍAS PERDIDOS | MES         | FRECUENCIA INCIDENTES | FRECUENCIA ACCIDENTES | SEVERIDAD ACCIDENTES | PROPORCIÓN AT MORTALES |
| 12            | Dic | 11              | 0             | 0               | 1               | 0       | 1     | 4                       | 0%             | 0                     | 0                        | 4                   | Dic         | 0                     | 9,09                  | 36,36                | 0                      |
| TOTAL         |     | 1               | 0             | 0               | 1               | 0       | 1     | 4                       | 0%             | 0%                    | 0                        | 4                   | TOTAL       | 0                     | 9,09                  | 36,36                | 0                      |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Ilustración 4. Indicador de frecuencia de accidentalidad

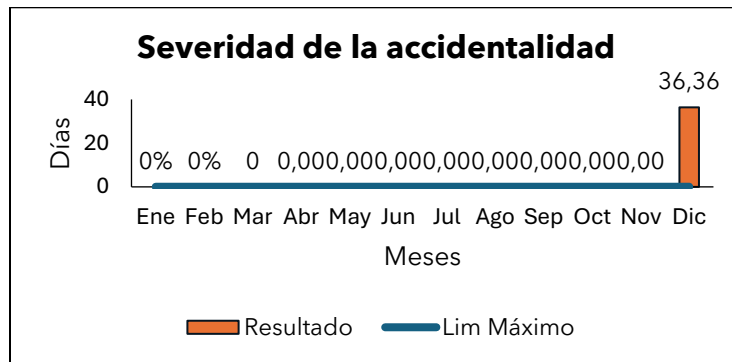


Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Como lo indica la resolución 312 de 2019 el indicador de la frecuencia de la accidentalidad se interpreta de la siguiente manera:

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 9 accidentes de trabajo.

Ilustración 5. Indicador de severidad de la accidentalidad



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Como lo indica la resolución 312 de 2019 el indicador de severidad de la accidentalidad se interpreta de la siguiente manera:

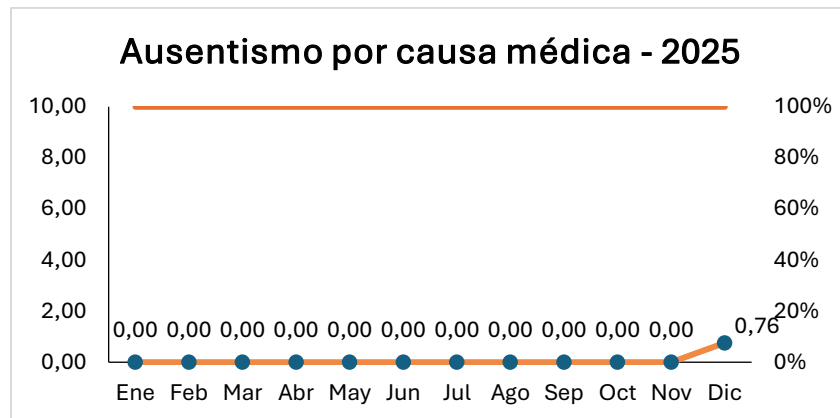
Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 36,36 días por accidente de trabajo.

Tabla 36. Ausentismo por causa medica mes diciembre 2025

| N°    | MES | DÍAS MES | N° TRABAJADORES | DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS | DÍAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD MÉDICA | RESULTADO INDICADOR DECIMAL | RESULTADO INDICADOR % | LIMITE |
|-------|-----|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 12    | Dic | 24       | 11              | 264                         | 2                                       | 0,76                        | 76%                   | 5      |
| TOTAL |     | 24       | 11              | 264                         | 2                                       | 0,76                        | 76%                   |        |

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Ilustración 6. Ausentismo por causa medica



**Fuente:** Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

De acuerdo con la Resolución 312 de 2019, el indicador de ausentismo por causa médica para el mes de diciembre fue del 0,76 %, lo que indica que menos del 1 % de los días de trabajo programados se vieron afectados por incapacidades médicas, ubicándose significativamente por debajo del límite de referencia del 5 %.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 49 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5. CONCLUSIONES

- La facturación del periodo del corte del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 de la ejecución del grupo de renaturalización y reverdecimiento en los Parques San Cristóbal Sur, Velódromo Primero de Mayo y El Recreo, correspondiente a \$ 83.475.388 M/CTE. el cual equivale al 2,46 % del avance financiero del total contratado.
- Se registró un avance técnico significativo en el componente de renaturalización y reverdecimiento, reflejado en el trazado de 147 puntos de arbolado en los parques San Cristóbal y Velódromo Primero de Mayo, equivalente al 49,15 % del total proyectado de 298 puntos para los tres parques. Adicionalmente, en el Parque San Cristóbal Sur se ejecutaron las actividades de ahoyado, perfilado y rectificación en 85 puntos definidos para la plantación.
- En el Parque Estructurante San Cristóbal Sur se ejecutaron actividades fundamentales para el avance del proyecto, incluyendo el ahoyado, perfilado y adecuación de 86 puntos de plantación, el llenado de 67 ahoyados con sustrato mejorado y la realización de la primera jornada de plantación, en la cual se establecieron 67 individuos arbóreos. Estas acciones permiten consolidar las condiciones técnicas necesarias para la siguiente fase de ejecución. Asimismo, se resalta la activa participación de la comunidad usuaria del parque, la cual contribuye al fortalecimiento de procesos de corresponsabilidad orientados al mantenimiento y sostenibilidad de las intervenciones realizadas.
- En el marco del contrato interadministrativo 3799-2025, Aguas de Bogotá SA ESP, Grupo 4 - Renaturalización y reverdecimiento, dispuso de los recursos logísticos, de personal, infraestructura, administrativo y jurídicos para dar alcance a lo solicitado por la supervisión del contrato, según las obligaciones adquiridas en el marco del contrato interadministrativo.
- Las acciones desarrolladas durante el periodo evidencian un compromiso sólido con la prevención de riesgos laborales. Las jornadas de capacitación, socialización de estadísticas y promoción de pausas activas han contribuido significativamente a fortalecer la cultura de seguridad y autocuidado entre los colaboradores.
- La implicación activa del equipo de trabajo, incluso en ausencia directa del área SST, demuestra una apropiación positiva de los hábitos seguros y un alto nivel de conciencia frente a la importancia de su bienestar físico y mental.
- Durante el mes de diciembre, en el marco del contrato vigente, se reportó un accidente laboral, al cual se le realizó la atención y seguimiento oportuno al trabajador.
- Se identificó que en el Parque Estructurante de San Cristóbal existe una amplia diversidad de actores involucrados en su desarrollo deportivo, ambiental y social, lo cual representa una fortaleza para impulsar iniciativas integrales dentro del espacio en relación con la estrategia de apropiación del componente de renaturalización y reverdecimiento.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 50 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

- La participación de múltiples actores en el Parque Estructurante de San Cristóbal puede favorecer significativamente la organización y el éxito de futuras actividades, promoviendo una mayor vinculación comunitaria y un uso sostenible del espacio.
- A pesar de no tener actividades comunitarias en el Parque Deportivo Primera de Mayo, se logró identificar que por su cercanía con el parque San Cristóbal existen muchos actores involucrados en ambos espacios deportivos, lo que supone una ventaja en términos de participación para la implementación del Plan de Gestión Social.
- A partir de los acercamientos en el Parque Estructurante El Recreo se determina que la recolección de información requerirá más esfuerzo por parte del área social, debido a las dinámicas propias del parque.
- Durante el recorrido de identificación del Parque Estructurante El Recreo se evidenció excretas de animales de compañía en el espacio público generando la percepción de la ausencia de compromiso a nivel cultura ciudadana, por lo tanto, se genera un reto para fortalecer en el proceso. Además, se evidencia la inseguridad, manejo inadecuado de los residuos, la falta de corresponsabilidad y apropiación, que al igual que la problemática expuesta al inicio será una oportunidad de mejorar para el plan de gestión social.
- En el Parque Estructurante El Recreo de Bosa hay presencia de actores vinculados a procesos deportivos, ambientales y sociales. Lo cual representa una fortaleza, para las diferentes estrategias, que facilitan el impulso a las iniciativas especialmente orientadas a la apropiación comunitaria, la naturalización del entorno y su reverdecimiento.
- El desarrollo del taller pedagógico el 19 de diciembre de 2025, en el marco de la jornada de plantación de árboles, permitió complementar la actividad práctica con un componente educativo, fortaleciendo los conocimientos y la sensibilización ambiental de las personas participantes sobre la importancia del cuidado y preservación del entorno natural.
- La participación de 27 personas en la jornada de plantación en el parque San Cristóbal, evidencia un nivel de convocatoria positivo, reflejando el interés de la comunidad por involucrarse en acciones ambientales orientadas a la recuperación y cuidado del parque San Cristóbal.
- La asistencia de 12 niñas y niños demuestra un impacto significativo en población infantil, contribuyendo a la formación temprana de conciencia ambiental y promoviendo valores de cuidado de la naturaleza desde edades tempranas.
- La participación de una persona joven indica una presencia limitada de este grupo etario, lo que sugiere la necesidad de fortalecer estrategias de convocatoria específicas para fomentar una mayor vinculación de jóvenes en futuras actividades ambientales.
- La ausencia de personas adultas y personas mayores en las actividades de plantación y riego representa un reto en la inclusión de esta población en futuras actividades.
- Por otro lado, se encuentra que la participación de 12 personas mayores en la jornada de socialización en el Parque Estructurante El Recreo en Bosa no solo da cuenta de un avance en las diferentes actividades y estrategias para la apropiación

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 51 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

local de los parques, sino que permite perfilar la población que usa en su mayoría dicho espacio.

- No se registró la participación de personas LGBTIQ+ en ninguno de los parques, lo que señala la importancia de implementar enfoques más inclusivos y estrategias de difusión que promuevan la participación diversa y equitativa en actividades comunitarias ambientales.
- La alta participación de mujeres, con un total de 22 asistentes en las actividades en el parque San Cristóbal y 10 mujeres en la jornada de socialización en el Parque Estructurante El Recreo, resalta su rol activo y protagónico en iniciativas de cuidado ambiental y trabajo comunitario, evidenciando su compromiso con la protección del territorio y los recursos naturales.
- La participación de 12 hombres (7 en la jornada de socialización del Parque Estructurante El Recreo y 5 en las actividades del parque San Cristóbal) aunque menor en comparación con la de mujeres, contribuye a la diversidad de la jornada y refleja la necesidad de incentivar una mayor participación masculina en este tipo de actividades ambientales.
- La asistencia de 2 personas pertenecientes a grupos étnicos a la jornada de plantación de árboles en el parque San Cristóbal, representa un avance en términos de inclusión y diversidad cultural, aunque también evidencia la necesidad de fortalecer la participación de comunidades étnicas en procesos ambientales comunitarios.
- Los anteriores datos presentados son contenidos en el archivo de indicadores, en el apartado de resultados, los cuales reúnen la caracterización de la población que participo en las actividades del mes de diciembre en todos los espacios de ejecución. (Ver Anexo 6).
- El componente social desarrollado en los parques San Cristóbal y El Recreo de Bosa evidencia que los parques constituyen escenarios estratégicos para la integración comunitaria, el fortalecimiento del tejido social y la apropiación del espacio público.
- Los procesos participativos realizados permitieron identificar percepciones, necesidades y usos del parque por parte de diferentes grupos poblacionales, confirmando que la planeación y la gestión del espacio público solo es sostenible cuando incorpora la voz de la comunidad.
- En ambos parques se observó que la comunidad reconoce el parque como un referente territorial y simbólico, asociado a recreación, deporte, encuentro intergeneracional y actividades culturales. Sin embargo, también se identificaron problemáticas sociales relacionadas con seguridad, mantenimiento, conflictividad por uso del espacio, manejo inadecuado de residuos y baja corresponsabilidad ciudadana, que requieren intervención articulada entre las entidades y la ciudadanía.
- El acompañamiento diario en SST, la aplicación de los controles definidos para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, el desarrollo de actividades tales como, inducción en el (SG-SST), Prevención consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, uso apropiado de elementos de protección personal y dotación entre otros, garantizan que dentro el marco del grupo de renaturalización

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |  |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 52 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

y reverdecimiento 3799 de 2025 se generen condiciones laborales seguras y un entorno de trabajo saludable, Además, de impulsar una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad compartida y el cumplimiento de la normatividad vigente.

- La aplicación de pausas activas durante la jornada laboral en el marco del grupo 4 de renaturalización y reverdecimiento 3799 de 2025 garantiza que se promueva el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, reduciendo los índices de fatiga, enfermedades laborales y contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los empleados.
- Dentro de los procesos de capacitación y acompañamiento realizados al personal se destaca el compromiso, participación y aportes por parte de los trabajadores, lo que evidencia el conocimiento de su parte en cuanto a los peligros a los que se encuentran expuestos y las medidas preventivas que se deben tomar en el desarrollo de las diferentes actividades con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 53 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 6. RECOMENDACIONES

- Fortalecer el programa Proyecto Ambiental Escolar - PRAE en los colegios cerca al parque e invitar recuperadores de oficio, para realizar estrategias de recolección de residuos y apropiación del espacio público del Parque Estructurante El Recreo de Bosa.
- Conformar equipos de trabajo permanente desde un enfoque participativo, vinculando juntas de acción comunal, colectivos ambientales, del Parque Estructurante El Recreo de Bosa.
- Continuar fortaleciendo las estrategias que aseguren la participación de todos los trabajadores del grupo de renaturalización y reverdecimiento en actividades como son inducción y reinducción, uso adecuado de los EPP, convivencia laboral, consumo de spa y alcohol, entre otros.
- Fortalecer la gestión integral de riesgos, asegurando la clara descripción de los controles y la implementación de medidas de prevención, con el fin de garantizar la efectividad y tratamiento de estos.
- Es importante tener en cuenta que los factores climáticos generan afectación en el desarrollo de las actividades, por lo que se debe contar con un espacio asignado por los administradores de los parques para resguardar las herramientas y elementos de los trabajadores del grupo 4.
- Continuar con la actualización y consolidación de los documentos diagnósticos de cada parque, asegurando que las decisiones técnicas y sociales se fundamenten en información territorial y comunitaria actualizada.
- Articular las acciones de renaturalización y reverdecimiento con procesos de educación ambiental continua, que fortalezcan la corresponsabilidad entre la institucionalidad y la ciudadanía.

|                                                                                   |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.      |                                |    |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL No. 1            | FECHA DE EMISIÓN<br>ABRIL 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | CONTRATO<br>IDRD-DG-CD-3799-2025 | Página 54 de 54                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ANEXOS

- Anexo 1. Actas
- Anexo 2. Diagnósticos de parques
- Anexo 3. Cronogramas y planes de trabajo
- Anexo 4. Documentación SST
- Anexo 5. Gestión Social
- Anexo 6. Componente técnico
- Anexo 7. Indicadores
