



7 DE ABRIL DE 2026

Conectamos
PERSONAS

INFORME AVANCES

CEFE SAN CRISTOBAL



NANCY RUIZ TOCORA

PARQUE SAN CRISTOBAL

Proyecto: Parques Inteligentes – Parque San Cristóbal

Objeto del informe: Entrega de avances de ejecución CEFE San Cristobal y novedades presentadas.

1. Martes, 24 de marzo 2026

Compra y Entrega de materiales en CEFE San Cristobal, para inicio de obra.





Listado de Materiales



NIT: 900.148.737 - 0

ELECTRICOS Y FER
TERMINALES TERMOS
CABLES Y ALAM
TORNILLOS, CHAZOS
RIEL CHANNEL, ABR
CAJAS Y COFRES PAR
CANALETAS, CORAZAS PLASTI

VENDIDO A: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O		FECHA FAC
C.C. o NIT: 860524545	ORDEN DE COMPRA:	Fecha y Hor
DIRECCION: CR 32 25 A 16	BOGOTÁ	FECHA VEN
Vendedor: COMERCIAL3		CONDICION
		TELEFONO

ITEM	CANTIDAD	REF	DESCRIPCION
1	200.00	RL38	CHAZO MULTIUSO 3/8" (RL38)
2	1.00	BR386	BROCA RANURADA 3/8*6" RA40 (BR386)
3	1.00	BR126	BROCA RANURADA 1/2*6" (BR126)
4	1.00	BR146	BROCA RANURADA 1/4*6" RA (BR146)
5	1.00	CM48100NA	CINTA MARCAR NARANJA 48MM*100MTS (CM48100NA)
6	1.00	CM48100AZ	CINTA MARCAR AZUL 48MMX 100M (CM48100AZ)



**ELECTRICOS Y
COMUNICACIONES
ALFA SAS**

NIT: 830083878-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
Resolución DDI-029334 31 OCT 2025
IVA REGIMEN COMUN

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764091277804 que habilita desde FVSC 38001
hasta FVSC 55999. Vence 2027-03-31

FACTURA ELE

FVSC

**Fecha Factu
Vencimier**

Vendido a : BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LTDA Y / NIT o C.C.: 860524545 1

Remisión:

Dirección: CARRERA 32 25A 16

Teléfono: 3153124307

Ciudad:

E-mail: contabilidad@bercont.com

Asesor Comercial : Mostrador David Sanchez

Forma d

Item	Código	Descripción	Bod	Cant	Und
1	2153437-1	Panel de 24 módulos de distribución Cat 6 /6A	Princip	2	Und.
2	2153449-2	Jack AMP-TWIST SLX , Cat 6A, Shielded 4 Pares NEGRO	Princip	48	Und.
3	884015608/10	Cable (F/UTP) Cat 6A LSZH 4 PR 23 AWG x 305 mts COMMSCOPE	Princip	6	Und.
4	AW222NXT62	Nexxt NPM-DH2UB Horizontal Duct Cable Mgmt 19" 2U	Princip	4	Und.
5	BV1URX38	Bandeja Ventilada Portaequipo 1URx38cm Fm	Princip	1	Und.
6	53449-6/2153449-4	Jack AMP-TWIST SLX , Cat 6A, Shielded 4 Pares AZUL	Princip	34	Und.
7	PC6ASZDB-BL150	Patch Cord, category 6A, S/FTP, LSZH, 1,5 m, blue	Princip	34	Und.
8	PC6ASZDB-BL002	Patch Cord, category 6A, S/FTP, LSZH, 2 m, blue	Princip	34	Und.
9	760249144	FACEPLATE KIT, LABELLED, 1 GANG, 1 PORT, PRO WHITE	Princip	34	Und.



**NACIONAL DE
ELECTRICOS**



NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA

NET 830054982-8

RESPONSABLE DE RA. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCION
NUMERO 08008 DE 31/03/2024 AGENTES RETENEDORES DE RA. SOMOS
AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RESOLUCION DE OCT/2020HS
GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA 8000TAURES, DDI-029334 DE 31-10-2025, ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TIENDA
ELECTROS DIAN AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764091277804 de
2025-08-10, AUTORIZACION CTIS 1258001 AL 12/2026
VIGENCIA 36 MESES.

TRIBUTAMOS EN BOGOTA, ESTA VENTA FUE OBTENIDA DESDE BOGOTA

Cliente: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O
BERCONT

NIT/C.C.: 860524545-1 **Ciudad:** BOGOTA

Dirección: CR 32 25 A 16

Teléfono: 3080996

Correo: contabilidad@bercont.com

Contacto:

Orden de Compra No.:

Pedido No.:

Remisión No.: 8005244

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD
1	26CPL128VA	CABLE LSZH-FR TO 7H CU PRO 3x12 BL-VRA2 Numero Lote: 193198868 Cantidad Lote: 308.90 Atributos:	PROCABLES	20491161	24.09 kg	200.00
3	44DSE1028	TACOS ENCHUF DSE 1x20A LX	LEGRAND	DSE-1030	0.78 kg	6.00
3	36T5020W	TOMALDV DOBLE CP 15A 125V BLAV	LEITON	5320W	0.04 kg	26.00
4	26CPL02	CABLE LSZH-FR TO 7H CU PRO 2 NO Numero Lote: 1932267681 Cantidad Lote: 108.90 Atributos:	PROCABLES	20491145	37.09 kg	100.00
8	74TE02	BORNA CU ESTAN-28KV 2 HS18"	CUC	300ITL1002	0.29 kg	10.00
8	74TE08	BORNA CU ESTAN-28KV 8 HS18"	CUC	300ITL1008	0.29 kg	20.00
7	53TM19	TABLERO SCH TRIF CUAL 200A 240V NTQ-18T ESP TOT	SCHNEIDER	2A000R11099	0.13 kg	1.00
8	53NG080	TACO IND E RACT 3x80A 25KA 240V	SCHNEIDER	62C-08N0800	0.60 kg	1.00
9	44DSE1030	TACOS ENCHUF DSE 1x20A LX	LEGRAND	DSE-1030	2.34 kg	18.00
10	26CP212	CABLE ENCUA PRO 600V 900 TO-FR-SR 3x12 Numero Lote: 1932219371 Cantidad Lote: 10.08 Atributos:	PROCABLES	20494434	1.69 kg	10.00


**NACIONAL DE
ELECTRICOS**

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 839954602-8

RESPONSABLE DE IVA: SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DAM RESOLUCION
 NUMERO 00293 DE 27/03/2024 AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS
 AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.018999 DE OCTUBRE 2018
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 ICA BOGOTA RES. 001-000304 DE 31-10-2025, ACTIVIDAD ECONOMICA 47021 TARIFA
 8.0X1000. DIAH. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 10704084228430 en
 2025-08-10, AUTORIZACION CTIS 100081 AL 1070800
 VIGENCIA: 24 MESES.

TRIBUTAMOS EN BOGOTA. ESTA VENTA FUE OBTENIDA DESDE BOGOTA

 Cliente: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y IO
 BERCONT

NIT/C.C.: 860524545-1 Ciudad: BOGOTA

Dirección: CR 32 20 A 10

Teléfono: 3690986

Correo: contabilidad@bercont.com

Contacto:

Orden de Compra No.:

Pedido No.:

Remisión No.: 6075244


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD
11	38P519CV	TOMA LEV AEREA C/P 15A 125V 515CV ABL	LEVITON	515-CV	1.00 kg	1.00
12	26CPL1BR	CABLE LSD+FR TC 7H CU PRC 10 RJ	PROCABLES	20486136	8.00 kg	100.00
13	26CPL1BR	CABLE LSD+FR TC 7H CU PRC 10 BL	PROCABLES	20486135	8.00 kg	100.00
14	26CPL1EV	CABLE LSD+FR TC 7H CU PRC 10 VD	PROCABLES	20486139	8.00 kg	100.00
15	26CPL13BR	CABLE LSD+FR TC 7H CU PRC 3x12 BL+VR-RJ	PROCABLES	20486172	158.00 kg	600.00
Numero Lote: 4208007281 Cantidad Lote: 908.80 Atributos:						
16	26C000	CABLE DESNUDO 7H CU 8 RSTIE	PROCABLES	20486114	9.80 kg	80.00
Numero Lote: 1021703863 Cantidad Lote: 80.08 Atributos:						
17	26AD14	ALAMBRE DESNUDO CU BLANDO 14 ROLLO	PROCABLES	20486905	2.00 kg	100.00
18	26CPL08M	CABLE LSD+FR TC 7H CU PRC 8 NO	PROCABLES	20486130	2.50 kg	25.00
Numero Lote: 1022367625 Cantidad Lote: 25.08 Atributos:						
19	74T528	BORNA CU ESTAN-35W 8 H31E"	CUC	30C1TL1028	0.02 kg	2.00


AMAYA
 Soluciones - Industriales S.A.S.
AMAYA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS
 NIT 900.104.210-2
 CL 18 13 16
 Tel: (1) 7425141 - Ext. 105
 Bogotá - Colombia

FAVOR RESPONDER A : Asesor al correo que aparece en la parte inferior

 Pagina web: www.amayasoluciones.com

Item	Descripción	Cantidad
1	CANAleta METALICA BLANCA CL 22 12X5X240 CON DIVISION Y TAPA	35.00
2	TROQUEL PLANO TRIPLE BLANCO CL 24 12CM	24.00



NIT: 900.148.737 - 0

ELECTRICOS Y FERRE
TERMINALES TERMOCENC
CABLES Y ALAMBRES
TORNILLOS, CHAZOS Y
RIEL CHANNEL, ABRAZA
CAJAS Y COPRES PARA 38
CANALETAS, CORAZAS PLASTICAS

VENDIDO A: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA

C.C. o NIT: 860524545 ORDEN DE COMPRA

DIRECCION: CR 32 25 A 16 BOGOTA

Vendedor: CESAR NIETO MEDINA

FECHA FA
FECHA VE
FECHA Y H
CONDICIO
TELEFONO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1.000.00	CHAZO SUPRA CALMAN 1/4" x 1/8" 81 TLL/81 140T (SUPRA 14)		
2	1.000.00	TLL ORYWALL 8" x 1/4" (81 140T)		
3	1.000.00	TLL PUNTA BROCA 7" x 1/8" 2IN (202TLL)		
4	250.00	CONECTOR P/DERIVACION TODO CABLE 12-18 (CODEAMAR)		
5	100.00	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO 12 AWG (CORE 12)		
6	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 1/2" AM (FT 12AM)		
7	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 1/2" AZ (FT 12AZ)		
8	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 1/2" RO (FT 12RO)		
9	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 1/2" BL (FT 12BL)		
10	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE 3/8" AM x 1.00M (FT 38AM)		
11	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 3/8" AZ (FT 38AZ)		
12	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 3/8" RO (FT 38RO)		
13	1.00	FUNDA TERMOCENCIGIBLE COLOR 3/8" BL (FT 38BL)		
14	10.00	CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS (CANE) *200-3.5%		
15	1.00	CINTA ADLER AMARILLO 20MTS (CAM) *200-3.5%		
16	1.00	CINTA ADLER AZUL 20MTS (CAZ) *200-3.5%		
17	1.00	CINTA ADLER VERDE 20MTS (CAVE) *200-3.5%		
18	1.00	CINTA ADLER ROJO 20MTS (CARO) *200-3.5%		
19	1.00	CINTA ADLER BLANCO 20MTS (CAEL) *CAJA-3.5%		
20	3.00	VELCRO DOBLE FAZ 3/4" x 25M (VDF 3425)		
21	1.00.00	TERMIN TUBULAR GRIS 12 AWG 4MM (PNT 12H)		
22	2.000.00	AMARRE PLASTICO 200MM x 45MM B (AMAB80)		
23	400.00	TLL PASANTE 6/32" x 1/2" PA (63212TLL) NCR ELL		
24	400.00	TUERCA HEX 6/32" (TH632)		
25	500.00	TUERCA HEXAGONA 3/8" (TH38)		
26	500.00	ARANDELA ZINCADA 3/8" (ARAN38)		


GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS
GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS SAS
 NIT 900.066.283-0
 CARRETERA 12 N° 36
 Tel: (051) 7470726
 Bogotá - Colombia

Este documento se emite únicamente con fines informativos y no constituye un producto, el pago de mercancía o la realización de ventas. Cualquier solicitud a través de una factura de venta electrónica.

Item	Descripción	Cantidad
1	BANDEJA MALLA 50X30X300	24.00
2	DIVISION PARA BANDEJA TIPO MALLA 1.50	47.00
3	JUEGO KIT CLEMA	210.00
4	UNION AUTOMATICA	40.00
5	RIEL CHANNEL 400 RANURADO 3 METROS	25.00
6	MARILLA ROSCADA 3/8	25.00
7	GRAPARIEL 3/4	150.00
8	GRAPARIEL 1 1/2	15.00
9	GRAPA DOBLE 1 1/2	100.00
10	PLACA BACULA TUBO	35.00
11	TUBO METALICO 1 1/4	7.00
12	UNION METALICA 1 1/4	4.00
13	TERMINAL METALICA 1 1/4	2.00
14	CURVA METALICA 1 1/4	2.00
15	TUBO METALICO 3/4	87.00
16	UNION METALICA 3/4	100.00
17	TERMINAL METALICA 3/4	44.00
18	CAJA DE INTERFERENCIA 5000 3 SALIDAS 3/4	16.00

ELECTRICOS Y COMUNICACIONES

NIT: 830083879-6 Cta. 12 No 15-82
Teléfono 57 (1) 2944488

CUENTE	BERNARDO CONTRERAS Y COMPANIA LTDA Y O BERD	FECHA DOO
MT	BOGOTÁ 1	FORMA DE
CONTACT	bernardoc@bercont.com	VENCER
DIRECCIO	CALLE RA 3E 25A 18	
CUBIAD	Bogotá D.C.	
TELEFON	(11) 2944488	

Extensión: 8r (8)

Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta

Cantidad	Código Inv.	Descripción
2.00	2153437-1	Panel de 24 módulos de distribución Cat 5 48A
1.00	21514938	Bondas Verticales Portafusos 1 Uridora 1x
4.00	AV0220K182	Acero N°10 DMS Horizontal Duct Cable Mgmt 18" 2U
6.00	8642180310	Cable (UTP) Cat 5A LSZH 4 RJ 23 AWG a 305 mts COMMERCORE
34.00	2153440-62153	Jack AMP-TWIST SLX Cat 5A Shielded 4 Pares AZUL
40.00	2153440-2	Jack AMP-TWIST SLX Cat 5A Shielded 4 Pares NEGRO
34.00	782348144	FACEPLATE KIT LABELLED, 1 GANG, 1 PORT, PRO WHITE
34.00	AP0045038-8L	Patch Cord, category 6A, SFTP, LSZH, 1.5 m. blue
34.00	AP0384520H-8L	Patch Cord, category 6A, SFTP, LSZH, 2 m. blue

2. Miércoles, 25 de marzo 2026

Inicio de trabajo en zona E-Sport

- ✓ Inicio de instalación de Canaleta en los dos salones de E-Sport, y parte de Cablofil



Novedad de Obra: La Administración del CEFE ha solicitado la suspensión inmediata de las labores programadas. El argumento técnico es que el edificio se encuentra bajo periodo de garantía, por lo cual se restringe cualquier intervención en la infraestructura. Para retomar actividades, es indispensable contar con una autorización formal emitida por la Coordinación del IDRD.

Ese mismo día se programa visita para el jueves a las 2:00 pm, el jueves 26 de marzo cancelan la visita y es reprograma para el viernes 27 de marzo a las 8 am.

3. Viernes, 27 de marzo 2026

Se realiza visita y recorrido en el parque con Oba civil, supervisión de IDRD, Arquitecta IDRD, Administrador de CEFE y Bercont/ETB

Durante el recorrido técnico realizado el viernes 27 de marzo, el equipo de obra civil

se comprometió a ejecutar las perforaciones en el muro de concreto y los pases en los salones de bloque para el lunes 30 de marzo.

4. Lunes, 30 de marzo de 2026

Instalación de Cablofil, cableado de polo a tierra

Novedad: Obra civil no alcanzo a realizar la perforación en muro de concreto y los pases en los salones de bloque.

5. Martes, 31 de marzo 2026

Este día el equipo técnico no realizo actividades ya que aun no se contaba con las perforaciones.

Obra Civil realizo los pases en los salones de bloque, quedo pendiente perforación en muro de concreto.

Novedad: Ese día se reporto hurto de material Eléctrico dentro del salón de E-Sport

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD
26CPL12BVA	CABLE LSZH-FR TC 7H CU PRC 3x12 BL- VR-AZ	20486161	200.00
26EP312	CABLE ENCAU PRC 600V 90C TC-FR- SR 3x12	20484424	10.00
26CPL12BVR	CABLE LSZH-FR TC 7H CU PRC 3x12 BL- VR-RJ	20486172	900.00
26CD06	CABLE DESNUDO 7H CU 6 RETIE	20486014	80.00
26CPL08N	CABLE LSZH-FR TC 7H CU PRC 8 NG	20486130	25.00




6. Miércoles, 01 de abril 2026

Se finaliza tarea de instalación de cablofil e instalación de tubería para Mogador 3

En la siguiente imagen, se identifica el camino con flecha en color Rojo



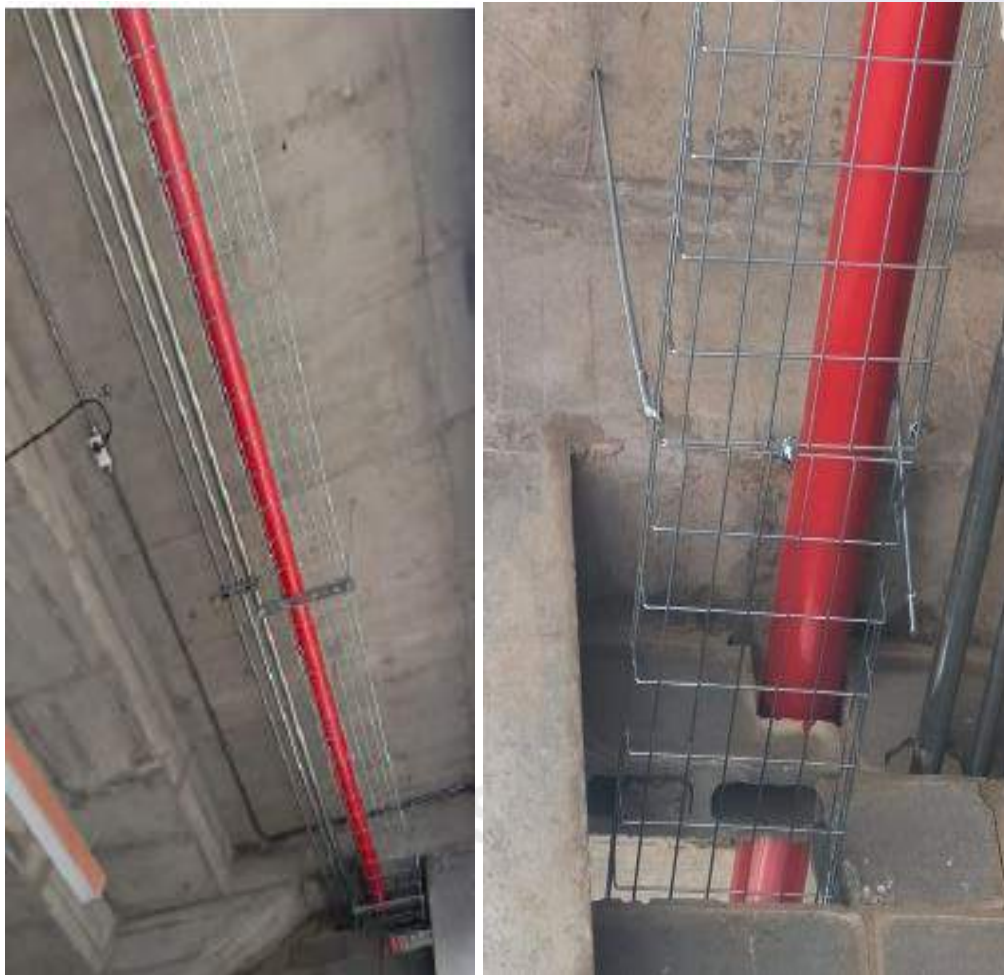





7. Lunes, 6 de abril 2026

Instalación de Cablofil en cuarto eléctrico E-Sport



Instalación de tubería para APs, instalación de tubería para Tv y cableado de UTP









