

 <p>Tierra del Alma</p> <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6</p>	<p>PÁGINA 1 DE 23</p>
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>CÓDIGO: JR-CL-FR-06</p> <p>VERSIÓN: 02</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025</p>

100.2

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO N.º 2026130					
Fecha de presentación: Mayo del año 2026					
Período del informe: MAYO AÑO 2026					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES LITRUPE S.A.S. NIT: 901.161.324 de Roldanillo (V)					
NOMBRE SUPERVISOR: HERNAN MAURICIO RAMIREZ CASTRO. CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE					
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO No: 2026130 DEL 2026 (año)					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA					
PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato en un plazo de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.					
VALOR CONTRATO: \$ 110.066.861,75					
DE INICIO: 11/03/2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 10/04/2026					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 125 Fecha 12/16/2025					
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 326 Fecha 03/06/2026					
FUENTE DE FINANCIACION: Sistema General de Regalías SGR					
MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Adiciones en Valor \$		Adiciones en %__ Fecha de la Adición: (dd/mm/aaaa)			
Prórroga al Plazo: (meses o días)		Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)			
ESTADOS FINANCIEROS					
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):					
Anticipo \$		Ejecución de Anticipo \$ _____			
Saldo por amortizar \$		Rendimientos financieros generados: \$ _____			
CONTROL DE POLIZAS					
GARANTIA	ASEGURADO RA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
INFORMACION ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO					
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas				Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y

  <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 2 DE 23
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06 VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

		CD (No. de folios archivos y/o anexos)
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA Contrato de obra No. 2026130 SAMC002DE2026 INFORME FINAL DE OBRA	<p>La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, desempeñó un papel fundamental en la ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), específicamente en el componente de desarrollo sostenible, mediante el acompañamiento técnico, ambiental y administrativo del proyecto denominado “Construcción e Instalación de Estufas Ecoeficientes Fijas para Vivienda Rural en el Municipio de Roldanillo – Valle del Cauca”, ejecutado a través del Contrato de Obra No. 2026130 – SAMC002DE2026.</p> <p>La participación de la Secretaría permitió garantizar que la ejecución del proyecto estuviera alineada con las políticas de sostenibilidad ambiental, mejoramiento de la calidad de vida rural y mitigación de impactos asociados al uso tradicional de leña en los hogares campesinos. Asimismo, se realizó seguimiento técnico al cumplimiento de las especificaciones constructivas, criterios de ecoeficiencia y adecuado uso de los recursos públicos asignados mediante el Sistema General de Regalías.</p> <p>La implementación de estufas ecoeficientes constituye una estrategia ambiental y social de alto impacto para las comunidades rurales del municipio, debido a que contribuye a la reducción del consumo de leña, disminución de emisiones contaminantes al interior de las viviendas, mitigación de la presión sobre los recursos forestales y mejoramiento de las condiciones de salud de las familias beneficiarias, especialmente en población vulnerable.</p> <p>De igual manera, el proyecto fortalece las acciones institucionales orientadas al desarrollo rural sostenible, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente y fomentando alternativas tecnológicas que permitan optimizar el aprovechamiento energético en las viviendas rurales del municipio.</p> <p>En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente reafirma su compromiso institucional en la formulación, acompañamiento y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, enfocados en la protección ambiental, el bienestar comunitario y el fortalecimiento del desarrollo sostenible en el Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.</p>	Informe de las actividades realizadas, con soporte fotográfico y planilla de seguridad social - folios 2.



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 3 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

Por medio de la empresa INVERSIONES LITRUPE S.A.S. se inició con la capacitación de los beneficiarios con los siguientes temas:

- Formas de uso de la estufa
- Manejo de los cebadores de la chimenea
- Manejo de la leña a usar y como iniciar el fogón
- Entrega de materiales a los beneficiarios
- Cronograma de construcción de las estufas ecoeficientes por las veredas y corregimientos





La

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, cumple un papel estratégico en la formulación, acompañamiento técnico, supervisión y ejecución de proyectos orientados al desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, mediante la adecuada gestión de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías y demás fuentes de financiación destinadas al fortalecimiento ambiental y rural del municipio.

El presente informe corresponde al desarrollo del Contrato de Obra No. 2026130, suscrito entre el Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, y la empresa INVERSIONES LITRUPE, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA", como parte de las estrategias institucionales diseñadas para fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal "Roldanillo, Tierra del Alma 2024-2027".

La participación de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente en la ejecución de este proyecto reviste gran importancia, debido a que permite articular acciones orientadas

  <p>Tierra del Alma</p> <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6</p>	<p>PÁGINA 4 DE 23</p>
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>CÓDIGO: JR-CL-FR-06</p> <p>VERSIÓN: 02</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025</p>

100.2

	<p>a la protección de los recursos naturales, la disminución de impactos ambientales derivados del consumo ineficiente de biomasa y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias rurales beneficiadas. Asimismo, la implementación de tecnologías ecoeficientes contribuye a reducir la presión sobre los recursos forestales, optimizar el consumo de leña y disminuir las emisiones contaminantes generadas al interior de las viviendas rurales.</p> <p>El informe presenta de manera detallada las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando el alcance de las intervenciones ejecutadas, los procedimientos técnicos implementados, los avances alcanzados y los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. Igualmente, evidencia el acompañamiento institucional realizado por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, ambientales y administrativos establecidos para este tipo de proyectos de inversión pública.</p> <p>Este documento tiene como objetivo principal demostrar el cumplimiento de las condiciones pactadas contractualmente, fortalecer los principios de transparencia y seguimiento en la ejecución de los recursos públicos, y presentar un análisis de los impactos sociales, ambientales y económicos generados mediante la implementación de estufas ecoeficientes en las zonas rurales del municipio.</p> <p>De esta manera, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente reafirma su compromiso con la promoción de proyectos sostenibles que contribuyan al bienestar de las comunidades rurales, la mitigación de los efectos del cambio climático y el fortalecimiento del desarrollo ambientalmente responsable en el Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO</p>	
--	--	--



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 5 DE 23


CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02



FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

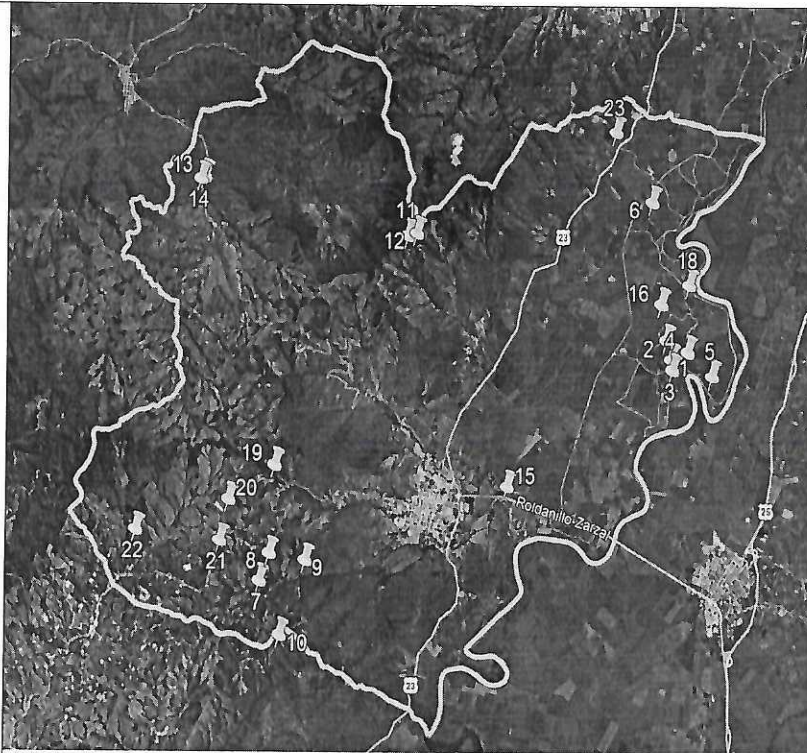100.2




Nº.	BENEFICIARIO	NORTE	ESTE
1	LINA MARIA GARCIA COSSIO	983,183.474	1,109,899.888
2	LEIDY YANET MAYOR LUGO	983,655.141	1,109,752.344
3	LUZ MARIA PLAZA GARCIA	982,923.854	1,109,947.190
4	NURY ESTELLA POSSO GARCIA	983,370.292	1,110,408.035
5	PATRICIA VARELA RUIZ	982,767.763	1,111,151.577
6	FABIOLA SUAREZ	987,161.835	1,109,282.717
7	MARIA RUBI ORTIZ SANCHEZ	977,454.030	1,097,362.424
8	MARIA EDILIA RAMOS PADILLA	978,161.836	1,097,648.824
9	HECTOR FABIO BARRETO GAMBOA	977,988.180	1,098,750.388
10	LAURA EMILIA CRUZ DE ORJUELA	978,079.386	1,097,988.319
11	ROSA MENFIS CARDONA LOZADA	986,266.621	1,101,818.724
12	SEBASTIAN HERRERA TAMAYO	986,322.557	1,102,083.427
13	ANA DOLORES HERNANDEZ	987,744.344	1,095,580.658
14	MARIA LUCIA CAMELO CASTILLO	987,887.144	1,095,466.735
15	ANA JUEL CASTAÑO	979,920.566	1,104,919.934
16	FRANCY ELENA GARCIA GARCIA	984,565.638	1,109,589.581
17	LUZ DARY DOSMAN AGUIRRE	983,129.544	1,109,931.485
18	CARLOS ALBERTO AGUADO GARCIA	985,059.489	1,110,436.505
19	ANYI LORENA CABRERA VARGAS	980,436.991	1,097,793.783
20	MILLY JOHANA GALLEGUO CIFUENTES	979,553.624	1,096,392.082
21	RENE POSSO	978,489.859	1,096,137.122
22	ANA DOLORES COLONIA	978,758.086	1,093,562.279
23	FRANCISCO ROJAS VASQUEZ	988,931.219	1,108,160.946

Ilustración 1. Localización general

  <p>Tierra del Alma</p> <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6</p>	<p>PÁGINA 6 DE 23</p>
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>CÓDIGO: JR-CL-FR-06</p> <p>VERSIÓN: 02</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025</p>

100.2

	<p>La importancia de este proyecto radica principalmente en que los beneficiarios pertenecen a las zonas rurales del Municipio de Roldanillo, donde históricamente se presentan mayores problemáticas asociadas a la deforestación de bosques nativos, debido a la extracción de madera utilizada como combustible en los fogones tradicionales de leña. Esta situación genera impactos negativos sobre los recursos forestales, la biodiversidad y las fuentes hídricas, además de contribuir al aumento de emisiones contaminantes y a los efectos del cambio climático.</p> <p>La implementación de estufas ecoeficientes fijas representa una alternativa tecnológica sostenible para las comunidades rurales, ya que estas estructuras permiten una reducción aproximada del 50% en el consumo de leña en comparación con los sistemas tradicionales, disminuyendo significativamente la presión sobre los ecosistemas boscosos del municipio. Asimismo, contribuyen al fortalecimiento de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático promovidas por la administración municipal y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.</p> <p>De igual manera, las estufas ecoeficientes generan beneficios directos en la salud de las familias beneficiarias, debido a que reducen la exposición al humo y material particulado producido por la combustión tradicional dentro de las viviendas, mejorando la calidad del aire intradomiciliario y disminuyendo el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y mujeres rurales.</p> <p>Las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato se enmarcan en las siguientes características técnicas generales, de acuerdo con especificaciones del proyecto y las orientaciones de la supervisión: El contrato No. 2026130, suscrito entre el Municipio de Roldanillo y la empresa INVERSIONES LITRUPE, tiene como objeto la construcción de veintitrés (23) estufas ecoeficientes en viviendas dispersas de la zona rural del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, como una medida de fortalecimiento de las estrategias de adaptación al cambio climático.</p> <p>Alcance Técnico El alcance del contrato incluye las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localización y replanteo del sitio de instalación: Se realizó un análisis previo de las condiciones de los espacios donde se construirían las estufas, asegurando que cumplieran con los requisitos técnicos establecidos. • Preparación del área de trabajo: Nivelación y adecuación de la base para garantizar un soporte firme y uniforme para cada estufa. 	
--	--	--

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	 Tierra del Alma	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 7 DE 23
		INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06 VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

- Construcción de las estufas ecoeficientes: Elaboradas con materiales de alta calidad, incluyendo ladrillo refractario para los componentes que estarán en contacto con altas temperaturas, y chimeneas de lámina galvanizada para asegurar una adecuada ventilación.
- Suministro e instalación del kit de herrajes: Incorporación de componentes metálicos necesarios para el funcionamiento eficiente de las estufas.
- Capacitación a los beneficiarios: Realización de talleres para garantizar el uso correcto, mantenimiento adecuado y prolongación de la vida útil de las estufas.

Especificaciones Técnicas

Las estufas ecoeficientes construidas cumplen con las siguientes especificaciones técnicas:

- Dimensiones: Longitud de 1.05 metros, ancho de 0.73 metros, y altura de 0.83 metros. Las anteriores medidas con una aproximación a la realidad ya que debido a diferentes factores pueden variar en lo más mínimo.

Materiales utilizados: Ladrillo refractario: Resistente a temperaturas de hasta 1400°C, utilizado en las zonas expuestas al calor directo.

Ladrillo farol: Para los muros exteriores, garantizando durabilidad y estabilidad estructural.

Chimenea de lámina galvanizada: Calibre 18, con dos codos y tapa gorro (Ø: 12 cm x 260 cm).

Herrajes metálicos: Marcos y puertas fabricados en lámina metálica, con sistema de cierre tipo gancho y bisagras de alta resistencia.

- Base de instalación: Superficie nivelada y rígida, construida en concreto o baldosín.

Objetivos Técnicos

Las características técnicas fueron diseñadas para cumplir con los siguientes objetivos:

- Reducción del consumo de leña: Mejorando la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental.
- Disminución de emisiones contaminantes: Mitigando riesgos a la salud derivados de la exposición a humos tóxicos.
- Mejoramiento de las condiciones de cocción: Proporcionando una solución más segura, eficiente y amigable con el medio ambiente.

El cumplimiento de estas características técnicas garantiza que las estufas ecoeficientes cumplan con su propósito de mejorar



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 8 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias, promoviendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental.

Características administrativas

NÚMERO DEL CONTRATO: 2026130
OBJETO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: INVERSIONES LITRUPE SAS.
REPRESENTANTE LEGAL: SONIA YISELA MONSALVE
FECHA DE CONTRATO: 06 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DIAS
VALOR INICIAL: \$ 110.228.006

Aspectos Logísticos



La implementación del proyecto para la construcción de estufas ecoeficientes en viviendas rurales dispersas en Roldanillo, Valle del Cauca, demandó una planificación y ejecución logística detallada, con el objetivo de garantizar la eficiencia en las actividades y maximizar los beneficios para las comunidades beneficiarias. A continuación, se destacan los principales aspectos logísticos:

Transporte y Suministro de Materiales

- **Abastecimiento de materiales:** Se adquirieron insumos de alta calidad, como ladrillos refractarios, ladrillos farol, chimeneas de lámina galvanizada y kits de herrajes, de proveedores certificados para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las estufas.



- **Transporte:** Los materiales fueron trasladados desde los puntos de distribución hasta las viviendas beneficiarias, tomando en cuenta las características geográficas y las condiciones de acceso de las zonas rurales. Esto incluyó el uso de vehículos adaptados para terrenos difíciles.
- **Almacenamiento temporal:** Se establecieron puntos estratégicos para el almacenamiento provisional, garantizando la protección de los materiales contra daños climáticos y físicos.

  Tierra del Alma Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 9 DE 23
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06
		VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

	<p>Coordinación con los Beneficiarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación y participación: Se trabajó en estrecha colaboración con las familias beneficiarias para coordinar las fechas de intervención y asegurar que las áreas estuvieran listas para la construcción. • Preparación del terreno: Cuando fue necesario, los beneficiarios, bajo supervisión técnica, realizaron ajustes en los espacios destinados a la instalación de las estufas, asegurando superficies niveladas y adecuadas. <p>Equipo y Organización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal especializado: El proyecto fue ejecutado por un equipo técnico compuesto por maestros de obra experimentados, auxiliares de construcción y un supervisor técnico, quienes se aseguraron de seguir los lineamientos establecidos. • Capacitación: Antes del inicio de las actividades, se realizaron sesiones de inducción para el personal, enfocadas en las especificaciones técnicas y las prácticas seguras de trabajo. <p>Gestión del Tiempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fases organizadas: El proyecto se dividió en etapas que incluyeron la localización y replanteo, la preparación de los espacios, la construcción y el taller de capacitación para los beneficiarios. • Seguimiento del cronograma: Se llevaron a cabo revisiones constantes para garantizar que cada etapa avanzara según lo programado, minimizando retrasos. <p>Supervisión y Control de Calidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo: La supervisión se realizó de manera continua, con visitas periódicas a los sitios de trabajo para verificar el cumplimiento de los estándares técnicos. • Evidencia documental: Se elaboraron registros fotográficos y actas de avance que respaldan el cumplimiento de los hitos del proyecto. <p>La planificación y ejecución de estos aspectos logísticos no solo garantizaron la eficiencia del proyecto, sino que también fortalecieron la relación con las comunidades beneficiarias, asegurando la sostenibilidad y el impacto positivo de las estufas ecoeficientes.</p> <p>4.3 Revisión de Cantidades</p>	
--	--	--



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 10 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

En conjunto con el Supervisor, se realizó la revisión de la obra y sus respectivas cantidades. Las cantidades se soportan al final del contrato con planos récord y memorias de cantidades.

Pólizas.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 22,045,601.20	6	3	26	6	8	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 55,114,063.00	6	3	26	6	12	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	\$ 33,068,401.80	6	3	26	6	8	29
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	30%	\$ 33,068,401.80	6	3	26	6	4	31

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 60-44-101017784

Certificado de modificación o anexo No.: 1

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26
Veículos propios y no propios	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26
Responsabilidad civil patronal	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	\$ 350,181,000	6	3	26	6	8	26

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 60-40-101008286 OTRAS PÓLIZAS No. N.A

Certificado de modificación o anexo No.: 1



Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Ilustración 2. Relación de póliza de cumplimiento y RCE

INFORME CONTRATO DE OBRA.



El proyecto consiste en la construcción e instalación de veintitrés (23) estufas ecoeficientes en viviendas dispersas de la zona rural del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Estas estufas están diseñadas para optimizar el uso de recursos energéticos, reducir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias.

La iniciativa forma parte del programa "Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima", contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal "Roldanillo, Tierra del Alma 2024-2027". Además, está alineada con los objetivos del Plan Anual de Adquisiciones 2026.

  Tierra del Alma Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 11 DE 23
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06 VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025



100.2

	<p>Finalidad del Proyecto El proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las familias rurales a través de la implementación de tecnologías de cocción más eficientes y sostenibles, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo el desarrollo social en las zonas más vulnerables del municipio.</p> <p>Objetivos</p> <p>Objetivo General</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático mediante la instalación de estufas ecoeficientes que optimicen el uso de recursos energéticos en las viviendas rurales de Roldanillo. <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducir el consumo de leña por hogar, disminuyendo la presión sobre los recursos forestales locales. • Disminuir las emisiones de gases contaminantes y partículas dañinas generadas por los fogones tradicionales, mejorando así la salud de las familias beneficiarias. • Proporcionar a las comunidades una solución tecnológica accesible, eficiente y adaptada a sus necesidades. • Incrementar la conciencia de la población sobre los impactos negativos del uso de tecnologías ineficientes y fomentar prácticas sostenibles de cocción. • Promover la transferencia de conocimiento mediante talleres que capaciten a los beneficiarios en el uso, mantenimiento y conservación de las estufas ecoeficientes. <p>Beneficios del Proyecto</p> <p>Este proyecto trae consigo una serie de beneficios sociales, ambientales y económicos, entre los que se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociales: Reducción de enfermedades respiratorias causadas por la exposición al humo, disminución de la carga física relacionada con la recolección de leña y mejora de las condiciones de seguridad en el hogar. • Ambientales: Conservación de los recursos forestales, disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribución a la mitigación del cambio climático. • Económicos: Ahorro en la compra de leña y en costos asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en interiores. 	
--	--	--

  Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 12 DE 23
		CÓDIGO: JR-CL-FR-06
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

	<p>El enfoque integral de este proyecto asegura un impacto positivo y duradero para las familias beneficiarias, alineándose con las metas de desarrollo sostenible y los compromisos ambientales del municipio.</p> <p>Localización del proyecto. El proyecto se desarrolla en la zona rural del municipio de Roldanillo Valle del Cauca, en las siguientes veredas o corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corregimiento de El Retiro. • Vereda Mateguadua. • Corregimiento de Cajamarca. • Corregimiento de Tierra Blanca • Vereda de Cascarillo • Corregimiento Puerto Quintero • Corregimiento de Candelaria • Corregimiento de Higuaroncito • Corregimiento de Buenavista. <p>Características técnicas, administrativas y financieras del proyecto.</p> <p>El proyecto tiene como eje central la construcción de estufas ecoeficientes, diseñadas para reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. Las principales características técnicas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de las estufas: Cada estufa cuenta con una longitud de 1.05 metros, un ancho de 0.73 metros y una altura de 0.83 metros. <p>Materiales utilizados: Ladrillo refractario: Resistente a altas temperaturas, utilizado en las áreas de mayor exposición al calor.</p> <p>Ladrillo farol: Usado en la estructura exterior para garantizar durabilidad.</p> <p>Chimenea de lámina galvanizada: Calibre 18, diseñada para asegurar la evacuación eficiente del humo.</p> <p>Herrajes metálicos: Incluyen puertas, marcos y accesorios de alta resistencia.</p> <p>Base de instalación: Preparación de una superficie nivelada y rígida en concreto o baldosín.</p> <p>Capacitación técnica: Talleres dirigidos a los beneficiarios para el uso, mantenimiento y conservación de las estufas.</p> <p>Características Administrativas</p> <p>La gestión del proyecto se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y bajo un esquema administrativo que garantizó el</p>	
--	---	--

  <p>Tierra del Alma</p> <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6</p>	PÁGINA 13 DE 23
		CÓDIGO: JR-CL-FR-06
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

	<p>cumplimiento de los objetivos. Los aspectos administrativos más destacados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entidad contratante: Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente (SEDAMA). Modalidad de contratación: Menor cuantía, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Supervisión: Delegada al Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, responsable de verificar el cumplimiento de las actividades y la calidad de los resultados. Obligaciones contractuales: El contratista asumió la ejecución de todas las actividades especificadas en los estudios previos, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y los plazos establecidos. <p>Características Financieras</p> <p>El componente financiero del proyecto estuvo alineado con el presupuesto aprobado y las políticas de contratación pública. Los principales aspectos financieros son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presupuesto asignado: \$110.228.006 que incluye todos los costos directos, indirectos, imprevistos y utilidades. <p>Ejecución presupuestal: Los recursos fueron distribuidos de la siguiente manera: Costos directos: Materiales, mano de obra y transporte. Costos indirectos: Administración, imprevistos y utilidades (AIU).</p> <p>Forma de pago: 1) Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato, a la aprobación de la Garantía Única, 2) El otro 50% una vez verificado el cumplimiento del 100% de las actividades acordadas, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato</p> <p>Garantías financieras: El contratista constituyó las siguientes garantías:</p> <p>Cumplimiento: 20% del valor del contrato. Buen manejo del anticipo: 100% del valor entregado Pago de salarios y prestaciones sociales: 30% del valor total. Estabilidad y calidad de la obra: 30% del valor del contrato. Responsabilidad civil extracontractual: Cobertura mínima de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>Estas características técnicas, administrativas y financieras reflejan un enfoque integral para garantizar la ejecución efectiva del proyecto, maximizando los beneficios sociales y ambientales, y cumpliendo con los estándares de transparencia y eficiencia.</p>	
--	---	--



Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 14 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06


INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

Cronograma

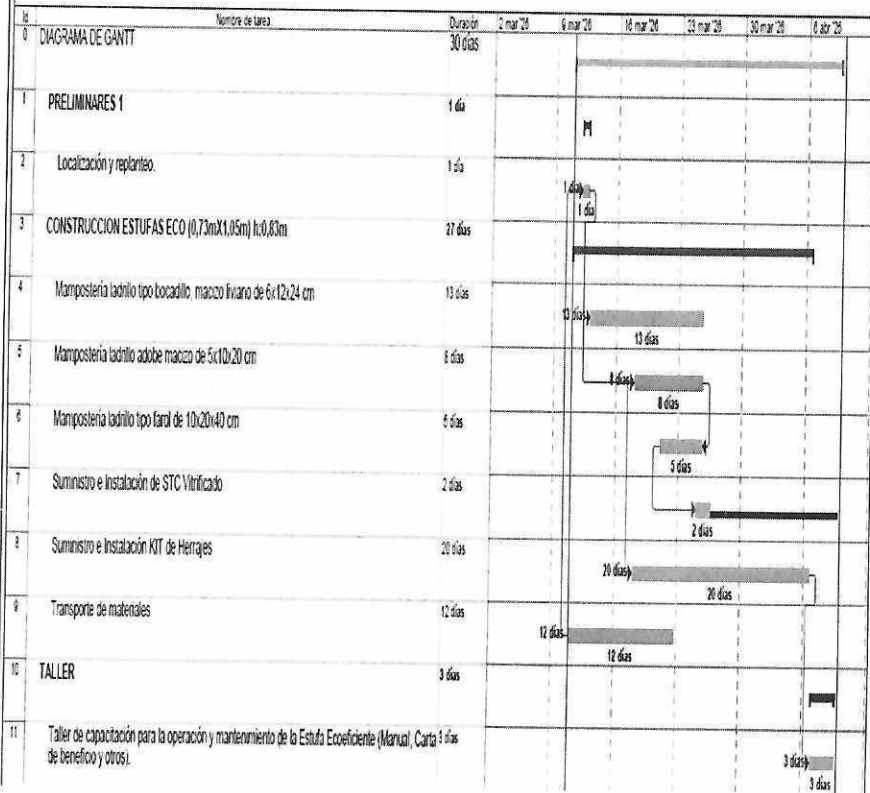

5.3 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
VR. CONTRATO	110.228.006	
ADICIONES	0	
VALOR TOTAL	110.228.006	
ANTICIPO		0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		0
ACTA PARCIAL 1		0
PRESENTE ACTA		110.066.862
TOTAL EJECUTADO		110.066.862
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		1.996
SUMAS IGUALES	110.228.006	110.228.006

5.4 Control de aportes legales y seguridad social del contrato

Para el contrato de obra se anexa el soporte de los aportes y pago de planilla de seguridad social.

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 15 DE 23
		CÓDIGO: JR-CL-FR-06
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

Seguimiento a la inversión del anticipo.

El contrato no tuvo anticipo.

Seguimiento a programas sociales.


Durante la gestión social se realizan varias actividades, las cuales se describen a continuación:

Empleos formales generados en la ejecución de la obra: durante la ejecución de la obra se generó empleo para lo cual fue necesario contratar mano de obra no calificada, así mismo durante la ejecución de este tipo de obras se necesita personal con cierta capacidad de entendimiento por lo que también se contrató personal con estas características.

Seguimiento a programas de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución de la obra se garantizó que cada una de las personas que laboran en la obra contaran con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, asegurándose que tuvieran al día la afiliación al sistema de seguridad social, ARL y que contaran con los elementos de protección personal como: casco, guantes, botas, chalecos, etc.

FOTOS DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DE LA ENTREGA DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS CONSTRUIDAS

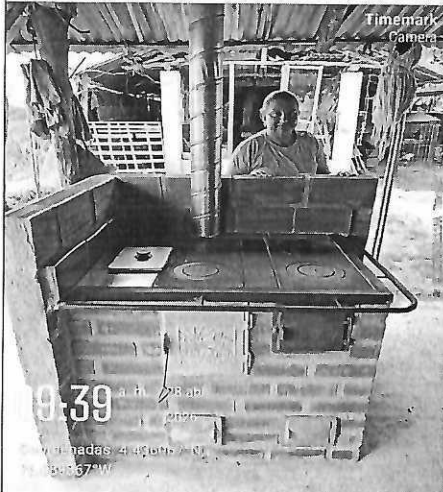



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 16 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2





Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 17 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2





Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 18 DE 23


CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

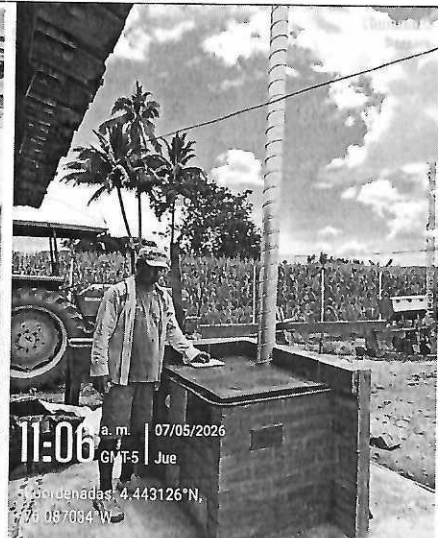



Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 19 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2



Durante el proceso de entrega a cada beneficiario se realizaron las actas de entrega para la cual se hacen firmar por cada usuario y supervisor del contrato, se agrega a este informe de supervisión para evidenciar de qué manera se realizó, pero se adjuntas todas completas las 23 actas de entrega en el informe de la empresa

INVERSIONES LITRUPE S.A.S.



Tierra del Alma

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 20 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2

ACTA DE ENTREGA ESTUFAS ECOEFICIENTES



ACTA Y RECIBIDO A
SATISFACCIÓN DE
ESTUFAS
ECOEFICIENTES

MES ABRIL
AÑO 2026

NOMBRE BENEFICIARIO

MARIA RUBY
ORTIZ SANCHEZ

MUNICIPIO Roldanillo

DEPARTAMENTO Valle del Cauca

NOMBRE DEL PREDIO _____

No. de documento 41891278

Siendo el día 10 del mes de Abril del 2026, se hicieron presentes en _____ para suscribir la presente acta con los involucrados aquí descritos de acuerdo con los cargos/roles operados en el desarrollo del proyecto "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE _____".

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

Contratista	NIT
<u>Inversiones Litpe S.A.S</u>	<u>901161324</u>
Supervisor	No. de documento
<u>Mauricio Ramirez</u>	
Técnico Operativo:	



Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PÁGINA 21 DE 23

CÓDIGO: JR-CL-FR-06

INFORME DE SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO


VERSIÓN: 02

FECHA DE EMISIÓN:
18/11/2025

100.2



ACTA DE ENTREGA ESTUFAS ECOEFICIENTES

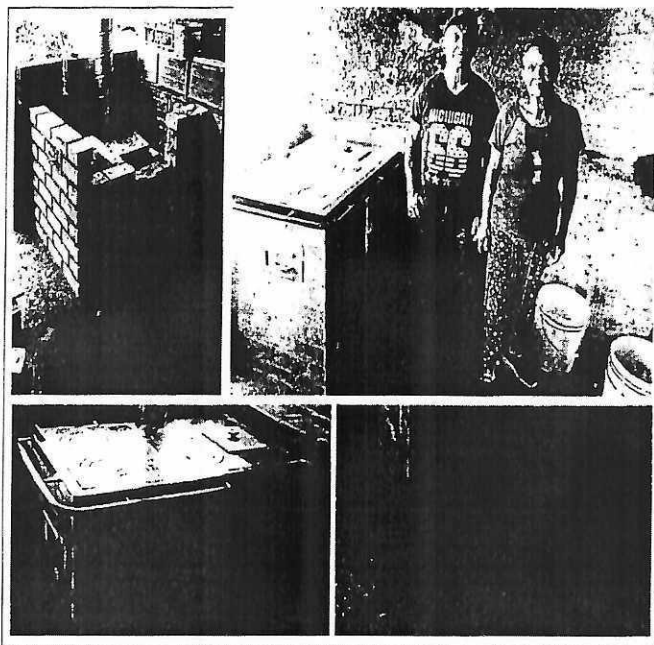EVIDENCIA



En consecuencia, recibe a satisfacción como se deja en constancia con su firma y número de identificación, el (la) señor (a) Mara Ruby Ortiz Sanchez identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 41891278 o su delegado asignado mediante comunicación escrita en calidad de **BENEFICIARIO**.

La operación mantenimiento y buen uso del bien entregado y recibido a satisfacción será responsabilidad del usuario beneficiado.

  Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 22 DE 23
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06 VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

AUTORIZACION DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, a veinte ocho (28) días del mes de MAYO del año 2026, se reunieron en las oficinas de SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. Esp, HERÁN MAURICIO RAMIREZ CASTRO, quien para el contrato en mención fue designado como supervisor y el (la) señor (a) INVERSIONES LITRUPE S.A.S. Con el **NIT: 901.161.324-1** de Roldanillo (V), para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial N° 01 final de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$110.066.861,75) MCTE, equivalente a un 100 % del total del contrato, para una ejecución acumulada del 100 %, quedando por ejecutar un 0 % del total del contrato.

FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato será de CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$110.066.861,75) M.CTE., los cuales serán cancelados así: 1) Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato, a la aprobación de la Garantía Única, 2) El otro 50% una vez verificado el cumplimiento del 100% de las actividades acordadas, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.

Se hará el pago con un solo pago FINAL por valor de \$110.066.861.75

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA



CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 110.066.861,75		30/11/2026	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 110.066.861,75	\$ 110.066.861,75		
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES				
VALOR A PAGAR	\$ 110.066.861,75	\$ 110.066.861,75		100%
SALDO POR EJECUTAR				
SUMAS IGUALES	\$ 110.066.861,75	\$ 110.066.861,75		100%

Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si lo hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).

INFORMACION TECNICA CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La secretaria de Agricultura y medio ambiente del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2026130 de 2026 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Documento	Requisito	Cumplimiento
Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la	Entrada a almacén	NA

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	 Tierra del Alma	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 23 DE 23 CÓDIGO: JR-CL-FR-06
		INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.2

gestión a proyectos de inversión.			
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista INVERSIONES LITRUPE S.A.S. NIT: 901.161.324 -1de Roldanillo (V), **\$110.066.861.75**, declara que: SI _____ / NO es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN


(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
9502732346	ARL	ARL SURA	ABRIL	06/04/2026	\$ 507.400
	SALUD	COOPSALUD EMSANAR NUEVA E.P.S NUEVA S.P.S MOVILIDAD S.O.S			\$175.200
					\$23.400
					\$58.400
			\$25.700		
	PENSION	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION	\$32.700		
			\$261.500		
\$869.000					
				\$130.800	

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

Contratista

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado en la plataforma electrónica SECOP II


HERNAN MAURICIO RAMIREZ CASTRO
 SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
 Supervisor contrato numero 2026130


SONIA YISELA MONSALVE
 CC: 66.870.529 de Roldanillo (V)
 Contratista
