

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO
05-06-2026

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Contenido

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

1.	DATOS DEL CONTRATO	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4
3.	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	5
4.	AVANCE TECNICO DEL CONTRATO	7
5.	AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATACIÓN.....	15
7.	CRONOGRAMA.....	15
8.	PERSONAL.	15
9.	REGISTRO FOTOGRÁFICO.	16
10.	OBSERVACIONES.	30
11.	CONCLUSIONES.....	30

1. DATOS DEL CONTRATO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	LP-002-2025				
CONTRATO No	494		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	
TIPO DE PERSONA	NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	OBRA				
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	IDENTIFICACIÓN		CC 6.805.417	
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$532.000.000) MCTE				
VALOR ADICIÓN:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$101.699.979,00) MCTE				
VALOR FINAL CONTRATO:	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$633.699.979,00) MCTE				
NO DE CDP.	1125	FECHA DE EXPEDICION	22/08/2025	VALOR	\$532.000.000,00
NO DE RP	1225	FECHA DE EXPEDICION	18/11/2025	VALOR	\$532.000.000,00
NO DE CDP.	426	FECHA DE EXPEDICION	01/06/2026	VALOR	\$101.699.979,00
NO DE RP	426	FECHA DE EXPEDICION	03/06/2026	VALOR	\$101.699.979,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CINCO (05) MESES				
FECHA ACTA INICIO INTERVENTORIA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
FECHA DE INICIO:	24 – 11 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 – 02 – 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	07 – 07 – 2026				

GARANTÍA ANEXO 0			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	24-11-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	14/11/2025-15/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	14/11/2025-15/02/2029
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	14/02/2026-14/02/2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	14/11/2025-14/02/2026

GARANTÍA ANEXO 2			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	12-12-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	24/11/2025-25/06/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	24/11/2025-25/02/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	24/02/2026-24/02/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	24/11/2025-24/02/2026	

GARANTÍA ANEXO 3			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	21-05-2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	19/02/2026-25/07/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	19/02/2026-25/03/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	24/03/2026-24/03/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	19/02/2026-24/03/2026	

GARANTÍA ANEXO 4		
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO	X
	PRORROGA	
	VALOR	
	CESION	

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

	OTRA	
FECHA DE APROBACIÓN	21-05-2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN 21/05/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN 21/05/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	23/02/2026-07/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	23/02/2026-07/06/2029
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	07/06/2026-07/06/2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	23/02/2026-07/06/2026

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 – 02 – 2026
MODIFICATORIO N°1 ACLARACIÓN PLAZO:	19 – 02 – 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 – 02 – 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN N°1	23 – 03 – 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN N°2	07 – 04 – 2026
FECHA DE REINICIO	07 – 05 – 2026
MODIFICATORIO N°2 ADICIÓN Y PRORROGA:	02 – 06 – 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	07 – 07 – 2026

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Que la misión del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá es consolidarse como una entidad territorial que formula e implementa políticas y estrategias orientadas a promover el desarrollo integral, la productividad, la equidad social y el bienestar de sus habitantes, actuando bajo principios de ética pública, transparencia y eficiencia administrativa, en el marco de su Plan de Desarrollo; y que el contrato a celebrarse se articula directamente con dicha misión, en la medida en que busca satisfacer necesidades básicas de la población y mejorar su calidad de vida mediante la ejecución de obras que benefician a la comunidad sanvicentina.

La necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante corresponde al proyecto denominado “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ”, el cual tiene como finalidad intervenir, adecuar y optimizar los espacios físicos destinados a la prestación del servicio institucional en el casco urbano.

La ejecución de este proyecto contempla actividades como la localización y replanteo de áreas de intervención, el desmonte de cubiertas y estructuras deterioradas, la limpieza y resane de muros existentes, así como la instalación de nuevos elementos estructurales y de cubierta, entre ellos perfiles metálicos, canales en lámina para manejo de aguas lluvias y teja metálica arquitectónica, con el propósito de garantizar ambientes seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades institucionales.

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Todas las obras se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas y a la normatividad vigente en materia de construcción, seguridad y calidad, asegurando la durabilidad de las intervenciones y el adecuado desempeño de la infraestructura institucional.

En consideración a las anteriores competencias, la secretaria de Infraestructura formuló y radicó en el banco de proyectos del Municipio, el proyecto de inversión denominado “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ”, identificado con el código BPIN: 2025187530007.

Dicho proyecto, plantea como objetivo mejorar y/o ampliar la infraestructura educativa en el área rural del Municipio, con el fin de evitar la deserción escolar. El servicio a contratar, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San Vicente del Caguán de la presente vigencia.

Durante la ejecución de las actividades adelantadas, se encontró la necesidad de realizar un balance de mayores y menores cantidades del contrato de obra para que se puedan implementar ajustes que aseguren el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades contractuales. Se han identificado diversas necesidades y condiciones específicas que no fueron contempladas en el presupuesto inicial. Estas necesidades pueden incluir condiciones inesperadas, actividades no previstas, requerimientos adicionales necesarios para garantizar la funcionalidad de las obras contratadas, entre otros factores.

La edificación conocida como CENTRO DE CONVIVENCIA CUIDADANA, fue construida durante el periodo de gobierno 2004-2007, se presume que la entrega de las instalaciones y el edificio fue el en el año 2007, ya que no se cuenta con información y/o archivos que lo soporten, en ese entendido, solo se cuenta con la información suministrada por los funcionarios antiguos que actualmente laboran en el edificio. Teniendo en cuenta la fecha de entrega de la edificación, estamos hablando de una edificación de casi 20 años, en tiempo de servicio es significativo el tiempo que ha transcurrido, en la actualidad existen bastantes necesidades en lo que respecta al mantenimiento de toda la edificación y es preciso rescatar que el contrato de la referencia tiene la intención de atender todas las problemáticas que actualmente se presentan en las instalaciones de la edificación, principalmente en adecuaciones locativas, además, se tiene dentro del alcance la ampliación de un espacio que no tenía uso dentro de la misma edificación.

En el desarrollo de las actividades contractuales se evidencia la necesidad de hacer ajustes que se justifican como una respuesta necesaria para adaptar el proyecto a estas nuevas circunstancias y garantizar su éxito en términos de calidad, seguridad y funcionalidad. Además, optimizar los recursos ya comprometidos y se puedan ajustar a las necesidades encontradas durante el desarrollo de las actividades ejecutadas, lo cual, es una práctica común en proyectos de mejoramiento de instalaciones y edificaciones existentes.

En resumen, se adelantó un balance con el fin de optimizar recursos y adaptarse a las necesidades encontradas en obra, además, se entregó a la entidad contratante un reporte de las actividades que no se encuentran en el proyecto pero que son necesarias, por tanto, se justifica en función de mejorar la eficiencia del proyecto, garantizar su viabilidad técnica, legal y satisfacer las necesidades de los funcionarios y usuarios que residen constantemente en las instalaciones, en términos de calidad y funcionalidad. Estos cambios son fundamentales para asegurar el éxito del proyecto y garantizar el cumplimiento del alcance y/o objeto contractual.

Que, realizado el análisis jurídico y técnico, específicamente en lo concerniente al valor del contrato de obra No. 494 del 3 de Julio del 2025, de acuerdo con los argumentos expuestos tanto por el contratista de obra como de la interventoría, necesariamente debe realizarse un aumento al presupuesto contractual de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$101.699.979,00), estableciendo así las siguientes condiciones financieras del contrato:

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACION:	\$532.000.000,00
MODIFICACIONES (+)	\$199.797.366,00
MODIFICACIONES (-)	\$98.097.387,00
VALOR ADICIONAL	\$101.699.979,00
VALOR TOTAL	\$633.699.979,00

Lo anterior, permitirá garantizar que las actividades y obligaciones contractuales sean cumplidas de manera eficaz.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Centro de convivencia ciudadana, Zona urbana, Municipio de San Vicente del Caguán.



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

3. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALES					COBRO PARCIAL N°1		COBRO PARCIAL N°2		SALDO POR COBRAR	
	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
OFICINA DE ARCHIVO											
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA										
1.1	CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00	ML	32,1	12.330,0	395.546,4	32,1	395.546,4				
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	42,4	6.036,0	256.035,0	42,4	256.035,0				
1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	42,4	8.689,0	368.570,0	42,4	368.570,0				
1.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.	M3	21,7	43.532,0	943.561,5	21,7	943.561,5				
1.5	SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO	M3	21,9	23.047,0	505.333,1			21,9	\$ 505.333,1		
1.6	RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	M3	11,2	32.026,0	359.495,9	11,2	359.495,9				
2	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
2.1	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA	M2	11,0	38.847,0	427.317,0	11,0	427.317,0				
2.2	CONCRETO ZAPATAS R-21MPA	M3	3,3	832.115,0	2.745.979,5	3,3	2.745.979,5				
2.3	CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA)	M3	3,1	471.141,0	1.452.998,8	3,1	1.452.998,8				
2.4	VIGA 0.25*0.25 CIMENTACIÓN R-21MPA	ML	35,4	104.778,0	3.704.950,1	35,4	3.704.950,1				
2.5	COLUMNA PEDESTAL 0.25*0.25 R-21MPA	ML	57,4	139.769,0	8.026.933,7	57,4	8.026.933,7				
2.6	VIGA AEREA 0.25*0.25 R-21MPA	ML	38,2	157.479,0	6.017.272,6	38,2	6.017.272,6				
2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO 0.20*0.20 R-21MPA	ML	38,2	125.678,0	4.802.156,4	38,2	4.802.156,4				
2.8	ACERO FY=420MPA	KG	2.019,0	13.347,0	26.947.593,0	2019,0	26.947.593,0				

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



2.9	PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	41,7	118.735,0	4.954.870,9			41,7	\$ 4.954.870,9		
2.10	MURO CORTINA EN CONCRETO REFORSAO H<0,1 MTS.	M3	1,3	1.170.132,0	1.526.250,0			1,3	\$ 1.526.250,0		
3	MAMPOSTERIA Y PAÑETES										
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4	M2	61,51	86.877,0	5.343.491,5	61,51	5.343.804,3	0,0	-\$ 312,8		
3,2	PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	M2	180,8	58.817,0	10.634.113,6			180,8	\$ 10.634.113,6		
3,3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	180,8	22.397,0	4.049.377,6			180,8	\$ 4.049.377,6		
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	M2	180,8	25.101,0	4.538.260,8			180,8	\$ 4.538.260,8		
4	CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS Y CUBIERTA										
4.1	PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)	M2	10,0	653.714,0	6.563.288,6			10,0	\$ 6.563.288,6		
4,3	CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO	ML	12,7	141.928,0	1.802.485,6	12,7	1.802.485,6				
4.4	CIELO RASO EN PVC	M2	38,3	77.588,0	2.968.051,4			38,3	\$ 2.968.051,4		
5	ACABADO DE PISOS										
5,1	CERAMICA PISO	M2	37,8	88.733,0	3.357.772,1			37,8	\$ 3.357.772,1		
6	INSTALACIONES ELECTRICAS										
6,1	TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE	UND	7,0	245.119,0	1.715.833,0	0,0		7,0	\$ 1.715.833,0		
6,2	TOMA CORRIENTE 220V	UND	3,0	246.705,0	740.115,0	0,0		3,0	\$ 740.115,0		
6,3	SALIDA ILUMINACIÓN	UND	8,0	141.842,0	1.134.736,0	0,0		8,0	\$ 1.134.736,0		

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

6,4	INTERRUPTOR	UND	2,0	135.199,0	270.398,0	0,0		2,0	\$	270.398,0		
6,5	PANEL LED 40W L/FRIA	UND	8,0	156.494,0	1.251.952,0	0,0		8,0	\$	1.251.952,0		
6.6	REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO	UND	3,0	712.593,0	2.137.779,0			3,0	\$	2.137.779,0		
7	INSTALACIONES SANTARIAS											
7,1	SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	2,0	193.406,0	386.812,0	0,0		2,0	\$	386.812,0		
7.2	ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)	UND	3,0	727.707,0	2.183.121,0			3,0	\$	2.183.121,0		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	ML	14,0	131.019,0	1.834.266,0			14,0	\$	1.834.266,0		
8	CUBIERTA											
8,1	CUBIERTA TEJA MASTER MIL	M2	43,7	88.050,0	3.846.728,4	43,7	3.846.728,4					
8,2	CORREA METALICA PERFIL C 203*65*3 MM	ML	50,8	97.885,0	4.972.558,0	50,8	4.972.558,0					
8,3	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	ML	17,4	41.949,0	730.332,1			17,4	\$	730.332,1		
ADECUACIONES CENTRO DE CONVIVENCIA												
1	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO											
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,7	6.036,0	2.937.787,6	486,7	2.937.787,6					
1.7	DESMONTAJE Y DISPOSICION DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO (Eternit)	M2	486,7	16.857,0	8.204.487,3	486,7	8.204.487,3					
1.8	RETIRO DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EXISTENTE EN MUROS	M2	1.855,5	13.741,0	25.496.473,6	1855,5	25.496.473,6					
1.9	DEMOLICION DE UNIDADES SANITARIAS (INODORO)	UND	8,0	14.785,0	118.280,0	8,0	118.280,0					
1.10	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	UND	7,0	13.713,0	95.991,0	7,0	95.991,0					

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



1,11	DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE	M2	95,1	15.388,0	1.464.014,3			95,1	\$	1.464.014,3		
1,12	RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)	M3	14,3	130.394,0	1.860.852,8			14,3	\$	1.860.852,8		
1,13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.	M3	12,2	43.532,0	532.309,3			12,2	\$	532.309,3		
3	MAMPOSTERIA Y PAÑETES											
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4	M2	6,27	86.877,0	544.718,8	4,0	343.164,2	2,3	\$	201.554,6		
3,2	PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	M2	22,9	58.817,0	1.346.909,3	7,9	464.654,3	15,0	\$	882.255,0		
3,3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	1.868,0	22.397,0	41.838.491,9	1863,4	41.734.648,2	4,6	\$	103.843,7		
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	M2	1.868,0	25.101,0	46.889.672,0	1863,4	46.773.291,3	4,6	\$	116.380,8		
3,5	MURO SUPERBOARD 10CMS	M2	17,3	242.500,0	4.203.737,5				\$	-	17,34	4.203.737,5
4	CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y CIELO RASO											
4,1	PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)	M2	6,1	653.714,0	4.006.613,1			6,1	\$	4.006.613,1		
4,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	24,0	328.972,0	7.895.328,0			24,0	\$	7.895.328,0		
4,4	CIELO RASO EN PVC	M2	328,0	77.588,0	25.444.984,6	328,0	25.444.984,6		\$	-		
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DEL PORTON (PUERTA PRINCIPAL)	UND	5,0	561.459,0	2.829.753,4				\$	-	5,04	2.829.753,4
8	CUBIERTA											
8,1	CUBIERTA TEJA MASTER MIL	M2	486,7	88.050,0	42.854.903,6	486,7	42.854.903,6		\$	-		
8,2	CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,80M DE DESARROLLO	ML	68,8	248.817,0	17.118.609,6			68,8	\$	17.118.609,6		

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



8,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	ML	34,4	225.535,0	7.758.404,0			34,4	\$ 7.758.404,0		
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	ML	68,8	116.978,0	8.048.086,4			68,8	\$ 8.048.086,4		
8,5	ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA	ML	68,8	150.958,0	10.385.910,4			68,8	\$ 10.385.910,4		
8,6	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	ML	13,4	41.949,0	562.116,6			13,4	\$ 562.116,6		
9	ASCENSOR										
9,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ASCENSOR	UND		29.819.890,0							
9,2	ACONDICIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA (INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO, INSTALACION DE TUBERIA SUBTERRANEA, PERAPACIÓN DE MURO, CAMBIO DE TUBERIA GALVANIZADA DESDE CONEXIÓN DE CONTADOR A POSTE) ACONDICIONAMIENTO DE REDES INTERNAS(CABLEADO Y ACCESORIOS)	UND	1,0	16.504.723,0	16.504.723,0				\$ -	1,00	16.504.723,0
9,3	INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR	UND	38,0	103.506,0	3.933.228,0				\$ -	38,00	3.933.228,0
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
10,1	SANITARIO BLANCO	UND	6,0	717.422,0	4.304.532,0			6,0	\$ 4.304.532,0		
10,2	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UND	2,0	534.653,0	1.069.306,0			2,0	\$ 1.069.306,0		
10,3	GRIFERIA PARA ORINAL	UND	6,0	249.264,0	1.495.584,0			6,0	\$ 1.495.584,0		
10,4	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	12,0	294.626,0	3.535.512,0			12,0	\$ 3.535.512,0		
10,5	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80	UND	3,0	718.295,0	2.154.885,0			3,0	\$ 2.154.885,0		
10,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"	ML	13,6	168.038,0	2.276.914,9			13,6	\$ 2.276.914,9		

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



10,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"	ML	9,8	400.637,0	3.926.242,6			9,8	\$ 3.926.242,6		
10,8	ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO	UND	1,0	791.854,0	791.854,0			1,0	\$ 791.854,0		
10,9	CERAMICA PISO	M2	41,4	88.733,0	3.675.516,1			41,4	\$ 3.675.516,1		
10,10	CERAMICA MURO	M2	129,1	88.733,0	11.454.010,6			129,1	\$ 11.454.010,6		
10,11	DIVICIONES DE BAÑOS Y PUERTAS EN ALUMINIO INCLUYE PERFILES, ANGULOS, CHAPAS, BISAGRAS Y PASADORES	UND	4,0	2.597.490,0	10.389.960,0				\$ -	4,00	10.389.960,0
11	ANDEN										
11,1	LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)	M2	95,1	247.289,0	23.527.075,5			95,1	\$ 23.527.075,5		
11.2	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN	ML	54,4	222.195,0	12.087.408,0					54,40	12.087.408,0
					\$ 487.461.522,00		\$ 266.882.652,00		\$ 170.630.060,00		\$ 49.948.810,00
	ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 121.865.381,00		\$ 66.720.663,00		\$ 42.657.515,00		\$ 12.487.203,00
	IMPREVISTOS			1%	\$ 4.874.615,00		\$ 2.668.827,00		\$ 1.706.301,00		\$ 499.488,00
	UTILIDAD			4%	\$ 19.498.461,00		\$ 10.675.306,00		\$ 6.825.202,00		\$ 1.997.952,00
					\$ 633.699.979,00		\$ 346.947.448,00		\$ 221.819.078,00		\$ 64.933.453,00

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Conforme lo anterior, el avance de ejecución es de un cien por ciento (100 %).

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO	100%	B
PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)	100%	B
MURO CORTINA EN CONCRETO REFORSAO H<0,1 MTS.	100%	B
PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	100%	B
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	100%	B
PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	100%	B
PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)	100%	B
CIELO RASO EN PVC	100%	B
CERAMICA PISO	100%	B
TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE	100%	B
TOMA CORRIENTE 220V	100%	B
SALIDA ILUMINACIÓN	100%	B
INTERRUPTOR	100%	B
PANEL LED 40W L/FRIA	100%	B
REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO	100%	B
SIFON DE DESAGUEN (INCUEYE TUBERIA Y ACCESORIOS)	100%	B
ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)	100%	B
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	100%	B
BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	100%	B
DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE	100%	B
RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)	100%	B
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.	100%	B
DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE	100%	B
MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4	100%	B
PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	100%	B
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	100%	B
PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	100%	B
PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)	100%	B
MANTENIEMIENTO DE PUERTAS	100%	B
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	100%	B
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	100%	B

ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA	100%	B
BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	100%	B
SANITARIO BLANCO	100%	B
LAVAMANOS DE SOBREPONER	100%	B
GRIFERIA PARA ORINAL	100%	B
GRIFERIA PARA LAVAMANOS	100%	B
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80	100%	B
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"	100%	B
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"	100%	B
ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO	100%	B
LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)	100%	B

4. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATACIÓN.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	\$ 0		0%
ADICIÓN	\$ 101.699.979,00	02-06-2025	N/A
VALOR EJECUTADO CORTE 1	\$ 346.947.448,00	24-11-2025 al 23-02-2026	55%
VALOR EJECUTADO CORTE 2	\$ 221.819.078,00	07-05-2026 al 05-06-2026	35%
VALOR A GIRAR	\$ 221.819.078,00	07-05-2026 al 05-06-2026	35%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUAL	\$ 633.699.979,00		100%

Nota: las estampillas serán retenidas del respectivo desembolso, toda vez que el balance financiero no discrimina las retenciones aplicables incluidas las respectivas estampillas derivadas del contrato de obra.

5. CRONOGRAMA

Se anexa cronograma con el presente informe.

6. PERSONAL.

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

MES DE MAYO-DIRECTOR CELSO ANDRES

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 144.000
PENSIÓN	\$ 576.000
ARL	\$ 250.600
N° DE PLANILLA	9492492989

MES DE MAYO-RESIDENTE ANDRES MAURICIO

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 144.000
PENSIÓN	\$ 576.000
ARL	\$ 250.600
N° DE PLANILLA	9492492989

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

NOTA EXPLICATIVA: El contratista certificó conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de la ley 2002.

Personal relacionado para la ejecución del contrato: MAYO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	IBC	PENSION	SALUD	ARL
CUBILLOS ORTEGA JEILER ANDREI	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500
DOMINGUEZ CALDERON RAYVER	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500
OSWALDO FLORIANO	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500
HERNANDEZ DIEGO					

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

1.5 SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO



2.9 PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATAIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

2.10 MURO CORTINA EN CONCRETO REFORSAO H<0,1 MTS.



3.2 PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)



3.3 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)



4.1 PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)



4.4 CIELO RASO EN PVC



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

5.1 CERAMICA PISO



6.1 TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE



6.2 TOMA CORRIENTE 220V



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

6.3 SALIDA ILUMINACIÓN



6.4 INTERRUPTOR



6.5 PANEL LED 40W L/FRIA



6.6 REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

7.1 SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS)



7.2 ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)



7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

8.3 BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC



1.11 DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE



1.12 RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

1.13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.



3.1 MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4



3.2 PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

3.3 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO



3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)



4.1 PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)



4.2 MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

8.2 CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,80M DE DESARROLLO



8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE



8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co


8.5 ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA



8.6 BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC



10.1 SANITARIO BLANCO

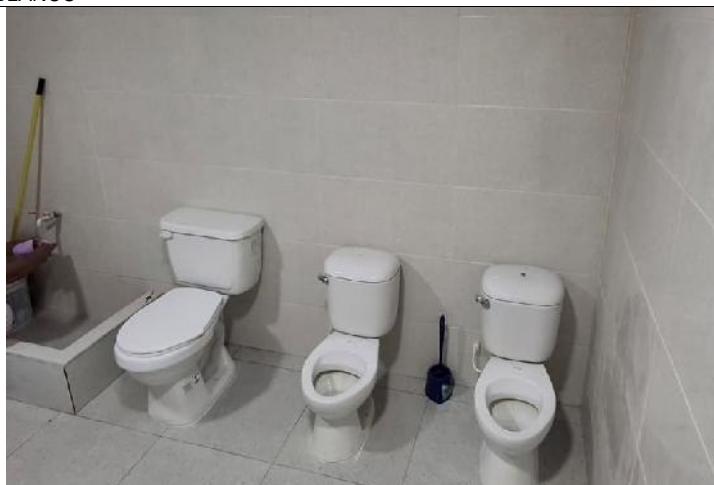

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

10.2 LAVAMANOS DE SOBREPONER



10.3 GRIFERIA PARA ORINAL



10.4 GRIFERIA PARA LAVAMANOS



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

10.5 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80



10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"



10.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"




Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
 contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

10.8 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO



10.9 CERAMICA PISO

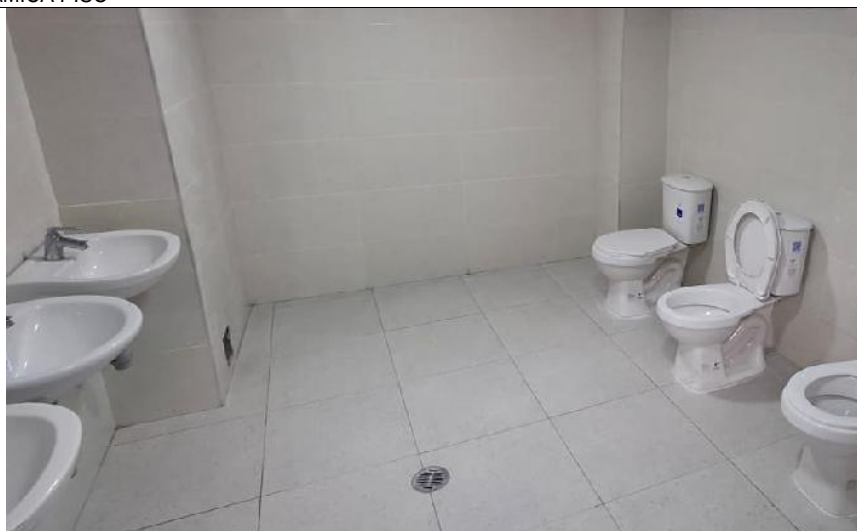

10.10 CERAMICA MURO



Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.

Revisó Yudy Vanessa Rivas H.

Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

11.1 LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)



8. OBSERVACIONES.

N/A

9. CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito INTERVENTOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre el 07 de mayo de 2026 al 05 de junio de 2026 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS. (\$221.819.078,00)

Firma.



KEVIN DANIEL TORRES LÓPEZ
INTERVENTOR

Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
