

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO	
--	---	--

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 004	LUGAR: Teams	FECHA: 28/08/2025	HORA DE INICIO: 2:03 PM	HORA FINAL: 2:50 PM

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Operativo N. 4 del Convenio interadministrativo número 1211- 2025, con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto: implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo y verificación del quórum 2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo) 3. Propuestas y Varios.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Instalación Sedes Educativas.	En proceso.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Saludo y Verificación del quórum La sesión fue instalada por el ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, quien presenta el saludo y dio apertura formal al comité a las 2:03 p.m., agradeciendo la presencia de los miembros del equipo técnico, jurídico y financiero, así como de los representantes de la Gobernación, el operador, la interventoría y la Contraloría General de la República y a continuación verifica la asistencia de los miembros del Comité, comprobando el quorum: • Supervisor del Convenio por parte de MinTIC, Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios • El Delegado del Fondo Único de TIC, Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez • La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora Sonia Arango Medina; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación. • Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla en materia de vigilancia realizado un seguimiento permanente a este convenio, teniendo en cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

por el Gobierno Nacional; por tal motivo, realizarán acompañamiento en los comités operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria.

Verificada la existencia del quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en Convenio Interadministrativo se inicia la reunión de comité, para el desarrollo del orden del día previamente establecido.

2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo)

La Supervisora de la Gobernación de Norte de Santander inició su intervención con un informe detallado sobre el estado de implementación de infraestructura tecnológica en las comunidades beneficiarias del Catatumbo, las cuales se encuentran en alguna de las siguientes etapas:




Al respecto, indicó que, en el marco del proyecto de conectividad para la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, se ha avanzado significativamente en la caracterización y validación de las comunidades beneficiaria y se expuso el progreso por junta de internet, indicando el número de comunidades focalizadas y estado de avance de la siguiente forma:

Comunidades del Área de Catatumbo

En el municipio de Ábrego, se han focalizado once comunidades, de las cuales seis se encuentran en etapa cuatro, listas para ser entregadas al operador. Una comunidad está en etapa tres, avanzando hacia la siguiente fase, una en etapa dos, mientras que tres han desistido del proceso. Total de hogares a conectar: 413.

Comunidades Beneficiadas en ABREGO

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
VEGA DEL TIGRE	Si	Si	Aprobado	45	Si	Si	Si	X	X
HOYO PILON	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X
EL LLANON	Desiste								
LA SIERRA-PALMIRA	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
OROQUE	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
LOS CEDROS	Desiste								
EL TABACO	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
EL TARRA	Si	Si	Aprobado	85	Si	Si	Si	X	X
EL GUAMAL	Si	Si	Aprobado	40	Si	No	No	X	
LOS INDIOS	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No	X	X
MOTILONA	Desiste								



En el municipio de Convención, se han identificado siete comunidades. Seis de ellas están en etapa cuatro, y un desistimiento. Total de hogares a conectar: 542.

Comunidades Beneficiadas en CONVENCIÓN

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LLANOS DE BELEN	Si	Si	Aprobado	101	Si	Si	Si	X	x
SANTA BARBARA LA LIBERTAD	Si	Si	Aprobado	67	Si	Si	Si	X	X
PATIECITOS	Si	Si	Aprobado	101	Si	Si	Si	X	X
CARTAGENA	Si	Si	Aprobado	96	Si	Si	Si	X	X
AGUA BLANCA	Si	Si	Aprobado	116	Si	Si	Si	X	x
BELLA LUZ	Desiste								



En El Carmen, de quince comunidades focalizadas, nueve se encuentran en etapa cuatro, una en etapa tres, una comunidad nueva y cuatro han desistido. Total de hogares a conectar: 738.

Comunidades Beneficiadas en EL CARMEN

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA OSA BAJA	Si	Si	Aprobado	63	Si	Si	Si	X	X
LA PEREGRINA	Desiste								
LIMONAL	Desiste								
QUEBRADA ARriba	Si	Si	Aprobado	61	Si	Si	Si	X	X
CAMORRA	Si	Si	Aprobado	66	Si	Si	Si	X	X
SANTA INES	Si	Si	Aprobado	100	Si	Si	Si	X	X
LAS AGUILAS	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
FILO DE PALO	Si	Si	Aprobado	50	Si	Si	Si	X	X
LAGUNETAS	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
EL LORO	Si	Si	Aprobado	80	Si	Si	Si	X	X
PLANADAS ALTA	Si	Si	Aprobado	98	Si	Si	Si	X	X
EL SUL	Si	Si	Aprobado	40	No	Si	Si	X	X
LA TRINIDAD				100					
SARAGOZA	Desiste								
ASTILLEROS	Desiste								



En el municipio de El Tarra presenta cuatro comunidades, todas en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 192.

Comunidades Beneficiadas en EL TARRA

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
KM 84	Si	Si	Aprobado	46	Si	Si	Si	X	X
KM 90	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
LA CAMPANA	Si	Si	Aprobado	46	Si	Si	Si	X	X
KM 77	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X



Total de Hogares a conectar: 192

Mientras que Hacarí cuenta con veinte comunidades, de las cuales catorce están en etapa cuatro, y seis han desistido. Total de hogares a conectar: 680.

Comunidades Beneficiadas en HACARÍ

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA ESTACION	Si	Si	Aprobado	61	Si	Si	Si	X	X
LA LOMA	Si	Si	Aprobado	62	Si	Si	Si	X	X
CUMANA BAJA	Si	Si	Aprobado	43	Si	Si	Si	X	X
SANTA MARTA	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X
SANDOVAL	Desiste								
LIMONCITOS	Si	Si	Aprobado	43	Si	Si	Si	X	X
FILO REAL	Si	Si	Aprobado	47	Si	Si	Si	X	X
MESITAS	Si	Si	Aprobado	49	Si	Si	Si	X	X
CASTRILLON	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
LA LAGUNA	Desiste								
BUENOS AIRES	Si	Si	Aprobado	45	Si	Si	Si	X	X
MARACAIBITO	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
SAN MIGUEL	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
AGUA BLANCA	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
LA ESPERANZA	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
GUAIMARAL	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
CARRIZAL	Desiste								
ASTILLEROS	Desiste								
QUEBRADA LA ORQUETA	Desiste								
SAN PABLO	Desiste								

TOTAL 14 - Etapa 4

TOTAL 6 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 680

En La Playa, se tienen once comunidades, ocho están en etapa cuatro, dos en etapa tres y 1 desistimiento. Total de hogares a conectar: 622.

Comunidad Beneficiada en LA PLAYA

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LLANO GRANDE	Si	Si	Aprobado	59	Si	Si	Si	X	X
MOHAN Y SUCRE	Desiste								
ASPASICA	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
TUNJA	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
CACAOS	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
ESPERANCITA	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X
MESA RICA	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
PARTE BAJA	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
REVENTON PARTE BAJA	Si	Si	Aprobado	100	Si	Si	Si	X	X
GUARINAS	Si	Si	Aprobado	46	No	Si	Si	X	X
ALTO DEL BUEY	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
ALGARROBOS	Si	Si	Aprobado	46	No	Si	Si	X	X

TOTAL 8 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 622

El municipio de Ocaña registra cinco comunidades, tres en etapa cuatro y dos desistidas. Total de hogares a conectar: 349.

Comunidades Beneficiadas en OCAÑA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
NUEVO AMANECER	Si	Si	Aprobado	175	Si	Si	Si	X	X
SAN FRANCISCO	Si	Si	Aprobado	73	Si	Si	Si	X	X
EL PUENTE	Si	Si	Aprobado	101	Si	Si	Si	X	X
LLANO DE LOS TRIGOS	Desiste								
ALTO DEL LUCERO	Desiste								

TOTAL

3 - Etapa 4

TOTAL

2 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 349

San Calixto ha reportado seis comunidades las cuales se encuentran en etapa cuatro. No hay desistimientos. Total de hogares a conectar: 313.

Comunidad Beneficiada en SAN CALIXTO



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA FORTUNA	Si	Si	Aprobado	42	Si	Si	Si	X	X
SAN JUAN	Si	Si	Aprobado	47	Si	Si	Si	X	X
EL CARACOL	Si	Si	Aprobado	57	Si	Si	Si	X	X
BANDERAS	Si	Si	Aprobado	47	Si	Si	Si	X	X
AGUACHICA	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X
BALSAMINA	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X

TOTAL

6 - Etapa 4

TOTAL

0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 313

Sardinata presenta cuatro comunidades, todas en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 195

Comunidades Beneficiadas en SARDINATA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
BELLAVISTA	Si	Si	Aprobado	46	Si	Si	Si	X	X
VALDERRAMA	Si	Si	Aprobado	50	Si	Si	Si	X	X
EL PORVENIR	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
PARCELA PRADERA	Si	Si	Aprobado	58	Si	Si	Si	X	X

TOTAL 4 - Etapa 4

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 195

En Teorama, hay catorce comunidades focalizadas, diez están en etapa cuatro y cuatro han desistido. Total de hogares a conectar: 662

Comunidades Beneficiadas en TEORAMA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA ESTRELLA	Si	Si	Aprobado	55	Si	Si	Si	X	X
VILLA NUEVA	Si	Si	Aprobado	65	Si	Si	Si	X	X
SAN JOSE DE LAS VEGAS	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X
PIEDRAS DE MOLER	Desiste								
COSTA RICA	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X
LA TIRADERA	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X
MUNDO NUEVO	Si	Si	Aprobado	44	Si	Si	Si	X	X
EI ASERRIO	Si	Si	Aprobado	166	Si	Si	Si	X	X
LA RUIDOSA	Si	Si	Aprobado	90	Si	Si	Si	X	X
LA PEDRECOSA	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
SAN MIGUELITO	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
JURISDICCIONES	Desiste								
LOS PULPITOS	Desiste								
ALTA GRACIA	Desiste								

TOTAL 10 - Etapa 4


TOTAL 4 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 662

Tibú cuenta con nueve comunidades, siete en etapa cuatro, dos en etapa tres y no se presentan desistimientos. Total de hogares a conectar: 560.

Comunidades Beneficiadas en TIBÚ

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
PALMERAS MIRADOR	Si	Si	Aprobado	50	Si	Si	Si	X	X
SAN JOSE KM 60	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
LA INDIA ALTO SAN MIGUEL	Si	Si	Aprobado	40	Si	No	No	X	X
TROCHA GANADERA	Si	Si	Aprobado	48	Si	Si	Si	X	X
LA RESERVA	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
CASA DE ZINC	Si	Si	Aprobado	46	Si	Si	Si	X	X
LA UNION AMBATO	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No	X	
CAMPO YUCA ORO CINCO	Si	Si	Aprobado	46	Si	Si	Si	X	X
VILLA ESPERANZA	Si	Si	Aprobado	209	Si	Si	Si	X	X



Total de Hogares a conectar: 560

A manera de resumen, expuso que la región del Catatumbo cuenta con ochenta y cinco comunidades: una en etapa nueva, una en etapa dos, seis en etapa tres, setenta y siete en etapa cuatro y veintiún comunidades que han desistido del proyecto. Total de hogares a conectar: 5.266.



Comunidades del Área de Metropolitana de Cúcuta

En cuanto al área metropolitana, presentó las comunidades beneficiadas por municipio y su estado, así:

En el municipio de Puerto Santander presentó tres veredas postuladas, pero ninguna cumple con el requisito de mínimo 40 viviendas; la vereda El Dave, ya cuenta con cobertura de dos operadores, lo que impide su inclusión en el proyecto, por lo que sostuvo que se ha programado una nueva reunión con estas comunidades para revisar su situación.

Comunidades Beneficiadas en PUERTO SANTANDER



Nombre Comunidad - Ubicación	Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
VEGAS DEL PAMPLONITA					Desiste					
EL DAVE					Desiste					
EL DIAMANTE					Desiste					

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 0 - Etapa 2

TOTAL 3 - Desistimientos

En Cúcuta, de once comunidades focalizadas, cuatro se encuentran en etapa cuatro y siete han desistido. Total hogares: 163

Comunidades Beneficiadas en CÚCUTA



Nombre Comunidad - Ubicación	Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
AGUA CLARA					Desiste					
ALTO VIENTO					Desiste					
BRISAS DEL RIO					Desiste					
PUERTO VILLAMIZAR					Desiste					
CAMPO ALEGRE					Desiste					
LOS CAMBULOS	Si	Si	Si	Aprobado	42	Si	Si	Si	X	X
LA PROSPERIDAD					Desiste					
EL ENCANTO	Si	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
SAN AGUSTIN DE LOS POZOS					Desiste					
CAÑO MONO	Si	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
EL ARRAYAN	Si	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X

TOTAL 4 - Etapa 4

TOTAL 7 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 163

En el municipio de Los Patios, se han identificado nueve comunidades, dos en etapa cuatro y siete han desistido por no cumplir con el número mínimo de viviendas. Total hogares: 130.

Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS

Nombre Comunidad - Ubicación	Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
CALIFORNIA	Si	Si	Si	Aprobado	70	Si	Si	Si	X	X
AGUALINDA	Desiste									
HELECHAL ALTO	Desiste									
LA MUTIS	Si	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X
EL TRAPICHE	Desiste									
COROZAL	Desiste									
LOS VADOS	Desiste									
LOS COLCHONES	Desiste									
20 DE JULIO	Desiste									



Total de Hogares a conectar: 130

El Zulia cuenta con doce comunidades, siete en etapa cuatro, cinco que han desistido. Total hogares a conectar: 358.

Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA

Nombre Comunidad - Ubicación	Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
20 DE JULIO	Si	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
CERRO LEON	Si	Si	Si	Aprobado	43	Si	Si	Si	X	X
ENCERRADEROS	Si	Si	Si	Aprobado	82	Si	Si	Si	X	X
EL PEDREGAL	Si	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
LA CONQUISTA	Si	Si	Si	Aprobado	47	Si	Si	Si	X	X
CRISTO REY	Si	Si	Si	Aprobado	55	Si	Si	Si	X	X
SANTA ROSA	Si	Si	Si	Aprobado	50	Si	Si	Si	X	X
LA ANGELITA	Desiste									
EL TABLAZO	Desiste									
LA CASTELLANA	Desiste									
PAN DE AZÚCAR	Desiste									
CAMILANDIA	Desiste									
PRECOZUL	Desiste									



Total de Hogares a conectar: 358

San Cayetano registra cuatro comunidades, dos en etapa cuatro y dos desistimientos. Total hogares a conectar: 83.

Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO



Nombre Comunidad - Ubicación	Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
PUENTE ZULIA	Desiste									
LA FLORIDA	Si	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
SAN ISIDRO	Si	Si	Si	Aprobado	43	Si	Si	Si	X	X
EL AYACUCHO	Desiste									

TOTAL 2 - Etapa 4

TOTAL 2 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 83

En total, señaló que el área metropolitana cuenta con quince comunidades, de las cuales quince están en etapa cuatro y veinticuatro que han desistido. Total hogares a conectar: 734.



Expuso que, actualmente, el consolidado general indica que se han identificado cien comunidades de juntas de internet – comunicades de conectividad con potencial para ser beneficiadas. De estas,

noventa y dos ya están listas para iniciar la instalación, y que las mismas ya fueron entregadas al operador para la realización de estudios de campo; ocho comunidades se encuentran en proceso de validación. Hasta la fecha, cuarenta y dos comunidades han desistido, y se han confirmado 6.000 hogares que serán conectados a través de las cien juntas activas, cumpliendo así con el primer objetivo técnico del proyecto.



Instituciones educativas

Respecto del segundo objetivo del proyecto de conectividad, se indicó que este corresponde a la focalización de instituciones educativas rurales en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, cuyo propósito central es garantizar el acceso a servicios digitales en sedes escolares ubicadas en zonas de difícil acceso, promoviendo la equidad tecnológica y fortaleciendo los procesos educativos en contextos rurales.

- **Instituciones educativas del área Metropolitana de Cúcuta**

En primer lugar, se abordó la situación del municipio de San Cayetano, donde inicialmente se habían identificado tres instituciones educativas para ser beneficiadas; no obstante, estas sedes decidieron desistir del proyecto, dado que ya reciben apoyo desde hace varios años por parte de otra entidad. Esta decisión fue formalizada mediante carta de desistimiento, y como resultado, los cupos asignados fueron redistribuidos a otras sedes ubicadas en municipios con disponibilidad y necesidad prioritaria.

I.E Beneficiadas en SAN CAYETANO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORNEJO	SEDE ROSA BLANCA	VDA AYACUCHO	15
	SEDE PUENTE ZULIA	VDA PUENTE ZULIA	20
	I.E. CORNEJO - SEDE PRINCIPAL	CORREG CORNEJO	572

TOTAL

3 Sedes desistieron



Nota: En Proceso de revisión Instituciones para remplazo

En el municipio de Los Patios, ya se encuentran instaladas dos sedes de la Institución Educativa La Garita.

I.E Beneficiadas en LOS PATIOS



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST EDUCATIVA LA GARITA	SEDE TORCOROMA	VDA AGUA LINDA	9
	SEDE TASCARENA	VDA LA MUTIS	15

TOTAL

2 Sedes Instaladas

En El Zulia se tienen las siguientes instituciones: El Instituto Agrícola Risaralda cuenta con siete sedes rurales. La Institución Educativa Rural Florentino Blanca cuenta con ocho sedes. En la Institución Educativa Rural Angelita se tiene cuatro sedes. Asimismo, en la Institución Educativa Rural San José Calasanz se incluyeron seis sedes. En este orden de ideas, el municipio de El Zulia cuenta con veinticuatro sedes instaladas y una sede educativa en proceso de revisión.

I.E Beneficiadas en EL ZULIA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE ASTILLEROS	VDA ASTILLEROS - LA	
	YE VIA TIBU		54
	SEDE GUADUALES	VDA ASTILLEROS	16
	SEDE PUEBLITOS	VDA ASTILLEROS	11
	SEDE LA UNION	VDA ASTILLEROS	89
	SEDE CERRO LEON	VDA CERRO LEON	13
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE RISARALDA	VDA ASTILLEROS	63
	SEDE RANCHO GRANDE	VDA RANCHO GRANDE	39
	SEDE PUERTO ESTRELLA	VDA PUERTO ESTRELLA	22
	SEDE PEDREGALES	VEREDA PEDREGALES	36
	SEDE EL LLANITO	VDA ENCERRADERO	8
	SEDE FE Y ALEGRIA	CORREG PAN DE AZUCAR	6
	SEDE LA ESTANCIA	AZUCAR	43
	SEDE PEÑALISA	VDA CAMPO ALICIA	7
	SEDE LOS MANGOS	VDA CAMPO ALICIA	21
	SEDE LA CONQUISTA	VDA PAN DE AZUCAR	8

I.E Beneficiadas en EL ZULIA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	VEGA DE MARTINEZ	VDA. LA ANGELITA	11
	SAN MIGUEL	VDA. SAN MIGUEL	42
	SAN CARLOS	VDA. EL GUAYABO	20
	LA MACARENA	VDA. LA MACARENA	12
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE VENTE DE JULIO	VDA VEINTE DE JULIO	16
	SEDE LA RAMPACHALA	VDA LA RAMPACHALA	51
	SEDE PLAYA COLORADA	AV 2 6-25	36
	SEDE EL MESTIZO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU PARTE ALTA	12
	SEDE EL PROGRESO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU	22
	SEDE LA COLORADA	VDA LA COLORADA	74

TOTAL **1 Sede En Revisión**

TOTAL **24 Sedes Instaladas**

• Instituciones educativas del área de Catatumbo

En lo que respecta a los municipios del Catatumbo, se presentó una cobertura amplia y representativa.

En Ábrego, se focalizaron las sedes La Teja, El Tarra Principal, La Gaira, El Llanón, Canutillo Parte Alta, Potrero Nuevo, Haraganazo y Llano Suárez. Las ocho sedes educativas se encuentran instaladas.

I.E Beneficiadas en ABREGO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO	SEDE LA TEJA	VDA LA TEJA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA	SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	VDA. EL TARRA	73
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS	SEDE GAIRA	VDA GAIRA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE	SEDE EL LLANON	VDA EL LLANON	31
CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ	CANUTILLO PARTE ALTA	VDA CANUTILLO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA	SEDE POTRERO NUEVO	VDA POTRERO NUEVO	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER	SEDE HARAGANAZO	VDA HARAGANAZO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO	SEDE LLANO SUAREZ	VDA LLANOSUAREZ	52

TOTAL 8 Sedes Instaladas

En Convención, se incluyeron las sedes Nueva Honduras, Batroctora, Agua Blanca, Mesa Rica, Bella Unión, San Juan del Llanos, San Francisco y Maicitos. Las siete sedes educativas se encuentran instaladas.

I.E Beneficiadas en CONVENCION



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	SEDE NUEVAS HONDURAS	VDA HONDURAS	7
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL YERARO	SEDE BATROCTORA	VD CORREGIMIENTO HONDURAS	22
MIMAY SASHIYI	SEDE AGUA BLANCA	VDA AGUA BLANCA	7
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	SEDE MESA RICA	CORREG MESA RICA	23
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL	SEDE BELLA UNION	VDA BELLA UNION	8
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	SEDE SAN JUAN DE LLANOS	VEREDA SAN JUAN DE LLANOS	27
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	13
	SEDE MAICITOS	VDA MAICITOS	21

TOTAL 7 Sedes Instaladas

En el municipio de El Carmen, se validaron sedes como El Paraíso, San Francisco, La Quiebra, La Peregrina, Potrero Grande, Limonal y Santa Rita. Las siete sedes educativas se encuentran instaladas.

I.E Beneficiadas en EL CARMEN



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	SEDE EL PARAISO	VDA EL PARAISO	26
	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	11
	SEDE LA QUIEBRA	VDA LA QUIEBRA	25
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LA PEREGRINA	VDA LA PEREGRINA	35
	SEDE POTRERO GRANDE	VDA POTRERO GRANDE	13
	SEDE LIMONAL	VDA LIMONAL	6
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	SEDE SANTA RITA	VDA SANTA RITA	5

TOTAL 7 Sedes Instaladas

Continuando con la distribución territorial, señaló que en El Tarra se incluyeron las sedes El Diviso, El Edén, Martillo Bajo, El Receptor, Tarra Sur, El Salado Bajo. Estas sedes educativas aunque se encuentran focalizadas no ha sido posible su instalación debido a eventos de fuerza mayor relacionados con la presencia de grupos armados que han impedido el acceso a la zona.

I.E Beneficiadas en EL TARRA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	SEDE EL DIVISO	VEREDA EL DIVISO	21
	SEDE EL EDEN	VDA PARTE ALTA DEL FILO DEL GRINGO	22
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO	SEDE MARTILLO BAJO	VDA MARTILLO BAJO	22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA	SEDE EL RECEPTOR	VDA EL RECEPTOR	15
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS	SEDE TARRA SUR	VDA TARRA SUR	21
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO	SEDE EL SALADO BAJO	VEREDA EL SALADO BAJO	15

TOTAL 0 sedes desistieron

En Hacarí, se focalizaron sedes como Palo Cruzal, Sandoval, San Miguelito, David Hadad Salcedo, Las Mercedes, El Llano y Manuel Dolores Ortíz. Las siete sedes educativas focalizadas se encuentran instaladas.

I.E Beneficiadas en HACARÍ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	SEDE PALO CRUZAL	VDA PALO CRUZAL	23
	SEDE SANDOVAL	VDA SANDOVAL	22
	SEDE SAN MIGUELITO	VDA PLATILLOS	18
	SEDE DAVID HADAD	VDA BUENA	18
	SALCEDO	SUERTE	
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE LAS MERCEDES	VDA LAS CAJICADAS	22
	SEDE EL LLANO	VDA EL LLANO	9
	SEDE MANUEL DOLORES	VDA BELGICA	28
	ORTIZ		

TOTAL **7 Sedes Instaladas**

En La Playa, se incluyeron el Centro Rural Cerro Viejo, Llano Grande, Lucio Pabón Núñez, Guayabón, Cumana, Sucre y La Legía. De estas sedes, seis se encuentran instaladas y una sede está en fase de planeación por reemplazo.

I.E Beneficiadas en LA PLAYA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO	CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	VDA CORRAL VIEJO	38
	SEDE LLANO GRANDE	VDA LLANO GRANDE	20
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LUCIO PABON NUÑEZ	CORREG LA VEGA DE SAN ANTONIO	61
	SEDE EL GUAYABON	VDA GUAYABON	26
	SEDE CUMANA	VDA MESARICA	25
INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	SEDE SUCRE	VDA SUCRE	21
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LA LEGIA	VDA LA LEGIA	21

TOTAL **1 sede en reemplazo**

TOTAL **6 Sedes Instaladas**

Reemplazo Cupo Sede Tibú

En el municipio de Ocaña, se beneficiaron las sedes de Béticas, Llano de los Trigos, Curos parte Alta, Curos Parte Baja, Filo del Cordón y Salobrito. De estas, cuatro sedes se encuentran instaladas y 2 están en fase de planeación por reemplazo.

I.E Beneficiadas en OCAÑA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES	SEDE BETICAS	VDA BETICA	18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS	SEDE LLANO DE LOS TRIGOS	VDA LLANO DE LOS TRIGOS	14
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO	SEDE LOS CUROS PARTE ALTA	VDA LOS CUROS	15
	SEDE LOS CUROS PARTE BAJA	VDA LOS CUROS	17
	SEDE FILO DEL CORDON	VDA FILO DEL CORDON	18
COL EDMUNDO VELASQUEZ	SEDE SALOBRITO	CORREG OTARE	8

TOTAL **2 sedes en remplazo**

TOTAL **4 Sedes Instaladas**

Remplazo Cupo Sede Tibú

En San Calixto, se han focalizado las sedes El Silencio, San Jerónimo, Vega del Palacio, El Loro, Mediagüita, Agua de la Virgen y La Colina. Las siete sedes educativas se encuentran instaladas.

I.E Beneficiadas en SAN CALIXTO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE EL SILENCIO	VDA EL SILENCIO	10
	SEDE SAN JERONIMO	VDA SAN JERONIMO	10
	SEDE VEGA DEL PALACIO	VDA VEGA DEL PALACIO	6
	SEDE EL LORO	VDA EL LORO	10
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE MEDIAGUITA	CORREG MEDIAGUITA	13
	SEDE AGUA DE LA VIRGEN	VDA EL HELECHO	9
	SEDE LA COLINA	VDA SAN IGNACIO	30

TOTAL **7 Sedes Instaladas**

En Sardinata, fueron incluidas las sedes El Porvenir, Filo Real, Paramillo, Cristalina Macondo, El Guayabo, El Páramo y Santa Ana. De estas siete sedes se encuentra solo instalada la correspondiente a El Guayabo, las demás se encuentran en fase de planeación.

I.E Beneficiadas en SARDINATA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE PORVENIR	VDA AGUAS CLARAS	11
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	SEDE FILO REAL	VDA FILO REAL	3
	SEDE PARAMILLO	VDA PARAMILLO	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA	SEDE CRISTALINA MACONDO	VDA CRISTALINA MACONDO	24
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE EL GUAYABO	VDA EL GUAYABO	11
	SEDE EL PARAMO	VDA EL PARAMO	4
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	SEDE SANTA ANA	CORREG DE SAN MARTIN DE LOBA	23

TOTAL **1 Sede En Revisión**

TOTAL **1 Sede Instalada**

Debido a que se ingresa por El Tarra

En el municipio de Teorama se focalizaron las sedes educativas La Estrella Parte Baja, El Limón Pulpitos, Altigracia, San Juan de Dios, El Rosario y San Luis Alto. A la fecha se han instalado seis sedes educativas, quedando solamente pendiente la sede Pulpitos.

I.E Beneficiadas en TEORAMA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA	LA ESTRELLA BAJA	8
	SEDE EL LIMON	VDA EL LIMON	13
	SEDE PULPITOS	VDA LOS PULPITOS	7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES	SEDE ALTA GRACIA	VDA ALTA GRACIA	7
	SEDE SAN JUAN DE DIOS	VDA SAN JUAN DE DIOS	6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA	SEDE EL ROSARIO	VDA EL ROSARIO	21
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO	SEDE SAN LUIS ALTO	VDA SAN LUIS ALTO	22

TOTAL **6 Sedes Instaladas**

En Tibú, se focalizaron sedes como Caño Tomás, Villa del Carmen, La Medrosa, Miramonte, María Auxiliadora, El Milagro, Puerto Palmas, Semilleros de Paz, Vetas del Oriente. Oru 7, San Martín, El Milagro, Las Timbas, Límites de Villanueva, La Colombiana y Oru L5, completando así la cobertura proyectada en este municipio. Estas sedes educativas se encuentran en fase de planeación.

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD	SEDE CAÑO TOMAS	VDA CAÑO TOMAS	52
	SEDE VILLA DEL CARMEN	VDA VILLA DEL CARMEN-CGTO LA LLANA	67
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE LA MEDROSA	VDA LA MEDROSA	22
	SEDE MIRAMONTE	VDA MIRAMONTE	89
	SEDE MARIA AUXILIADORA	VDA FILO DE LA VIRGEN	49
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	SEDE EL MILAGRO	VDA LA SELVA CORREGIMIENTO CAMPO DOS	38
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	PUERTO PALMAS	VDA. PUERTO PALMA	80
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEMILLEROS DE PAZ	VDA CAÑO INDIO	41
	SEDE VETAS DE ORIENTE	CRG LA GABARRA VD LA GABARRA	81

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	ORÚ 7	VDA. ORÚ 7	105
	SEDE SAN MARTIN	VDA KM 23	70
	EL MILAGRO	VDA. P30 BAJO	81
	SEDE LAS TIMBAS	VDA EL CUARENTA	36
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA	VDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	61
	SEDE LA COLOMBIANA	VDA COLOMBIANA	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BERTRANIA	SEDE ORU L5	VDA CAMPO YUCA	50

TOTAL **1 sede en remplazo**

TOTAL **3 sedes desistieron**

SEDE	OBSERVACIONES
SEDE MIRAMONTE	Se desiste por el tema de la conexión eléctrica
SEDE VETAS DE ORIENTE	Tiene el beneficio de internet con internexa
ORÚ 7	Solicitaron beneficio a 2 planteles de la sede, No puede ser beneficiada en sus dos planteles (Primaria y Secundaria), ya que para la Secretaría de Educación se considera una sola sede.

Resultado de lo anterior, la supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones educativas validadas para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a ciento diez sedes, todas ellas han sido entregadas al operador, quien ha iniciado el proceso técnico correspondiente para instalación. Indicó que, hasta la fecha, se han instalado setenta y nueve sedes educativas, diecinueve en proceso de instalación, se han aprobado noventa y ocho estudios de campo y doce estudios de campo se encuentra pendientes de aprobación para completar la totalidad de sedes educativas beneficiarias. De otro lado, se han presentado siete desistimientos y cuatro sedes fueron retiradas por ser beneficiarias de otros programas de conectividad.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



110

Sedes Educativas

Sedes del Área Metropolitana y Zona Catatumbo.

Avance consolidado

19

En Fase De Instalación

79

Instaladas

98

Estudios de Campo Aprobados

7

Desistimientos

4

Con Otros Programas

12

En Aprobación EC

Por último, diecinueve instituciones educativas se encuentran en fase de instalación. No obstante, el desarrollo de estas actividades ha presentado retrasos significativos para diecisiete sedes, debido a situaciones de orden público en las zonas de intervención, las cuales han limitado la movilidad de los equipos técnicos y la ejecución normal de las labores programadas.

Estas circunstancias, ajenas a la voluntad de las partes y catalogadas como hechos constitutivos de fuerza mayor, han sido debidamente informadas por el operador y serán soportadas con la respectiva declaración juramentada de fuerza mayor, con el fin de dejar constancia formal de las condiciones que han impedido el cumplimiento oportuno del cronograma inicial.

MUNICIPIO	NOMBRE IE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA
Sardinata	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	SEDE FILO REAL
		SEDE PARAMILLO
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE PORVENIR
Tibú	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	SEDE EL PARAMO
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	SEDE SANTA ANA
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD	SEDE CAÑO TOMAS
		SEDE VILLA DEL CARMEN
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE LA MEDROSA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	SEDE EL MILAGRO
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	PUERTO PALMAS
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEMILLEROS DE PAZ
		SEDE SAN MARTIN
		EL MILAGRO
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	SEDE LAS TIMBAS
		SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA
		SEDE LA COLOMBIANA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BERTRANIA	SEDE ORU L5



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



bajo radicado 25209891 del 26 de junio de 2025 y se realizó solicitud actualización al plan de utilizaciones y cronograma de ejecución mediante radicado 251092725 del 21 de julio de 2025.

La Supervisión del MINTIC informa que está revisando la solicitud en conjunto con la justificación técnica, financiera, jurídica y administrativa enviada por la Gobernación de Norte de Santander mediante radicado MINTIC 2511107319 del 19 de agosto de 2025, con el propósito de emitir concepto para la aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones y Cronograma de Ejecución del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Estado Financiero del Convenio



Plan de Utilizaciones:

RADICADO MINTIC SOLICITUD DE APROBACIÓN	RADICADO MINTIC APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN SUPERVISIÓN	COMITÉ OPERATIVO Y FECHA DEL COMITÉ DONDE SE APROBÓ LA UTILIZACIÓN
251070554	252098913	N/A
MODIFICACION PLAN UTILIZACION		
251092725	Pendiente	Pendiente

Legalización de Recursos:

PERIODO	CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN	VALOR	UTILIZACIÓN NO.	RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN	RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En cuanto al balance general del estado financiero del proyecto, se detalló que el valor total del convenio asciende a \$47.000.000.000 y que los rendimientos financieros acumulado hasta la fecha corresponden a \$36.097.734,44 M/cte.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Estado Financiero del Convenio



Cuadro de Ejecución:

Concepto	Valor Estimado	Observaciones
Valor total del convenio	\$42.000.000.000	Recursos De Ministerio
	\$5.000.000.000	Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha	\$47.000.000.000	Operador E Interventoría
Valor ejecutado	\$0	No se han efectuado pagos aún
Rendimientos financieros	\$ 36.097.734,44	Acumulado a mes de julio
Rendimientos financieros Devueltos	\$ 36.097.734,44	Del mes de junio y julio
Saldo disponible en cuenta	\$42.000.000.000	Recursos disponibles una vez aprobado primer desembolso

Hasta el momento, no se ha realizado ningún pago por lo cual no se reporta Legalizaciones.

Estado jurídico.

El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación administrativa previsto en la Ley 80 de 1993 y que la interventoría se encuentra en ejecución bajo el régimen de contratación interadministrativa, también contemplado en la prenombrada ley, en virtud del contrato interadministrativo número CI- STIC 02177 de 2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander.

En lo que respecta a la contratación del operador, se destacó que esta se formalizó el 16 de junio de 2025 con la Sociedad Entel S.A. ESP, bajo el contrato número CI-STIC-02178 de 2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025, y su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2026, siendo el valor total del contrato asciende a \$44.916.969.831, cero por ciento de ejecución

Por otro lado, sostuvo que la contratación de la interventoría fue realizada el 20 de junio de 2025 con la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el contrato número CI STIC 02177 de 2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025 y una fecha de finalización prevista es el 31 de diciembre de 2025. El valor del contrato es de \$2.083.030.169 cero por ciento de ejecución.

En cuanto a los recursos de contrapartida, se señaló que estos corresponden a un aporte de \$5.000.000.000 pesos M/cte por parte de la Gobernación, con vigencia futura para el año 2026.

Logros alcanzados



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



A manera de conclusión, en lo que respecta a los logros alcanzados, la supervisora de la gobernación destacó lo siguiente: 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet. 92 comunidades listas para instalación. 8 comunidades en proceso de alistamiento. 92 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo. 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total). 98 estudios de campo aprobados. 19 instituciones educativas en fase de instalación. 79 instituciones educativas instaladas (incluyendo 4 sedes ya reportadas como logro inicial). Procesos de sustitución y reemplazo de cupos gestionados en coordinación con rectores y comunidad. Trámite de justificaciones por situaciones de orden público y presencia de otros programas de conectividad. Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a los estudios de campo.

Intervención Ingeniero Jorge Matulevich

En este punto, el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez interviene planteando compromisos que deben ser atendidos por la Gobernación de Norte de Santander, así:

1. Reconocimiento por parte de la Interventoría Universidad Francisco de Paula Santander de los eventos de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de un tercero o imposibilidades materiales que han dificultado la instalación de las Sedes Educativas y las Juntas de Internet – Comunidades Conectividad.
2. Remitir copia de los desistimientos por parte de las sedes educativas y las Juntas de Internet, donde se evidencie las causales del por qué no desean formar parte de los beneficios del proyecto.
3. Teniendo en cuenta la ejecución técnica del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025, se solicita que la ejecución financiera se vaya adelantando teniendo en cuenta los hitos establecidos y así poder aprobar las utilizaciones contenidas en el respectivo Plan.
4. Realizar cuanto antes las visitas de aprobación por parte de la Interventoría a las Sedes Educativas instaladas para que en el próximo comité operativo se cuente con la totalidad de las sedes focalizadas en fase de Operación.

Intervención Ingeniero Camilo Luna

Seguidamente, el Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios interviene señalando la importancia de que el avance financiero este correlacionado con el avance técnico dada la temporalidad del proyecto y los resultados que han de obtenerse al 31 de diciembre de 2025.

De igual forma, recomienda que los reportes de avance comiencen a ser remitidos a la supervisión, con el fin de garantizar trazabilidad y seguimiento adecuado al cumplimiento de los hitos técnicos establecidos en el convenio; señala que, aunque aún se cuenta con plazo contractual para cumplir las metas, es necesario documentar cada fase del proceso, desde la entrega de listados hasta la instalación, para que la supervisión tenga claridad sobre el progreso real del proyecto.

3. Propuestas y Varios.

Finalmente, el Ingeniero Matulevich pregunta si hay alguna observación adicional y teniendo en cuenta que no hay más comentarios, agradeció la participación de todos los asistentes y dio



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO	
--	---	--

por cerrada la sesión del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, siendo las 2:50 p.m. del 28 de agosto de 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Instalación de Instituciones Educativas	Gobernación Ejecutor Interventoría	30/09/2025
Reconocimiento por parte de la Interventoría Universidad Francisco de Paula Santander de los eventos de fuerza mayor	Gobernación Interventoría	15/09/2025
Copia de los desistimientos por parte de las sedes educativas y las Juntas de Internet,	Gobernación	15/09/2025
Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo	Gobernación	30/09/2025
Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a las Sedes Educativas Instaladas.	Gobernación	30/09/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS	Asesor del Despacho del Ministro-Supervisor Convenio 1211 de 2025.	
SONIA ARANGO MEDINA	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander – Supervisora Convenio 1211-2025 – Gobernación	
JORGE ALBERTO MATULEVICH P	Profesional Especializado-Delegado Secretaría General MINTIC	
MÓNICA PAZ SUÁREZ	Profesional Especializada – Apoyo técnico a la supervisión MINTIC	
JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA	Contratista apoyo técnico a la supervisión MINTIC	
CARMEN LAURA MEJIA PUERTA	Contratista apoyo jurídico a la supervisión MINTIC	
ANDREA DEL PILAR GARCIA	Contratista apoyo financiero a la supervisión MINTIC	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



FELIPE ROJAS	Representante Operador	
LEONARDO CONTRERAS	Ingeniero de la Secretaría de las TIC - Gobernación	
JORDY ROLÓN	Ingeniero de la Secretaría de las TIC - Gobernación	
MARIO GALLARDO	Ingeniero Interventoría	
JUAN PABLO ÁLVAREZ	Ingeniero Interventoría	
LUIS HERNANDO JOYA NEIRA	Contraloría General de la República	
LUIS ANTONIO VERA AYALA	Contraloría General de la República	
BEATRIZ ALICIA PAVAJEAU OLIVARES	Contraloría General de la República	
ALBERTO MAURICIO SANTOS PEÑA	Contraloría General de la República	
SERGIO TORRES CÁRDENAS	Contraloría General de la República	
GLORIA PATRICIA PERDOMO	Asesora Oficina Fomento Regional	
YENI CAROLINA MOLANO RAMIREZ	Contratista Oficina Fomento Regional	
YANK CARLOS GONZALEZ FORERO	Ingeniero Interventoría	
ASTRID CAROLINA CONTRERAS	Profesional Secretaría TIC Gobernación	
SERGIO ANDRÉS	Ingeniero TIC Gobernación Norte de Santander	
FABIÁN BURBANO	Profesional Secretaría TIC Gobernación	
SERGIO TORRES CÁRDENAS	Contratista Oficina Fomento Regional	
CAMILO TORO	Ingeniero Interventoría	
EMMANUEL PALLARES	Ingeniero Interventoría	

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS	Asesor del Despacho del Ministro-Supervisor Convenio 1211 de 2025	
SONIA ARANGO MEDINA	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander – Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación	
JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ	Profesional Especializado-	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Delegado
MINTIC


Secretaría
General

Anexos



COMITÉ OPERATIVO CONV. 1211-2025

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

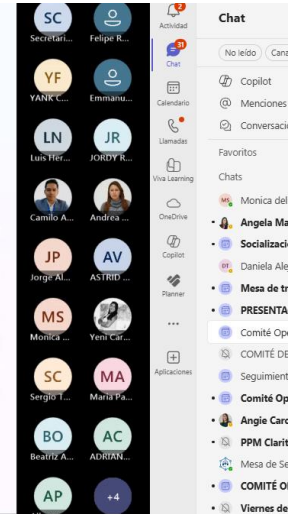

LISTADO DE ASISTENCIA

Resumen									
Título de la reunión Comité Operativo Convenio Interadministrativo 1957-2024 Norte de Santander									
Participantes que asistieron 27									
Hora de inicio 8/28/25, 1:49:00 PM									
Hora de finalización 8/28/25, 2:51:17 PM									
Duración de la reunión 1 h 2 min 16s									
Tiempo medio de asistencia 46 min 10s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Jorge Alberto Matulevich Peláez	8/28/25, 2:00:50 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 27s	jmatulevich@mintic.gov.co	jmatulevich@mintic.gov.co	Organizador			
Monica del Rosario Paz Suarez	8/28/25, 1:58:32 PM	8/28/25, 2:51:15 PM	52 min 42s	mpaz@mintic.gov.co	mpaz@mintic.gov.co	Moderador			
Yeni Carolina Molano Ramirez	8/28/25, 1:58:38 PM	8/28/25, 2:51:12 PM	52 min 34s	ymolano@mintic.gov.co	ymolano@mintic.gov.co	Moderador			
Sergio Torres Cardenas (C)	8/28/25, 2:00:32 PM	8/28/25, 2:51:09 PM	50 min 36s	sergio.torres@contraloria.gov.co	sergio.torres@contraloria.gov.co	Moderador			
JORDY ROLON-TIC (No comprobado)	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 43s			Moderador			
Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 43s	tic@nortedesantander.gov.co	tic@nortedesantander.gov.co				
Moderador									
YANK CARLOS GONZALEZ FORERO (No comprobado)	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:16 PM	50 min 43s			Moderador			
Luis Hernando Joya Neira (CGR)	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 43s	luis.joya@contraloria.gov.co	lhjoya@contraloria.gov.co	Moderador			
Emmanuel Pallares	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 43s			Moderador			
Alberto Mauricio Santos Pena (CGR)	8/28/25, 2:00:33 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 43s	alberto.santos@contraloria.gov.co	amsantos@contraloria.gov.co	Moderador			
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR	8/28/25, 2:00:34 PM	8/28/25, 2:51:10 PM	50 min 35s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co				
Moderador									
Felipe Rojas	8/28/25, 2:00:36 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 41s			Moderador			
Maria Paula Antia (No comprobado)	8/28/25, 2:00:37 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	50 min 39s			Moderador			
ADRIANA PATRICIA MOYA CASTAÑO (No comprobado)	8/28/25, 2:00:39 PM	8/28/25, 2:51:13 PM	50 min 33s			Moderador			
Camilo Andres Luna Berríos	8/28/25, 2:01:47 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	49 min 29s	caluna@mintic.gov.co	caluna@mintic.gov.co	Moderador			
Andrea Del Pilar Garcia Imitola	8/28/25, 2:01:49 PM	8/28/25, 2:51:08 PM	49 min 18s	agarcia@mintic.gov.co	agarcia@mintic.gov.co	Moderador			
Beatriz Alicia Pavajeau Olivares (CGR)	8/28/25, 2:03:18 PM	8/28/25, 2:51:12 PM	47 min 54s	beatriz.pavajeau@contraloria.gov.co	beatriz.pavajeau@contraloria.gov.co				
Moderador									
Gloria Montoya gomez	8/28/25, 2:03:38 PM	8/28/25, 2:50:30 PM	46 min 52s			Moderador			
Juan pablo alvarez perez	8/28/25, 2:04:26 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	46 min 50s			Moderador			
Yaneth (No comprobado)	8/28/25, 2:05:09 PM	8/28/25, 2:51:15 PM	46 min 5s			Moderador			
Juan pablo alvarez (No comprobado)	8/28/25, 2:05:21 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	45 min 55s			Moderador			
Luis Antonio Vera Ayala (CGR)	8/28/25, 2:06:40 PM	8/28/25, 2:51:15 PM	44 min 34s	luis.vera@contraloria.gov.co	lvera@contraloria.gov.co	Moderador			
Mario Gallardo (No comprobado)	8/28/25, 2:08:24 PM	8/28/25, 2:51:15 PM	42 min 50s			Moderador			
Sergio Orjuela TIC (No comprobado)	8/28/25, 2:09:24 PM	8/28/25, 2:51:15 PM	41 min 51s			Moderador			
Gisselle Hernandez Vargas	8/28/25, 2:11:56 PM	8/28/25, 2:51:17 PM	39 min 20s			Moderador			
Pedro Felipe Campo Guida	8/28/25, 2:25:51 PM	8/28/25, 2:50:56 PM	25 min 5s	pcampo@mintic.gov.co	pcampo@mintic.gov.co	Moderador			
Jose Ubaldo Castro Acosta	8/28/25, 2:43:49 PM	8/28/25, 2:51:11 PM	7 min 22s	jucastro@mintic.gov.co	jucastro@mintic.gov.co	Moderador			



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 4 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Agosto-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250915-163522-6bfba6-51671737

Creación: 2025-09-15 16:35:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-18 15:38:37



Escanee el código
para verificación

Firma: Secretaria TIC Gobernación Norte de Santander

Sonia Arango Medina
60371697
tic@nortedesantander.gov.co
Secretaria TIC
Gobernacion Norte de Santander

Firma: Apoyo Jurídico a la Supervisión

Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Firma: Apoyo Financiero a la Supervisión

Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Firma: Apoyo Técnico a la Supervisión

Mónica del Rosario Paz Suarez
51855160
mpaz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 4 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Agosto-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250915-163522-6bfba6-51671737

Creación: 2025-09-15 16:35:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-18 15:38:37



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor MINTIC Convenio 1211 de 2025

Camilo Andrés Luna Barrios

1.110.466.090

caluna@mintic.gov.co

Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura

Asesor del Despacho del Ministro

Firma: Delegado Secretaria General MINTIC Convenio 1211 de 2025

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

C.C. 79.760.815

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta 4 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Agosto-25			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250915-163522-6bfba6-51671737		Creación: 2025-09-15 16:35:22	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-09-18 15:38:37	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mónica del Rosario Paz Suarez mpaz@mintic.gov.co Profesional Especializado MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-09-15 16:35:35 Lec.: 2025-09-15 16:49:30 Res.: 2025-09-15 16:49:34 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Andrea Garcia agarciai@mintic.gov.co Contratista Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-09-15 16:49:34 Lec.: 2025-09-16 12:18:01 Res.: 2025-09-16 12:18:05 IP Res.: 186.155.138.255
Firma	Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2025-09-16 12:18:05 Lec.: 2025-09-16 12:18:33 Res.: 2025-09-16 12:18:38 IP Res.: 172.56.164.121
Firma	Sonia Arango Medina tic@nortedesantander.gov.co Secretaria TIC Gobernacion Norte de Santander	Aprobado	Env.: 2025-09-16 12:18:38 Lec.: 2025-09-16 15:26:44 Res.: 2025-09-18 10:20:59 IP Res.: 191.156.188.3
Firma	JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ jmatulevich@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Env.: 2025-09-18 10:20:59 Lec.: 2025-09-18 10:22:42 Res.: 2025-09-18 10:23:04 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infr Asesor del Despacho del Ministro	Aprobado	Env.: 2025-09-18 10:23:04 Lec.: 2025-09-18 11:55:00 Res.: 2025-09-18 15:38:37 IP Res.: 190.145.189.98
