



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 2120

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
16	Reunión virtual	09-Marzo-2026	9:30 a.m.	10:30. m.

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo Convenio **1211 de 2025** – Departamento de Norte de Santander Catatumbo y Área Metropolitana del mes de febrero de 2026, para realizar el seguimiento del avance del proyecto que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la “IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Verificación del quorum.
3. Avances Técnicos – Jurídico y Financiero.
4. Suspensión # 1
5. Propuesta y varios.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
01	Detalles de avance mensual en la ejecución del proyecto.	En proceso
03	Documento de verificación y certificación del cumplimiento de requisitos de licencias y permisos.	En proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO.

En uso de la palabra el ingeniero Libardo Sánchez, saluda a todos los integrantes del comité de la gobernación, la Dra. luz Myriam Gil.

Como invitados, por parte de la Dirección de Infraestructura



ACTA DE REUNIÓN



- Michael Ansony Hernández sandia
- Jesús Andrés Luna Mestra
- Miguel Armando Cruz Ortiz

Y por parte de la Gobernación

- Sonia Arango

2. VERIFICACIÓN ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ – QUÓRUM

- Se inicia la reunión, verificando la presencia de los miembros del Comité Técnico Operativo conformado por el Ing. Libardo Sánchez, luz Myriam Gil Osorio y Sonia Arango se especifican la conformación y funciones del comité.

Teniendo quorum para el desarrollo del presente comité, se continua adelante con el mismo.

Se procede a preguntar a los asistentes si hay algún inconveniente para que el comité sea grabado. Teniendo en cuenta que no hay ninguna objeción se procede a dar inicio a la grabación.

Continuando con el orden del día el supervisor, Ing. Libardo procede a dar la palabra al departamento del Norte de Santander para que realice la presentación objeto de esta acta.

3. AVANCES TECNICOS – JURIDICO Y FINANCIERO.

Toma la palabra la Dra. Sonia quien hace la presentación del estado técnico, jurídico y financiero del convenio 1211 de 2025 de la siguiente manera donde se habló de los avances a las obligaciones contractuales. (presentación anexa).

De los puntos a resaltar en la presenta acta están:

Inicia con el resume las actividades realizadas entre el **2 y el 3 de febrero**, incluyendo reuniones de seguimiento entre interventoría y operador del convenio, así como mesas técnicas para analizar solicitudes y definir lineamientos técnicos

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 1



(02 de febrero – 03 de febrero)

- Participación en reunión de seguimiento entre interventoría y operador del Convenio 1211.
- Participación en mesa técnica para análisis y estructuración de respuesta a derecho de petición relacionado con el convenio.
- Reunión de coordinación con interventoría para revisión de requerimientos derivados del derecho de petición, definiendo lineamientos técnicos para la respuesta institucional

Imagen que presenta las actividades del **6 de febrero**, donde se reporta el envío del **Formato 051 correspondiente al mes de enero**, consolidando información técnica y administrativa y enviando soportes al Ministerio.

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 2



(06 de febrero)

- Reporte y envío del Formato 051 correspondiente al mes de enero, consolidando información técnica y administrativa requerida.
- Remisión formal al Ministerio de la presentación y soportes del comité del mes de enero, garantizando la trazabilidad documental y cumplimiento de los procesos de reporte.

Continúa con la semana del **9 de febrero al 12 de febrero**, donde reporta el envío del informe integral correspondiente al mes de diciembre, la participación en la reunión con el ministerio para el análisis de situación de fuerza mayor y el envío de la solicitud de la suspensión del convenio 1211-2024

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 3



(09 de febrero – 12 de febrero)

- Envío del informe integral correspondiente al mes de diciembre.
- Participación en reunión con el Ministerio para análisis de situación de fuerza mayor que impacta la ejecución del convenio.
- Envío de la solicitud de suspensión temporal del Convenio 1211-2025.

En el seguimiento de la semana del **17 al 19 de febrero**, se realizó la proyección y envío de la respuesta al derecho de petición recibido para el traslado, la remisión a la interventoría y soportes técnicos para las respuestas oficiales, adicional la consolidación de respuestas oficiales.

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 4



(17 de febrero – 19 de febrero)

- Proyección y envío de respuesta a derecho de petición recibido para traslado, incluyendo estructuración técnica de la respuesta institucional.
- Remisión a la interventoría de derechos de petición y soportes técnicos para la consolidación de respuestas oficiales.
- Consolidación y envío de soportes de rendimientos financieros mes de enero.

La Dra. Sonia inicia el informe del avance de juntas de internet, no ha podido avanzar debido a los temas de orden público, y fuerza mayor, sustentando al ministerio, se envió solicitud de suspensión, la cual, a la fecha no se ha recibido respuesta.

A continuación, se presentan las **comunidades beneficiadas de El**, incluyendo nombre de la comunidad, número de hogares a conectar, estado de estudios de campo e instalación. También presenta totales de hogares proyectados y el estado de avance.

Abrego, Hogares conectados: 82, por conectar 413

Comunidades Beneficiadas en ABREGO



TOTAL

8 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
VEGA DEL TIGRE	45	-	Si	En Instalación
HOYO PILON	51	-	Si	En Instalación
LA SIERRA-PALMIRA	70	-	Si	En Instalación
OROQUE	41	41	Si	Instalada
EL TABACO	41	41	Si	Instalada
EL TARRA	85	-	Si	En Instalación
EL GUAMAL	40	-	Si	En Instalación
LOS INDIOS	40	-	Si	En Instalación

Total de Hogares a conectar: 413

ORDEN PUBLICO

Total de Hogares conectados: 82

ORDEN PUBLICO

E.C

8 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO

6 - En Instalación

INST.

2 - Comunidades Instaladas

Convención, Hogares conectados 0, por conectar 542

Comunidades Beneficiadas en CONVENCION



TOTAL

6 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LLANOS DE BELEN	101	-	Si	No
SANTA BARBARA	67	-	No	No
LA LIBERTAD	101	-	Si	En Instalación
PATIECITOS	96	-	Si	No
CARTAGENA	116	-	Si	No
AGUA BLANCA	61	-	Si	En Instalación

Total de Hogares a conectar: 542

ORDEN PUBLICO

Total de Hogares conectados: 0

E.C

5 - Estudios de Campo Aprobados


ESTADO

2 - En Instalación


INST.

0 - Comunidades Instaladas


El Carmen, hogares conectados 0, por conectar 711

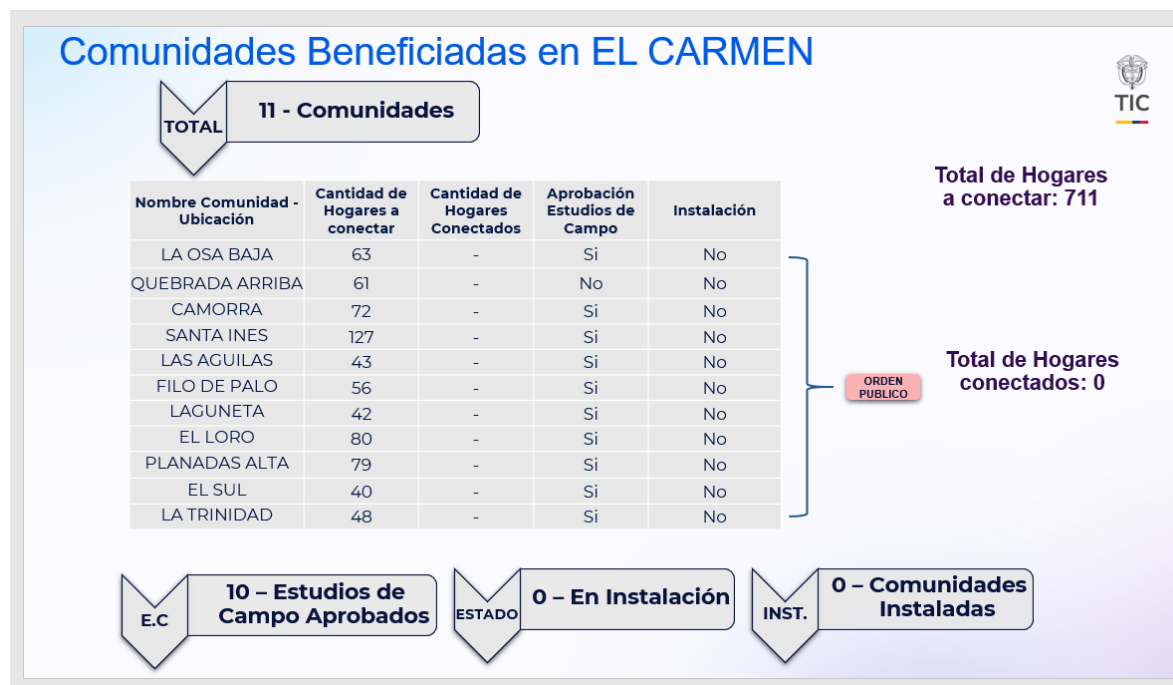


La Tarra, conectados 0, por conectar 192

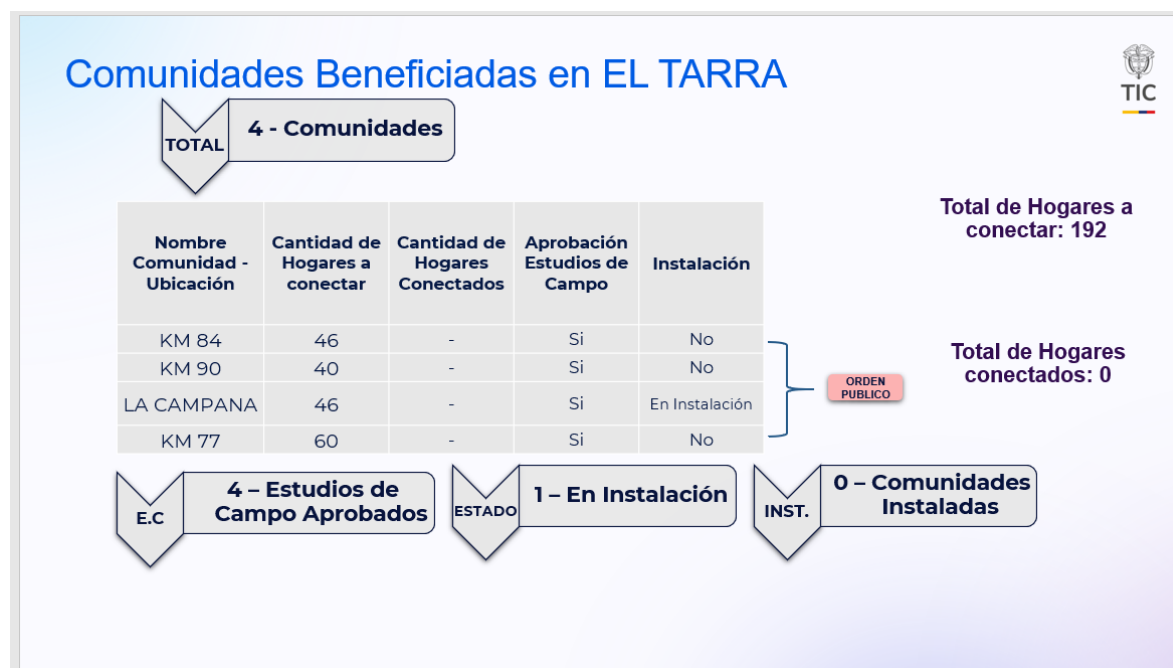


Hacari, hogares conectados 0, por conectar 683

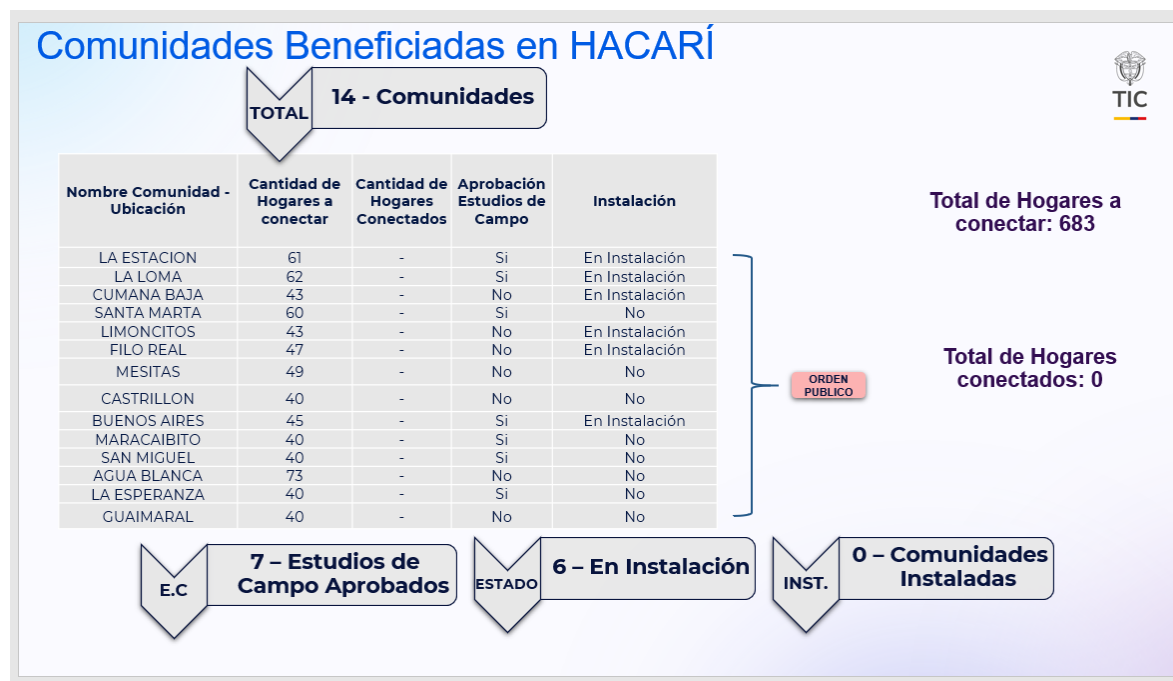


La Playa, hogares conectados 119, por conectar 636

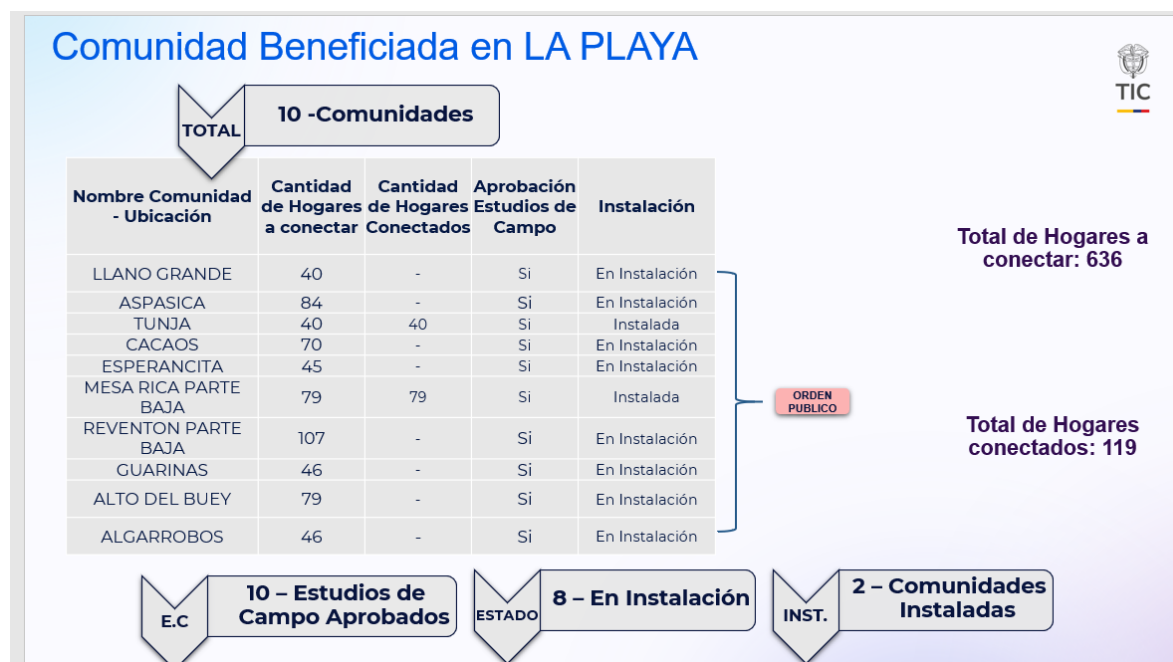


Ocaña, hogares conectados 175, por conectar 349

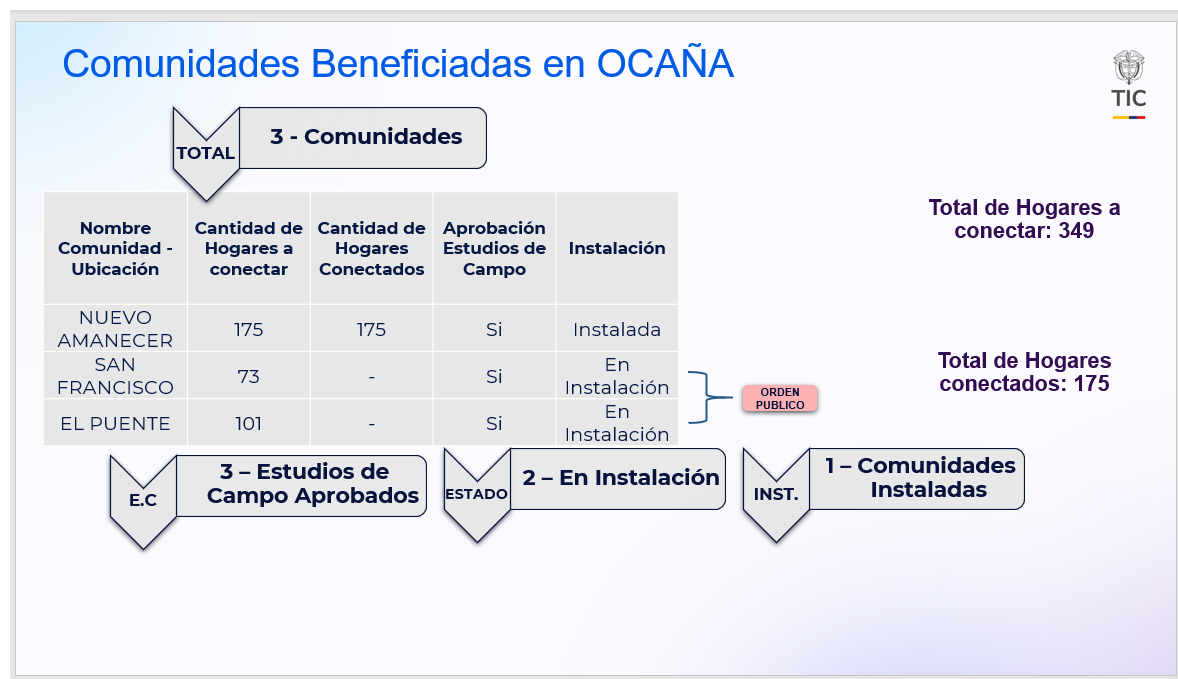


San Calixto, hogares conectados 0, por conectar 374

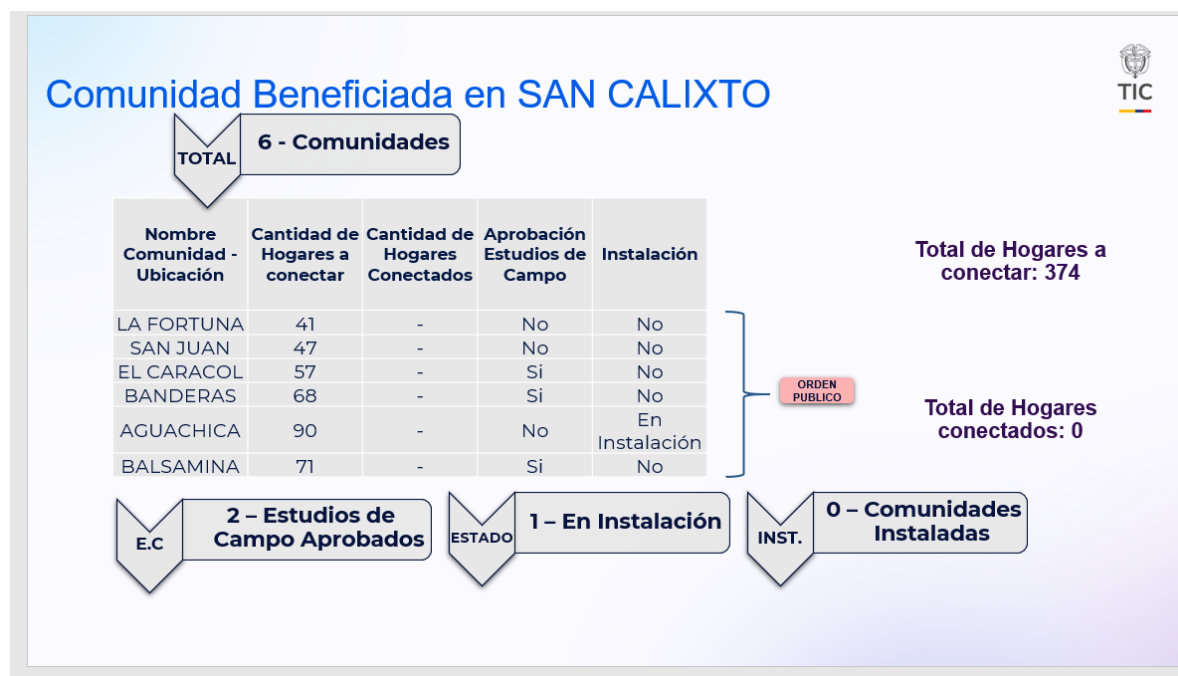

Sardinata, hogares conectados 0, por conectar 195

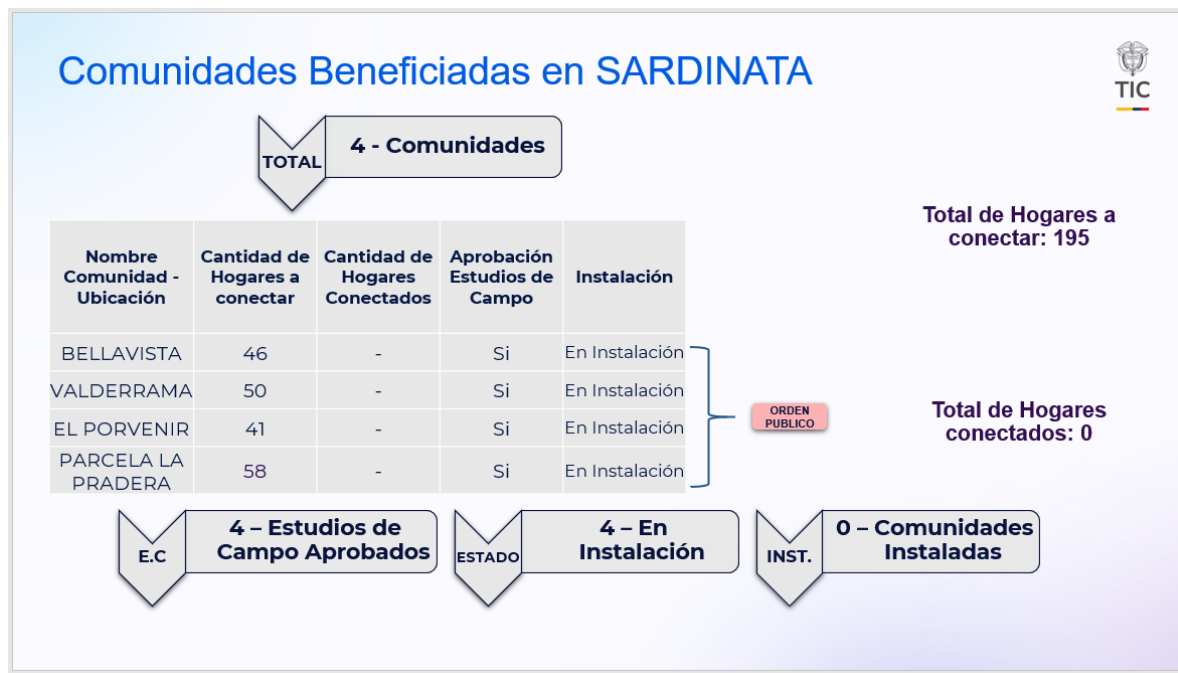

Teorama, hogares conectados 231, por conectar 662

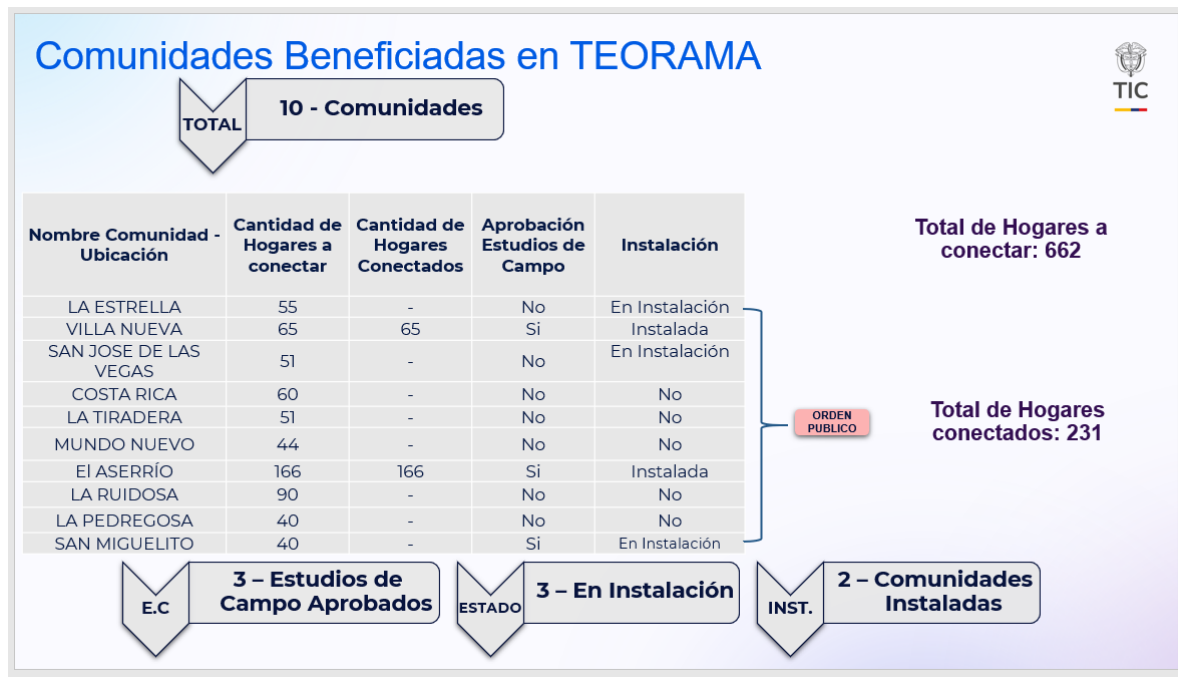

Tibu, hogares conectados 198, por conectar 509

Comunidades Beneficiadas en TIBÚ



TOTAL 9 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
PALMERAS MIRADOR	50	-	Si	En Instalación
SAN JOSE KM 60	41	-	Si	En Instalación
LA INDIA ALTO SAN MIGUEL	40	-	No	No
TROCHA GANADERA	48	-	Si	En Instalación
LA RESERVA	40	-	No	En Proceso de Desistimiento
CASA DE ZINC	46	-	Si	No
LA UNION AMBATO	40	40	Si	Instalada
CAMPO YUCA ORO CINCO	46	-	Si	En Instalación
VILLA ESPERANZA	158	158	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 509

Total de Hogares conectados: 198

ORDEN PUBLICO

7 - Estudios de Campo Aprobados
E.C

4 - En Instalación
ESTADO

2 - Comunidades Instaladas
INST.

Comunidades Beneficiadas en TIBÚ



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA RESERVA – MUNICIPIO DE TIBÚ

Tibú, 18 de febrero de 2026

Señores:

MINITIC
EMTEL SAS
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
Ciudad

Asunto: Desistimiento del proyecto de Internet – Vereda La Reserva (Tibú)

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en representación de la comunidad de la Vereda La Reserva, me permito informar el desistimiento del proyecto de Internet previsto para dicha vereda.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta que, al momento de la socialización, la comunidad contaba con un estimado de hasta cuarenta (40) beneficiarios como tope para el proyecto. Sin embargo, debido a la situación de orden público que se ha venido presentando durante más de un (1) año, la gran mayoría de familias inscritas se ha visto obligada a desplazarse por amenazas o por temor, quedando actualmente una minoría de personas en la vereda.

En reunión comunitaria, y considerando lo anterior, se tomó la decisión de no continuar con la ejecución del proyecto, dado que el número actual de posibles beneficiarios es insuficiente para su desarrollo.

Agradecemos su comprensión y el acompañamiento brindado.

Atentamente,

Vereda La Reserva
PRESIDENTE
Emilse Florez Mantilla
Presidenta Junta.

Nombre = Emilse Florez Mantilla
Cédula = cc 39726-338
Teléfono = # 3104140806
Emilse Florez Mantilla
Presidenta
C.C.37.726.338
Teléfono: 310 419 0806
Junta de Acción Comunal – Vereda La Reserva

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA RESERVA	40	-	No	En Proceso de Desistimiento



REDUCCIÓN DE USUARIOS POR ORDEN PUBLICO Y NO SE CUMPLEN CON LOS 40 HOGARES MÍNIMO

Avance Catatumbo, en el cual encontramos un total de 85 comunidades, 9 instaladas, 37 en proceso de instalación y 1 desistimiento



A continuación, inicia con la presentación de los avances del área metropolitana.

Cucuta, hogares conectados 163, por conectar 163

Comunidades Beneficiadas en CÚCUTA



TOTAL 4 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LOS CAMBULOS	42	42	Si	Instalada
EL ENCANTO	41	41	Si	Instalada
CAÑO MONO	40	40	Si	Instalada
EL ARRAYAN	40	40	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 163

Total de Hogares conectados: 163

E.C 4 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 4 - Comunidades Instaladas

Los Patios, hogares conectados 60, por conectar 130

Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS



TOTAL 2 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
CALIFORNIA	70	-	Si	En Instalación
LA MUTIS	60	60	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 130

Total de Hogares conectados: 60

E.C 2 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 1 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas

El Zulia, hogares conectados 302, por conectar 358

Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA



TOTAL 7 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
20 DE JULIO	40	40	Si	Instalada
CERRO LEON	43	43	Si	Instalada
ENCERRADEROS	82	82	Si	Instalada
EL PEDREGAL	40	40	Si	En Instalación
LA CONQUISTA	47	47	Si	Instalada
CRISTO REY	56	-	Si	En Instalación
SANTA ROSA	50	50	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 358

Total de Hogares conectados: 302

E.C 7 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 2 - En Instalación

INST. 6 - Comunidades Instaladas

San Cayetano, hogares conectados 43, por conectar 83

Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO



TOTAL 2 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA FLORIDA	40	-	Si	En Proceso de Desistimiento
LLANO AMARILLO-SAN ISIDRO	43	43	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 83

Total de Hogares conectados: 43

E.C 2 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas



ACTA DE REUNIÓN



Avance Área Metropolitana, en el cual encontramos un total de 15 comunidades, 12 instaladas, 3 en proceso de instalación y 1 desistimiento



Resumen consolidado

Avance Consolidado 100 J.A.C



100

Comunidades

Comunidades para la implementación de juntas de internet.

1.

2.

40

Comunidades En Instalación

21

Comunidades Instaladas

3.

4.

6.000

Hogares a Conectar

1.373

Hogares Conectados

CONVENIO	JI-CDC (META)	HOGARES (META)	JI-CDC Instaladas	JI-CDC por instalar	% de Avances en Juntas	Hogares Conectados	Hogares por Conectar	% de Avances en Hogares	JI-CDC en desistimiento
CONVENIO 1211	100	6000	21	77	21%	1373	4627	23%	2
TOTAL	100	6000	21	77	21%	1373	4627	23%	2

Estas son las 40 juntas de acción comunal que están de instalación, con porcentaje de avance

40

Comunidades En Instalación



INDICE	HITO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUNIDAD -	ZONA	AVANCE NODO	CANTIDAD DE CASAS	AVANCE HOGARE	PORCENTAJE AVANCE
1	2	EL ZULIA	EL PEDREGAL	AREA METROPOLITANA	100%	40	40	100%
2	2	TIBU	SAN JOSE KM 60	CATATUMBO	100%	41	40	98%
3	2	LOS PATIOS	CALIFORNIA	AREA METROPOLITANA	100%	70	68	97%
4	2	TEORAMA	SAN MIGUELITO	CATATUMBO	100%	40	38	95%
5	2	EL ZULIA	CRISTOREY	AREA METROPOLITANA	100%	58	52	93%
6	2	LA PLAYA	ALTO DEL BUEY	CATATUMBO	100%	70	65	93%
7	2	ABREGO	EL GUAMAL	CATATUMBO	100%	40	37	93%
8	2	OCAÑA	EL PUENTE	CATATUMBO	100%	101	93	92%
9	2	ABREGO	EL TARRA	CATATUMBO	100%	85	78	92%
10	2	TIBU	TROCHA GANADERA	CATATUMBO	100%	48	44	92%
11	2	LA PLAYA	ALGARROBOS	CATATUMBO	100%	46	42	91%
12	2	ABREGO	LA SIERRA-PALMIRA	CATATUMBO	100%	70	63	90%
13	2	ABREGO	LOS INDIOS	CATATUMBO	100%	40	36	90%
14	2	LA PLAYA	GUARINAS	CATATUMBO	100%	48	41	85%
15	2	LA PLAYA	ASPASICA	CATATUMBO	100%	70	62	89%
16	2	LA PLAYA	REVENTON PARTE BAJA	CATATUMBO	100%	100	88	88%
17	2	ABREGO	VEGA DEL TIGRE	CATATUMBO	100%	45	39	87%
18	2	OCAÑA	SAN FRANCISCO	CATATUMBO	100%	73	63	86%
19	2	SARDINATA	PARCELA LA PRADERA	CATATUMBO	100%	59	42	72%
20	2	SARDINATA	EL PORVENIR	CATATUMBO	100%	41	29	71%
21	2	EL TARRA	LA CAMPANA	CATATUMBO	100%	46	32	70%
22	2	SARDINATA	BELLAVISTA	CATATUMBO	100%	46	32	70%
23	2	SARDINATA	VALDEPRAMA	CATATUMBO	100%	50	31	62%
24	2	ABREGO	HOTO PILON	CATATUMBO	100%	51	28	55%
25	2	CONVENCIOR	LA LIBERTAD	CATATUMBO	100%	101	101	100%
26	2	CONVENCIOR	AGUA BLANCA	CATATUMBO	100%	61	61	100%
27	2	HACARI	BUENOS AIRES	CATATUMBO	100%	45	45	100%
28	2	HACARI	CUMANA BAJA	CATATUMBO	100%	43	43	100%
29	2	HACARI	FILO REAL	CATATUMBO	100%	47	47	100%
30	2	HACARI	LA ESTACION	CATATUMBO	100%	61	61	100%
31	2	HACARI	LA LOMA	CATATUMBO	100%	62	62	100%
32	2	HACARI	LIMONCITOS	CATATUMBO	100%	43	43	100%
33	2	LA PLAYA	CACAO	CATATUMBO	100%	70	70	100%
34	2	LA PLAYA	ESPERANCITA	CATATUMBO	100%	51	51	100%
35	2	LA PLAYA	LLANO GRANDE	CATATUMBO	100%	59	59	100%
36	2	SAN CALIXTO	AGUACHICA	CATATUMBO	100%	60	60	100%
37	2	TEORAMA	LA ESTRELLA	CATATUMBO	100%	55	55	100%
38	2	TEORAMA	SAN JOSE DE LAS VEGAS	CATATUMBO	100%	51	51	100%
39	2	TIBU	CAMPO YUCA ORO CINCO	CATATUMBO	100%	46	46	100%
40	2	TIBU	PALMERAS MIRADOR	CATATUMBO	100%	50	50	100%

SOLO SE TRASLADARON EQUIPOS

A continuación expone el avance de las capacitaciones, en 26 juntas de acción comunal

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

AVANCE DE CAPACITACIONES



- Avance en **26 Juntas de Acción Comunal (JAC)**

Resumen ejecutivo (KPIs)

Participantes registrados
342

Formación En Apropiación
Técnica Y Operativa
109

Formación En Apropiación
Digital
233

% femenino
44%

% masculino
56%

Tipo dominante
COMUNITARIO

Avance de capacitaciones en 26 juntas de acción comunal.

AVANCE DE CAPACITACIONES



- Avance en **26 Juntas de Acción Comunal (JAC)**

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE AVANCES DE CAPACITACIONES								
JUNTAS	SOCIALIZACION	CULTIVANDO REDES	ASEGURANDO EL TERRENO	ACUERDOS LEGALES	ECONOMIA CAMPESINA	SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA	EXPLORANDO EL MUNDO DIGITAL	TOTAL
20 DE JULIO	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
ALGARROBOS	14%	14%				14%	14%	57%
ALTO DEL BUEY	14%	14%	14%			14%	14%	71%
ASPASICA	14%	14%				14%	14%	57%
CACAOS	14%	14%				14%	14%	57%
CALIFORNIA	14%	14%				14%	14%	57%
CAÑO MONO	14%						14%	29%
CERRO LEON	14%	14%				14%	14%	57%
EL ARRAYAN	14%	14%				14%	14%	57%
EL ENCANTO	14%	14%			14%	14%	14%	71%
EL PEDREGAL	14%	14%	14%			14%	14%	71%
EL TABACO	14%	14%				14%	14%	57%
ENCERRADEROS	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
ESPERANCITA	14%	14%				14%	14%	57%
GUARINAS	14%	14%				14%	14%	57%
LA CONQUISTA	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
LA MUTIS	14%	14%				14%	14%	57%
LIMONCITOS	14%					14%	14%	43%
LLANO AMARILLO	14%	14%			14%	14%	14%	71%
LLANO GRANDE	14%	14%	14%			14%	14%	71%
LOS CAMBULOS	14%	14%				14%	14%	57%
MESA RICA PARTE BAJA	14%	14%				14%	14%	57%
OROQUE	14%	14%				14%	14%	57%
REVENTON PARTE BAJA	14%	14%	14%			14%	14%	71%
SANTA ROSA	14%	14%				14%	14%	57%
TUNJA	14%	14%				14%	14%	57%

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

AVANCE DE CAPACITACIONES



Avance en 26
Juntas de Acción
Comunal (JAC)

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS CAPACITADAS					
JUNTAS	ADMINISTRATIVO	COMUNITARIO	TÉCNICO	TOTAL	TOTAL %
20 DE JULIO	8	8	2	18	5,26%
ALGARROBOS		8		8	2,34%
ALTO DEL BUEY		10		10	2,92%
ASPASICA		7		7	2,05%
CACAOS		8		8	2,34%
CALIFORNIA	3	9		12	3,51%
CAÑO MONO	1	5		6	1,75%
CERRO LEON	7	8	2	17	4,97%
EL ARRAYAN	4	10	3	17	4,97%
EL ENCANTO	5	9	2	16	4,68%
EL PEDREGAL		8		8	2,34%
EL TABACO	3	9	3	15	4,39%
ENCERRADEROS	3	9	4	16	4,68%
ESPERANCITA		9		9	2,63%
GUARINAS		8		8	2,34%
LA CONQUISTA	5	17	4	26	7,60%
LA MUTIS	4	15	2	21	6,14%
LIMONCITOS		9		9	2,63%
LLANO AMARILLO	2	9	2	13	3,80%
LLANO GRANDE		9		9	2,63%
LOS CAMBULOS	6	7	2	15	4,39%
MESA RICA PARTE BAJA	5	7	3	15	4,39%
OROQUE	3	7	2	12	3,51%
REVENTON PARTE BAJA	6	9	3	18	5,26%
SANTA ROSA	2	10	3	15	4,39%
TUNJA	3	9	2	14	4,09%
TOTAL	70	233	39	342	100%

El Dr. Libardo pregunta al operador si el tiempo restante del contrato, 90 días, es suficiente para terminar el proyecto, el cual informa que por temas de orden nacional, no es posible. Se acuerda dar 30 días más.

I.E Beneficiadas en LOS PATIOS



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST EDUCATIVA LA GARITA	SEDE TORCOROMA	VDA AGUA LINDA	9
	SEDE TASCARENA	VDA LA MUTIS	15



Instituciones Educativas beneficiadas en El Zulia

Instituciones Educativas beneficiadas en El Zulia

I.E Beneficiadas en EL ZULIA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE ASTILLEROS	VDA ASTILLEROS - LA YE VIA TIBU	54
	SEDE GUADUALES	VDA ASTILLEROS	16
	SEDE PUEBLITOS	VDA ASTILLEROS	11
	SEDE LA UNION	VDA ASTILLEROS	89
	SEDE CERRO LEON	VDA CERRO LEON	13
	SEDE RISARALDA	VDA ASTILLEROS	63
	SEDE RANCHO GRANDE	VDA RANCHO GRANDE	39
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE PUERTO ESTRELLA	VDA PUERTO ESTRELLA	22
	SEDE PEDREGALES	VEREDA PEDREGALES	36
	SEDE EL LLANITO	VDA ENCERRADERO	8
	SEDE FE Y ALEGRIA	CORREG PAN DE AZUCAR	6
	SEDE LA ESTANCIA	AZUCAR	43
	SEDE PEÑALISA	VDA CAMPO ALICIA	7
	SEDE LOS MANGOS	VDA PAN DE AZUCAR	21
	SEDE LA CONQUISTA	VDA PAN DE AZUCAR	8

Instituciones Educativas beneficiadas en El Zulia

I.E Beneficiadas en EL ZULIA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITTA	VEGA DE MARTINEZ	VDA. LA ANGELITTA	11
	SAN MIGUEL	VDA. SAN MIGUEL	42
	SAN CARLOS	VDA. EL GUAYABO	20
	LA MACARENA	VDA. LA MACARENA	12
	SEDE VENTE DE JULIO	VDA VEINTE DE JULIO	16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE LA RAMPACHALA	VDA LA RAMPACHALA	51
	SEDE PLAYA COLORADA	AV 2 6-25	36
	SEDE EL MESTIZO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU PARTE ALTA	12
	SEDE EL PROGRESO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU	22
	SEDE LA COLORADA	VDA LA COLORADA	74



Instituciones Educativas beneficiadas en Abrego

I.E Beneficiadas en ABREGO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO	SEDE LA TEJA	VDA LA TEJA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA	SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	VDA. EL TARRA	73
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS	SEDE GAIRA	VDA GAIRA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE	SEDE EL LLANON	VDA EL LLANON	31
CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ	CANUTILLO PARTE ALTA	VDA CANUTILLO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA	SEDE POTRERO NUEVO	VDA POTRERO NUEVO	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER	SEDE HARAGANAZO	VDA HARAGANAZO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO	SEDE LLANO SUAREZ	VDA LLANOSUAREZ	52

TOTAL 8 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Convencion

I.E Beneficiadas en CONVENCION



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	SEDE NUEVAS HONDURAS	VDA HONDURAS	7
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL YERARO MIMAY SASHIYI	SEDE BATROCTORA	VD CORREGIMIENTO HONDURAS	22
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	SEDE AGUA BLANCA	VDA AGUA BLANCA	7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL	SEDE MESA RICA	CORREG MESA RICA	23
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	SEDE BELLA UNION	VDA BELLA UNION	8
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	SEDE SAN JUAN DE LLANOS	VEREDA SAN JUAN DE LLANOS	27
	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	13
	SEDE MAICITOS	VDA MAICITOS	21

TOTAL 8 Sedes En Operación

Puesta en marcha 7 sedes 01 de octubre

Puesta en marcha 1 sede 01 de noviembre

Instituciones Educativas beneficiadas en El Carmen

I.E Beneficiadas en EL CARMEN



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	SEDE EL PARAISO	VDA EL PARAISO	26
	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	11
	SEDE LA QUIEBRA	VDA LA QUIEBRA	25
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LA PEREGRINA	VDA LA PEREGRINA	35
	SEDE POTRERO GRANDE	VDA POTRERO GRANDE	13
	SEDE LIMONAL	VDA LIMONAL	6
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	SEDE SANTA RITA	VDA SANTA RITA	5

TOTAL 7 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en El Tarra

I.E Beneficiadas en EL TARRA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	SEDE EL DIVISO	VEREDA EL DIVISO	21
	SEDE EL EDEN	VDA PARTE ALTA DEL FILO DEL GRINGO	22
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO	SEDE MARTILLO BAJO	VDA MARTILLO BAJO	22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA	SEDE EL RECEPTOR	VDA EL RECEPTOR	15
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS	SEDE TARRA SUR	VDA TARRA SUR	21
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO	SEDE EL SALADO BAJO	VEREDA EL SALADO BAJO	15

TOTAL 6 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Hacarí

I.E Beneficiadas en HACARÍ			
NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	SEDE PALO CRUZAL	VDA PALO CRUZAL	23
	SEDE SANDOVAL	VDA SANDOVAL	22
	SEDE SAN MIGUELITO	VDA PLATILLOS	18
	SEDE DAVID HADAD SALCEDO	VDA BUENA SUERTE	18
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE LAS MERCEDES	VDA LAS CAJICADAS	22
	SEDE EL LLANO	VDA EL LLANO	9
	SEDE MANUEL DOLORES ORTIZ	VDA BELGICA	28
TOTAL		7 Sedes En Operación	Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en La Playa

I.E Beneficiadas en LA PLAYA			
NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO	CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	VDA CORRAL VIEJO	38
	SEDE LLANO GRANDE	VDA LLANO GRANDE	20
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LUCIO PABON NUÑEZ	CORREG LA VEGA DE SAN ANTONIO	61
	SEDE EL GUAYABON	VDA GUAYABON	26
	SEDE CUMANA	VDA MESARICA	25
	SEDE LA LEGIA	VDA LA LEGIA	21
INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	SEDE SUCRE	VDA SUCRE	21
TOTAL		7 Sedes En Operación	Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Ocaña

I.E Beneficiadas en OCAÑA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES	SEDE BETICAS	VDA BETICA	18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS	SEDE LLANO DE LOS TRIGOS	VDA LLANO DE LOS TRIGOS	14
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO	SEDE LOS CUROS PARTE ALTA	VDA LOS CUROS	15
	SEDE LOS CUROS PARTE BAJA	VDA LOS CUROS	17
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	SEDE FILO DEL CORDON	VDA FILO DEL CORDON	18
COL EDMUNDO VELASQUEZ	SEDE SALOBRITO	CORREG OTARE	8

TOTAL 6 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en San Calixto

I.E Beneficiadas en SAN CALIXTO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE EL SILENCIO	VDA EL SILENCIO	10
	SEDE SAN JERONIMO	VDA SAN JERONIMO	10
	SEDE VEGA DEL PALACIO	VDA VEGA DEL PALACIO	6
	SEDE EL LORO	VDA EL LORO	10
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE MEDIAGUITA	CORREG MEDIAGUITA	13
	SEDE AGUA DE LA VIRGEN	VDA EL HELECHO	9
	SEDE LA COLINA	VDA SAN IGNACIO	30

TOTAL 7 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Sardinata

I.E Beneficiadas en SARDINATA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE PORVENIR	VDA AGUAS CLARAS	11
	SEDE EL GUAYABO	VDA EL GUAYABO	11
	SEDE EL PARAMO	VDA EL PARAMO	4
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	SEDE FILO REAL	VDA FILO REAL	3
	SEDE PARAMILLO	VDA PARAMILLO	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA	SEDE CRISTALINA MACONDO	VDA CRISTALINA MACONDO	24
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	SEDE SANTA ANA	CORREG DE SAN MARTIN DE LOBA	23

TOTAL **7 Sedes En Operación**

Puesta en marcha **01 de octubre**

Instituciones Educativas beneficiadas en Teorama

I.E Beneficiadas en TEORAMA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA	LA ESTRELLA BAJA	8
	SEDE EL LIIMON	VDA EL LIMON	13
	SEDE PULPITOS	VDA LOS PULPITOS	7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES	SEDE ALTA GRACIA	VDA ALTA GRACIA	7
	SEDE SAN JUAN DE DIOS	VDA SAN JUAN DE DIOS	6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA	SEDE EL ROSARIO	VDA EL ROSARIO	21
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO	SEDE SAN LUIS ALTO	VDA SAN LUIS ALTO	22

TOTAL **7 Sedes En Operación**

Puesta en marcha **6 sedes 01 de octubre**
Puesta en marcha **1 sede 01 de noviembre**

Instituciones Educativas beneficiadas en Tibú

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD	SEDE CAÑO TOMAS	VDA CAÑO TOMAS	52
	SEDE VILLA DEL CARMEN	VDA VILLA DEL CARMEN- CGTO LA LLANA	67
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE LA MEDROSA	VDA LA MEDROSA	22
	SEDE MARIA AUXILIADORA	VDA FILO DE LA VIRGEN	49
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	SEDE EL MILAGRO	VDA LA SELVA CORREGIMIENTO CAMPO DOS	38
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	PUERTO PALMAS	VDA. PUERTO PALMA	80
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEMILLEROS DE PAZ	VDA CAÑO INDIO	41

Instituciones Educativas beneficiadas en Tibú

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEDE SAN MARTIN	VDA KM 23	70
	EL MILAGRO	VDA. P30 BAJO	81
	SEDE LAS TIMBAS	VDA EL CUARENTA	36
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA	VDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	61
	SEDE LA COLOMBIANA	VDA COLOMBIANA	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BERTRANIA	SEDE ORU L5	VDA CAMPO YUCA	50

TOTAL 13 Sedes
En Operación

Puesta en
marcha 01 de
octubre

A continuación los indicadores de Instituciones educativas, equipo de la gobernación hace la explicación del consolidado, el cual no presento afectaciones durante el mes de febrero.

INDICADORES IE				
Enero:				
Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 96%	Sí
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	Sí
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	Sí
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h	Sí
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	Sí (programada)

Radicado: Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-088

Indicadores por disponibilidad del servicio



ACTA DE REUNIÓN




INDICADORES IE



Modelo Ejemplo

2.1. Disponibilidad del Servicio

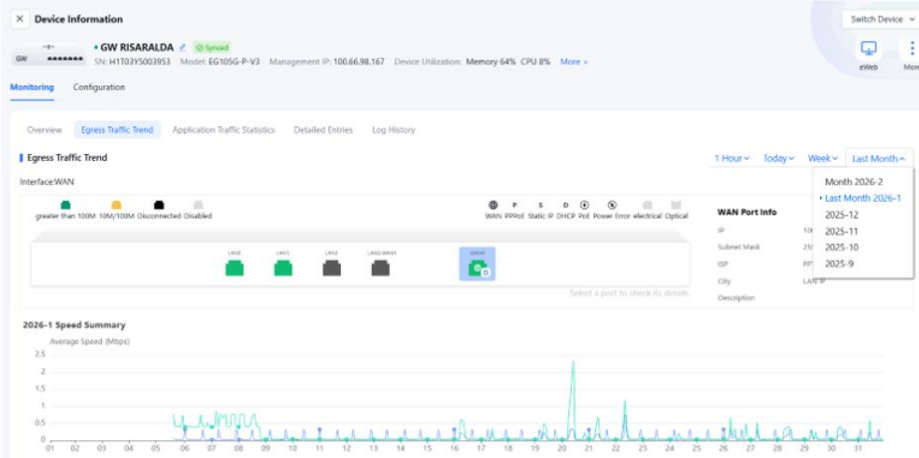


Indicadores por usuarios conectados y calidad del Wi-Fi

INDICADORES IE



Modelo Ejemplo

2.2. Usuarios Conectados, Calidad de Señal Wi-Fi

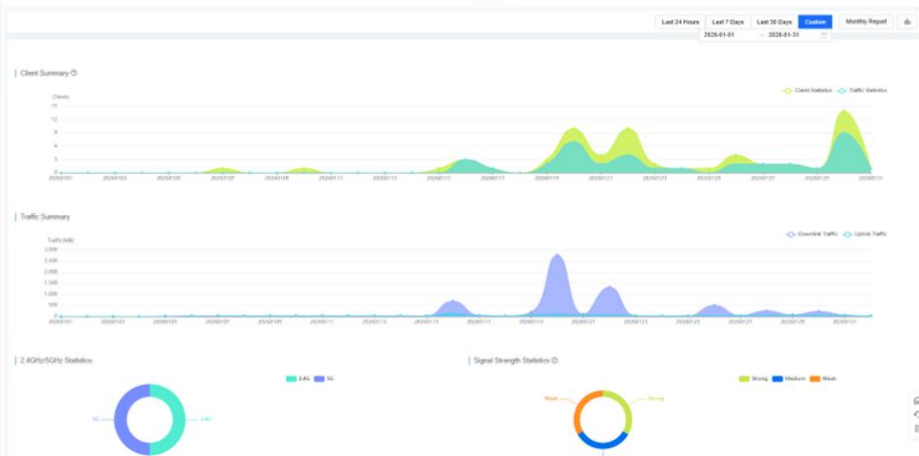

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”




ACTA DE REUNIÓN



Indicadores por dispositivos conectados y puntos de acceso Red Wi-Fi





Indicadores por consumo de internet por tipo de aplicación

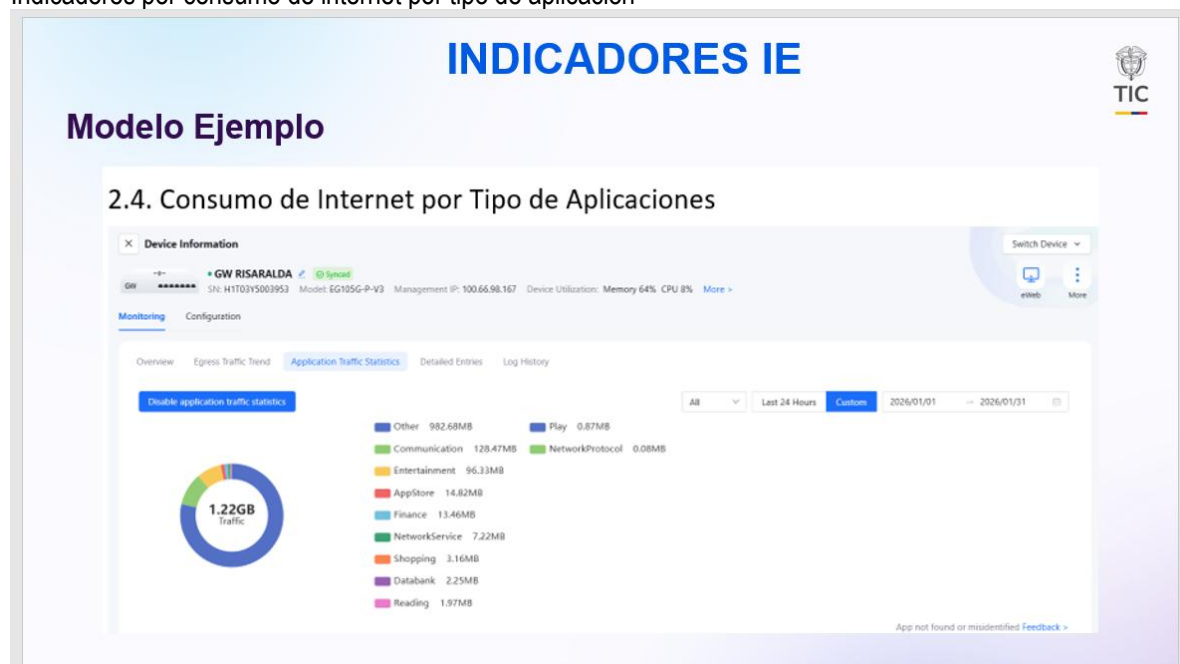

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Indicadores por consumo mensual Plataforma KVH

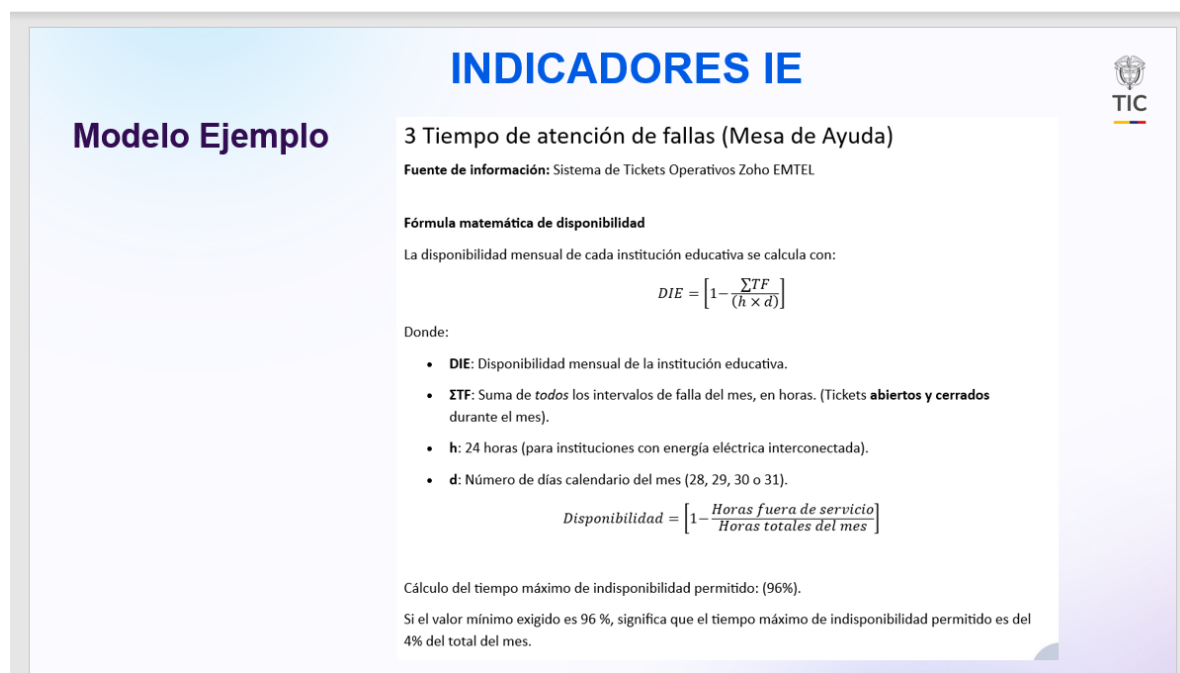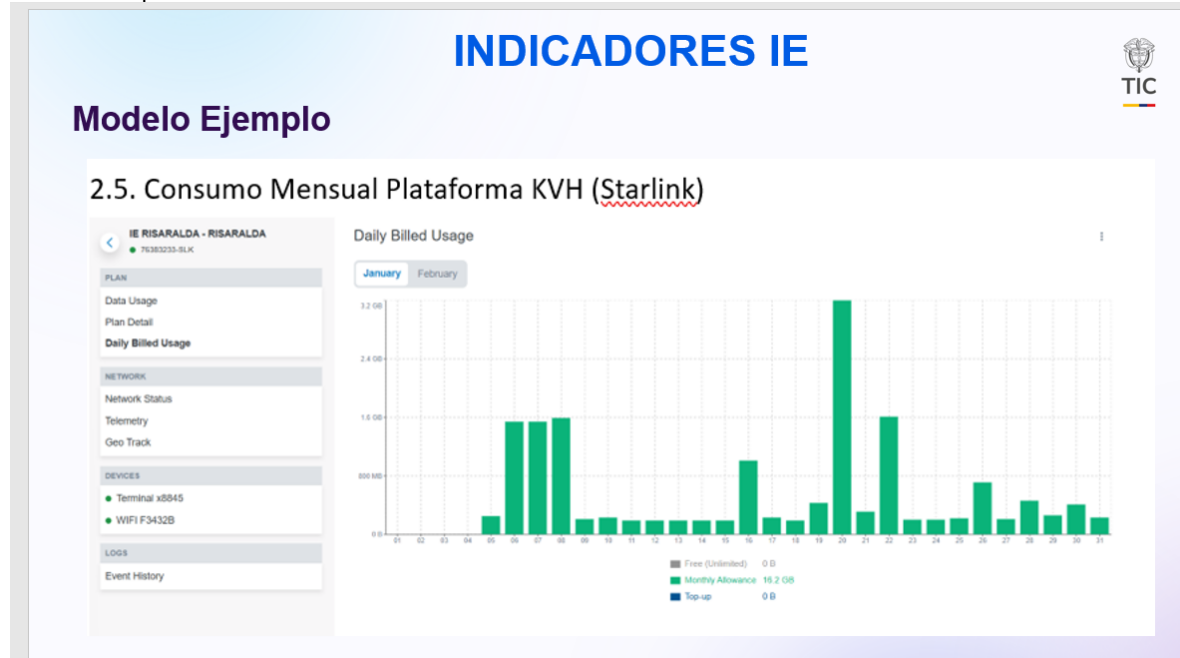

Indicadorws febrero

INDICADORES IE				
Febrero:				
Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 96%	Sí
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	Sí
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	Sí
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h	Sí
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	Sí (programada)

Indicador parcial* Radicado: Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-089

Gráfico de indicadores que muestra el **estado de avance en instituciones educativas conectadas**, indicando que durante el mes evaluado **no se presentaron afectaciones en la ejecución del proyecto**.

INDICADORES JI CDC



Enero

Indicador	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio.	Mínimo 95% del tiempo mensual.	Sí (99,89%)
Velocidad de Descarga	Rapidez de bajada	Pruebas de velocidad (<u>Speedtest</u>) en los hogares.	Mínimo 25 Mbps.	Sí
Velocidad de Carga	Rapidez de subida	Pruebas de velocidad (<u>Speedtest</u>) en los hogares.	Mínimo 5 Mbps.	Sí
Latencia	Retrasos o " <u>lag</u> "	Medición del tiempo de respuesta de la red (ms).	Máximo 150 ms (terrestre).	Sí
Mesa de Ayuda	Solución de fallas	Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran.	Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo.	Sí
Mantenimiento	Salud de los equipos	Revisión física de los equipos y actas de visita.	Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses.	Sí

Radicado Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-088

INDICADORES JI CDC



Febrero

Indicador	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio.	Mínimo 95% del tiempo mensual.	Sí (98,74%)
Velocidad de Descarga	Rapidez de bajada	Pruebas de velocidad (<u>Speedtest</u>) en los hogares.	Mínimo 25 Mbps.	Sí
Velocidad de Carga	Rapidez de subida	Pruebas de velocidad (<u>Speedtest</u>) en los hogares.	Mínimo 5 Mbps.	Sí
Latencia	Retrasos o " <u>lag</u> "	Medición del tiempo de respuesta de la red (ms).	Máximo 150 ms (terrestre).	Sí
Mesa de Ayuda	Solución de fallas	Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran.	Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo.	Sí
Mantenimiento	Salud de los equipos	Revisión física de los equipos y actas de visita.	Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses.	Sí

Indicador parcial* Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-089



ACTA DE REUNIÓN



A continuación, se presenta el Estado Financiero de Convenio. Tabla o gráfico que resume la **situación financiera del convenio**, incluyendo recursos asignados, ejecutados y pendientes dentro del seguimiento del proyecto.

Estado Financiero del Convenio



Desembolso:

DESCRIPCIÓN	VALOR	RADICADO MinTIC	FECHA RADICADO MinTIC	ESTADO	Nº EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE	251070554	2025-06-13	APROBADO	215904825	2025-06-26	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000)

Rendimientos

Estado Financiero del Convenio



Rendimientos Financieros:

PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS	FECHA CONSIGNACIÓN	NO. COMPROBANTE FIDUCIARIA	NO. COMPROBANTE MINTIC
JUNIO	\$4.124.047,85	\$4.124.047,85	18/07/2025	CE 006054	Pendiente
JULIO	\$31.973.686,59	\$31.973.686,59	11/08/2025	CE 007589	No. 2206
AGOSTO	\$31.982.173,88	\$31.982.173,88	10/09/2025	CE 009913	No. 2432
SEPTIEMBRE	\$30.948.086,63	\$30.948.086,63	10/10/2025	CE 012224	Pendiente
OCTUBRE	\$31.982.006,43	\$31.982.006,43	12/11/2025	CE 014793	Pendiente
NOVIEMBRE	\$30.649.300,60	\$30.649.300,60	12/12/2025	CE 017730	Pendiente
DICIEMBRE	\$28.430.557,11	\$28.430.557,11	22/01/2026	CE 00503	Pendiente
ENERO	\$27.450.660,44	\$27.450.660,44	09/02/2026	CE 000731	Pendiente

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Legalización de Recursos

Estado Financiero del Convenio



Legalización de Recursos:

PERIODO	CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN	VALOR	UTILIZACIÓN NO.	RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN	RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
Noviembre	Documentos				
	Plan de ingeniería y Operación (IDEO)				
	Plan de comercialización				
	Plan de mantenimiento				
	Aprobación con el concepto de Interventoría y Gobernación de Norte de Santander	\$4.800.000.000	1	251160460	Pendiente
Diciembre	Interventoría Hito 1. Informes de Interventoría meses de julio de 2025	\$595.151.477	11	Pendiente	Pendiente
Enero	Hito 1. 30 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas	\$1.183.054.600	2	Pendiente	Pendiente
Enero	Hito 2. 40 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas	\$1.577.406.133	3	Pendiente	Pendiente
Enero	Hito 3. 40 Instituciones Educativas instaladas y operativas	\$1.577.406.133	4	Pendiente	Pendiente

Cuadro de Ejecución

Estado Financiero del Convenio



Cuadro de Ejecución:

Concepto	Valor Estimado	Observaciones
Valor total del convenio	\$ 42.000.000.000	Recursos De Ministerio
	\$ 5.000.000.000	Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha	\$ 47.000.000.000	Operador E Interventoría
Valor ejecutado	\$ 9.733.018.343	Pagos Utilizaciones 1,2,3,4 y 11
Rendimientos financieros	\$ 217.540.519,53	Acumulado
Rendimientos financieros Devueltos	\$ 217.540.519,53	Del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre y enero
Saldo disponible en cuenta	\$ 32.049.441.137	Recursos disponibles

Estado Jurídico, la tabla presenta el **estado jurídico del convenio**, mostrando el cumplimiento de requisitos legales, permisos o procesos administrativos asociados al proyecto.

Estado Jurídico del Convenio





OPERADOR

Contrato Interadministrativo N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P.

Novedades: Solicitud de suspensión



INTERVENTORIA

Contrato Interadministrativo N.º CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS

Novedades: Solicitud de suspensión

A continuación, se exponen los avances en la ejecución del convenio

Avance en la Ejecución del Convenio



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de contratación: 07 de mayo de 2025

No. del Contrato: 1211-2025

Fecha de inicio: 07/05/2025

Fecha de finalización: 6/07/2027

Valor del contrato: \$ 47.000.000.000

% de ejecución Financiera: 20,71%

% de ejecución Técnica: 70,2 %

Estado: En Ejecución

Contratación Derivada

OPERADOR

Fecha de contratación: 16 de junio de 2025
Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P
No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025
Fecha de inicio: 01/07/2025
Fecha de finalización: 31/03/2027
Valor del contrato: \$ 44.916.969.831
% de ejecución Financiera: 20,34%
% de ejecución Técnica: 59,5%
Estado: En Ejecución
(Peso Porcentual 90% del Cronograma)



INTERVENTORIA

Fecha de contratación: 20 de junio de 2025
Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025
Fecha de inicio: 01/07/2025
Fecha de finalización: 31/03/2026
Valor del contrato: \$ 2.083.030.169
% de ejecución Financiera: 28,57%
% de ejecución Técnica: 10%
Estado: En Ejecución
(Peso Porcentual 10% del Cronograma)

Recursos de contrapartida - Gobernación



Valor Aportado
\$ 5.000.000.000

Fecha de aporte
Vigencia 2026

Número de cuenta
No Aplica.

¿Se han ejecutado recursos?
No

Valor ejecutado
\$ 0

Concepto de pago
No Aplica.





ACTA DE REUNIÓN



Resumen de los logros.

Logros



Articulación territorial y comunitaria

- Validación territorial con actores comunitarios.

Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet)

- 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet y listas para instalación.
- 100 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo.
 - 84 EC Aprobados
 - 21 Comunidades Instaladas
 - 40 Comunidades En Proceso de Instalación
- 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total).
- 1.373 Hogares Conectados

Avances en instituciones educativas

- 110 estudios de campo aprobados.
- 110 instituciones educativas instaladas
- 108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Octubre
- 2 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Noviembre

Gestión frente a dificultades

- Trámite de justificaciones por situaciones de retraso en instalación de JI-CDC
- Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a las Instalaciones.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Respuesta solicitud de suspencion convenio Ampliacion del convenio a 4 meses	MINTIC	Proximo comité.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Yordi Rolón	Gobernación Norte de Santander	
Carlos Felipe Rojas Gómez	Gobernación Norte de Santander	
Luz Myriam Gil Osorio	Designada por la Secretaría General del MinTIC.	
German Antonio Sánchez Cruz	Contratista Financiera Dirección de Infraestructura	
Michael Ansony Hernández Sandia	Subdirección de Operaciones Contratista	
Sonia Arango Medina	Supervisora del Convenio Secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
Vanesa Johana Caraballo Silva	Contratista Dirección de Infraestructura	
Libardo Sanchez Agredo	Asesor código 1020 – 16 Viceministerio de Conectividad	
Jesus Andrés Luna Mestra	Subdirección de Operaciones Contratista	
Miguel Armando Cruz	Contratista Dirección de Infraestructura	

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Libardo Sanchez Agredo	Asesor código 1020 – 16 Viceministerio de Conectividad Supervisor Convenio 1211-2025 MINTIC/FUTIC	
Sonia Arango Medina	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación	
Luz Myriam Gil Osorio	Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo convenio 1211-2025 Febrero 2026
CATAUMBO NORTE DE SANTANDER

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260325-143021-b9aab2-68847174

Creación: 2026-03-25 14:30:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-25 15:00:44

Firma: Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC

LUZ MYRIAM GIL OSORIO

20351997

lmgil@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Ministerio TIC

Firma: Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación

Sonia Arango Medina

60371697

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernación Norte de Santander

Firma: Asesor código 1020 ? 16 Viceministerio de Conectividad Supervisor Convenio 1211-2025 MINTIC/FUTIC

Libardo Sanchez

16690176

lsancheza@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta Comité Operativo convenio 1211-2025 Febrero 2026 CATAUMBO NORTE DE SANTANDER Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260325-143021-b9aab2-68847174		Creación: 2026-03-25 14:30:21	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-03-25 15:00:44	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	libardo sanchez lsancheza@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-25 14:30:23 Lec.: 2026-03-25 14:42:02 Res.: 2026-03-25 14:42:09 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Sonia Arango Medina tic@nortedesantander.gov.co Secretaria TIC Gobernacion Norte de Santander	Aprobado	Env.: 2026-03-25 14:42:10 Lec.: 2026-03-25 14:57:44 Res.: 2026-03-25 14:58:49 IP Res.: 186.112.223.186 Canal: Email
Firma	LUZ MYRIAM GIL OSORIO lmgil@mintic.gov.co Profesional Especializado Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-03-25 14:58:49 Lec.: 2026-03-25 15:00:28 Res.: 2026-03-25 15:00:44 IP Res.: 191.156.63.179 Canal: Email
